FECHA (D/M/A): 11-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,08 TON
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 5
COMUNA: LA CANDELARIA	
BARRIO: PRADO	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 4:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO
TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- SE REALIZA CHARLA SOCIO-AMBIENTAL CON ENFASIS EN LA IMPORTANCIA DEL ORDEN Y ASEO Y DEL AUTO CUIDADO Y MAS EN ZONAS CON ORDEN PUBLICO DELICADO.
- SE REALIZA SEÑALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE TRABAJO, INSTALACIÓN DE SEÑALES VERTICALES EN LA CR 51 Y CL 65.
- SE DEMARCAN TRES BACHES A INTERVENIR DONDE EL BACHE 1 PRESENTABA DESPRENDIMIENTO DE LA RODADURA CON PIEL DE COCODRILO EN EL PERIMETRO AL IGUAL QUE EL BACHE 2 Y BACHE 3 PERDIDA SECTORIZADO DE CARPETA GENERANDO MULTIPLES BACHES QUE CONSTITUYEN UN RIESGO PARA LOS ACTORES VIALES.
- EN LA ACTIVIDAD DE DEMOLICIÓN SE ENCONTRARON ESPESORES VARIABLES ENTRE (0,14) A 0,17M Y EN EL BACHE SE AFECTO LA DEMARCACIÓN VIAL DE LINEAS PEATONALES
- LAS ACTIVIDADES TRANSCURRIERON CON NORMALIDAD SIN NOVEDADES.

5. VISITANTES

Jorge Morales

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Diego Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JONIER CACERES	X		
7	Ayudante	MARIO MARTINEZ	X		
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS	X		
9	Ayudante	JOSE VILLA LOBOS	X		
10	Ayudante	FRANCISCO TOBON	X		
11	Ayudante	EDUARDO MESA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EDISON YAIL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MACQUITEC	X		
2	Compresor	DOOSAN - 185	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TNG 712 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	WIW 714	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5008529	150860	1A	CRSOD CL65	2,15	1,43	0,15	3,07	0,46	1,11
5008527	150860	1B	CRSOD CL65	1,51	1,42	0,15	2,14	0,32	0,77
5008599	160921	2A	CL 65 SOD-26	2	3,80	0,14	7,60	1,06	2,55
5008599	160921	2B	CL 65 SOD-26	3,80	1,34	0,14	5,09	0,71	1,71
2001132	160933	3A	CRSI 65-10	3,70	2,70	0,15	9,99	1,50	3,60
2001132	160933	3B	CRSI 65-10	1,05	0,90	0,15	0,95	0,14	0,34
TOTALES							28,85	4,20	10,08

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233924	WLW 714	10,08	10,08	141


BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23137	WLW 714	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 11-09-2025

10. ESQUEMAS

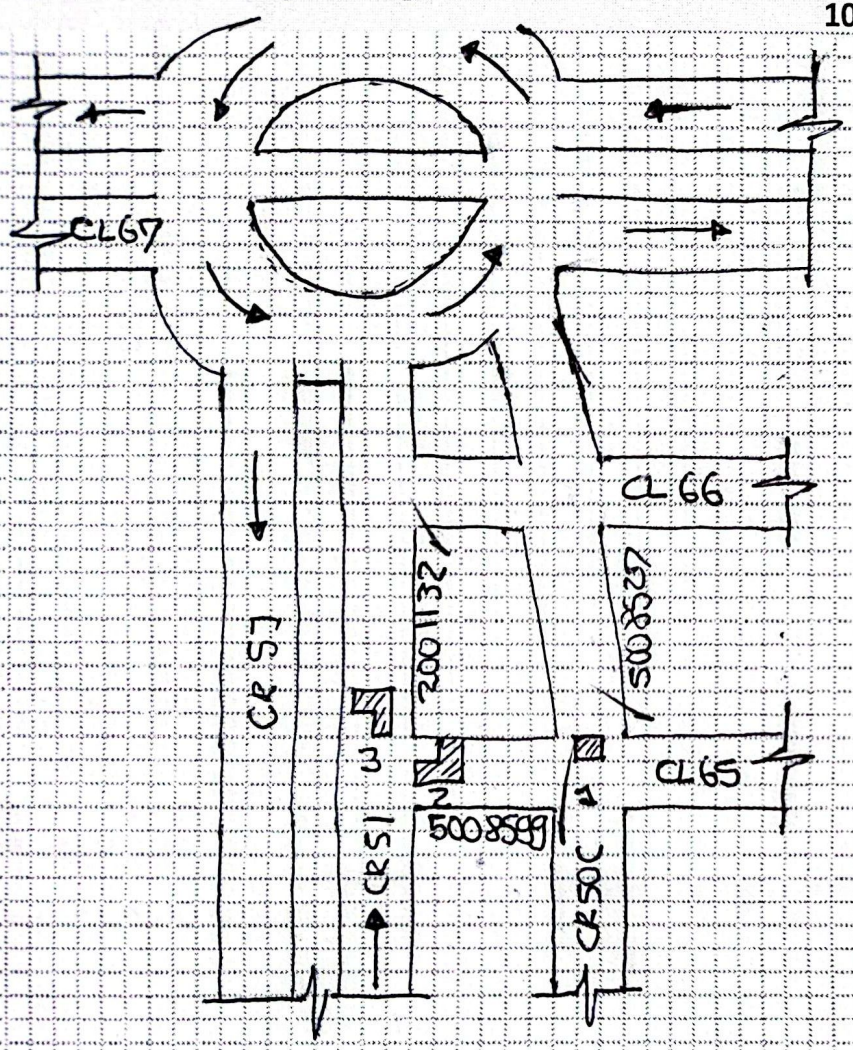

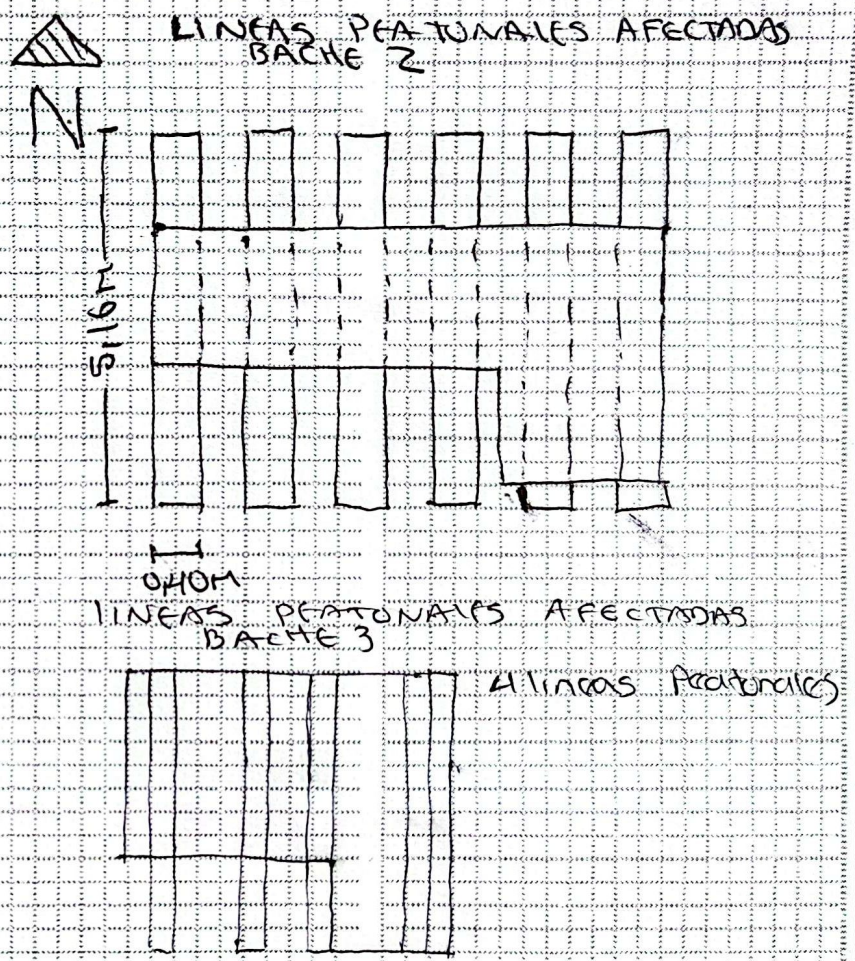

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	5
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,08 TON
BARRIO	PRADO	DIRECCIÓN	CL65 CRS1 Y CL 65 CON CRS0C

Powered by CamScanner

E ST Y PAVS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233924

ESTACION HOSPITAL

FECHA: 11/09/2025

HORA: 6:22:47 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906398

PESO BRUTO: 18.13 Tonnes

PESO TARA: 8.05 Tonnes

PESO NETO: 10.08 Tonnes

J Pablo Ochoa

EDISON YALI 1023922702

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 11

TOTAL DESPACHADA: 108.41 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23137**

PROVEEDOR: Frente #5 - Vial

VALE POR UN VIAJE: Escombro

11-09-2025

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A. 11 SET 2025

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
