FECHA (D/M/A): 12-09-2025	**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,05 TON

ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	LA CANDELARIA		
BARRIO	VILLA NUEVA		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 PM	—
TERMINACIÓN: 4:30 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: DESPEJADO
	TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DEL SEGMENTO VIAL SOBRE LA CL 57 ENTRE CR 50 Y CR 49 VIA EN UN SOLO SENTIDO; SE REALIZA DESVIO POR LA CR 50 LUEGO CL 57B Y CL 49 RETOMANDO LA CL 57. DICHO CIERRE FUE NECESARIO YA QUE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR REQUERIAN DEL USO DE LOS DOS CARRILES.
EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN SE REALIZAN TRES BACHES DONDE EL BACHE TRES SE INTERVIENE EN LA CL 57 CON CR 51 A TRES (CUADRAS) DE LAS DEMAS INTERVENCIONES POR LO QUE SE REALIZA UNA SEÑALIZACIÓN PUNTUAL. EN LAS INTERVENCIONES DEL BACHE 1 Y BACHE 2 SE INTERVIENEN LAS ÁREAS MAS CRITICAS DE LA PATOLOGIA MITIGANDO EL RIESGO A LOS ACTORES VIALES.

5. VISITANTES

Juan David Rodriguez G

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	*Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR*
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Rodriguez G	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	*Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR*

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JONIER CACERES	X		
7	Ayudante	MARIO MARTINES	X		
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS	X		
9	Ayudante	JOSE VIVA LOBOS	X		
10	Ayudante	FRANCISCO TOBON	X		
11	Ayudante	EDUARDO MESA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EDISON YAU	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MACQUITEC	X		
2	Compresor	DOOSAN - 185	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FE - COM FC-30			
11	Soplador	NA			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TNG 712 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	WLW 714	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001276	161001	1A	CL57 49-91	0,79	1,51	0,13	1,19	0,16	0,37
4001276	161001	1B	CL57 49-91	1,54	3,20	0,13	4,93	0,64	1,54
4001276	162002	2	CL57 49-81	4,85	3,13	0,13	15,18	1,97	4,74
2000582	161015	3A	CL 58 50A-130	1,51	0,81	0,16	1,22	0,20	0,47
2000582	161015	3B	CL 58 50A-130	4,36	1,75	0,16	7,63	1,22	2,93
TOTALES							30,15	4,19	10,05

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233952	VOLW714	10,05	10,05	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23139	VOLW714	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 12-09-2025

10. ESQUEMAS

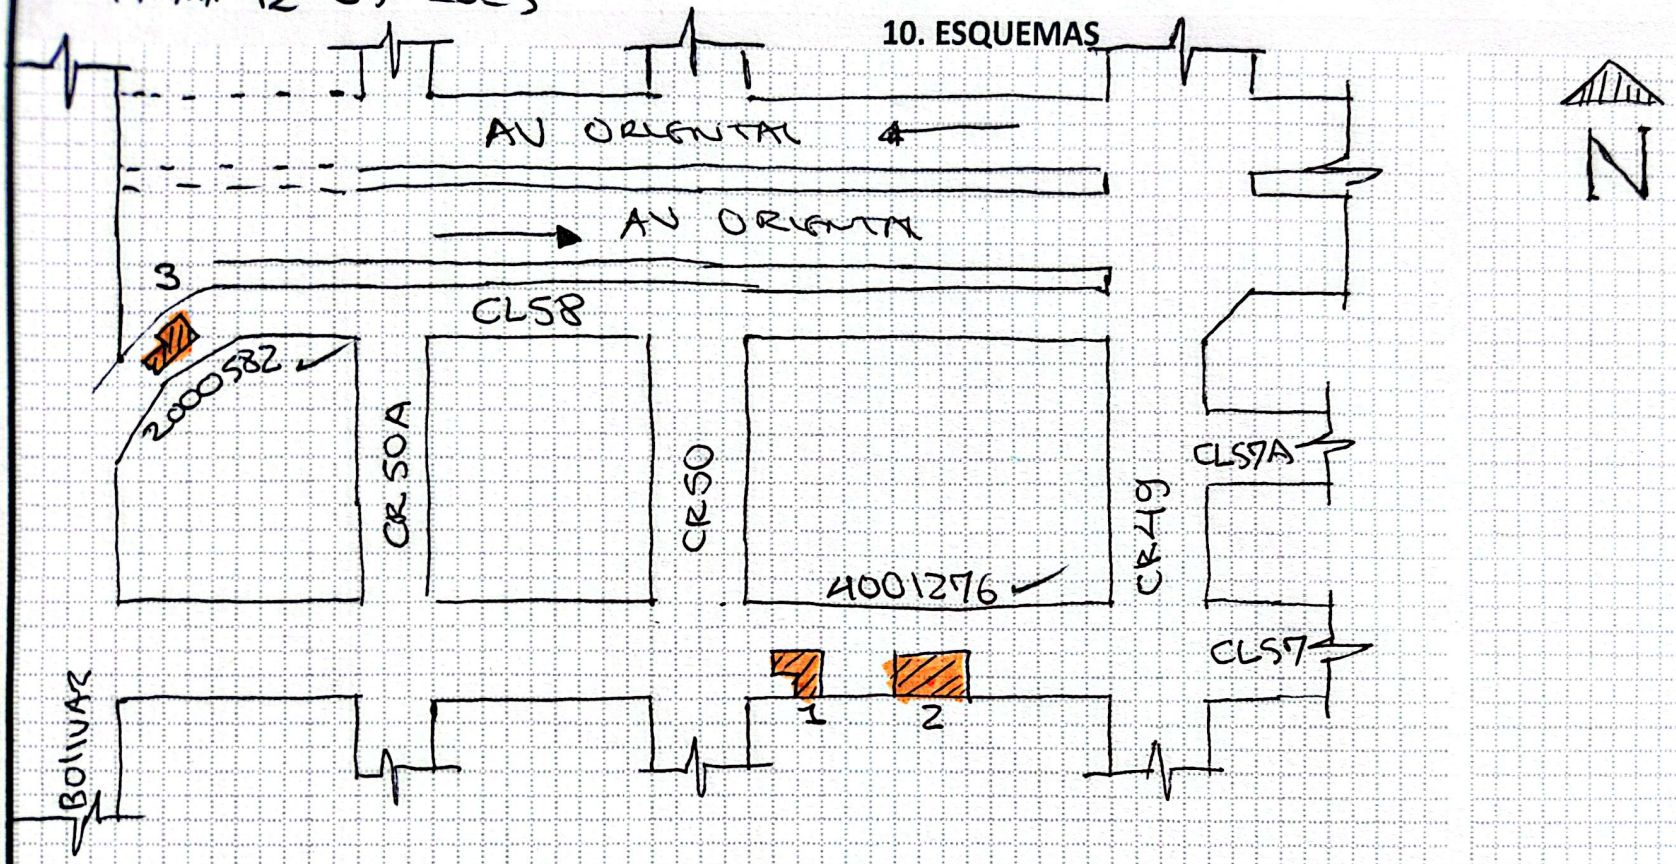

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CINCO ✓
RANGO:	1 ✓	CANTIDAD:	10,05 TON ✓
BARRIO	VILLA NUEVA ✓	DIRECCIÓN	CL 57 ENTRE CR49 Y CR50 CL 58 50A - 130

Powered by CamScanner

EST Y PAV

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233952

VILLA NUEVA CENTRO

FECHA: 12/09/2025

HORA: 6:22:52 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

J Pablo Ochoa

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.12 Tonnes

PESO TARA: 8.07 Tonnes

PESO NETO: 10,05 Tonnes

EDISON YALI 1020423202

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C.

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 34.98 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23139**

PROVEEDOR: Frente #5 - Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombro

12-09-2025

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
NIT. 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
