FECHA (D/M/A): 22-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,09 TON
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	LA CANDELARIA		
BARRIO	CAIG NUEVA		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 4:00AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL SOBRE LA CR 51 ENTRE CL 35 Y CL 34 COSTADO OCCIDENTAL. SE INSTALA SEÑALIZACIÓN PUNTUAL Y SOBRE LOS BACHES 2 Y 4 EN CL 34 CR 51 Y CR 51 CON CL 35.

SE REALIZA MITIGACIÓN EN EL BARRIO PRADO SOBRE BACHE LOCALIZADO SOBRE RESALTO YA QUE ESTE CONSTITUIDA UN RIESGO INMINENTE PARA LOS ACTORES VIALES.

SE INTERVIENE BACHE MEDIATICO QUE CORRESPONDE AL BACHE 1 SOLICITADO EXPRESAMENTE POR LA SUPERVISIÓN.

SE REALIZA DEMARCACIÓN, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, IMPRIMACIÓN E INSTALACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA SIN PRESENTAR NOVEDADES

SE IDENTIFICO EN LA AV 33 CON CR 51 COSTADO ORIENTAL SOCAVÓN DE APROXIMADAMENTE DE 0,60M DE PROFUNDIDAD QUE CONSTITUYE UN RIESGO INMINENTE CON EL AGRAVE DE ESTAR EN VÍA PRINCIPAL; SE REALIZA EL RESPECTIVO REPORTE Y SE DEJA SEÑALIZADO CON DOS BALIZAS MIENTRAS SE DEFINE LA SITUACIÓN Y LA ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUTAR

5. VISITANTES

J. P. Ochoa A.

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JUAN DAVID RODRIGUEZ GIL	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JONIER CACERES	X		
7	Ayudante	MARIO MARTINES	X		
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS	X		
9	Ayudante	JOSE VILLA LOBOS	X		
10	Ayudante	FRANCISCO TOBON	X		
11	Ayudante	N/A			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	EDUARDO MESA	X		
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	C/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ALEX YAIL	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MAQUITEC	X		
2	Compresor	DOOSAN- 185	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TN6 712 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	(WIW 714) GTY061	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000010	160872	1A	CRSI 32-160	2,50	3,10	0,13	7,75	1,01	2,42
3000010	160872	1B	CRSI 32-160	2,67	1,94	0,13	5,18	0,67	1,62
4003233	161540	2	CL34 CRSJ	2,36	2,70	0,13	6,37	0,83	1,99
3000010	161541	3	CRSJ CL32	5,29	1,66	0,15	8,78	1,32	3,16
3000011	161542	4	CRSI 34-65	2,30	1,20	0,13	2,76	0,36	0,86
3000157	160682	5	CR 48 65 -13	0,40	0,40	0,10	0,16	0,02	0,04
TOTALES							31,00	4,20	10,09

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234108	GTY061	10,09	10,09	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23145	GTY061	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22-09-2025

10. ESQUEMAS

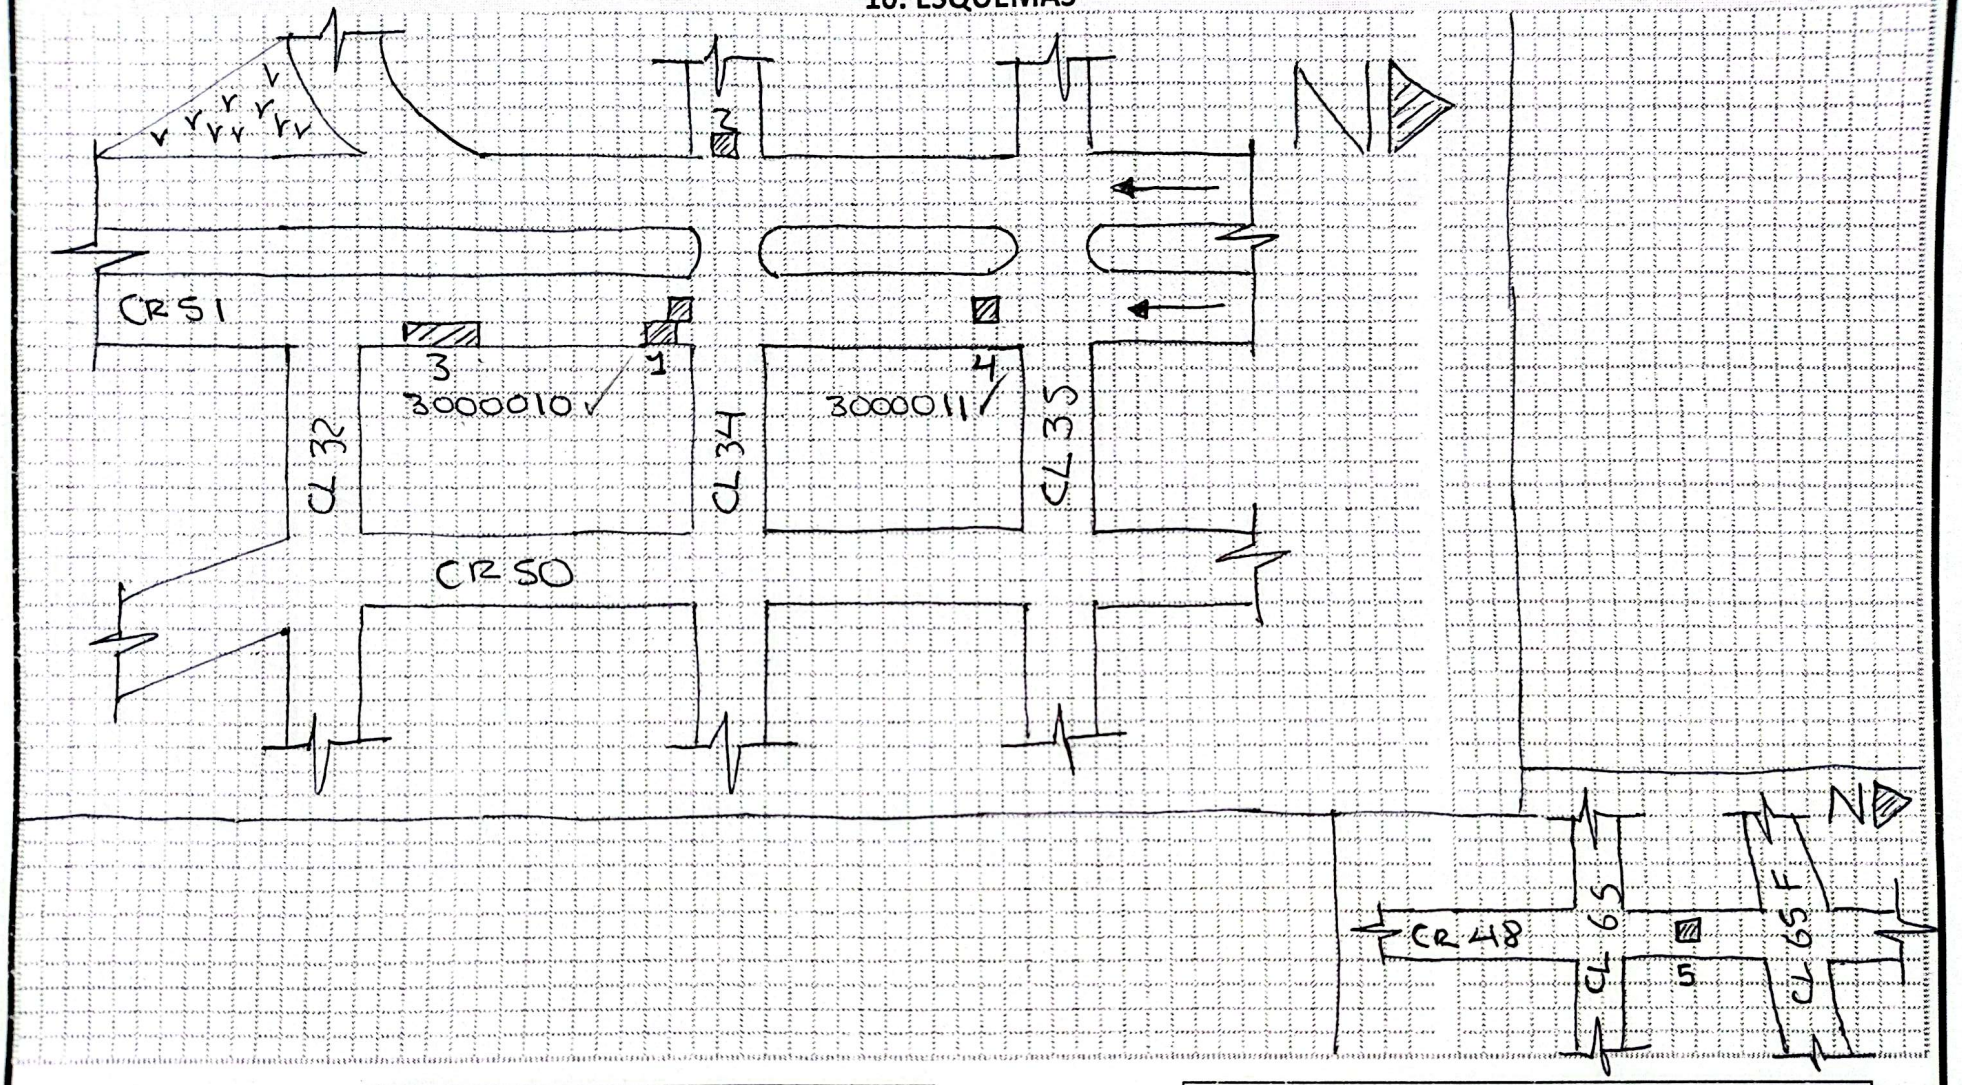

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CINCO
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	10,09 TON
BARRIO	CALLE NUEVA	DIRECCIÓN	CR 51 ENTRE CL 32 Y CL 35

Powered by CamScanner

EDT Y PAVIDY

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 234108

FECHA: 22/09/2025

HORA: 6:26:32 PM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.38 Tonnes

PESO TARA: 8.29 Tonnes

PESO NETO: 10.09 Tonnes

J Pablo Ochoa

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 10

TOTAL DESPACHADA: 97.06 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23145**

PROVEEDOR: Frente #5 - Vial

VALE POR UN VIAJE: Escombro

PROCOPAL S.A. NIT 890.906.388-0

22-09-2025

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 22-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,09 TON
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	LA CANDELARIA		
BARRIO	CALLE NUEVA		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 4:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: DESPEJADO
	TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

EN LAS INTERVENCIONES DEL BACHE 2 SE AFECTA DOS LINEAS PEATONALES,
EN LAS INTERVENCIONES DEL BACHE 4 SE AFECTA UNA LINEA PEATONAL.
EN LA INTERVENCIÓN DEL BACHE TRES SE AFECTA UNA FLECHA DE GIRO.

5. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan Ochoa Rodriguez	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner
