FECHA (D/M/A): 23-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,03 TON
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 5
COMUNA: LA CANDELARIA	
BARRIO: CALLE NUEVA	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00PM	
TERMINACIÓN: 4:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: NUBLADO
	TARDE: NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE INICIAL DE UN CARRIL EN LA CR52 - ENTRE CL 35 Y CL 36 APARTIR DE LAS 11:00PM SE REALIZA EL CIERRE DE TRES CARRILES DEJANDO UN SOLO CARRIL PARA EL TRAFICO VEHICULAR YA QUE LOS BACHES ASI LO AMERITAB Y EL POCO FLUJO VEHICULAR FACILITABA DICHA ACCIÓN.
SE INTERVIANAN CUATRO BACHES DE LOS CUALES EL BACHE 1 Y BACHE 3 TENIAN AFECTACIÓN DE PINTURA LINEAS DE RAP Y LINEAS PEATONALES.

SE PRESENTO DIFICULTADES CON EL RODILLO YA QUE ESTE CARECIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAUSANDO RECALENTAMIENTO EN EL MISMO POR AUSENCIA DE ACEITE DE MOTOR EL CUAL FUE SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR GENERANDO UNA INACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE COMPACTACIÓN DE UNA HORA APROXIMADAMENTE.
SE CULMINAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE MEZCLA CON NORMALIDAD

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Bustamante	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JUAN DAVID RODRIGUEZ G.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGLNIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JUNIOR CACERES		X	
7	Ayudante	MARLO MARTINES	X		
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS		X	
9	Ayudante	JOSE VILLA LOBOS	X		
10	Ayudante	FRANCISCO TOBON	X		
11	Ayudante	EDUARDO MESA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PARRA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	ALEX YALI	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MACNTEE	X		CAMBIO DE ACEITE
2	Compresor	DUOSAN-185	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECON FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TNG 712 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	GTY 061	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 23-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000012	161598	1A	CR 51 CL 35-01	1,66	1,53	0,18	2,54	0,46	1,10
3000012	161598	1B	CR 51 CL 35-01	2,98	2,25	0,18	6,71	1,21	2,90
3000012	161597	2A	CR 51 35-07	2,76	1,90	0,13	5,24	0,68	1,64
3000012	161597	2B	CR 51 35-07	2,21	0,70	0,13	1,55	0,20	0,48
3000012	161599	3A	CR 51 35-05	1,60	3,09	0,13	4,94	0,64	1,54
3000012	161599	3B	CR 51 35-05	1,78	1,50	0,13	2,67	0,35	0,83
3000012	161600	4	CR 51 35-06	3,24	1,52	0,13	4,92	0,64	1,54
TOTALES							28,57	4,18	10,03

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234134	GTY061	10,03	10,03	142


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23146	GTY061	SENCILLA	1	


Powered by CamScanner


FECHA (D/M/A): 23-09-2025

10. ESQUEMAS

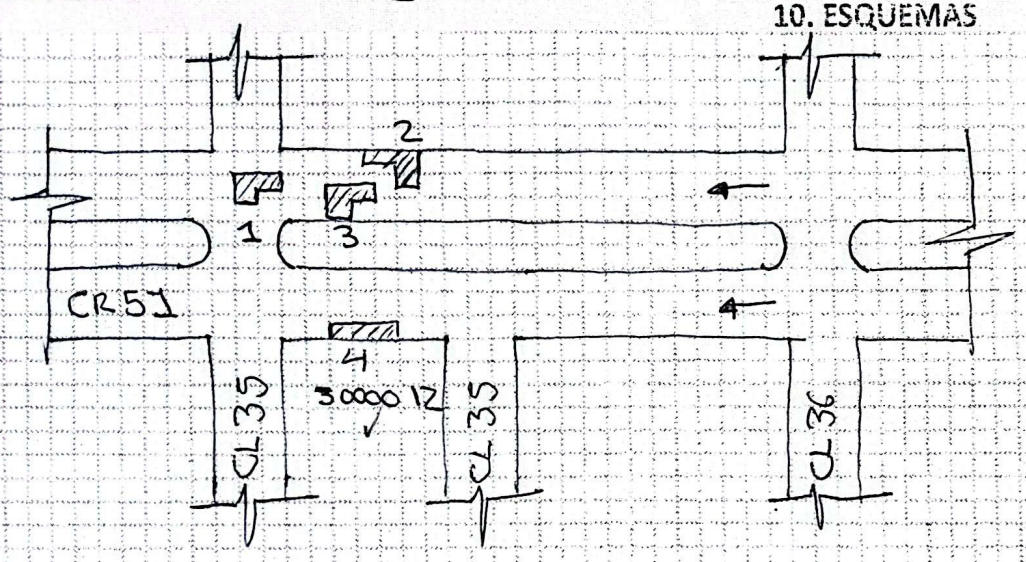

BACHES INTERVENIDOS



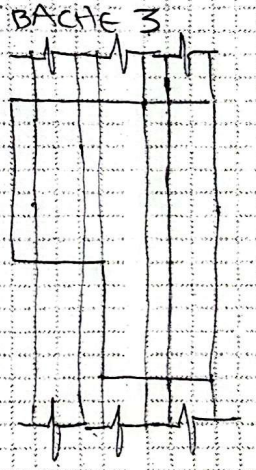

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL ✓	FRENTE	CINCO ✓
RANGO:	UNO ✓	CANTIDAD:	10,03 TON ✓
BARRIO	CALLE NUEVA ✓	DIRECCIÓN	CR 51 ENTRE CL 35 Y CL 36

Powered by CamScanner

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 234130

FECHA: 23/09/2025

HORA: 6:26:44 PM

CONDUCTOR: ALEX YALI

PLACA: GTY061

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.27 Tonnes

PESO TARA: 8.24 Tonnes

PESO NETO: 10.03 Tonnes

J Pablo Ochoa

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 36.92 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23146**

PROVEEDOR: Frente #5 - Mina

VALE POR UN VIAJE: Escombro

PLACA No: GTY061 CAPACIDAD: M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A. 24 SEP 2025 DESPACHOS - BASCULA

23-09-2025

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
