FECHA (D/M/A): 15-09-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,06 TON
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 5
COMUNA: LA CANDELARIA	
BARRIO: ESTACIÓN VILLA	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 8:00AM
TERMINACIÓN: 5:00 AM

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:
MAÑANA: DESPEJADO
TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL DE LA CRA 52 ENTRE CL 55 Y CL 54, LA CL 54 SE REALIZA CIERRE PARCIAL DESDE LAS 11:30PM YA QUE LOS NEGOCIOS AMBULANTES OCUPABAN UN CARRIL Y LAS ACTIVIDADES REQUERIAN EL OTRO CARRIL, DESVIANDO EL TRANSITO VEHICULAR POR LA AV GREIFF.

SE REALIZAN CINCO INTERVENCIONES CON ESPESORES DE PAVIMENTO ENTRE 0,16 Y 0,18m.

SE REALIZAN TRES MITIGACIONES EN LA AV SAN JUAN CON CL 43B YA QUE ESTAS CONSTITUIAN UN ALTO RIESGO A LOS ACTORES VIALES.

REPETITIVAMENTE SE HA INFORMADO DEL RIESGO PUBLICO PRESENTE EN LA ZONA DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES PRESENTANDOSE PERDIDA DE ELEMENTOS COMO CANECAS DE DISPOSICIÓN, PIMPINAS DE LIQUIDOS Y OBJETOS PERSONALES DE LOS TRABAJADORES. RESPECTO A LAS ACTIVIDADES SE CONTO CON LA NOVEDAD DE QUE EL OPERADOR DE RODILLO NO SE PRESENTO A LABURAR Y ESTE TUVO QUE SER REEMPLAZADO POR UN AYUDANTE

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JUNIOR CACERES			
7	Ayudante	MARIO MARTINES		X	
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS	X		
9	Ayudante	JOSE VILLA LOBOS			
10	Ayudante	FRANCISCO TOBÓN	X	X	
11	Ayudante	EDUARDO MESA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	CARLOS CARMONA	X		
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN		X	
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EDISON YATI	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	MAQUITEC	X		
2	Compresor	DOUSAN-185	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FC-CUM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TN6 712 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	WLW 714	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4001660	161103	1	CR 52 54-35	1,90	1,50	0,16	2,85	0,46	1,09
4001660	161106	2	CR 52 54-23	3,71	1,15	0,16	4,27	0,68	1,641
4001660	161104	3A	CR 52 54-21	1,55	1,55	0,16	2,40	0,38	0,92
4001660	161104	3B	CR 52 54-21	0,98	2,76	0,16	2,70	0,43	1,04
5007622	151095	4A	CL 54 52-28	6,20	0,90	0,16	5,58	0,89	2,14
5007622	151095	4B	CL 54 52-28	1,60	1,54	0,16	2,46	0,39	0,95
5007622	151093	5A	CL 54 52-32	0,86	1,58	0,18	1,36	0,24	0,59
5007622	151093	5B	CL 54 52-32	3,34	1,17	0,18	3,91	0,70	1,69
TOTALES							25,53	4,19	10,06

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
233983	WIW714	10,06	10,06	140	23140	WIW714	SENCILLA	1	PREDIO COPOT

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-09-2025

10. ESQUEMAS

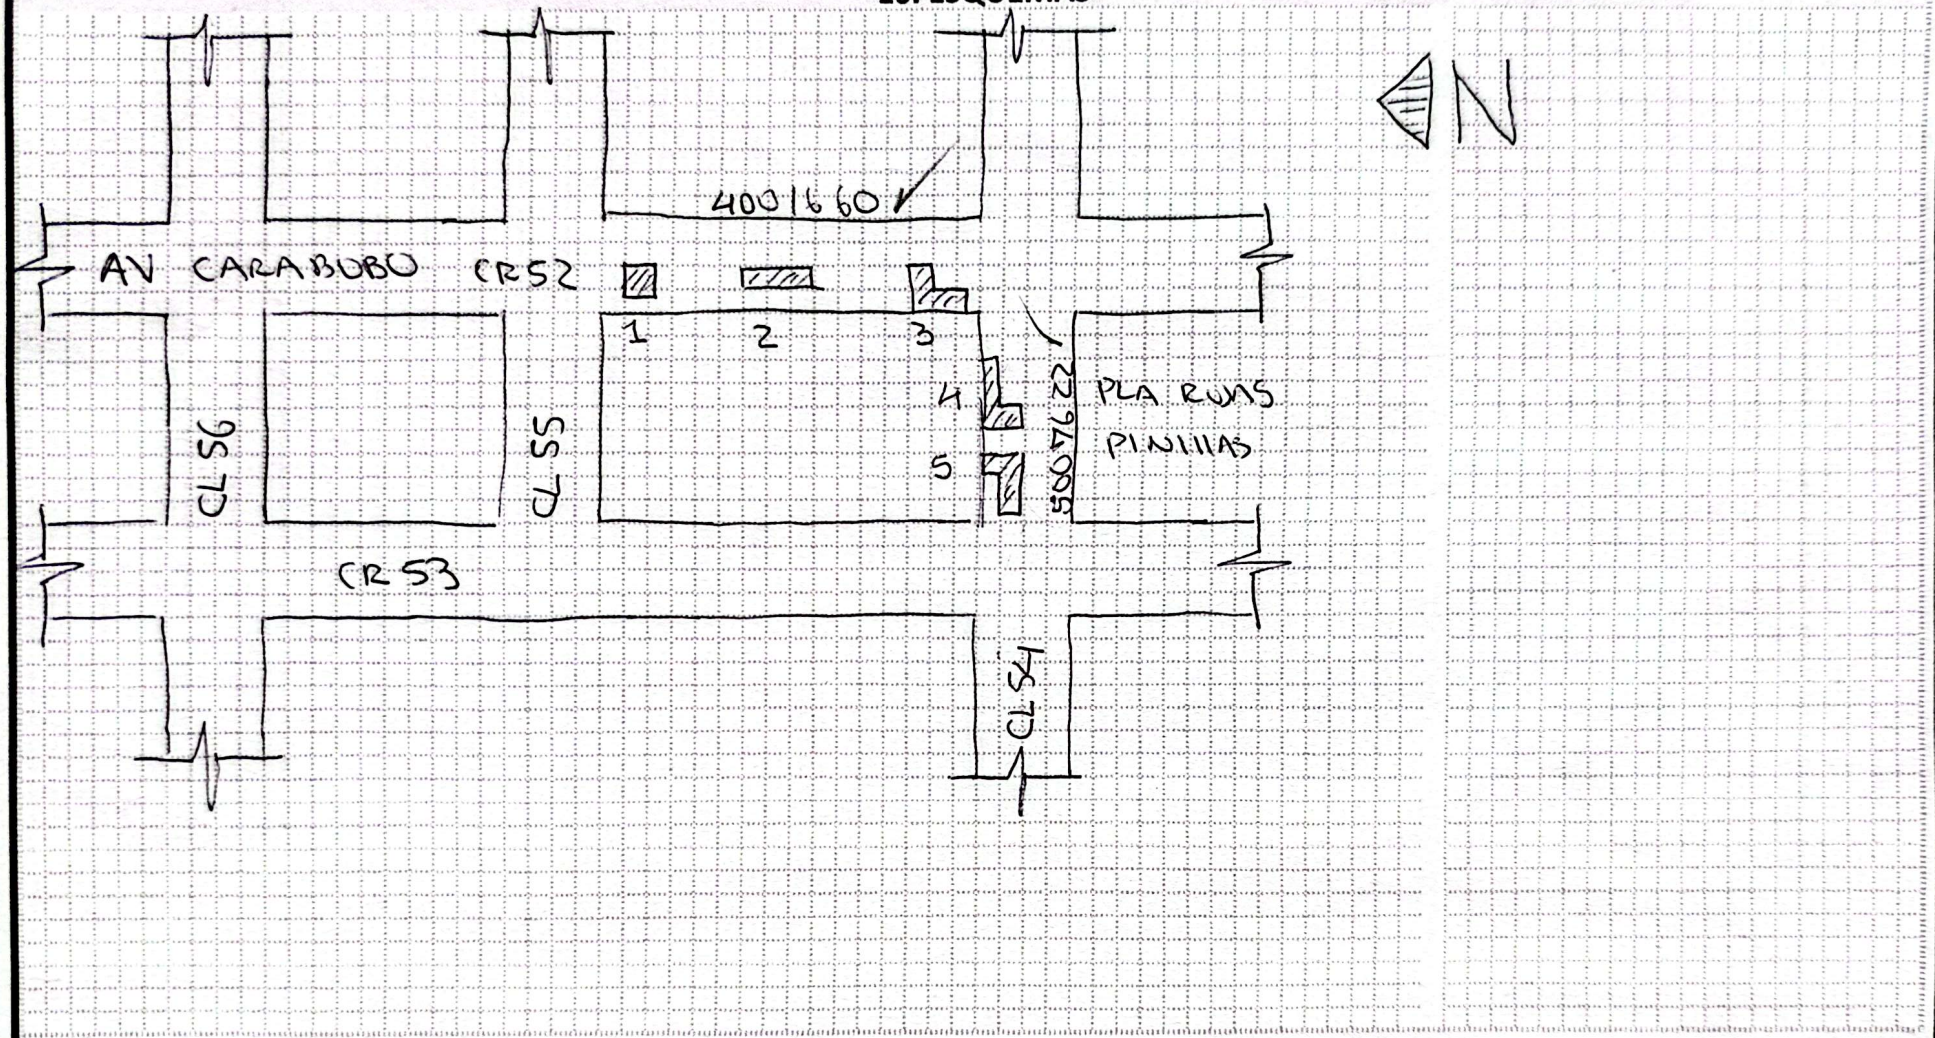

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CINCO
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	10,06 TON
BARRIO	ESTACIÓN VILLA	DIRECCIÓN	CR 52 Y CL 54

Powered by CamScanner

HA (D/M/A): 15-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,06TON

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	7A CANDELARIA		
BARRIO	ESTACIÓN VILLA		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00PM	———
TERMINACIÓN: 5:00AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	DESPEJADO
	TARDE	DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

QUE AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMACIÓN PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD, RESPECTO A LA INSTALACIÓN SE OBSERVAN ALGUNAS FALENCIAS QUE EL OPERADOR ENCARGADO FUE ATENDIENDO LOGRANDO SALVAGUARDAR LA ACTIVIDAD.
DE PARTE DE LA INTERVENTORIA SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE CUALQUIER DESPERFECTO EN LA INSTALACIÓN DE LA MEZCLA POR UN MAL PROCESO CONSTRUCTIVO O POR NO CONTAR CON PERSONAL IDONEO PARA LA ACTIVIDAD; ES RESPONSABILIDAD DEL MISMO CORREGIR A SU PROPIO COSTO. ✓

5. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	JOHN FREDY RIVERA Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Juan David Restrepo Y Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 233983

FECHA: 15/09/2025

HORA: 6:26:36 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.13 Tonnes

PESO TARA: 8.07 Tonnes

PESO NETO: 10.06 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 34.99 Tonnes

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23140**

PROVEEDOR: Frente Hs - Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Escombro

15-09-2025

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit 890.906.388-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
