FECHA (D/M/A): 16-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,35 TON
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 5
COMUNA: LA CANDELARIA	
BARRIO: GUAYAQUIL	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 3:30 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: DESPEJADO
	TARDE: DESPEJADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE DOS CARRILES SOBRE LA CL 46 ENTRE CR 56 Y CR 56B DEJANDO HABILITADO EL CARRIL IZQUIERDO, SE ENCONTRO QUE DICHO SEGMENTO PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE CARPETA DE RODADURA GENERANDO MULTIPLES BACHES.

SE INTERVIENE EL SEGMENTO CON CUATRO BACHES INTERVENIDOS DE ÁREA VARIABLE ABORDANDO LOS MULTIPLES BACHES; LOS SOLITARIOS SE MITIGAN. QUEDANDO PENDIENTE LOS DEL CARRIL IZQUIERDO PARA LA SIGUIENTE JORNADA.

SE REALIZAN MITIGACIONES DE BACHES CON SIKA EN LA CR 55 ENTRE CL 48 Y CL 50 Y OTROS BACHES DEJANDO LA ZONA LIBRE DE LOS MISMOS.

LA JORNADA TRANSCURRE CON NORMALIDAD EVIDENCIANDOSE LOS BACHES INTERVENIDOS

EL CONTRATISTA REALIZA REPOSICIÓN DE DOS CANECAS Y LA BANDAYA ANTIDERRAME QUE HABIAN SIDO HURTADAS EN LA JORNADA ANTERIOR.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Juan J. Bermudez R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JUNIER CACERES	X		
7	Ayudante	MARLO MARTINES		X	
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS	X		
9	Ayudante	JOSE VILLA LOBOS	X		
10	Ayudante	FRANCISCO TOBON	X		
11	Ayudante	EDUARDO MESA			
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER LUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EDISON YALI	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MARCITEC	X		
2	Compresor	DOOSAN LP5	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FE-COM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TNG 712 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	WLW 714	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002017	161218	1	CL 46 56-42	4,13	1,32	0,17	5,45	0,93	2,22
4002017	161219	2	CL 46 56-26	5,12	1,62	0,18	8,29	1,49	3,58
4002018	161220	3	CL 46 55-54	3,95	1,22	0,17	4,82	0,82	1,97
50073970	161225	4A	CR 56 CL 46+6M	1,12	1,76	0,17	1,97	0,34	0,80
50073970	161225	4B	CR 56 CL 46+6M	1,64	2,58	0,17	4,23	0,72	1,73
4001267	158721	5	CR 55 48-17	0,45	0,45	0,03	0,20	0,01	0,01
4001268	161068	6	CR 55 49-101	0,50	0,60	0,05	0,30	0,02	0,04
TOTALES							25,27	4,31	10,35

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234016	WLW714	10,35	10,35	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23141	WLW714	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 16-09-2025

10. ESQUEMAS

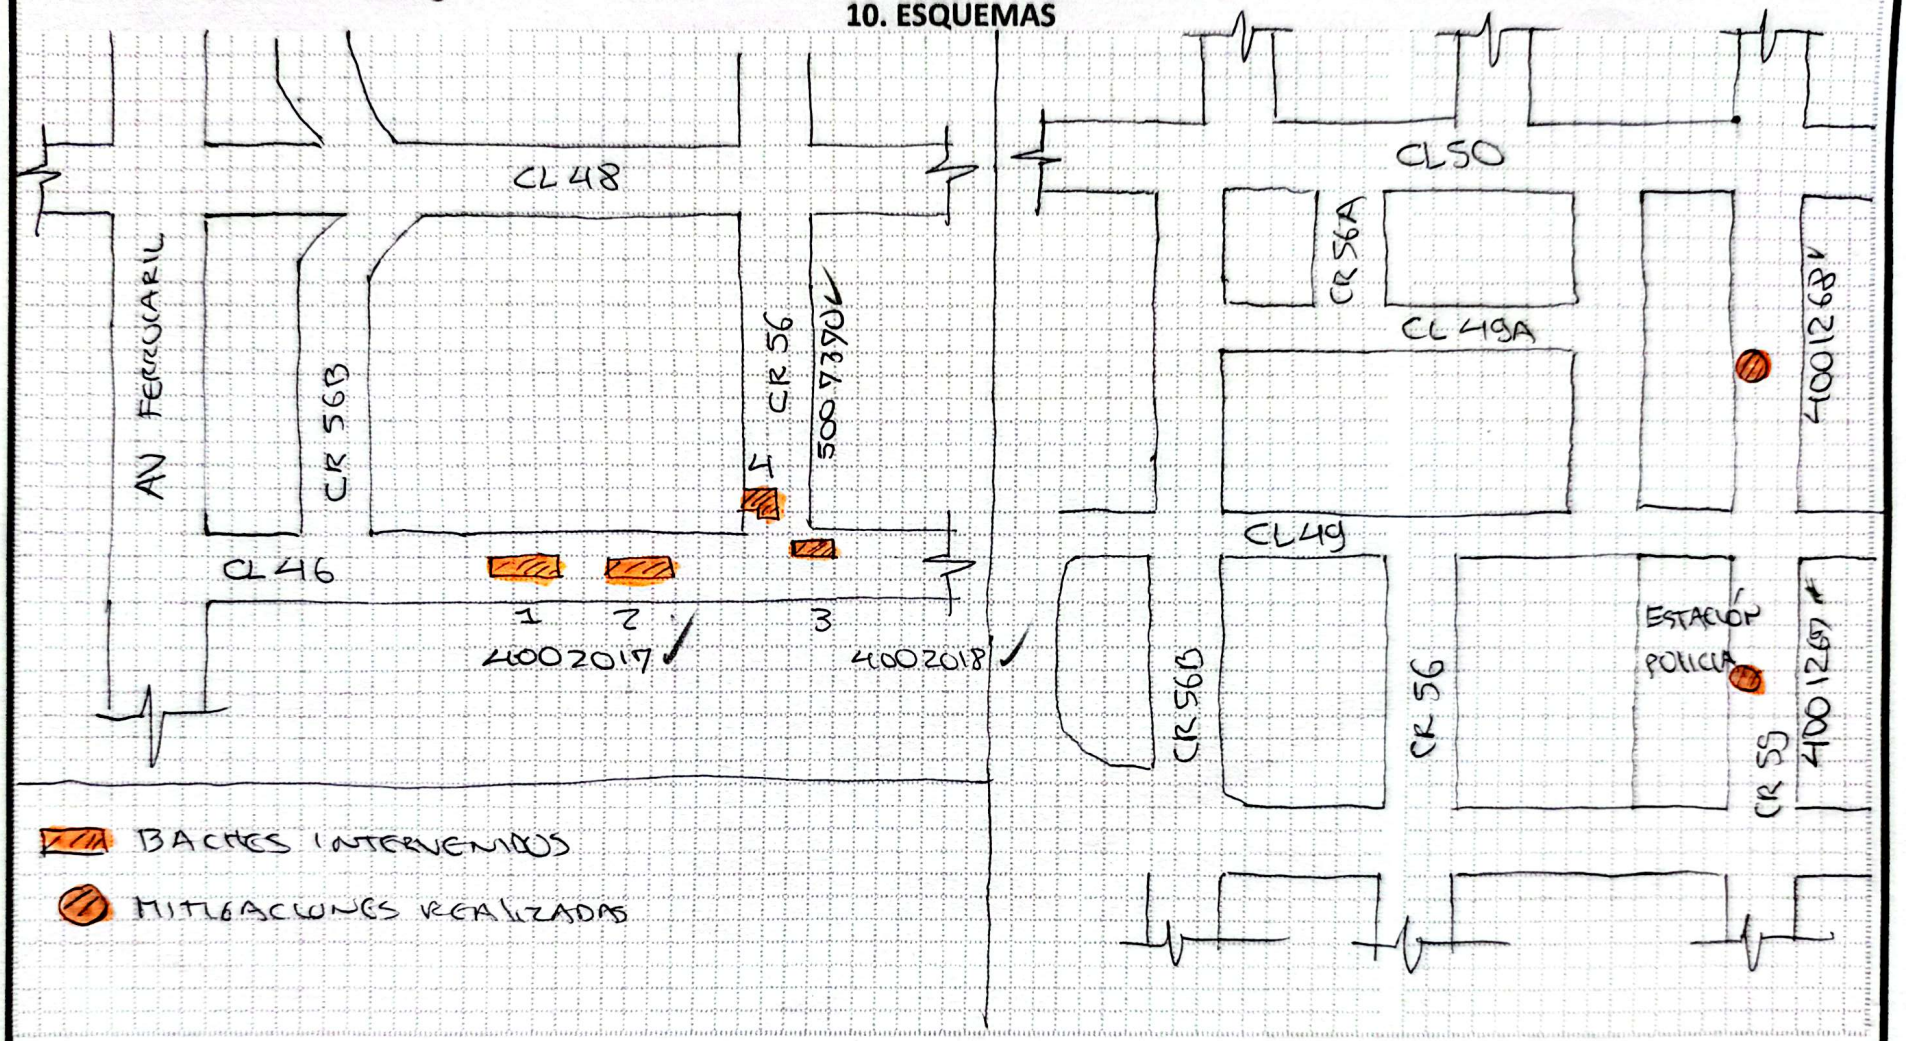

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CINCO
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	10,35 TON
BARRIO	GUAYAQUIL	DIRECCIÓN	CL 46 ENTRE CR 56 Y CR 56B

Powered by CamScanner

EST Y PAVIM

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 234016

FECHA: 16/09/2025

HORA: 6:34:15 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.54 Toneles

PESO TARA: 8.19 Toneles

PESO NETO: 10.35 Toneles

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 35.19 Toneles

Guayacol (Tunja)

J Pablo Ochoa

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT. 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23141

PROVEEDOR: Frente Obras - Yalcol

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

16-09-2025

17 SEP 2025 PROCOPAL S.A.

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
