FECHA (D/M/A): 17-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL		
RANGO:	1	CANTIDAD:	10,06 TON
ZONA	3	FRENTE DE TRABAJO:	5
COMUNA	LA CANDELARIA		
BARRIO	GUAYACUIL		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 5:00 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	LLUVIA DE BAJA INTENSIDAD ADVERTIR
TARDE	11:00PM DE FORMA INTERMITENTE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE Y SEÑALIZACIÓN DE UN CARRIL EN EL SEGMENTO CL 46 ENTRE CR 56 Y CR56B SE INTERVIENEN LOS BACHES FALTANTES DEJANDO FINALIZADO DICHO SEGMENTO.
SE INTERVIENE UN TERCER BACHE EN LA CL 46 CON CR 56 CERCA A LA ESTACIÓN DE POLICIA.
SE DETECTA HUNDIMIENTO EN LA VIA CON DIRECCIÓN CR 56 46-04 DE FORMA REDONDA Y UN ASENTAMIENTO DE 15CM APROX SE PRESUME QUE ES CAUSADO DICHO FALLO POR FUGA DE RED POR LO QUE SE REPORTA A EPM EN SU APP CON NUMERO DE RADICADO 244446.
SE PRESENTA LLUVIAS APARTIR DE LAS 11:00PM AFECTANDO EL RENDIMIENTO DE LA JORNADA YA QUE SE TUVO QUE SUSPENDER HASTA TENER CONDICIONES DE TRABAJO. EL BACHE 1 Y BACHE 2 POR ESTAR DEBAJO DEL VIADUCTO DEL METRO FACILITO LA INSTALACIÓN DE LA MEZCLA.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JUAN DAVID RODRIGUEZ	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA	X		
4	Rastrillero	JORGE ARLEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JUNIOR CACERES	X		
7	Ayudante	MARIO MARTINES		X	
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS			
9	Ayudante	JOSE VILA LOBOS			
10	Ayudante	FRANCISCO TOBÓN	X		
11	Ayudante	EDUARDO MESA		X	
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA	X		
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EDISON YALI	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MAQUITEC	X		
2	Compresor	DOOSAN - LRS	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FE-COM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
12	Mini cargador	N/A			
13	Barredora	N/A			
14	Carrotanque	N/A			
15	Camión	TNG 712 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	WLW 714	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4002017	161289	1	CL46SG-SH	3,16	3,10	0,15	11,16	1,67	4,02
4002017	161286	2A	CL46SG-22	2,48	1,48	0,15	3,67	0,55	1,32
4002017	161286	2B	CL46SG-22	3,95	1,90	0,15	7,51	1,13	2,70
5007407	160582	3	CL48 CR56	3	2	0,14	6,00	0,84	2,02
TOTALES							28,34	4,19	10,06

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234030	WIW714	10,06	10,06	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23142	WIW714	SENCILLA	1	PROCOPAL

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 17-09-2025

10. ESQUEMAS

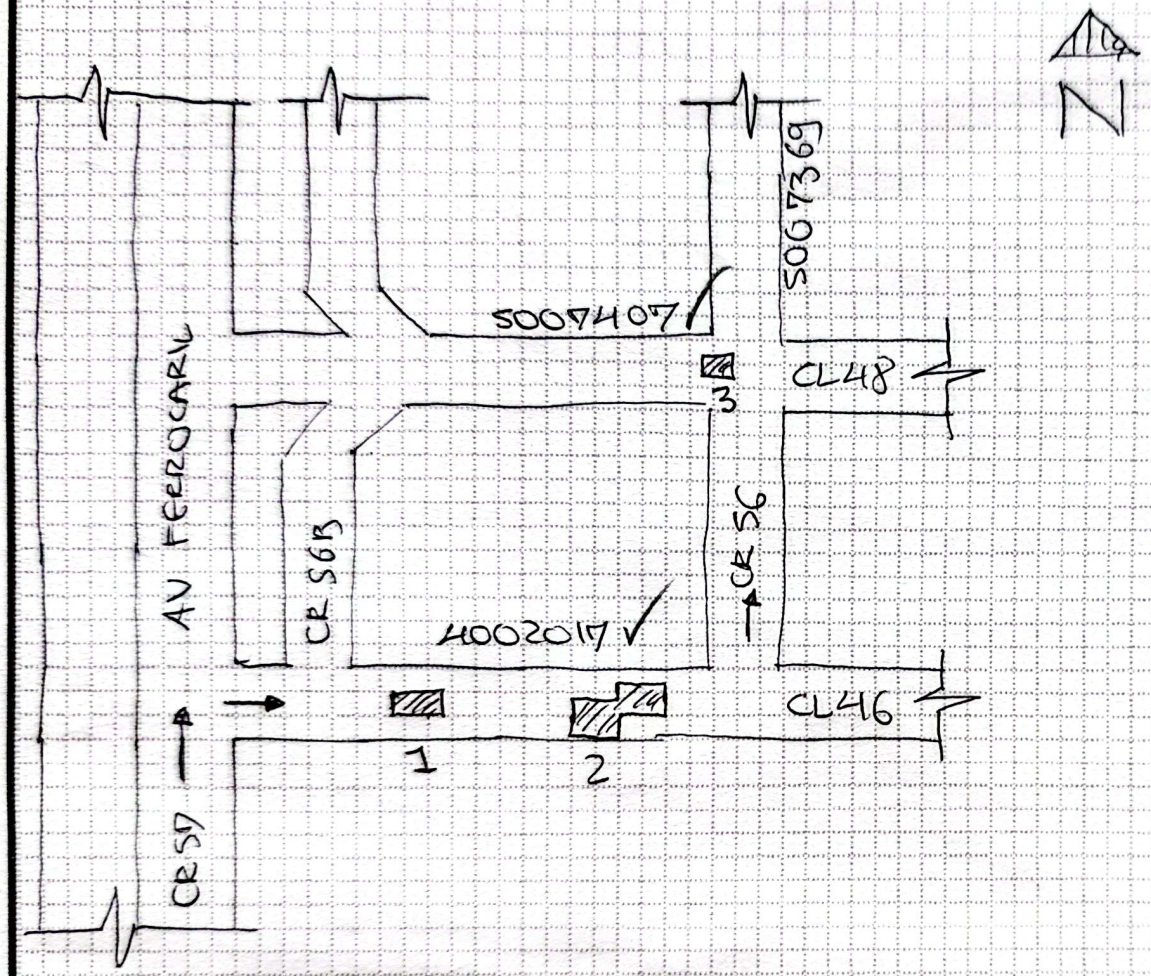

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CINCO
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	10,06 TON
BARRIO	GUAYACUIL	DIRECCIÓN	CL 46 ENTRE CR 56 Y CR 56B CL 48 CR 56

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 23403

FECHA: 17/09/2025

HORA: 6:43:04 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

OBRA: 2307

SANTA.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890905386

PESO BRUTO: 18.20 Toneles

PESO TARA: 8.14 Toneles

PESO NETO: 10.06 Toneles

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MOD37

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 20.12 Toneles

Pablo Ochoa

Guaymaral

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

PROCOPAL S.A.

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23142

18 SEP 2025

PROVEEDOR: Ficte #5 - Vial Mez

VALE POR UN VIAJE: Escombro DESPACHO - BASCULA 17-09-2025

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

J Pablo Ocha

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
