FECHA (D/M/A): 18-09-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	MANTENIMIENTO PUNTUAL
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,00 TON
ZONA: 3	FRENTE DE TRABAJO: 5
COMUNA: LA CANDELARIA	
BARRIO: CALLE NUEVA	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 PM	
TERMINACIÓN: 4:30 AM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: DESPEJADO

TARDE: NUBLADO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

SE REALIZA CIERRE DE UN CARRIL EN LA CL 40 ENTRE CR 50 Y CR 51 Y CIERRES O SEÑALIZACIÓN PUNTUAL EN LA (INTERSECCIÓN) CR (51) CON CL 41 APARTIR DE LAS 11:45 PM QUE EL FLUJO VEHICULAR SE REDUJO.

LAS INTERVENCIONES 4, 5 Y 6 SOBRE EL CRUCE CR 51 CON CL 41. SE REALIZAN. SOBRE UN PAVIMENTO CON ALTA PATOLOGÍA ATENDIENDO LOS BACHES Y DISMINUYENDO EL RIESGO A LOS ACTORES VIALES.

EL PERSONAL TUVO CHARLA SST SOBRE LA IMPORTANCIA DE USO DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA AUDICCIÓN Y UNA SOCIALIZACIÓN DE LOS ACCIDENTES LABORALES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO.

SE CONTO CON LA VISITA DE LA PARTE AMBIENTAL DE LA INTERVENTORIA Y DEL ING RESIDENTE JOSE LUIS, EN EL CUAL INCLUYÓ EN LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y LOS PUNTOS A INTERVENIR.

5. VISITANTES

José Luis Guzmán A

Jorge Morales

6. FIRMAS

NOMBRE: Juan Pablo Ochoa Benjumea	JOHN FREDY RIVERA
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Juan J. Bermudez R
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	JUAN PABLO OCHOA	X		
2	Encargado	N/A			
3	Liguero	JORGE MOSQUERA		X	
4	Rastrillero	JORGE ARBEY DUARTE	X		
5	Rastrillero	N/A			
6	Ayudante	JONIER CACERES	X		
7	Ayudante	MARIO MARTINES	X		
8	Ayudante	JUAN DAVID PALACIOS	X		
9	Ayudante	JOSE VILLA LOBOS	X		
10	Ayudante	FRANCISCO TORZON	X		
11	Ayudante	EDUARDO MESA	X		
12	Ayudante	N/A			
13	Ayudante	N/A			
14	Ayudante	N/A			
15	Ayudante	N/A			
16	Operador Rodillo manual	JUAN DAVID SAN MARTIN	X		
17	Operador compresor	EDER USUGA	X		
18	Operador fresadora	N/A			
19	Operador finisher	N/A			
20	Operador Retroexcavadora	N/A			
21	Operador Vibrocompactador	N/A			
22	Operador Compactador llantas	N/A			
23	Operador Cortador Asfalto	N/A			
24	Operador Equipo Imprimación	JORGE MOSQUERA		X	
25	Operador Mini cargador	N/A			
26	Operador Barredora	N/A			
27	Coductor Carrotanque	N/A			
28	Conductor Camión	HECTOR PAREJA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	EDISON YALI	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	MAQUITEC	X		
2	Compresor	DOOSAN - 185	X		
3	Fresadora	N/A			
4	Finisher	N/A			
5	Retroexcavadora	N/A			
6	Vibrocompactador	N/A			
7	Compactador llantas	N/A			
8	Cortador Asfalto	N/A			
9	Equipo Imprimación	MARMITA MANUAL	X		
10	Placa vibratoria	FECOM FC-30	X		
11	Soplador	N/A			
	Mini cargador	N/A			
	Barredora	N/A			
	Carrotanque	N/A			
	amión	TNG 712 CHEVROLET	X		
	lqueta(s)	WLW 714	X		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L(m)	DIMENSIONES A(m)	DIMENSIONES e(m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
3000017	161371	1	CRSI 39-78	4,65	0,72	0,16	3,35	0,54	1,29
3000017	149253	2	CRSI 39-82	1,25	0,70	0,16	0,88	0,14	0,34
5009485	157373	3A	CL 40 CRSI-34	1,02	1,08	0,16	1,10	0,18	0,42
5009485	157373	3B	CL 40 CRSI-34	1,26	4,55	0,16	5,73	0,92	2,20
4003392	159056	4A	CRSI CL 41	1,93	1,28	0,16	2,47	0,40	0,95
4003392	159056	4B	CRSI CL 41	2,21	2,44	0,16	5,39	0,86	2,07
4003393	159287	5A	CL41 CRSI + 10M	2,36	1,34	0,13	3,16	0,41	0,99
4003393	159287	5B	CL 41 CRSI + 10M	1,04	1,72	0,13	1,79	0,23	0,56
4003392	149254	6	CL41 CRSO-72	2,20	1,40	0,16	3,08	0,49	1,18
TOTALES							26,95	4,16	10.00

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234050	WLW 714	10,00	10,00	141

BOTADA DE ESCOMBROS


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23143	WLW 714	SENCILLA	1	PROPIO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 18-09-2025

10. ESQUEMAS

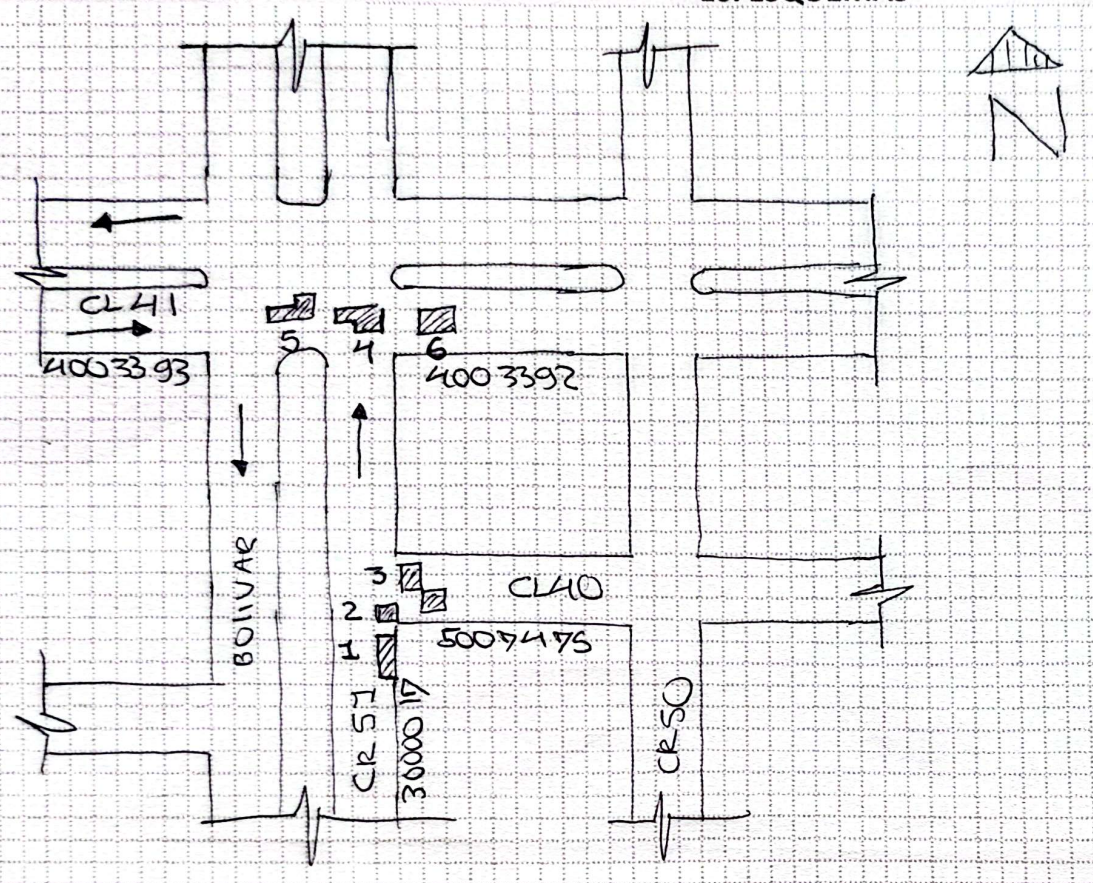

TIPO DE INTERVENCIÓN:	MANTENIMIENTO PUNTUAL	FRENTE	CINCO
RANGO:	UNO	CANTIDAD:	10,00 TON
BARRIO	CALLE NUEVA	DIRECCIÓN	CR51 ENTRE CL40 Y CL41

E ST Y PAVM

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 234050

FECHA: 18/09/2025

HORA: 7:36:11 PM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW719

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 18.09 Toneles

PESO TARA: 8.09 Toneles

PESO NETO: 10.00 Toneles

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 5

TOTAL DESPACHADA: 47.03 Toneles

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23143**

PROVEEDOR: Frente #5 - Yal Med

VALE POR UN VIAJE: Escon

PROCOPAL S.A.

18-09-2025

PLACA No: WLW 719 CAPACIDAD: 7 M3

18 SEP 2025

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR: DESPACHOS - BASCULA

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Pablo Ochoa

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
