FECHA (D/M/A): 2/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	77,01 t.
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	6
COMUNA	16		
BARRIO	San Bernardo		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	bajo rendimiento del personal
TERMINACIÓN: 6:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inician actividades con la instalación de la Señalización vertical en el área según lo indica el PITT.
- Cerramiento provisional del área a intervenir con malla y Balizas
- Marcación, Corte, Demolición, excavación y retiro de carpeta asfaltica existente en cada bache marcado.
- Acopio temporal de material sobrante de excavación y demolición.
- Llegada de la Mezcla a las 10:17 am.
- Chequeo de temperatura 132.9 °C.
- Nivelación y compactación de la base granular existente en cada bache.
- Imprimación y extensión de la mezcla en cada uno de los baches en 1- 2 capa.
- Recolección de escombros y retiro de señalización

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro P	Daniela Barragán
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE: José Luis Guzmán. A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 4/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Elkin Casiani	X		
4	Rastrillero				
5	Rastrillero	Luis Emiro Mosquera	X		
6	Ayudante	Josua Mira	X		
7	Ayudante	Jhoan Higuita	X		
8	Ayudante	Wilmar Sanchez	X		
9	Ayudante	Javier Mejia	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Yovanny Grisales	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Hector Moreno	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	KM TBG F	X		
2	Compresor	Doosan 185	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WGV 714	X		
16	Volqueta(s)	UQE 721	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 2/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
500 7160	154233	1A	CL 27A 78 -06	0.80	1.55	0.12	1.24	0.15	0.36
500 7160	154233	1B	CL 27A 78 -06	2.30	3.30	0.12	7.59	0.91	2.18
500 7160	160393	2A	CL 27A 78 - 10	3.30	1.05	0.12	3.47	0.42	1.01
500 7160	160393	2B	CL 27A 78 - 10	3.80	2.30	0.12	8.74	1.05	2.52
500 7160	154238	3A	CL 27 A 78-52	3.73	2.30	0.12	8.58	1.03	2.47
500 7160	154238	3B	CL 27 A 78-52	1.80	0.90	0.12	1.62	0.19	0.46
500 7160	160869	4	CL 27 A 78 - 70	1.80	2.00	0.12	3.60	0.43	1.03
500 7160	160396	5	CL 27 A 78 - 72	2.60	1.30	0.12	3.38	0.41	0.98
TOTALES							38.22	4.59	11.01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233665	UGE 121	11.01	11.01	141 C°


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23422	UGE 121	Sencilla	1	Procopal

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 2/09/2025

10. ESQUEMAS

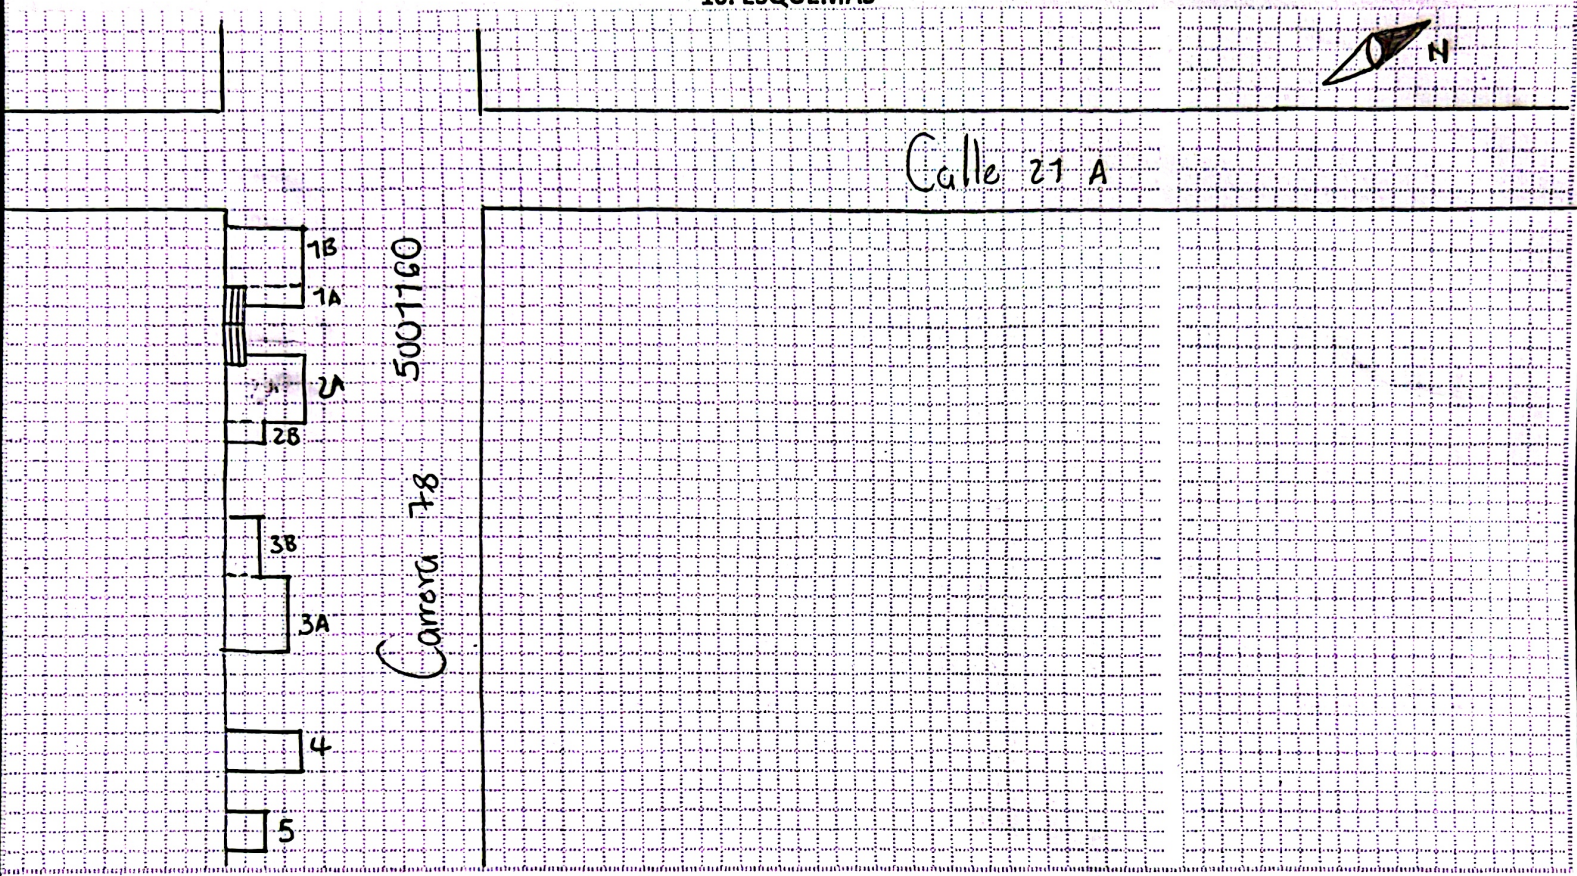

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	11.01 ton
BARRIO	San Bernardo	DIRECCIÓN	CL 21 A 78 - 06

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 233665

FECHA: 02/09/2025

HORA: 8:45:00 AM

CONDUCTOR: PEDRO ORTIZ

PLACA: UDE121

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.65 Toonnes

PESO TARA: 7.64 Tonnes

PESO NETO: 11.01 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141 °C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 15.84 Tonnes

Daniela B.

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23422

PROVEEDOR: Finca 6

VALE POR UN VIAJE: Estación

02/09/25

PLACA No: UDE 121 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Patio 6

RECIBIDO POR: PROCOPAL S.A.

03 SEP 2025

DESPACHOS BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniela B.

Scanned with CamScanner
