FECHA (D/M/A): 8/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual.		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.01 ton
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	6
COMUNA	16		
BARRIO	La Palma		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	—
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inicia con la señalización vertical en la zona de acuerdo al plan de manejo de transito.
- Se realiza cerramiento provisional con malla y Balicao.
- Se realiza la marcación de los baches a ejecutar.
- Se inicia con la demolición, excavación y retiro de carpeta asfaltica.
- Se realiza acopio temporal de material de demolición.
- Llegada de la mezcla 10:15 am
- Se realiza chequeo de temperatura. 153.1 C
- Se realiza la nivelación y compactación de la base granular existente en cada bache.
- Imprimación y extensión de mezcla en cada uno de los baches en 1-2 capa.
- Recolección de escombros y retiro de señalización

5. VISITANTES

Jorge Monsalve

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandra [illegible]	Daniela Barragán
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: Jose [illegible]
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 8/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riquelme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Elkin Casiani	X		
4	Rastrillero	Luis Emiro Mosquera	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Jhosua Mira	X		
7	Ayudante	Yhoan Higuita	X		
8	Ayudante	Wilmar Sanchez	X		
9	Ayudante	Javier Mejia	X		
10	Ayudante				
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Johel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yovany Grisales	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	RM 186 F	X		
2	Compresor	Doosan 186	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 774	X		
16	Volqueta(s)	UQE 127	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 8/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001137	160688	1	Cl 21 A 80-32	1.20	1.75	0.12	2.10	0.25	0.60
5001137	160686	2	Cl 27A 80-33	8.15	1.80	0.12	14.67	1.76	4.22
5001145	160684	3	Cl 27A 80-01	2.25	1.35	0.10	3.04	0.30	0.72
5001145	160685	4	Cl 27A 80-01+2	3.05	2.30	0.10	7.02	0.70	1.68
5001145	160600	5	Cl 27 79-149	7.25	2.30	0.12	16.68	2.00	4.80
TOTALES							43.51	5.01	12.02

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
233790	UGE 121	12.01	12.01	141°C


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23426	UGE 121	Sencilla	1	Procopal

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 8/09/2025

10. ESQUEMAS

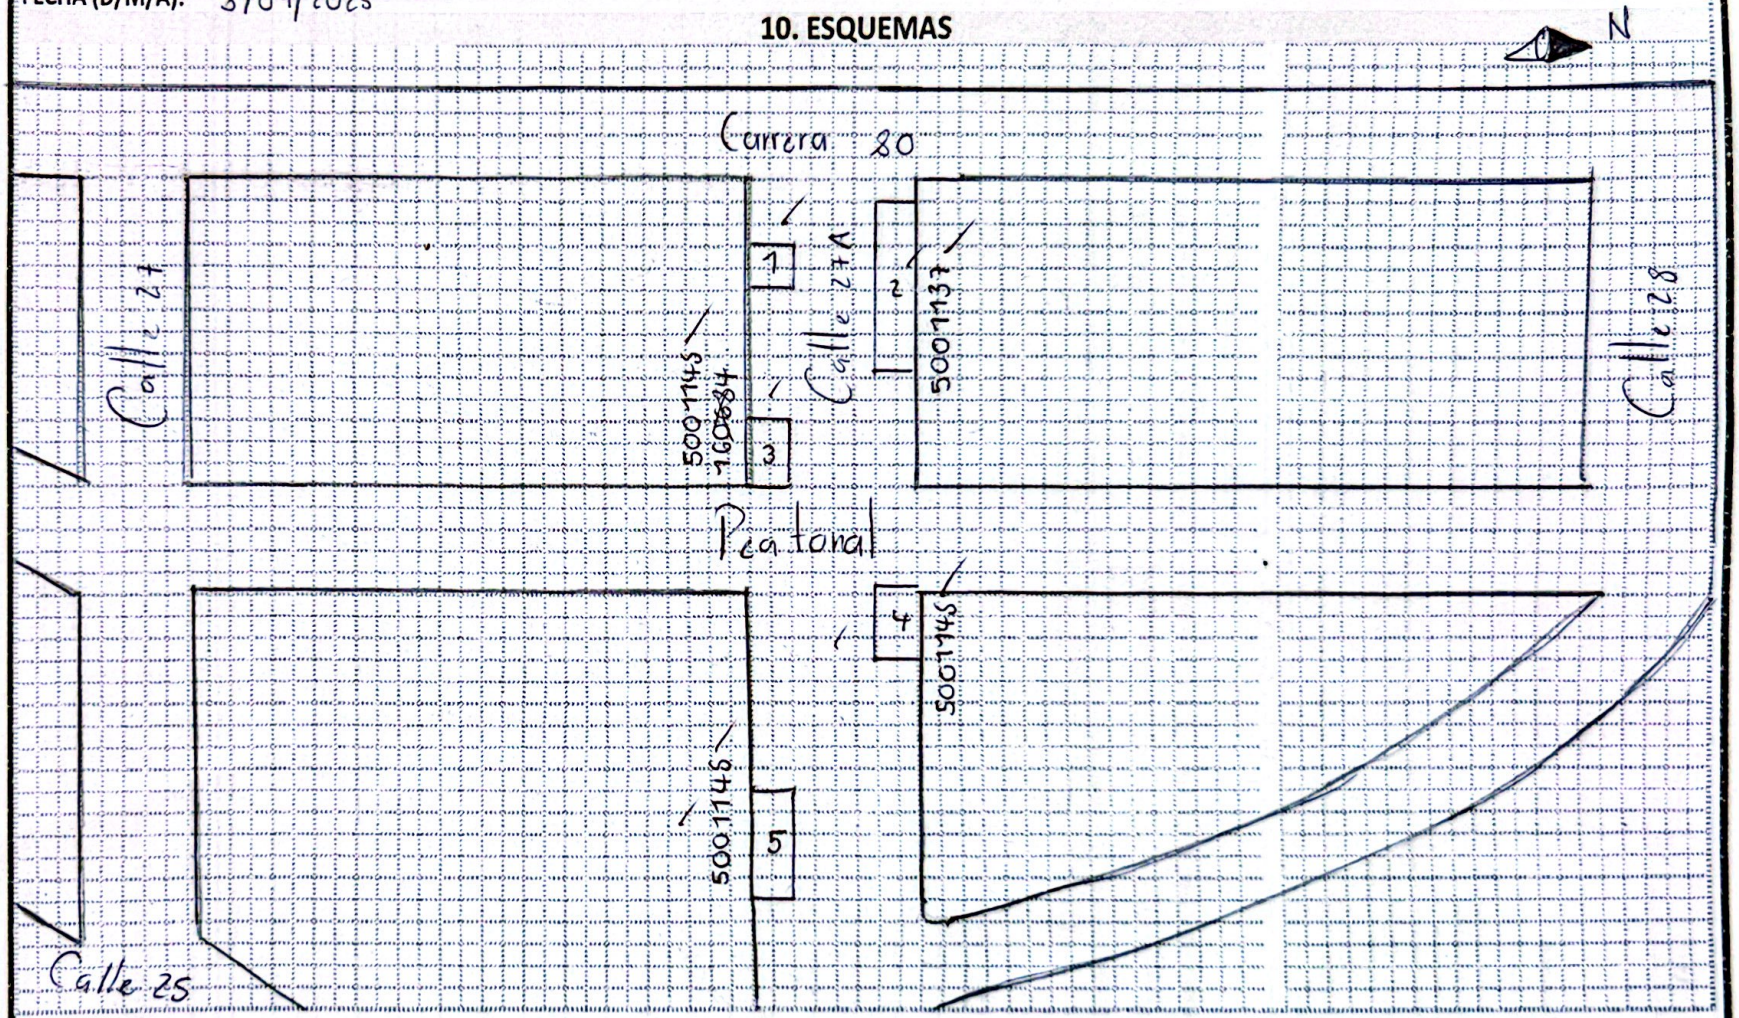

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.01 ton
BARRIO	La Palma	DIRECCIÓN	CL 27 A 79 - 155

Scanned with CamScanner

ESTY POUDS

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 233790

FECHA: 08/09/2025

HORA: 8:41:33 AM

CONDUCTOR: PEDRO ORTIZ

PLACA: UOE121

OBRA: 2307

SUMINMEZ ASF. ESTRUC. PAVIMENTO

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.62 Tonnes

PESO TARA: 7.61 Tonnes

PESO NETO: 12.01 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.83 Tonnes

Alfredo

Daniela Barragán

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900243.3[illegible]

PROCOPAL S.A.

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS No. 23426

DESPACHOS - BASCULA

PROVEEDOR: Frente #6

VALE POR UN VIAJE: Esambos

PLACA No: UOE 121 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Alfredo

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniela Barragán

Scanned with CamScanner
