FECHA (D/M/A): 26/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.05 Ton
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	6
COMUNA	16		
BARRIO	LAS PLAYAS		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 am	
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleado
TARDE	Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se inicia instalando la señalización vertical segun el Plan de manejo de transito.
- Se realiza el cerramiento provisional del área a intervenir con malla y balizas.
- Se realiza la marcación de los baches a ejecutar.
- Se inicia con la demolición de la carpeta asfaltica.
- Se realiza acopio de escombros temporal para el cargue a la volqueta
- Se compacta la base granular existente.
- Llegada de la volqueta 9:30 am.
- Se realiza el chequeo de la temperatura de la mezcla asfaltica.
- Se realiza retiro de escombros a la volqueta y el retiro de la señalización instalada.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Alejandro P — Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Daniela Barragán — Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Leonardo Restrepo — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: José Luis Guzmán D — Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 26/09/2028

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Alejandro Riqueme	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Elkin Casian	X		
4	Rastrillero	Luis Emiro Mosquera	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Thosua Mira	X		
7	Ayudante	Thoan Higuita	X		
8	Ayudante	Wilmar Sanchez	X		
9	Ayudante	Javier Mejia	X		
10	Ayudante	Heferson Correa	X		
11	Ayudante	Jair Martinez	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Jchel Ramirez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Hector Moreno	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Yoranny Grisales	X		
	Auxiliar transito	Anllely Contreras	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	KM 186 F	X		
2	Compresor	Doosan 18	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton WCV 774	X		
16	Volqueta(s)	UGE 171 internacional	X		

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A): 26/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5001094	761847	1	CL 17 70-17	1.90	1.0	0.16	1.90	0.30	0.72
5001094	761848	2A	CL 17 70-36	9.60	1.80	0.15	17.28	2.59	6.22
5001094	761848	2B	CL 17 70-36	1.16	1.80	0.15	2.09	0.31	0.74
5001094	761849	3	CL 17 70-49	1.90	1.50	0.16	2.85	0.46	1.10
5001094	761850	4	CL 17 70-77	2.40	3.55	0.16	8.52	1.36	3.26
TOTALES							32.64	5.02	12.04

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
234220	UGE121	12.05	12.05	142 C°	23440	UGE121	Sencilla	1	Procopal

Scanned with CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

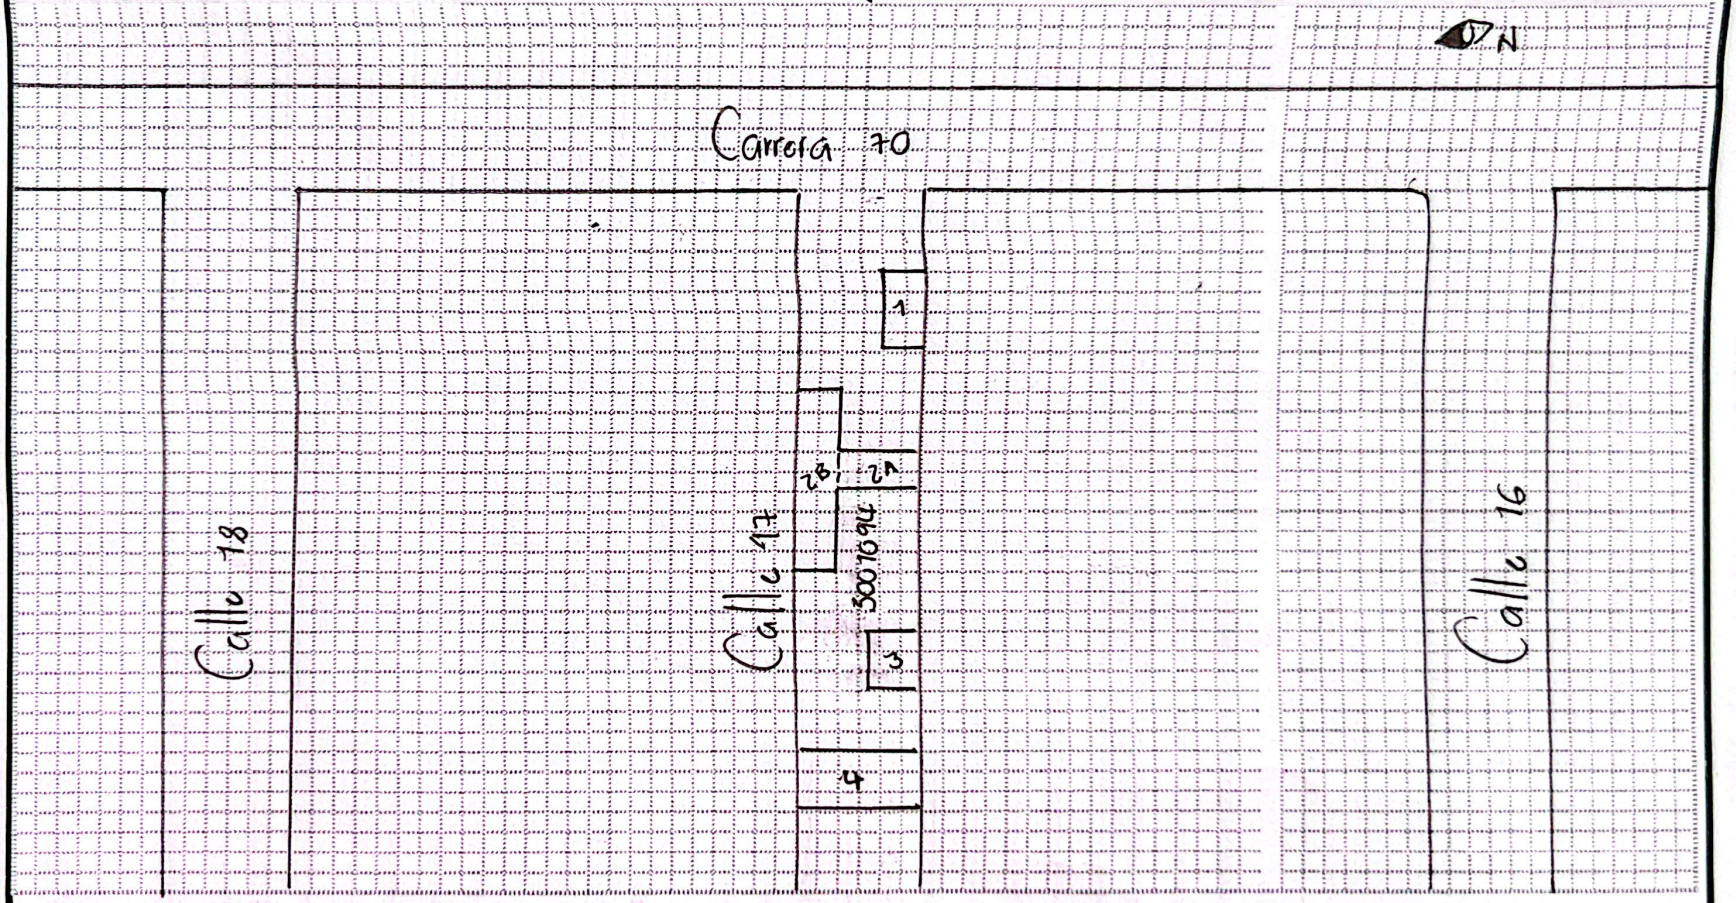

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	6
RANGO:	1	CANTIDAD:	12.05 Ton
BARRIO	Las Playas	DIRECCIÓN	Cl 17 70-49

Scanned with CamScanner

PROCOPAL S.A.

Ingenieros C[illegible]

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234220

FECHA: 26/09/2025

HORA: 8:05:54 AM

CONDUCTOR: PEDRO ORTIZ

PLACA: UQE121

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.71 Tonnes

PESO TARA: 7.66 Tonnes

PESO NETO: 12.05 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 16.88 Tonnes

Daniela Barragán

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23440

PROVEEDOR: Frente # 6

VALE POR UN VIAJE: Escombros

26/09/25

PLACA No: UQE 121 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.388-0
Firma Autorizada

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Daniela Barragán

pesos.

Scanned with CamScanner
