FECHA (D/M/A): 02/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento parche rígido		
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,01
ZONA	2	FRENTE DE TRABAJO:	7
COMUNA	7		
BARRIO	V. Exp Payarito.		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:40 AM.	Camion llega tarde y personal bajo rendimiento.
TERMINACIÓN: 17:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se solicitado el dia de hoy se Atienden puntos en Expansion Payarito. se llega personal 7:00 Am y se espera Camión el cual llega 8:00 Am, personal se dispone a organizarce y a desayunar como a venido pasando Hoy Visita y Campaña sst lo cual a las 8:45 que se dispongan a comenzar se hace con charla sst. se empieza demolicion 9:15 am en el Bache # 1 y luego de que estan los otros demolidos se continuan, se Realizan 5 Baches con el ultimo punto s solicitado. Tubo 1 intercepcion de la 117.

Se demuelen, se imprimes se Aplican Mezcla que llega en Volqueta con temperatura en obra de 138° se Compacta y se termina actividad, se carga Volqueta con Escombros. Camion se cargo con Equipos y señalizaciones. se termina Actividades. a las 5:00 pm.

5. VISITANTES

Vanessa Vargas B | Luis Restrepo. (Social)

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cano A.
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02/09/2020

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Arcila	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Quirola	✓		
4	Rastrillero	Juan Acosta	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	mateo mosquera	✓		
7	Ayudante	Omar Alejandro montoya	✓		
8	Ayudante	Alcario ~~[illegible]~~	✓		
9	Ayudante	Steven Cosa	✓		
10	Ayudante	Alexander mosquera	✓		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Gonzalez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis fernando montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Elkin Ruiz	✓		
	Aux Vial				
	Aux Vial				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac	✓		
2	Compresor	Ingersoll	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marimpa	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRT 504	✓		
16	Volqueta(s)	TTO 095	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5019108	181527	1A	C1 64Bf 117C-43	2,25	2,5	0,14	5,63	0,79	1,81
		1B		1,95	1,8	0,13	3,51	0,46	1,1
5019108	160389	2	C1 64BD 117H-46	2,8	2,5	0,14	7,0	0,98	2,35
5019108	160399	3	C1 64BD 117H-27	1,92	2,5	0,13	4,8	0,62	1,5
5019108	160397	4	C1 64BD 117H-23	3,5	1,9	0,14	6,65	0,93	2,23
5018430	140418	5	C1 64 CR 117f	2,5	1,8	0,18	9,5	0,81	1,94
TOTALES									11,01

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
522962	TTO 095	11,01	—	144°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23329	TTO095	SENCILLA	1	Portmentar

Powered by CamScanner

20250902 09:31

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 522962
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON ESTIVEN GUTIERREZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia - asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,01 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED #2055
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:18.420,00

ENTRADA: 02 sep 2025 -m09:39 a.
SALIDA: 02 sep 2025 - m09:39 a.
TEMPERATURA:144,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250903 06:54

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23329.
PLACA: TTO095
CONDUCTOR: JHON STIVEN VARGAS

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.410,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 03 sep 2025 -m07:03 a.
SALIDA: 03 sep 2025 - m07:03 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIR

CUADRI
HUMEDA
OBSERV
Sum. -
Peso b
Peso t
Peso n

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23329**

PROVEEDOR: SUM - 2058
VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #7
02/09/2025
PLACA No: TTO 095 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellin/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02/09/2025

10. ESQUEMAS

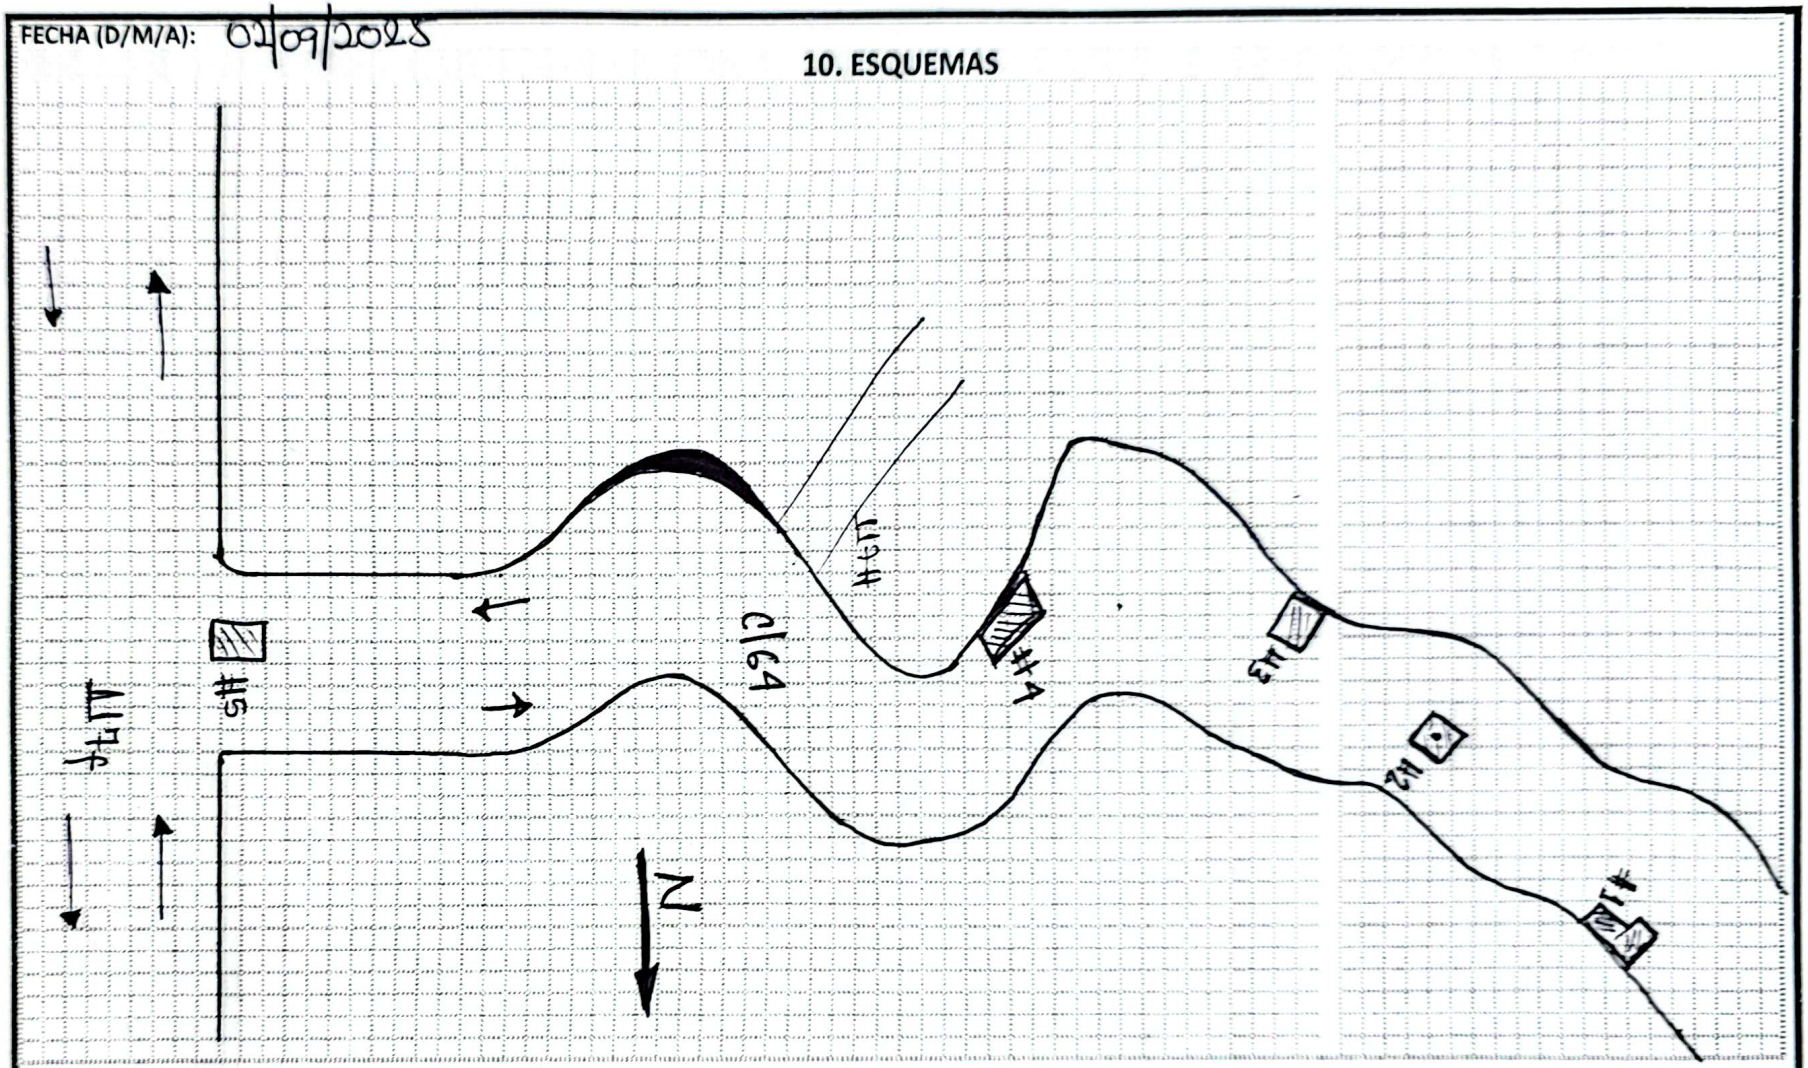

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Portical	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,01
BARRIO	Exp Pajarito.	DIRECCIÓN	Cl 64 CR 117F

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 02/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):

RANGO: 1 CANTIDAD:

ZONA 2

COMUNA 7

BARRIO EXP PAJARITO

FRENTE DE TRABAJO: 7

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:

INICIO : 8:40

TERMINACIÓN: 17:00 pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA Soleado

TARDE Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Nota:

Durante la aplicación de la mezcla el personal ayudante decía los coches y la pala, dejan de cargar mezcla y se van a almorzar, un lapso de 1 Aprox 1 hora. El cual el Rendimiento no es el mismo Entre el Pavimentero y el encargado AL Pato haciendo la actividad.

5. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner
