FECHA (D/M/A): 03/ de Sep del 2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Bacheo puntual		
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,02
ZONA	2	FRENTE DE TRABAJO:	7
COMUNA	9		
BARRIO	El Diamante		

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 9:00AM	llega comida 8:00AM y se demoran para EL comienzo.
TERMINACIÓN: 5:40pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Hay personal en zona desde 7:00AM, llega comida 8:00AM y empiezo personal a cambiarce ya desayonar mientras organizan comenzaron a las 9:00 AM con instalacion de señalizacion de verticales y cerramiento, el compresor a demdar. Se limpian e imprimen bacheo, llega volqueta con mezcla MDC 19 con RAP tibia con temperatura en OBRA DE 140°, se Realizo Bacheo para Bajar gravedad en Loma.
Se Aplico y compacta, se Limpia y se movilizan al Bache #3 a otra cerada se Aplica y compacta se limpia y se cargan escombros volqueta se Retiran señalizaciones y se cargan en camión con equipos.
se tiene visita Ambiental del contratista. se termina Actividad a las 5:40pm

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA (Cristian D. Correa A.)
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Figueroa	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Cortés	✓		
4	Rastrillero				
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Mateo Mosquera	✓		
8	Ayudante	Alvaro Osorio	✓		
9	Ayudante	Omar Montoya	✓		
10	Ayudante	Edinson Sanchez	✓		
11	Ayudante	Eliven Soto	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)	Edinson			
	Aux vial	Hector Arrieta	✓		
	Aux Vial	~~Prestado~~ Rada Aguirre	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Bouarna	✓		
2	Compresor	Doorsan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Barmita	✓		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRI 80A	✓		
16	Volqueta(s)	WLW 714.	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005658	160599	1	CR 86 78-26	5,8	2,7	0,13	15,66	2,04	4,89
5005658	160598	2A	CR 86 78-11	2,7	2,4	0,13	6,48	984	2,02
		2B		4,83	08	0,12	3,86	0,46	1,11
5005694	160660	3	CR 85A 78A-8	8,5	1,05	0,14	8,93	1,25	3.0
TOTALES									11,03 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
23 3792	wlw 714	11,02	——	140°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23333	WLW 714	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
Ingenieros Contratistas

TIQUETE DE BASCULA: 233792

FECHA: 08/09/2025

HORA: 8:52:49 AM

CONDUCTOR: EDISON YALI

PLACA: WLW714

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 19.09 Tonnes

PESO TARA: 8.07 Tonnes

PESO NETO: 11.02 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 149 °C

VIAJE NUMERO: 4

TOTAL DESPACHADA: 37.86 Tonnes

Escombro

REMISION DE MATERIALES 20250909 07:40
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23333
PLACA: WLW714
CONDUCTOR: EDISON YALI

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED M2058
PESO TARA: 7.910,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 09 sep 2025 - 07:48 a.
SALIDA: 09 sep 2025 - 07:48 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23333**

PROVEEDOR: SUM-2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #7

08/09/2025

PLACA No: WLW 714 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Pavimentar

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 08/09/2025

10. ESQUEMAS

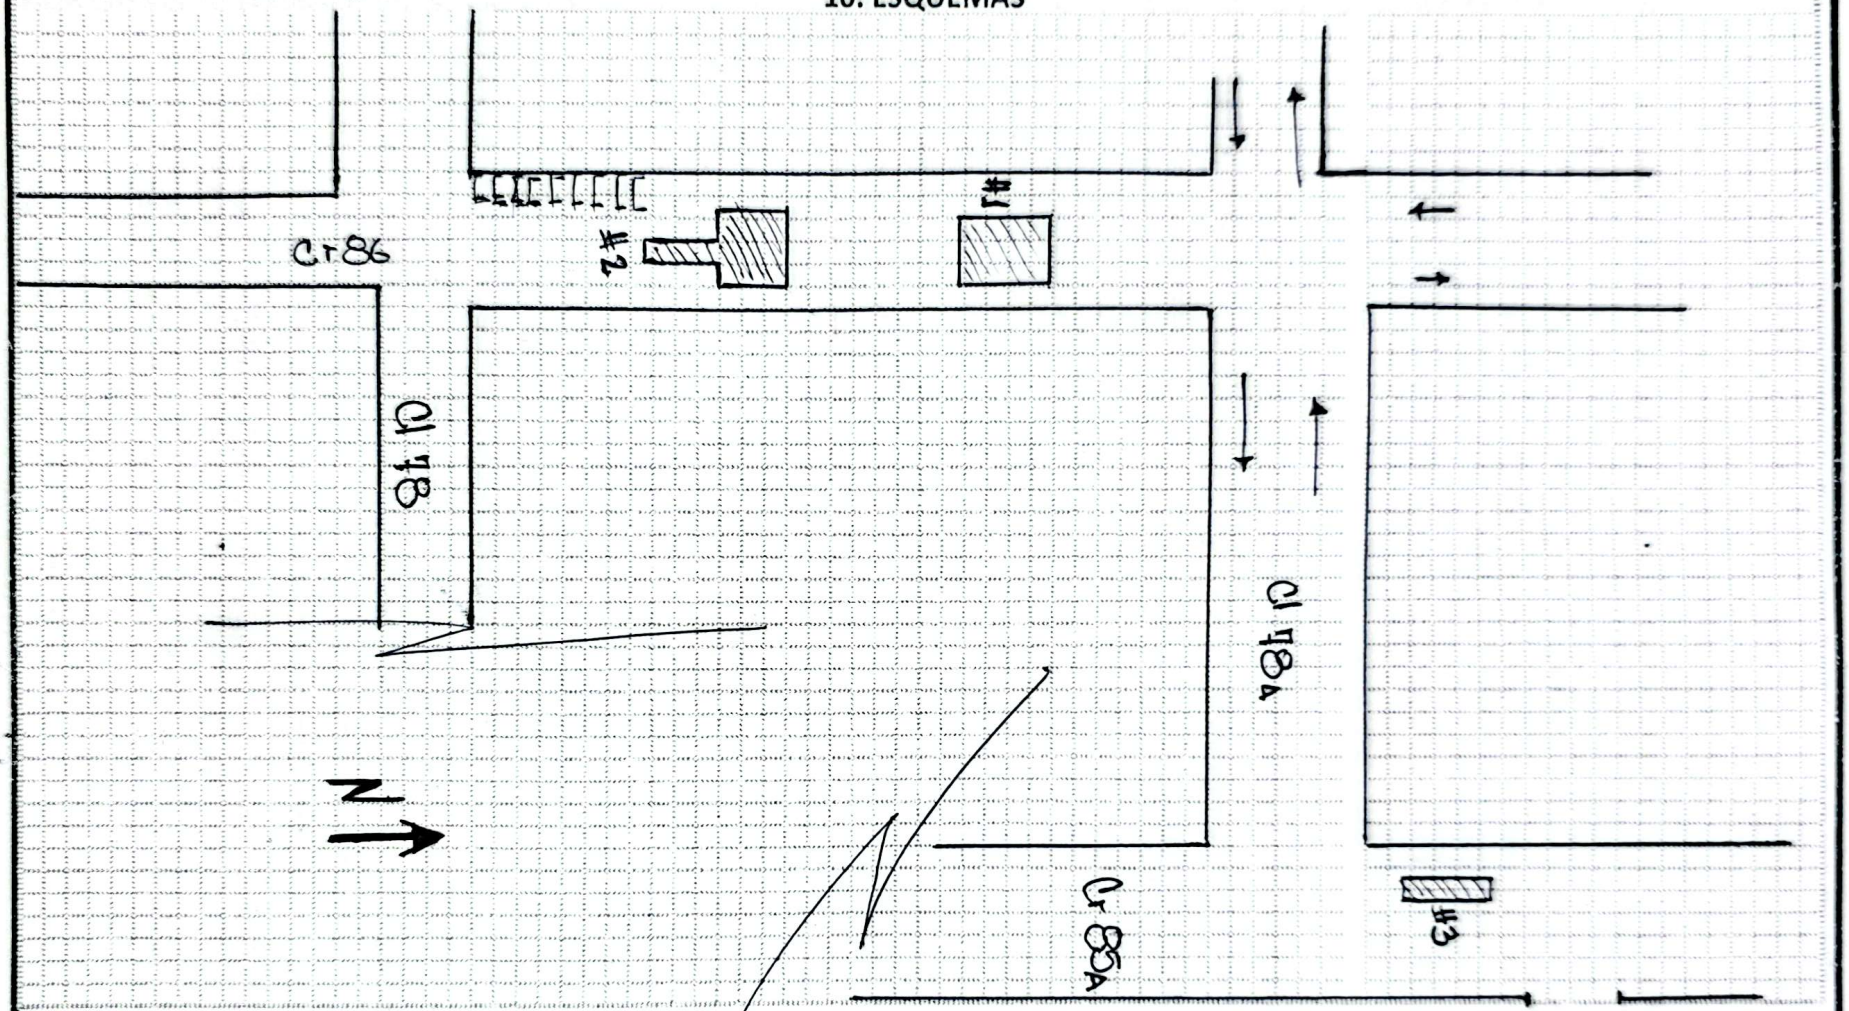

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Mejoramiento Bache Puntual	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	11,02
BARRIO	El Diamante	DIRECCIÓN	Cr 86 Cl 78 Y 78A.

Powered by CamScanner
