FECHA (D/M/A): 09/09/2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Mejoramiento Bacth Pontual
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,04
ZONA	2
COMUNA	7
BARRIO	ACRES I
FRENTE DE TRABAJO:	7

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDUREANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 AM	
TERMINACIÓN: 3:30 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada

TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Personal llega a obra 7:00 AM y espera Camion el cual llega Antes de las 8:00 AM. se organizan, descansan y comienzan a instalar señalizacion y a bajar Equipos y Hta Comienzan con demolicion en Baches ya indicados por la Interventoria.

mientras que llega la Interventoria 9:15 AM les da los otros puntos A intervenir # 3 y 4. se demuelen, se limpian e imprimen. se organizan y llega Volqueta con mezcla MDC 19 con RAP Tibia a una Temperatura en obra de 142° se instala y se Compacta. se organiza Lugar, se hace limpieza se cárga Volqueta con escombros. se Recoge con Camion señalizaciones y Equipos

Actividad terminada a las 3:30 pm.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Heroo Perez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Tejo	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Trigoita	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Cuanto	✓		
4	Rastrillero	Juan Cuesta	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante				
7	Ayudante	Mateo Moscoso	✓		
8	Ayudante	Omar Alejandro Monroy	✓		
9	Ayudante	Edinson Sanchez	✓		
10	Ayudante	Alvaro Osorio	✓		
11	Ayudante	Stiven Sosa	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	-			
29	Conductor Volqueta(s)	- Mateo A.	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac	✓		
2	Compresor	Doosan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita			
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Chevrolet TRI 504	✓		
16	Volqueta(s)	SMV 696	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 04/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005950	150614	1	Cl 79 93-29	2,35	4,1	0,15	9,64	1,45	3,47
5005948	147792	2	Cl 79 84-26	1,2	2,8	0,15	3,36	0,50	1,21
5005718	160739	3A	CR 84 79-11	2,33	1,6	0,11	3,73	0,41	0,98
5005718		3B		2,4	1,9	0,11	4,56	0,50	1,2
5005718	160737	4A	CR 84 79-85	1,75	3,15	0,15	5,51	0,83	1,98
5005718		4B		1,9	1,65	0,16	3,14	0,50	1,2
TOTALES									10,04 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
523612	SMV 676	10,04 ✓	——	146°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIoN
23334	SMV 676	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

REMISION DE MATERIALES 20250909 09:09
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523612
PLACA: SMV676
CONDUCTOR: MATEO ARANGOMATEO ARANGO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,04 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.320,00
PESO BRUTO:17.360,00

ENTRADA: 09 sep 2025 - 09:09 a.
SALIDA: 09 sep 2025 - 09:09 a.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

REMISION DE MATERIALES 20250820 11:29
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23334
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 10 sep 2025 - 06:56 a.
SALIDA: 10 sep 2025 - 06:56 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

CUADRI...
HUMEDA...
OBSERV...
Sum. -...
Peso b...
Peso t...
Peso n...

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23334**

PROVEEDOR: SUM- 2058
VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #2
09/09/2025
PLACA No: SMV (676) 677 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 09/09/2025

10. ESQUEMAS

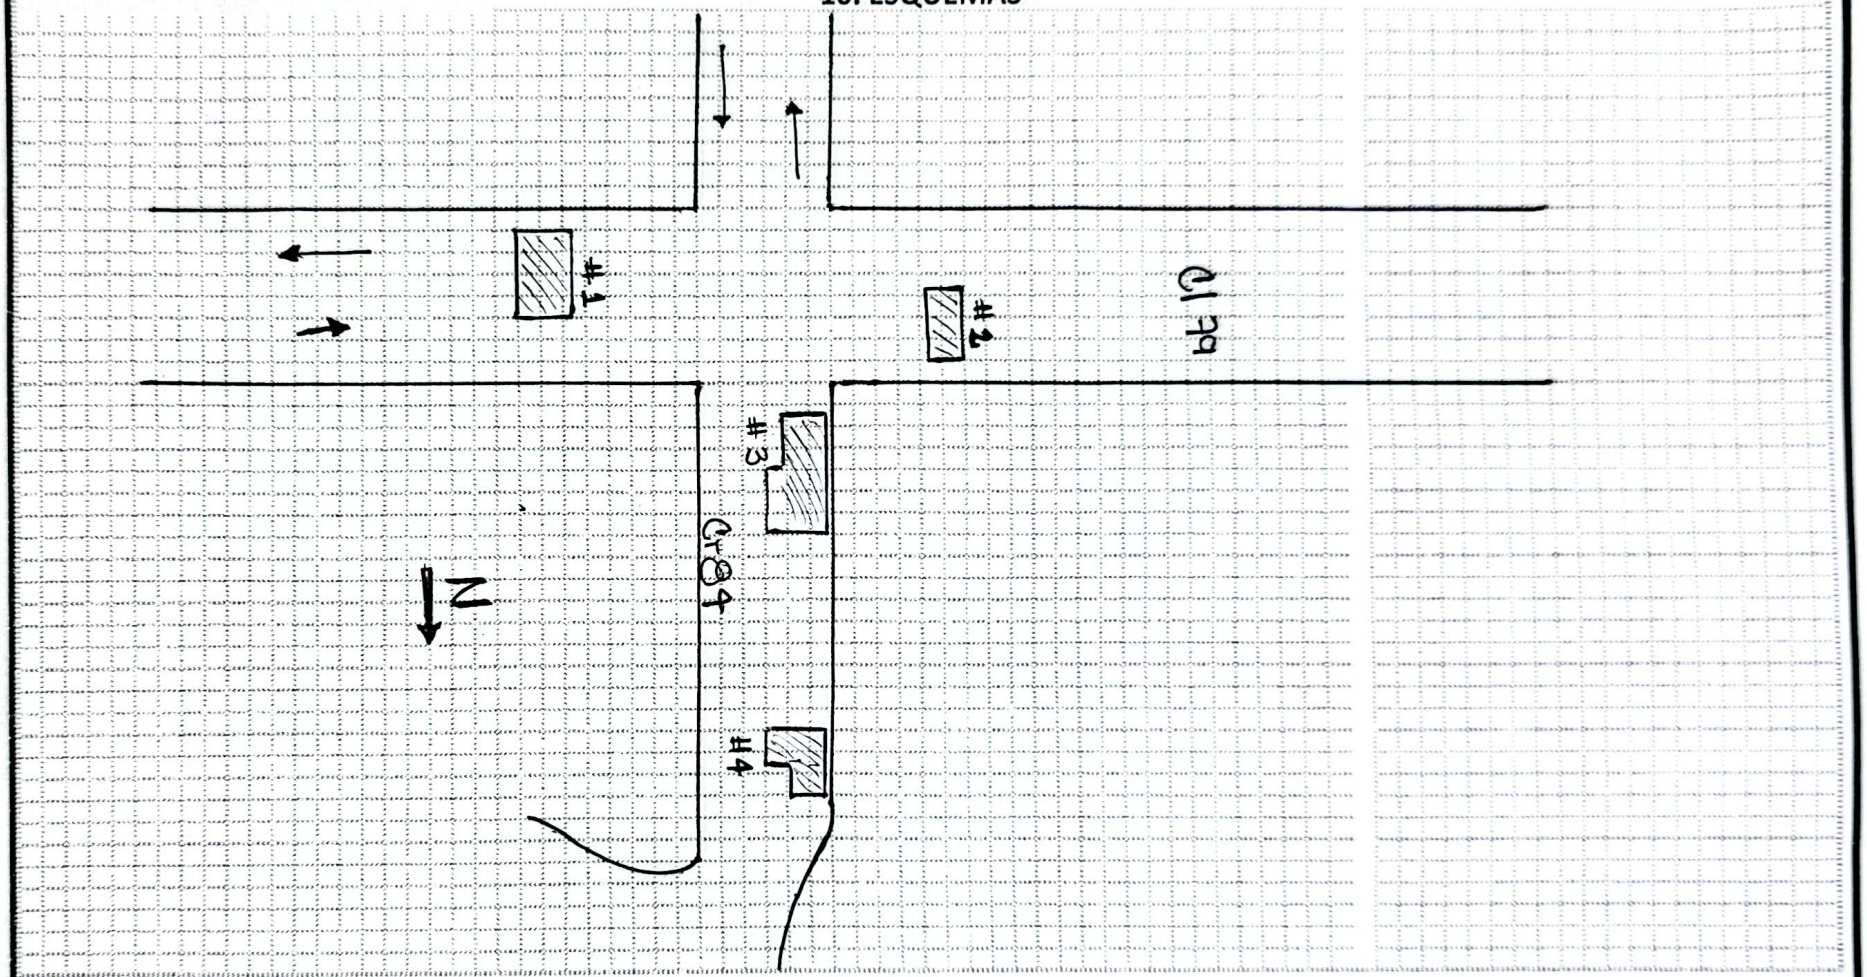

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Rontoal	FRENTE	1
RANGO:	1	CANTIDAD:	10.04
BARRIO	Arco I	DIRECCIÓN	Cr 83 Cl 79

Powered by CamScanner
