FECHA (D/M/A): 10/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Mejoramiento Bacht Asfaltal
RANGO: 1	CANTIDAD: 10,07
ZONA 2	FRENTE DE TRABAJO: 7
COMUNA 7	
BARRIO ANDES I	

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 8:00 AM	Camión llega 7:55 AM Ayudantes 8:15 AM
TERMINACIÓN: 4:30 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleada
TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Personal llega al lugar 7:00 AM se espera camion que llega 7:45
- personal se cambia y se organizan, otro grupo llegan 8:20 AM.
- Se disponen a Pegar e instalar señalización, Equipos y Cerramiento.
- Se demarcan puntos a intervenir, empezando por #1 frente al Convento. Se Comienza con demolición, se Realiza Cortico con 2 Ax circ ya que es vía doble sentido
- Se demoran se demuelen se limpian y embrocan los 3 Bacheo mas.
- llega volqueta con Mezcla MDC 19 con RAP tibia a Temperatura de obra de 148°.
- Se Aplica, se Compacta el Bacheo. se Realiza Limpieza.
- Se carga volqueta con escombros, se Carga camion con señalización y Equipos.
- Actividad terminada A las 4:30 pm

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Higuita Valencia	Tatiana Henao Perez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Carlos Toro	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Arguelta	✓		
2	Encargado	Jaime Herrera	✓		
3	Liguero	Brayan Cuello	✓		
4	Rastrillero	Juan Cuesta	✓		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Mateo mosquera	✓		
7	Ayudante	Omar Alejandro Monroy	✓		
8	Ayudante	Edinson Sanchez	—		
9	Ayudante	Alvaro Osorio	—		
10	Ayudante	Alexander Mosquera	—		
11	Ayudante	Steven Soto.	—		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Mauricio Sanchez	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Luis Fernando Montoya	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	EPD	✓		
	Aux Vial	Paola Agudelo	—		
	Aux Vial	Hector Arteta	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Dynapac	✓		
2	Compresor	Doosan	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	—		
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TRI 504 Chevrolet	✓		
16	Volqueta(s)	OMV 677			

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 10/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5005584	160959	1A	CL 87A 76-165	4,4	2,15	0,15	9,46	1,42	3,41
5005584		1B		1,9	3.4	0,12	6,46	0,78	1,86
5005584	160850	2	CL 87A 76-19	1,4	3.49	0,15	4,89	0,73	1,76
5005584	160812	3	CL 87 76AP-29	3,1	1,9	0,14	5,89	0,82	1,98
5005584	160813	4A	CL 87A 76-19	1,8	1,5	0,11	2,70	0,30	0,71
5005584		4B		1,25	1,05	0,11	1,31	0,14	0,35
TOTALES									10,07

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
523720	SMV 677	10,07	——	149°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23335	SMV 677	Sencillo	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

20250910 07:46

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523720
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: ELKIN RUIZ

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 10,07 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA IAL MED
M2055
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:17.350,00

ENTRADA: 10 sep 2025 -m07:46 a.
SALIDA: 10 sep 2025 - m07:46 a.
TEMPERATURA:149,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250911 07:27

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23335.
PLACA: SMV677
CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003596 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED M2058
PESO TARA: 7.280,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 11 sep 2025 -m07:29 a.
SALIDA: 11 sep 2025 - m07:29 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIR
CUADRILL
HUMEDAD:
OBSERVAC
Sum. - S
Peso bru
Peso tar
Peso net

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23335**

PROVEEDOR: SUM - 2058
VALE POR UN VIAJE: Escombro. Frente #7
10/09/2025
PLACA No: SMV677 CAPACIDAD: 7 M3
DESTINO: Pavimentar
RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.


Santiago H.
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

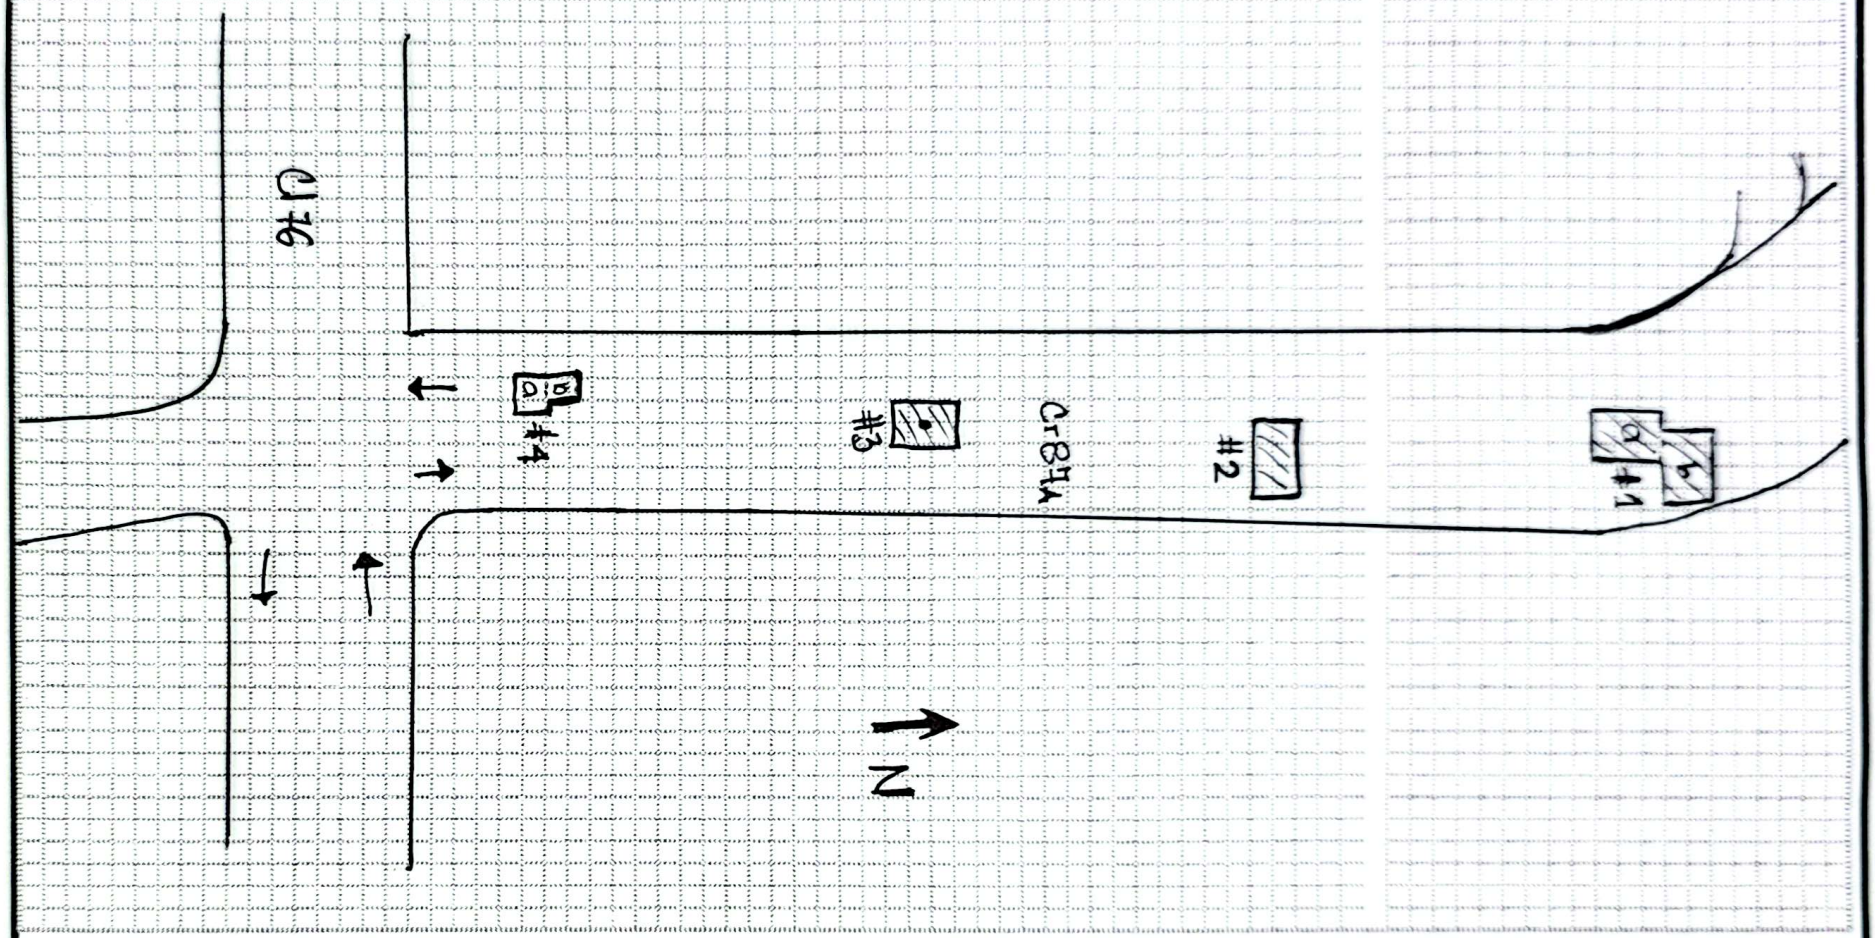

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Bache Portal	FRENTE	7
RANGO:	1	CANTIDAD:	1007
BARRIO	Acros I	DIRECCIÓN	Cr 87A 76-165

Powered by CamScanner
