FECHA (D/M/A): 03-09-2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1 diurno	CANTIDAD: 12,24 TON
ZONA	6 - 4.
COMUNA	16 Belen - 11 Laureles
BARRIO	Nueva villa del aburrá - La Castellana
FRENTE DE TRABAJO:	11

Alcaldia de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 07:00 am.	N/A.
TERMINACIÓN: 05:00 Pm.	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada.
	TARDE: Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciongs de la jornada.
Instalacion de señalizacion vertical. segun PMT.
Instalacion de Señalizacion de cerramiento y vaya informativa
Ubicacion de baño mobil, punto ecologico, camilla...
Marcado, corte y demolicion de las intervenciones
* las intervenciones 1 a 4 tienen su ultima carpeta de mezcla existente de 4cm aprox. y una base de fresado como tercera capa en su parte mas onda la cual se nivela y se vuelve a compactar.
Acopio de escombros y coberturo del mismo
Se encuentra a la Cuadrilla 11 ejecutando las labores inherentes a ejecucion de obra. Sin observar novedad.
Aplicacion de emulsion asfaltica, aplicacion y compactacion de mezcla tipo MDC-19 tibia con rap de la empresa Pavimentar con temperatura de planta 145°C, 130°C a la 7:30pm.
Cargue de escombros, limpieza general de obra
* Se solicita extraccion de nucleos en bache # 4.

5. VISITANTES

Mayentorneno mejia - Supervision SIF
Lucia Restrepo (social).

6. FIRMAS

NOMBRE: Andres Reyes Quintero	David Alvarez
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Sí	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Andres Reyes	✓		
2	Encargado	—			
3	Liguero	Ruben Espinal	✓		
4	Rastrillero	Daniel Rios	✓		
5	Rastrillero	—			
6	Ayudante	Tony Polo	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Andres Restrepo	✓		
9	Ayudante	Kaner Ramirez.	✓		
10	Ayudante	Jose Palencia	✓		
11	Ayudante	Julian Mayo	✓		
12	Ayudante	Hector Velez.	✓		
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo	✓		
17	Operador compresor	Didier Castro	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Ruben Espinal	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Elmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Giraldo	✓		
30	Controladora Vial	Luz Andrea Jaramillo	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Sí	No	
1	Rodillo manual	Ecoroad 2017	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	✓		
10	Placa vibratoria	EMS 90B.	✓		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford Cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional - Freightliner	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5009289	160489	1	CR 82B CL 32E-33	2,25	1,55	0,15	3,49	0,52	1,25
5009289	160490	2	CR 82B CL 32E-37	2,45	1,55	0,21	3,80	0,80	1,92
5009289	160491	3	CR 82B CL 32E-64	3,10	1,60	0,19	4,96	0,94	2,26
5009289	160419	4	CR 82B CL 32E-104	3,10	2,25	0,23	6,98	1,61	3,86
4000478	160492	5	CL 32EE CR 82A-40	2,70	1,15	0,13	3,11	0,40	0,96
4000478	160493	6	CL 32EE CR 82A-~~40~~ 26	2,50	0,70	0,13	1,75	0,23	0,55
4000478	160494	7	CL 32EE CR 82A-16	3,10	1,50	0,13	4,65	0,60	1,44
TOTALES							28,74	5,10	12,24

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
523058	ZNM196	12,26	—	145	23614	ZNM196	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 03-09-2025

10. ESQUEMAS

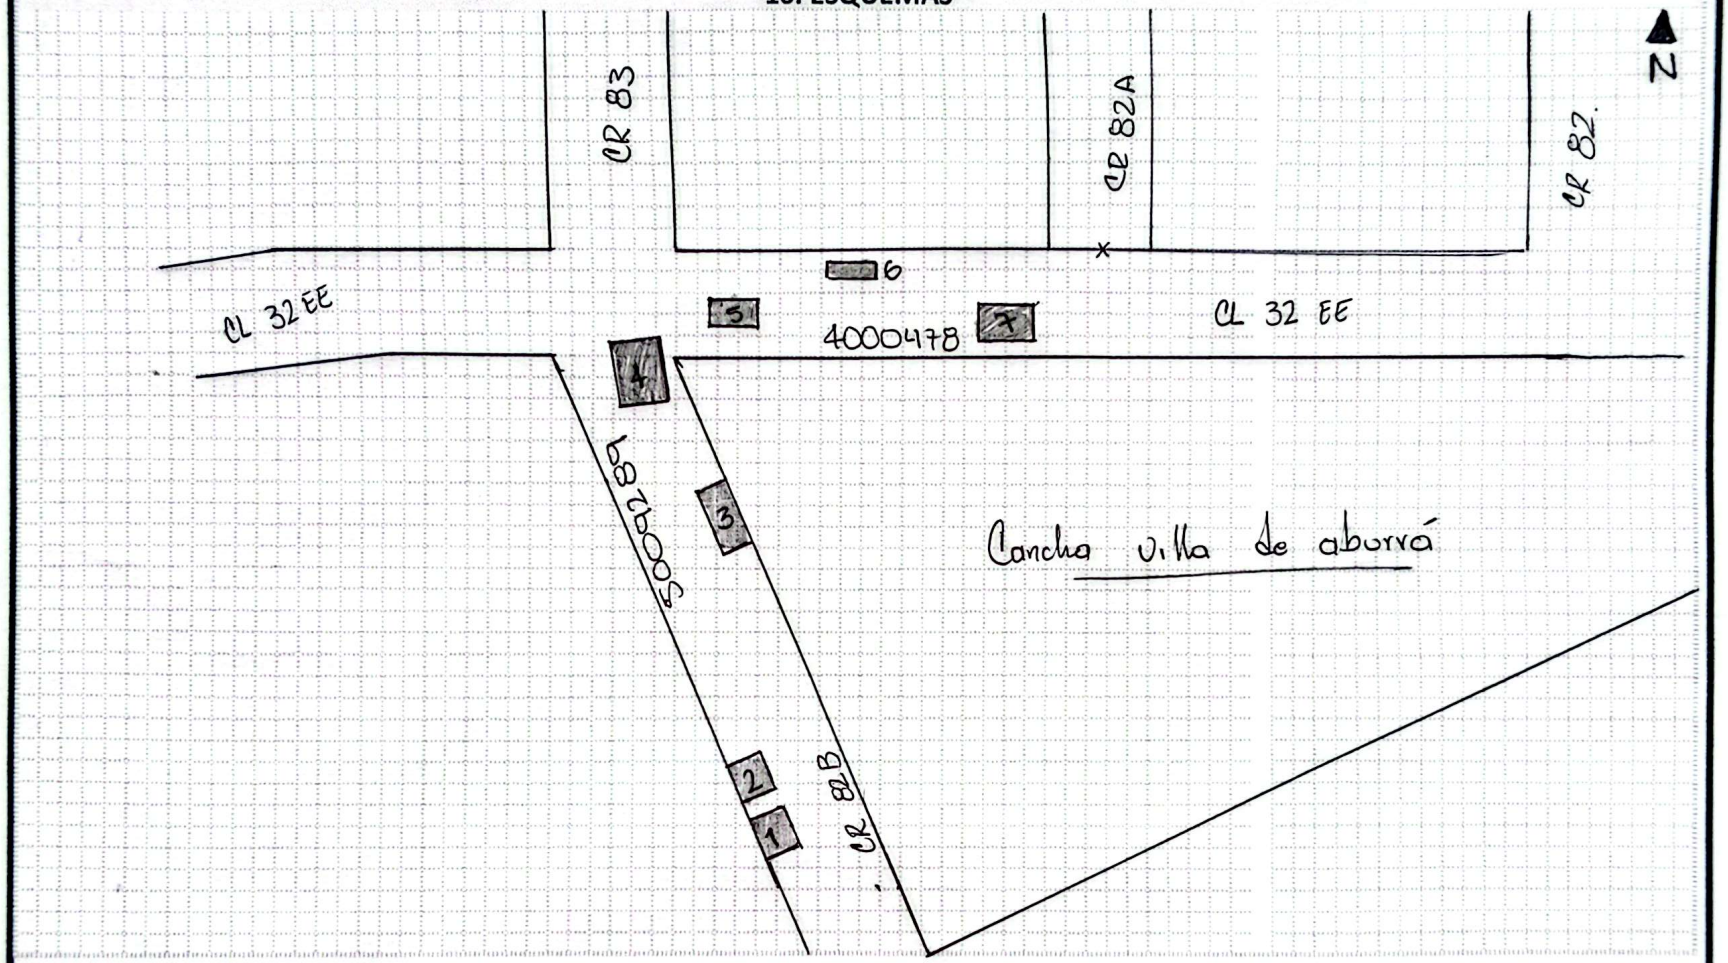

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1 diurno	CANTIDAD:	12,24 TON
BARRIO	Nueva villa del aburra la castellana	DIRECCIÓN	CR 83 CL 32E y 32 EE.

Powered by CamScanner

20250903 08:24
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523058
PLACA: ZNM196
CONDUCTOR: ALVARO GIRALDO

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-19 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 12,26 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA VIAL MED
#2055
PESO TARA: 7.890,00
PESO BRUTO:20.150,00

ENTRADA: 03 sep 2025 -m08:25 a.
SALIDA: 03 sep 2025 - m08:25 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

3/9/2025
1054703430
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

20250904 06:39
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 23614
PLACA: ZNM196
CONDUCTOR: IVAN URIBE

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

OBRA: V000003594 SUM-2058- EYP ESCOMBROS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.890,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 04 sep 2025 -m06:50 a.
SALIDA: 04 sep 2025 - m06:50 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Andres Reyes
1054703430
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 18590
Peso tara : 7890
Peso neto : 10700

Powered by CamScanner
