FECHA (D/M/A): 15-09-2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual
RANGO: 1 diurno	CANTIDAD: 11,02 TON
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 11
COMUNA: 12 - La America	
BARRIO: La Floresta	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 07:00 am	N/A
TERMINACIÓN: 04:30 pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Soleada
TARDE	Soleada.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Identificacion de las intervenciones de la jornada.
Instalacion de señalizacion vertical segun PMT.
Marcado de las intervenciones, Instalacion de señalizacion de cerramiento, ubicacion de baño mobil, punto ecologico camilla, botiquin...
Corte y demolicion de pavimento afectado
acopio de escombros y cobertura con plastico
Limpieza de las intervenciones y compactacion de base
aplicacion de emulsion asfaltica
aplicacion y compactacion de mezcla asfaltica MDC-19 tibio con Rap de pavimentar con temperatura de planta 145°a
Cargue de escombros
Recogida de señalizacion y limpieza general de obra.
En esta jornada se intervienen señales horizontales en las intervenciones # 1,3,5,6,7 las cuales se deben reponer.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Andres Rojas 16/9/2025	David Alvarez
Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Brayan D. Cano A.
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-09-2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Andres Reyes	✓		
2	Encargado	-			
3	Liguero	Ruben Espinal	✓		
4	Rastrillero	Ulver Betancourt	✓		
5	Rastrillero	-			
6	Ayudante	Tony Polo U.	✓		
7	Ayudante	Wilson Caicedo	✓		
8	Ayudante	Kaner Ramirez	✓		
9	Ayudante	Jose Palencia	✓		
10	Ayudante	Julian Mazo	✓		
11	Ayudante	Hector Velez	✓		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Tony Polo U. (Ayudante)	✓		
17	Operador compresor	Didier Castro	✓		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Ruben Espinal	✓		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Olmer Uribe	✓		
29	Conductor Volqueta(s)	Alvaro Giraldo Uribe	✓		
30	Controladora Vial	Luz A. Jaramillo	✓		
31	Controlador Vial	Hector Arrieta	✓		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Ecoroad 2022	✓		
2	Compresor	Doosan C-185	✓		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita.	✓		
10	Placa vibratoria	EMS 90B		✓	
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Ford Cargo 2007	✓		
16	Volqueta(s)	Internacional	✓		

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4000301	161153	1	CR 82 CL 47-84	3,10	1,95	0,12	6,05	0,73	1,74
4000301	161154	2	CR 82 CL 47-138	0,80	1,90	0,12	1,52	0,18	0,44
4000301	161175	3	CR 82 CL 47-144	1,55	1,40	0,13	2,17	0,28	0,68
4000301	161176	4	CR 82 CL 47-150	3,70	2,55	0,13	9,44	1,23	2,94
4000301	161177	5	CR 82 CL 47-154	1,45	1,10	0,12	1,60	0,19	0,46
4000301	161179	6A	CR 82 CL 47-207	1,00	2,90	0,13	2,90	0,38	0,90
4000301	161179	6B	CR 82 CL 47-207	3,20	1,75	0,13	5,60	0,73	1,75
3000105	157503	7	CL 47 D CR81A-103	3,00	2,25	0,13	6,75	0,88	2,11
TOTALES							36,02	4,59	11,02 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
524049	ZNM 196	11,02	—	145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23622	ZNM 196	Sencilla	1	Pavimentar

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 15-09-2025

10. ESQUEMAS

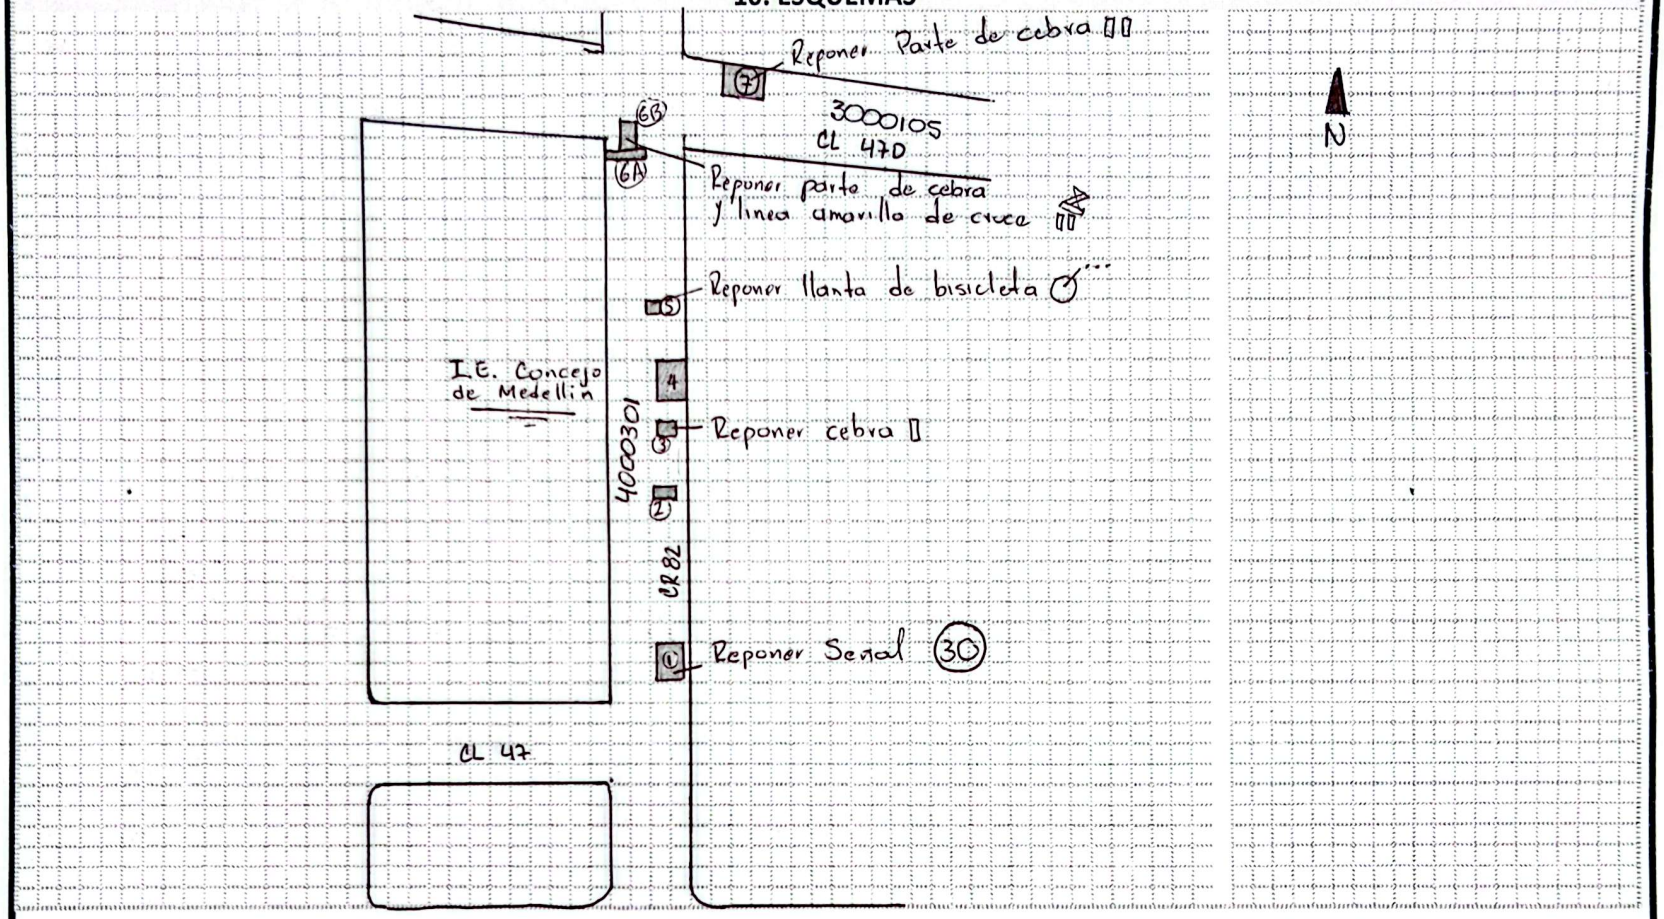

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	11
RANGO:	1 diurno	CANTIDAD:	11.02 TON /
BARRIO	La Floresta	DIRECCIÓN	CR 82 CL 47 y 47D.

Powered by CamScanner

----------20250915 09:07
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 524049
PLACA: ZNN196
CONDUCTOR: ZNN196

PRODUCTO:14524-9 Mezcla asfaltica MDC-1 9 - tibia -
asfalto 60 -70 - RAP
CANT. NETA: 11,02 Ton

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003593 SUM-2055- EYP MALLA V IAL MED
#2055
PESO TARA: 7.890,00
PESO BRUTO:18.910,00

ENTRADA: 15 sep 2025 - 09:08 a.
SALIDA: 15 sep 2025 - 09:08 a.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

16/09/2025
1069703934
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras + Sum. - Suministros a terceros

Peso bruto : 17700
Peso tara : 7280
Peso neto : 10420
----------20250916 04:52
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 27422
PLACA: ZNN196
CONDUCTOR: IVAN URIBE

PRODUCTO:3396 Escombros (viaje)

CANT. NETA: 1,00 Trayecto

CLIENTE:900243322-4 ESTRUCTURAS Y PAVI MENTOS

OBRA: V000003594 SUM-2058- EYP ESCOMBR OS
MALLA VIAL MED #2058
PESO TARA: 7.890,00
PESO BRUTO:0,00

ENTRADA: 16 sep 2025 - 06:54 a.
SALIDA: 16 sep 2025 - 06:54 a.
TEMPERATURA:0,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

1034853094
FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros a terceros
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Sum. - Suministros a terceros
Peso bruto : 17820
Peso tara : 7890
Peso neto : 9930

Powered by CamScanner
