FECHA (D/M/A): 26/09/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Fallos		
RANGO:	3	CANTIDAD:	
ZONA	1	FRENTE DE TRABAJO:	#14
COMUNA	1		
BARRIO	Aldea Pablo VI		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 07:00 AM	bajo rendimiento, lluvias fuertes
TERMINACIÓN: 08:00 PM	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	Seco / Nublado
TARDE	lluvias 4:00PM / 6:00PM

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza recorrida del area
- Se realiza cerramiento total de la via ya que es estrecha
- Se realiza instalacion PMT
- Se realiza marcacion con interventoria y contratista
- Se cervica uso del baño portatil, punto ecologico, kit antiderrames cartelera informativa, valla fijera etc...
- Se realiza demolicion en zonas puntuales para retiro de fallos puntuales, nivelacion, imprimacion, instalacion y compactacion para luego continuar con un recapeo superficial por orden del supervisor Gabriel de la SIF
- Se le recomienda al contratista mejorar el cerramiento e implementar un segundo controlador vial ya que los motos estan ingresando a la zona de trabajo colocando en riesgo la vida e integridad de los trabajadores y de si mismos.
- Se le recomienda al contratista realizar una buena compactacion en los hombros de la via ya que estan quedando muy irregulares
- Se realiza el realce de un MH el cual se instala con mezcla a 70°

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Ramos M.	Santiago Granados.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Luis Alejandro Castro R.	NOMBRE: Juan V. Ramos S.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Henao	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Espitaqueta Perea	x		
4	Rastrillero	Julian Galeano	x		
5	Rastrillero	Shony Cordoba	x		
6	Ayudante	Oneida Cerqueira	x		
7	Ayudante	Victor cordoba	x		
8	Ayudante	Jose de los santos	x		
9	Ayudante	Jose Pozo	x		
10	Ayudante	Orlando Mendoza	x		
11	Ayudante	Sebastian Velasquez	x		
12	Ayudante	Henry Perea	x		
13	Ayudante	Marconi Burgos	x		
14	Ayudante	Deiler Sanchez Alzara	x		
15	Ayudante	Ronald Echavarria / Alexander Bello			
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora	Orlando Ospina			
21	Operador Vibrocompactador	Alvaro Soto	x		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión				
29	Conductor Volqueta(s)	Damian Benitez Alzate	x		
		Jerardo Chirinos	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	KAESER M50	x		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora	New Holland B95B	x		
6	Vibrocompactador	Volvo DD24	x		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto	Si			
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria	Maquinaria			
11	Soplador	GX700	x		
12	Mini cargador		x		
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Foton SV0420			
16	Volqueta(s)		x		

Zda

FECHA (D/M/A):			BITACORA DE OBRA
1. DATOS GENERALES			Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Fallas		
RANGO: 3	CANTIDAD:		
ZONA 1	FRENTE DE TRABAJO: #14		
COMUNA 1			
BARRIO Aldea Pablo VI			

2. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO :	
TERMINACIÓN:	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA
	TARDE

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Se recomienda a los residentes tener en observación ya que se instalo (en) con mezcla que no contaba con la temperatura adecuada.

- Se le recomienda al contratista tapar y cubrir bien la mezcla si ya a usar en bajos largos de tiempo - fin de jornada
- Se genera 5cb 1 viaje de escombro

Nota: las tapas y anillo que instalo el contratista tienen aspecto deteriorado. y ya usados anteriormente, el contratista se compromete a reponer tapas nuevas pero callarin no. esta situación queda a criterio de residentes.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Uenno M.	Santiago Granados.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Johanno Rodriguez	NOMBRE: Juan J. Bermúdez R.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Ingenieros Contratista

Santiago Herrera M.

TIQUETE DE BASCULA: 234216

FECHA: 26/09/2025

HORA: 7:46:15 AM

CONDUCTOR: IVAN LOPEZ

PLACA: ZNM449

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.97 Tonnes

PESO TARA: 7.96 Tonnes

PESO NETO: 10.01 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 10.01 Tonnes

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Ingenieros Contratista

Santiago Herrera

TIQUETE DE BASCULA: 234217

FECHA: 26/09/2025

HORA: 7:51:40 AM

CONDUCTOR: JEFFERSON LOPER

PLACA: WEX535

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 17.70 Tonnes

PESO TARA: 7.67 Tonnes

PESO NETO: 10.03 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 20.04 Tonnes

PROCOPAL S.A.

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Ingenieros Contratista

Santiago Herrera M.

TIQUETE DE BASCULA: 234218

FECHA: 26/09/2025

HORA: 7:56:44 AM

CONDUCTOR: HAROLD LOPEZ

PLACA: TMP284

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 18.12 Tonnes

PESO TARA: 8.09 Tonnes

PESO NETO: 10.03 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 30.07 Tonnes

FECHA (D/M/A):

2.35

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5012149		1	CR26C CL97BB CL99A	4,84	2,10	0,16	10,16	1,63	3,82
"		2	" " "	3,50	2,10	0,16	7,35	1,18	2,76
"		3	" " "	29.00	5,50	0,06	159,50	9,57	22,49
		-	Reake MH	1	0	0	(1,77)	(0.25)	
5012153			CR28 CL80-26						
			Nota: El reake del MH se gasta 1 ton y se saca de los viajes del día						
							1238		
TOTALES							177,01	12,37	29,07

MEZCLA ASFALTICA

REMISION No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234216	ZNN449	10.01	—	140
234217	WEN535	10.03	—	140
234218	TMP264	10.03	—	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN	
23931	ZNN449	Sencilla	1	Proceal	
—	—	—	—	—	No genera escombro
—	—	—	—	—	No genera escombro

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS


Grafica Instalación de mezcla

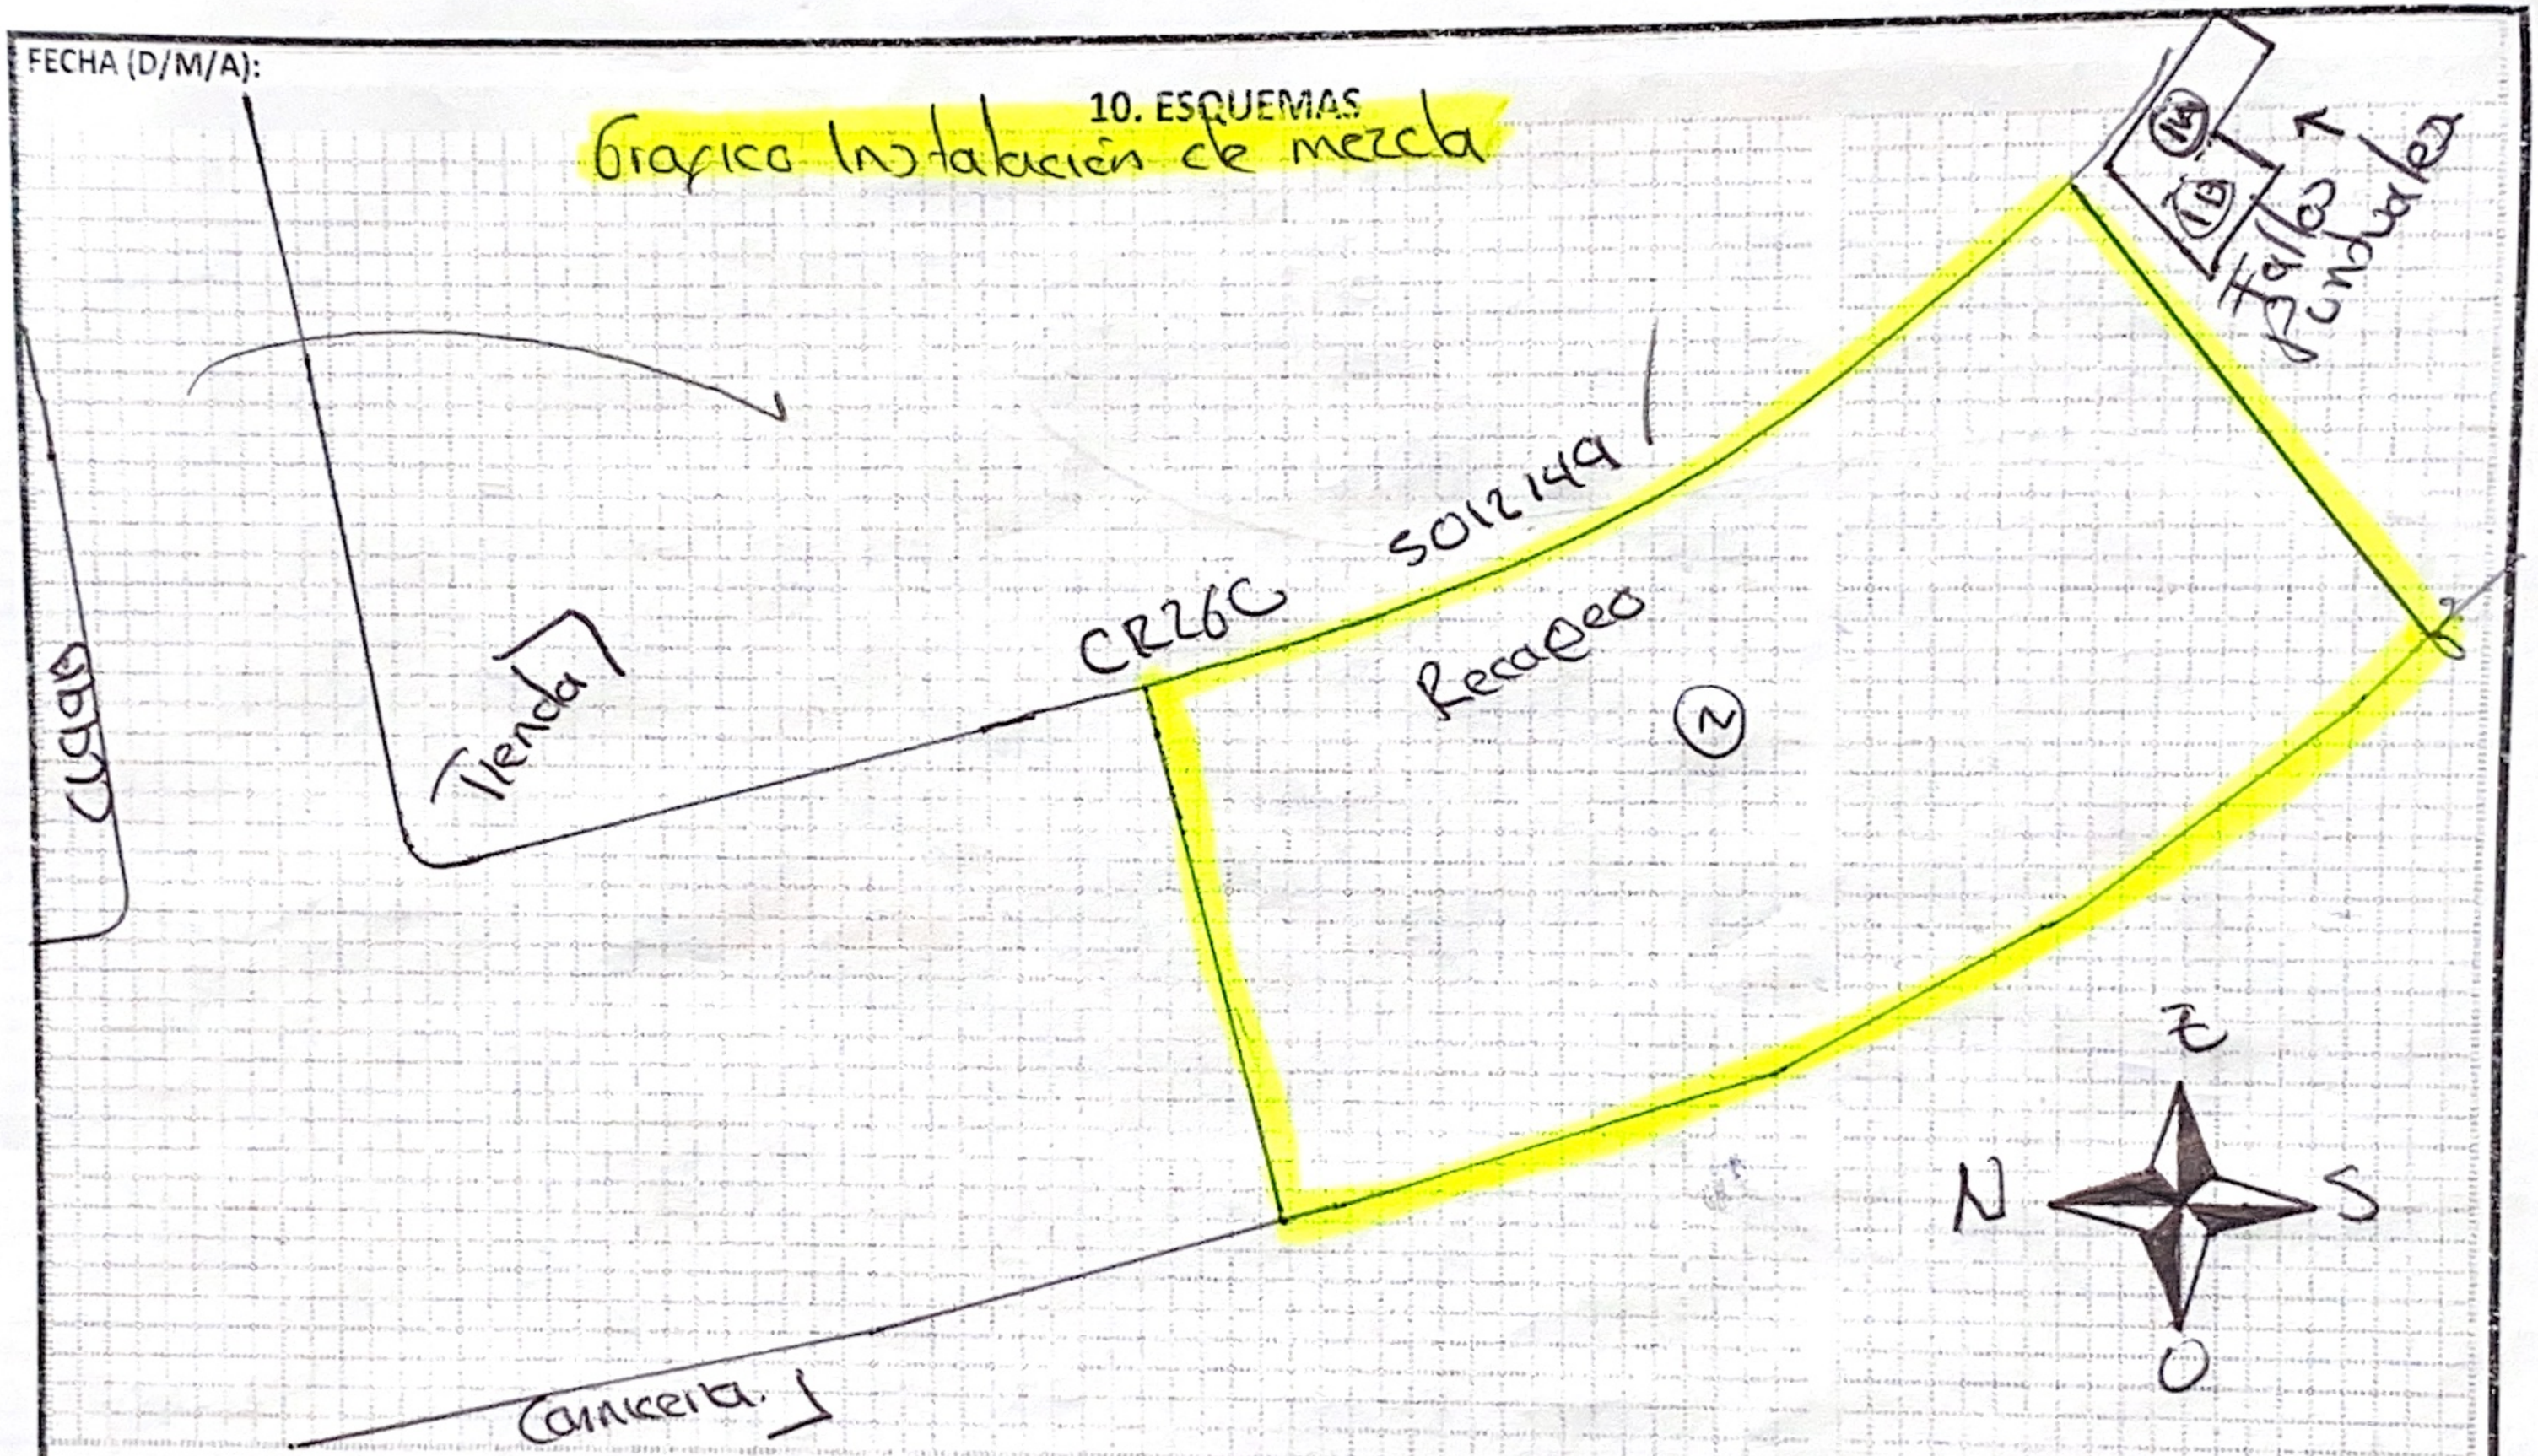

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Fallas	FRENTE	#14
RANGO:	3	CANTIDAD:	29,07 t / 12,37 m³
BARRIO	La Aldea Pablo VI	DIRECCIÓN	CR26C CL97BB CL99A

CHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

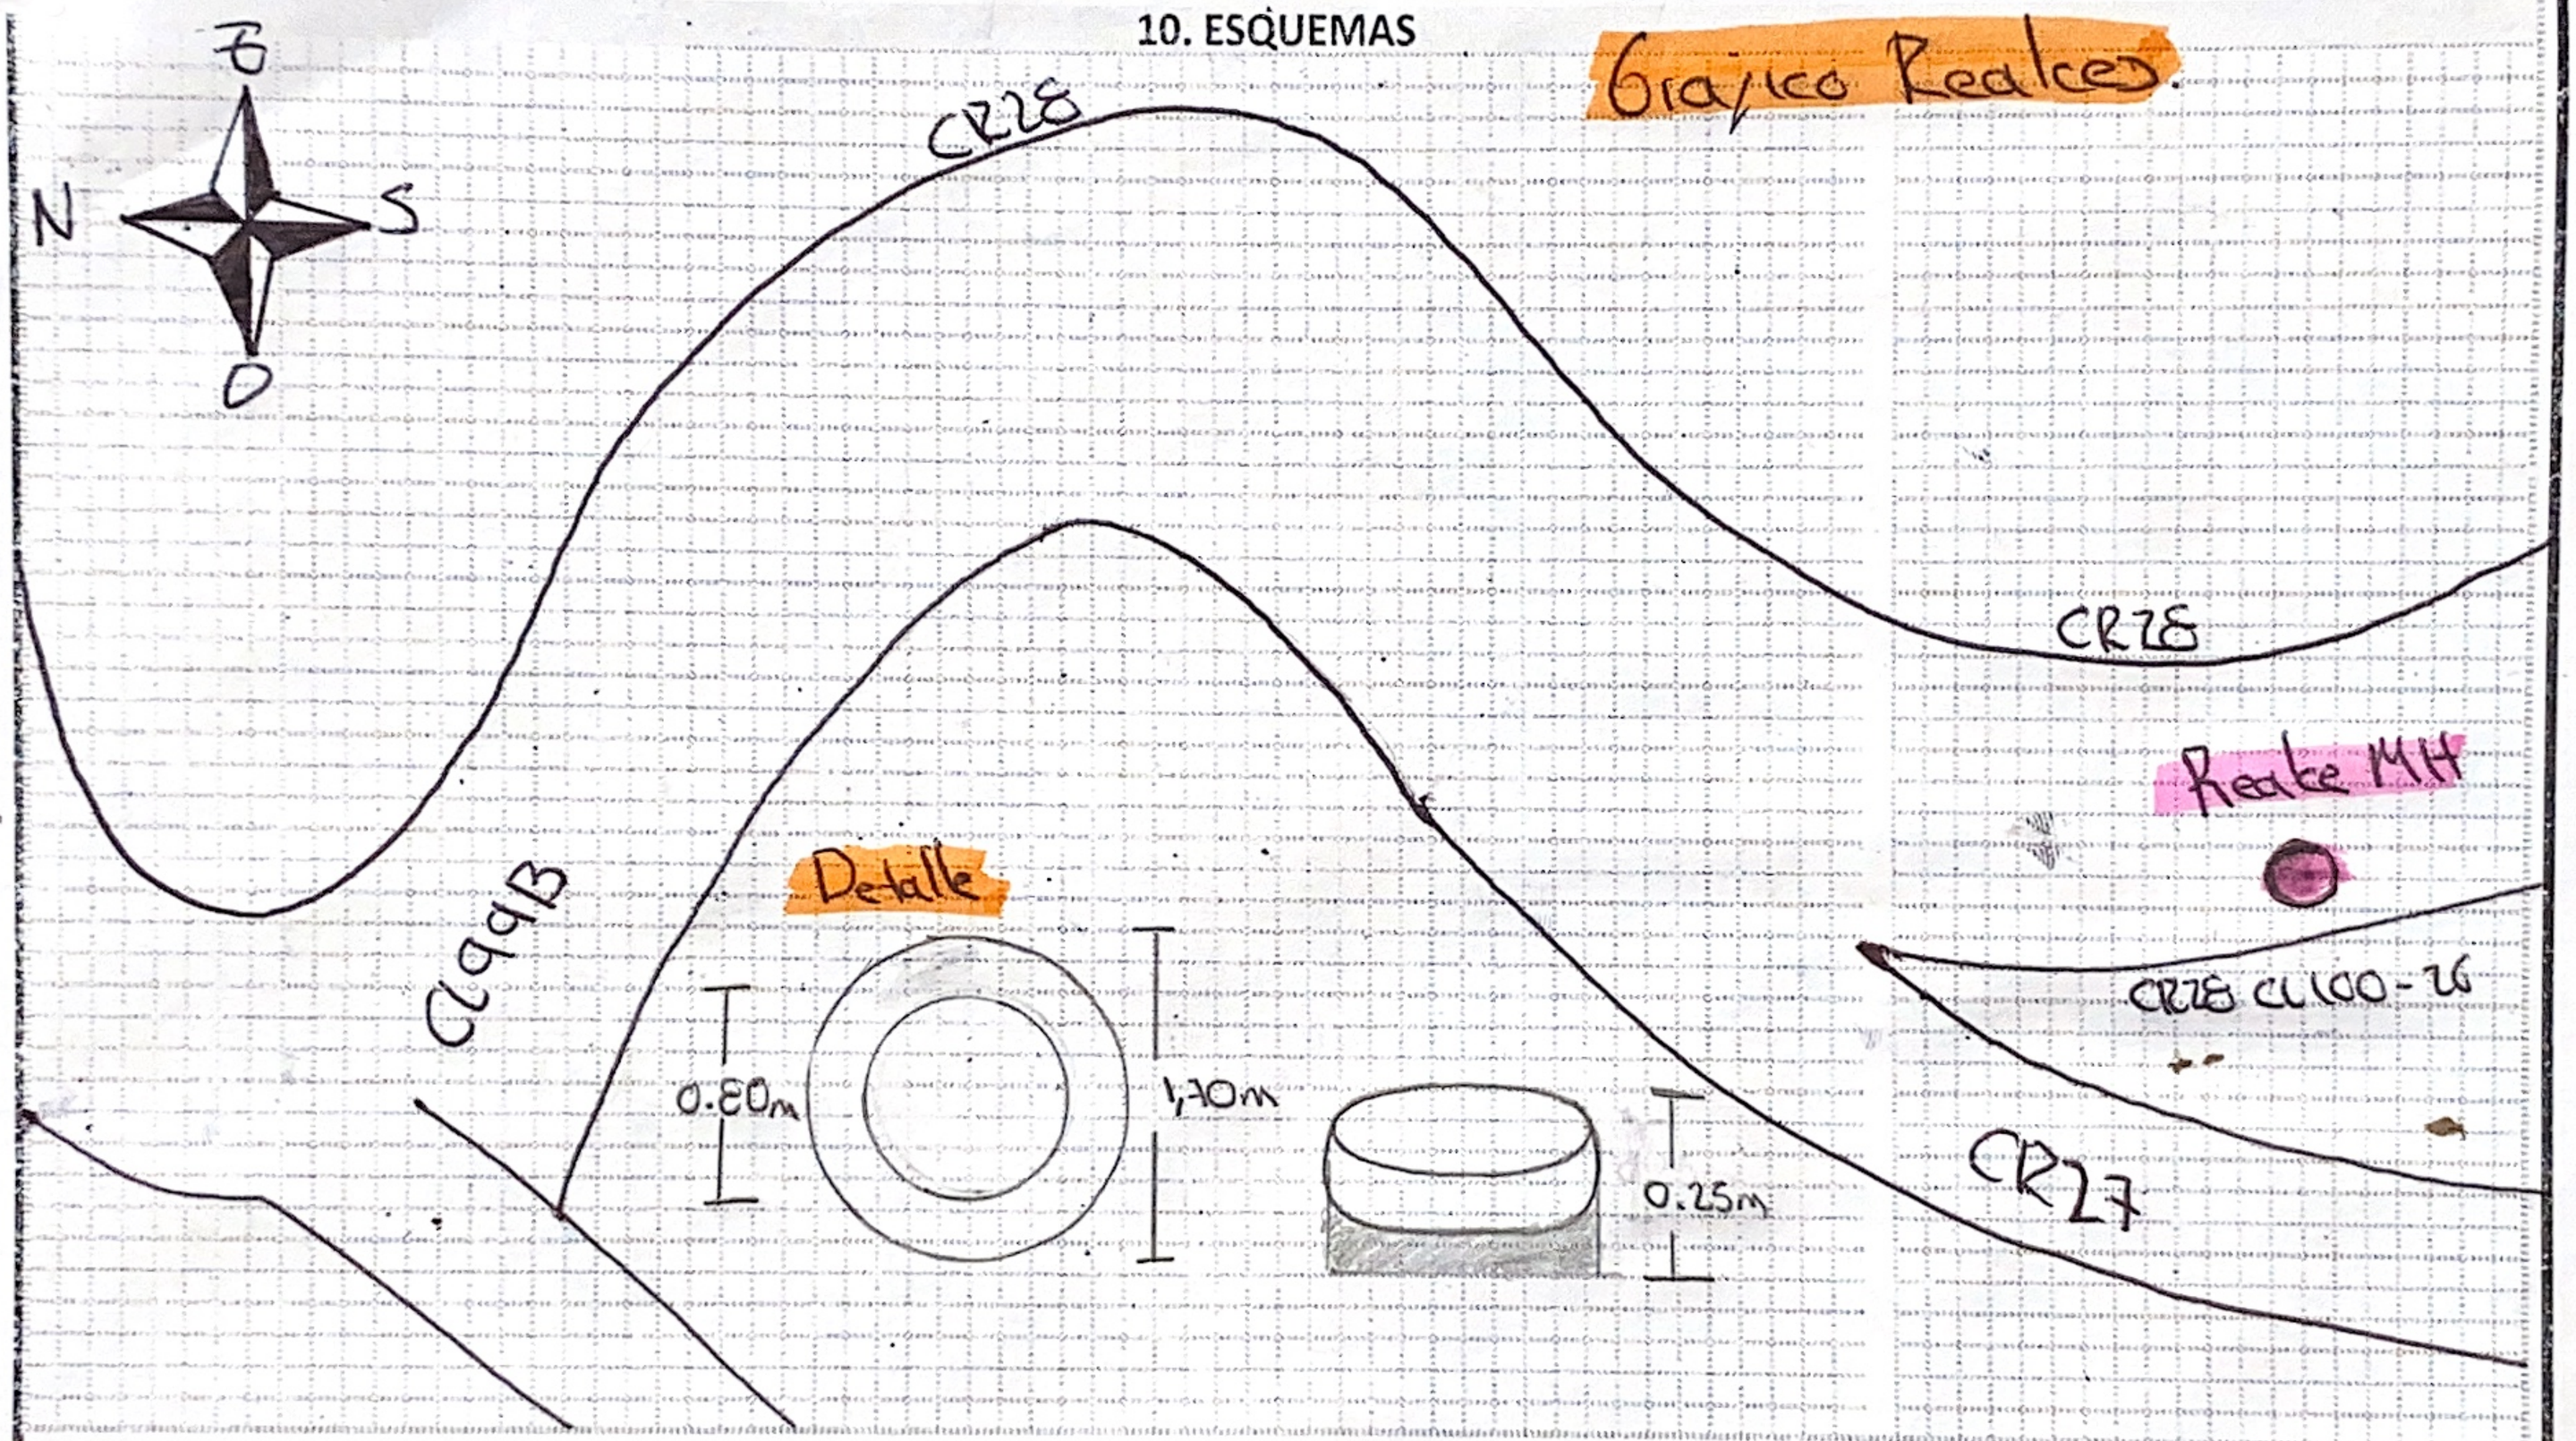

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Realce MH	FRENTE	#14
RANGO:	3	CANTIDAD:	1 ton / 0.425 m³
BARRIO	Aldea Bbb VI	DIRECCIÓN	CR28 CL100 - 26

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 23931

PROVEEDOR: Fredy 14 V Altmed

VALE POR UN VIAJE: Escombro

26/09/25

PLACA No: ZNM 449 CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: Parque

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A
Nit. 890.906.380-0

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Santiago Herrera M

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
