OK

FECHA (D/M/A): 30/09/2025 ✓	**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Fallas ✓		
RANGO:	3 ✓	CANTIDAD:	26,88t / 11,49m³

ZONA	1 ✓	FRENTE DE TRABAJO:	#14 ✓
COMUNA	1 ✓		
BARRIO	Aldea Pablo VI ✓		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO : (07:00AM) 7:00AM TERMINACIÓN: 07:00PM	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Lluvias y bajo rendimiento ✓

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA	Seco / Nublado ✓
	TARDE	Lluvias 5:00PM / 7:00PM ✓

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se realiza recorrido del area identificando inicio de la intervencion
- Se realiza cerramiento total de la via ya que es estrecha
- Se realiza instalacion PMT, se le recomienda al contratista mejorar el cerramiento e implementar un segundo controlador vial
- Se verifica implementacion de baño portatil, Punto ecologico kit antiderrames, cartelera informativa, valla tuyera, bucon, etc.
- Se realiza demolicion, nivelacion, limpieza, impermacion, instalacion y compactacion de merda asfaltica MSC 19 semi tibia con RAP
- Se genera 1 viaje de excombro en la jornada
- Se realizan 2 realces de MH uno en la CL99B CR26C-36 y el otro en la CL99B CR26C-78 con espesores de 0,40m.
- La mezcla utilizada para los realces es la mencionada en remisiones.
- Hora de llegada del camion 9:30AM
- Contratista realiza construccion de cordon con peticion PQR transmitido de la comunidad a la alcaldia en la CR28 # 99B 67 int 201 por la señora Luz Marina Naranjo Arenas, con especificaciones de la comunidad

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Santiago Jerez M.	Santiago Granados.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Julio Alejandro Castro R.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A):

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			Si	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Santiago Henao	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Sergio Enrique Pereira	X		
4	Rastrillero	Julian Galeano	X		
5	Rastrillero	Jhony Londoño	X		
6	Ayudante	Deiler Sanchez	X		
7	Ayudante	Esneider cerquera	X		
8	Ayudante	Victor Cordoba	X		
9	Ayudante	Jose de los Santos	X		
10	Ayudante	Jose Lozano	X		
11	Ayudante	Orlando Mendoza	X		
12	Ayudante	Sebastyan Velazquez	X		
13	Ayudante	Henry Perea			
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Martin Alonso Valdez	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora	Orlando Osaina	X		
21	Operador Vibrocompactador	Alvaro Salas	X		
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Danilson Benitez	X		
29	Conductor Volqueta(s)				
•	Cadrilador vial	Jerardo Chicano	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual				
2	Compresor	KAESER M50	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora	New Holland B95B	X		
6	Vibrocompactador	Dolus DD24	X		
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Sin maquina	X		
10	Placa vibratoria	6X200	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	Fotos SW420	X		
16	Volqueta(s)				

FECHA (D/M/A): 30-09-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)	
5012149		1	CR26C CL97BBCL99A	29,20	5,93	0,06	173,16	10,39	24,41	Recapeo
5012149		2	" " "	2,0	5,25	0,10	10,50	1,05	2,47	Resalto
5012152	Realce de MH		CL99B CR26C-36	1						Realce MH
5012152	Realce de MH		CL99B CR26C-28	1						Realce MH

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234284

FECHA: 30/09/2025

HORA: 7:50:11 AM

CONDUCTOR: JEFFERSON LOPEZ

PLACA: WEX535

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 17.83 Tonnes

PESO TARA: 7.72 Tonnes

PESO NETO: 10.11 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 10.11 Tonnes

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Santiago Naranjo M.

TIQUETE DE BASCULA: 234285

FECHA: 30/09/2025

HORA: 7:54:50 AM

CONDUCTOR: IVAN LOPEZ

PLACA: ZNM449

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 17.99 Tonnes

PESO TARA: 7.98 Tonnes

PESO NETO: 10.01 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 142°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 20.12 Tonnes

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

Santiago Naranjo M.

TIQUETE DE BASCULA: 234286

FECHA: 30/09/2025

HORA: 7:59:30 AM

CONDUCTOR: HAROLD LOPEZ

PLACA: THP384

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 18.07 Tonnes

PESO TARA: 7.99 Tonnes

PESO NETO: 10.08 Tonnes

PRODUCTO:113

MEZC .SEMI TIBIA RAP MSC19

TEMPERATURA: 141°C


VIAJE NUMERO: 3

TOTAL DESPACHADA: 30.20 Tonnes


FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

Esquema 1 Mezcla

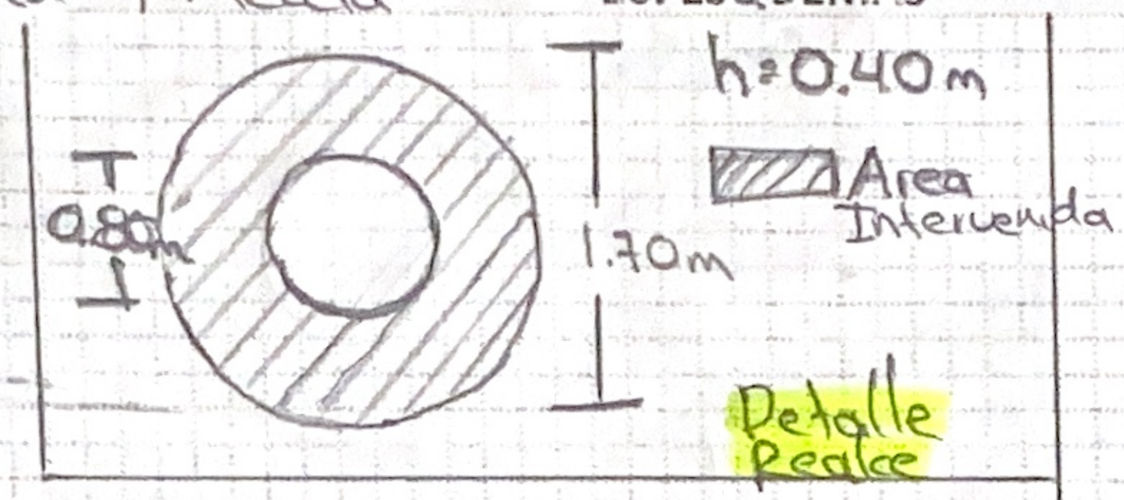

Esquema 2 Realce

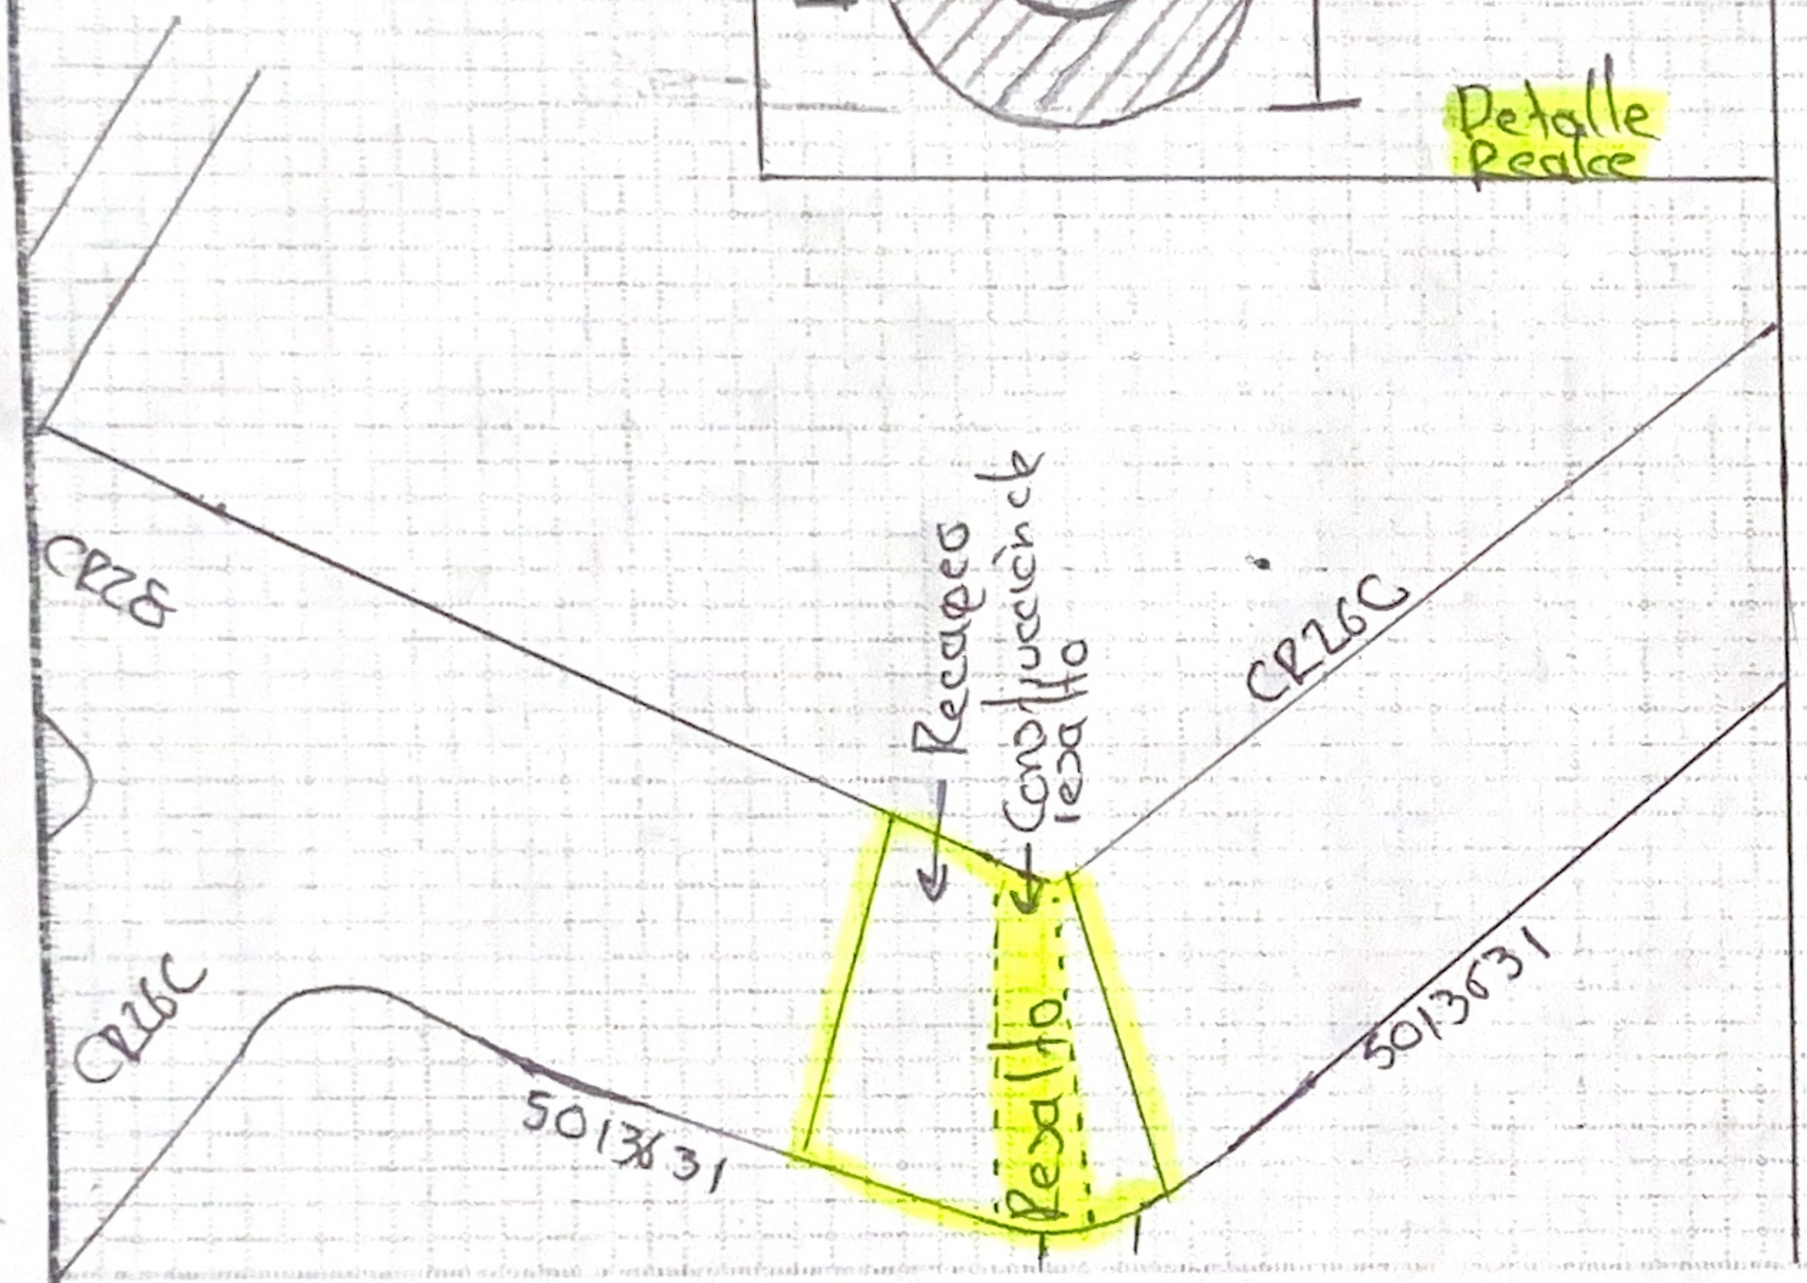

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Fallos.	FRENTE	#14
RANGO:	3	CANTIDAD:	(10) 26,88t / 11,49 m³
BARRIO	Aldea Pablo VI	DIRECCIÓN	CR26C CL97BB CL99A

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS

Nº 23934

PROVEEDOR: PROCOPAL S.A.

30/09/25

VALE POR UN VIAJE: Egoimbra

PLACA No: ZNM 494 01 OCT 2025

CAPACIDAD: 7 M3

DESTINO: DESPACHOS - BASCULA

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Sergio Alvarado

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
