FECHA (D/M/A): 10 09-2025	**BITACORA DE OBRA**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango #4		
RANGO:	04.	CANTIDAD:	90,33 toneladas
ZONA	02	FRENTE DE TRABAJO:	15.
COMUNA	07; Robledo		
BARRIO	0713; Aures Nº1.		

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	**JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:**
INICIO : 7:00 a.m.	(2horas). Actividad de limpieza tanto Volqueta Hpilen viaje.
TERMINACIÓN: 3:00 p.m	
3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA Sol, despejado.
	TARDE Sol, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se solicita al Contratista aplicar de manera correcta las Condiciones que imparte el PMT para intervenciones viales segun el Uso de la Continuo informar al especialista.
- Se solicita al Contratista usar de manera correcta los EPP durante la Jornada laboral y segun el tipo de riesgo.
- Se solicita al Contratista proteger y/o limpiar los Sumideros aledaño a la Obra del material generado por el proceso Constructivo.
- Se deja en evidencia que se ejecuta reparacion de acometida por parte de Empresa encargada en la CR94A CL98B-21.
- localizacion; demarcacion; demolicion; limpieza; imprimacion; aplicacion mezcla asfaltica; acarreo; Compactacion; orden y aseo.
Patologias: fatiga; envejecimiento; agrietamientos; fracturas en bloque; hundimientos; perdida de ligantes; asentamiento Brechas; perdida Corpeta Base granular:
- Se solicita al Contratista Continuar con las especificaciones tecnicas dadas por la S.I.F e Interventoria.

5. VISITANTES

Juan Jose Bermudez > Interventoria Jose Luis Guzman.	

6. FIRMAS

NOMBRE: Elkin Mora	Paulo Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	*Vo. Bo.TECNOLOGO INTERVENTOR*
FIRMA Andy Amaya N	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: Ma Catalina Ocha A
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	*Vo. Bo.INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR*

FECHA (D/M/A): 10.09.2025.

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Elkin Mora.	X		EyP Pavimentar.
2	Encargado	Gilberto Colorado	X		
3	Liguero	Sandro Uribe.	X		
4	Rastrillero	Luis Parra	X		
5	Rastrillero	Diego Lopez.	X		
6	Ayudante	Fabian Mendoza	X		
7	Ayudante	Luis Alonso Suliarez.	X		
8	Ayudante	Victor Manuel Gallo	X		
9	Ayudante	Isacc Ortea.	X		
10	Ayudante	Alonso Paniagua.	X		
11	Ayudante	Carlos Mario Rivera.	X		
12	Ayudante	Flaminio Torusero	X		
13	Ayudante	Alejandro Morales.	X		
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor	Yeison Gudavid.	X		
18	Operador fresadora	Alexander Charry.	X		
19	Operador finisher	Elias Valderrama.	X		
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador	Rolando Mesa.		X	
22	Operador Compactador llantas	Gilberto Bulgarin.	X		
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación	Alexander Zapata.	X		
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque	Henry Erwbar	X		
28	Conductor Camión	Mauricio Ortega.	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor	Kaeser SOM-19C	X		Parimentar Presenta fallas de encendido.
3	Fresadora	Wirtgen W-1000	X		
4	Finisher	Vogele Super 1303-3.	X		
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador	Dynapac CC3800 Mixto	X		
7	Compactador llantas	Ingersollrand PT 140 A.	X		
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Hino 500 FC WLX 298	X		
10	Placa vibratoria.	Honda GX 200.	X		
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque	Hino 500 FC GY4054	X		
15	Camión	Wolkwagen VKE 971.	X		
16	Volqueta(s)	C) Kenwerth.	X		
		C) International	X		

FECHA (D/M/A): 10·09·2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5014822	N.A	1	CL94A CL79 Y CL79A	70,0	3,10	0,105	217,00	22,79	54,91
5014821	N.A	2	CL94A CL79A4 CL79A#26 Costado Occidental	45,15	3,10	0,105	139,97	14,70	35,42
TOTALES							356,97	37,48	90,33

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
523772	SIZ403	18,05	18,05	147°
523774	EQW855	18,06	36,11	148°
523783	IRK254	18,10	54,21	147°
523784	IRF301	18,04	72,25	145°
523788	IRK250	18,08	90,33	147°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
22971	IRK254	Doble.	1	la 30
22972	IRK250	Doble.	1	la 30
22973	SNZ331	Doble.	1	la 30
22974	SNZ330	Doble.	1	la 30
22975.	SIZ 403.	Doble.	1	Pavimentar
			10M3	

FECHA (D/M/A): 10-09-2025

10. ESQUEMAS

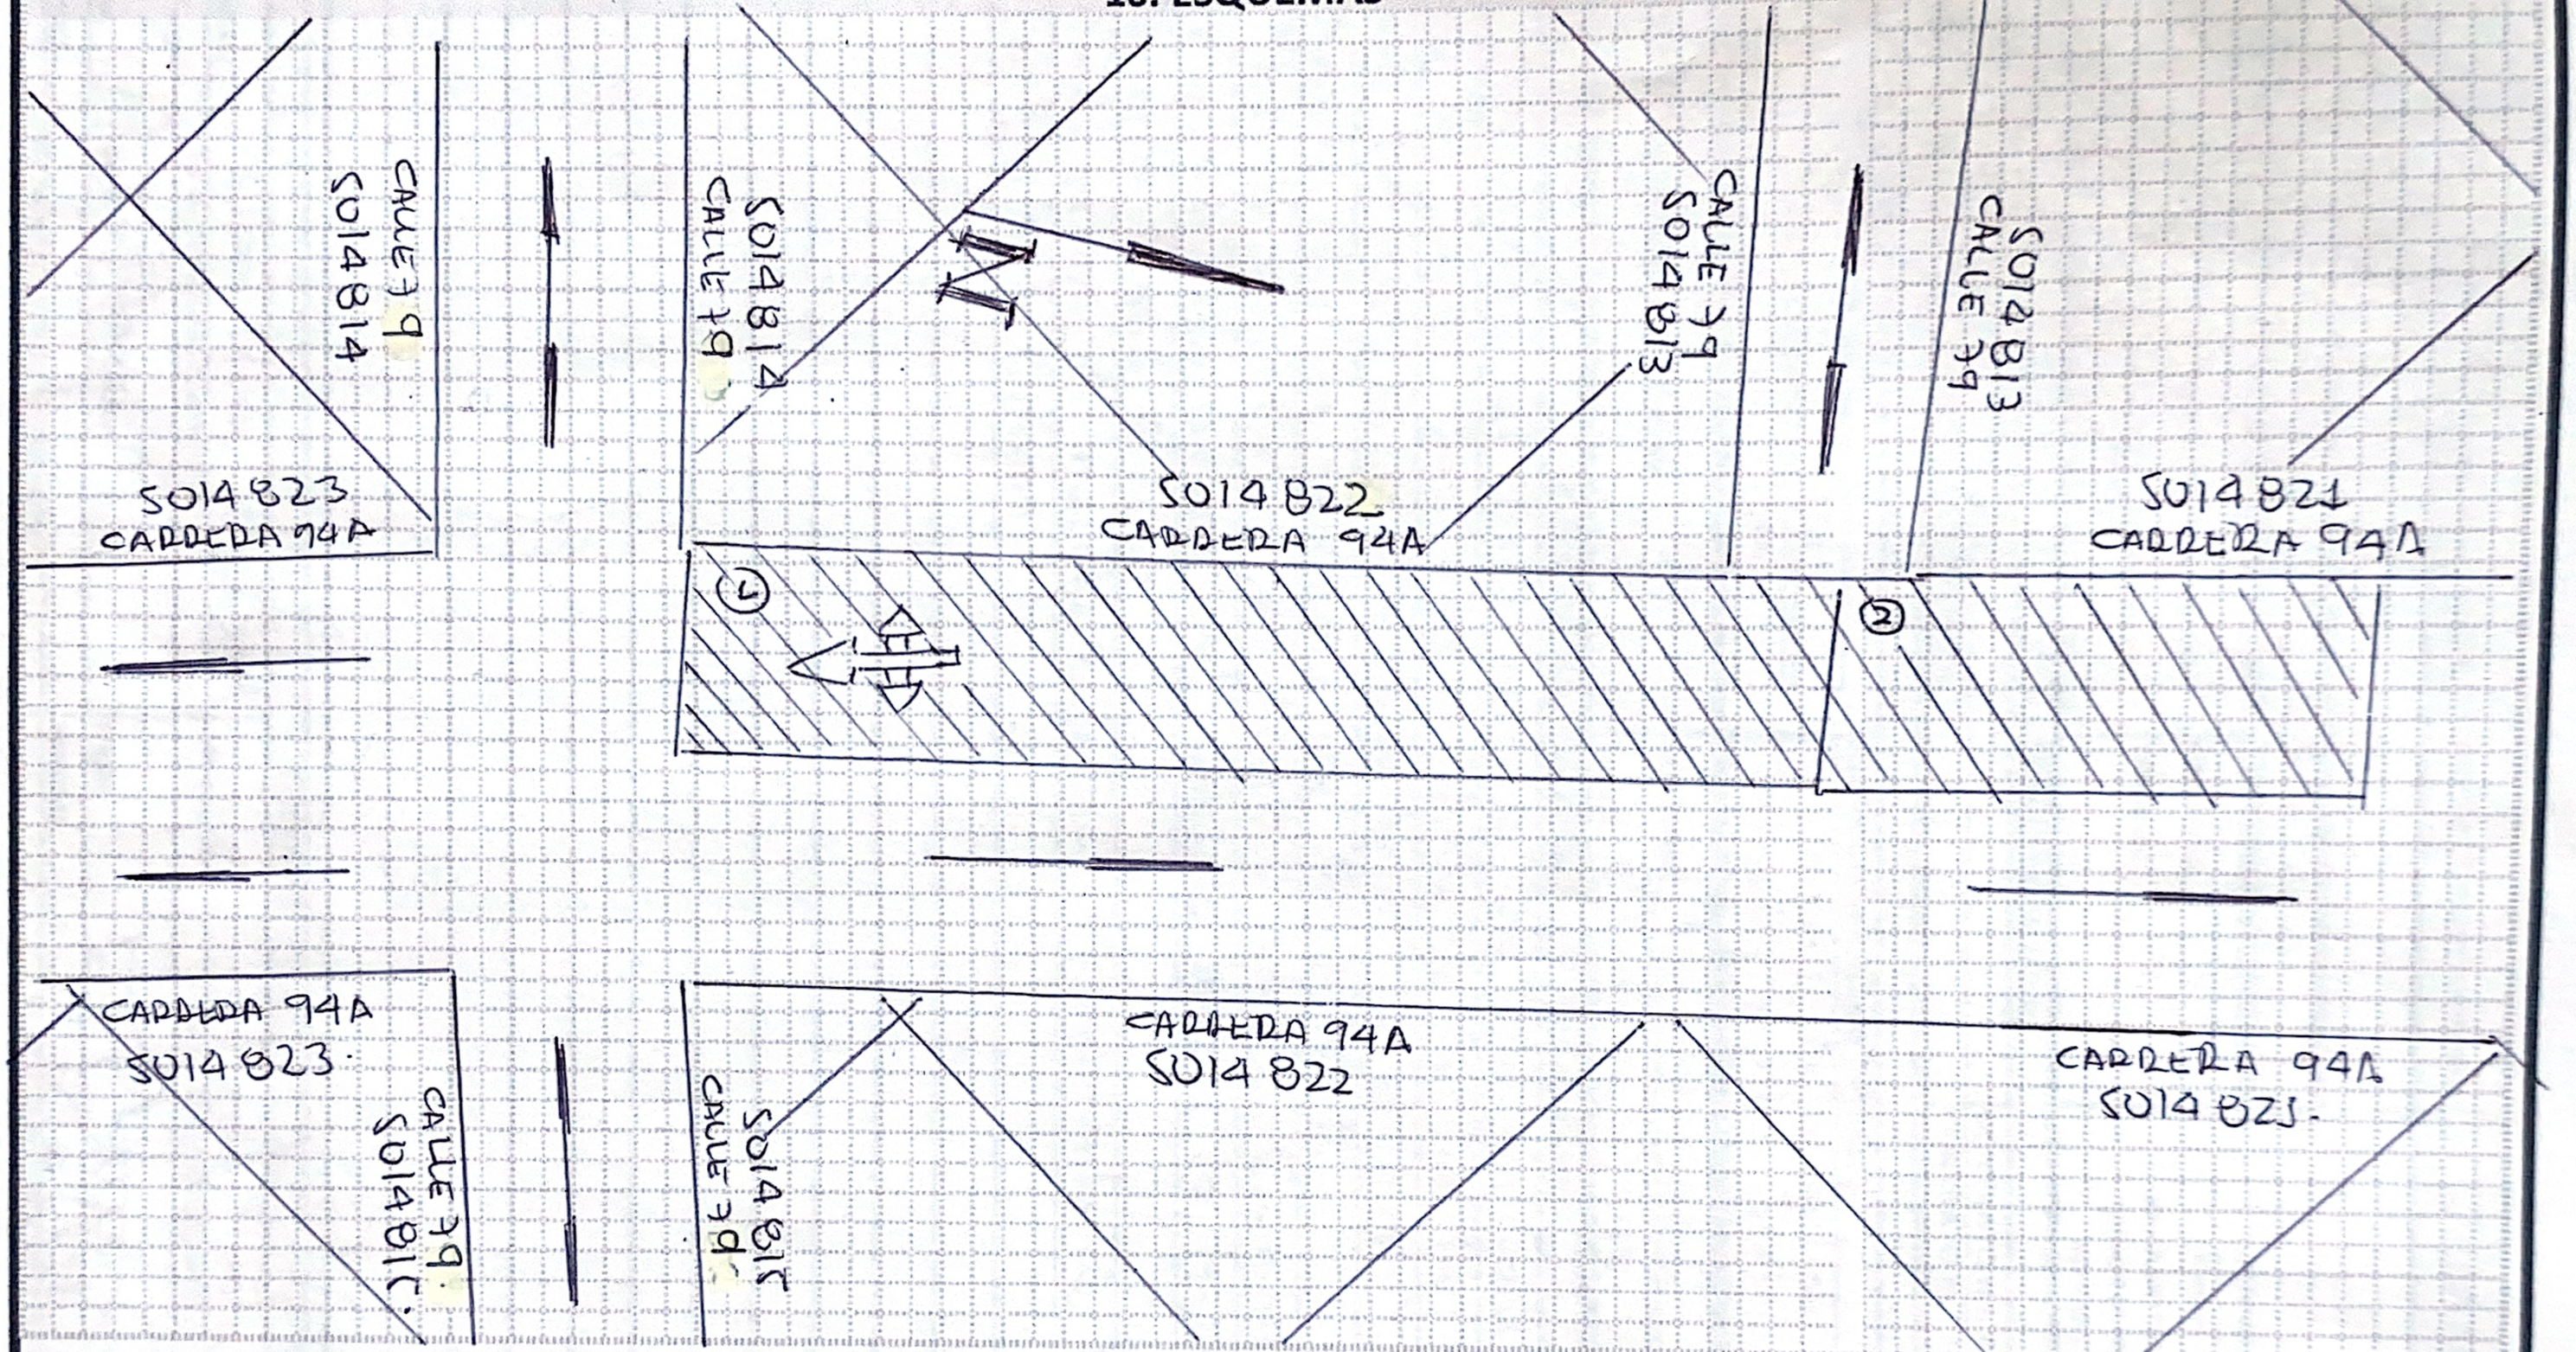

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Rango #4	FRENTE	15
RANGO:	04.	CANTIDAD:	90,33. toneladas MSC-19 RAP MDIA
BARRIO	0713; Aures N°1.	DIRECCIÓN	CR 94A Ct 78B Y Ct 79A Circuito Occidental.

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

FECHA (D/M/A): 10.09.2025

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Rango #4
RANGO: 04	CANTIDAD: 90,33 toneladas

ZONA	02
COMUNA	07; Roberto
BARRIO	0713; Aures N°1.
FRENTE DE TRABAJO:	15.

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377

CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO : 7:00 am.
TERMINACIÓN: 7:00 p.m.

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
(2 horas); Actividad de limpieza tanto Volquetas tapiten Viaje.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Sin, despejado.
TARDE: Sin, despejado.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Mantenimiento al Buñq movil de Cuadrilla por parte de empresa gestion del servicio. Se Evidenaa Hueco de Concreto Roja que compone punto Ewtugiw. Se repone en su totalidad el punto Ewtugiw.
- Mezcla asfaltica, proveniente de PAVIMENTAR.
- Fresado depositado en RAPID LAZO; Escombros en PAVIMENTAR.
- Recuperar finalizacion vial como lo muestra la figura (1) FLECHA FRENTE DOBLE GIRO.
- Temperatura de mezcla asfaltica al momento de la aplicacion. (143,8 °C). Optima.

5. FIRMAS

NOMBRE: Elkin Moru	Paula Montoya Velez.
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA: Andy Anaya M	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE: Ta Catalina Ochoa
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

----------20250910 12:11
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523784
PLACA: TRF301
CONDUCTOR: Francisco Javier Carvajal Gallego

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 18,04 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaciín Base #33

PESO TARA: 11.560,00
PESO BRUTO:29.600,00

ENTRADA: 10 sep 2025 -m12:53 p.
SALIDA: 10 sep 2025 - m12:53 p.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

----------20250910 11:53
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523783
PLACA: TRK254
CONDUCTOR: Roberto Antonio Rave Bueno

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 18,10 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaciín Base #33

PESO TARA: 11.640,00
PESO BRUTO:29.740,00

ENTRADA: 10 sep 2025 -m12:08 p.
SALIDA: 10 sep 2025 - m12:08 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

----------20250910 11:02
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523774
PLACA: EQW855
CONDUCTOR: Jonnathan Rodriguez Bello

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 18,06 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaciín Base #33

PESO TARA: 12.990,00
PESO BRUTO:31.050,00

ENTRADA: 10 sep 2025 -m11:07 a.
SALIDA: 10 sep 2025 - m11:07 a.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

----------2025
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523772
PLACA: STZ403
CONDUCTOR: JEFERSON ANTONIO VALENCIA MA
...

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 18,05 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotizaciín Base #33

PESO TARA: 12.060,00
PESO BRUTO:30.110,00

ENTRADA: 10 sep 2025 -m10:57 a.
SALIDA: 10 sep 2025 - m10:57 a.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

----------20250910 12:54
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 523788
PLACA: TRK250
CONDUCTOR: JAIRO ORLANDO ARBOLEDA YEPES

PRODUCTO:14524-3 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 - RAP
CANT. NETA: 18,08 Ton

CLIENTE:C-OBP@3002070217-0 25-26 (M.V
ial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.900,00
PESO BRUTO:29.980,00

ENTRADA: 10 sep 2025 -m01:11 p.
SALIDA: 10 sep 2025 - m01:11 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Cuadrilla Gilberto Colorado
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Cuadrilla Gilberto Colorado

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA		
22973	DD 10	MM 09	AA 2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	LA 30	SNZ 331
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		**Nº REMISIÓN**
BASE		ARENILLA		MARGEN IZQUIERDA
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		**CANTIDAD X REMISIÓN**
ARENA		ASFALTO		ROBLEDO AURES
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		Carlos Calonto

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA		
22971	DD 10	MM 09	AA

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	LA 30	TRK 254
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		**Nº REMISIÓN**
BASE		ARENILLA		MARGEN IZQUIERDA
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		**CANTIDAD X REMISIÓN**
ARENA		ASFALTO		ROBLEDO AURES
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		Roberto Rave

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA		
22974	DD 10	MM 09	AA 2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	LA 30	SNZ 330
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14 MTS

SUBBASE		ESCOMBROS		**Nº REMISIÓN**
BASE		ARENILLA		MARGEN Izquierda
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		**CANTIDAD X REMISIÓN**
ARENA		ASFALTO		ROBLEDO AURE
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		

pavimentar ingeniería al futuro

REGISTRO TRANSPORTE

Nº	FECHA		
22972	DD 10	MM 09	AA 2025

CC ORIGEN	CC DESTINO	PLACA
M V M	LA 30	TRK 250
KILOMETRAJE INICIAL	**KILOMETRAJE FINAL**	**CANTIDAD**
		14

SUBBASE		ESCOMBROS		**Nº REMISIÓN**
BASE		ARENILLA		MARGEN IZQUIERDA
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		**CANTIDAD X REMISIÓN**
ARENA		ASFALTO		ROBLEDO AURES
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
DIEGO LOPEZ		

pavimentar	REGISTRO TRANSPORTE	Nº	FECHA		
		22975	DD 10	MM 09	AA 2025

CC ORIGEN		CC DESTINO		PLACA
M V M		PLANTA PAVIMENTAR		STZ 403
KILOMETRAJE INICIAL		KILOMETRAJE FINAL		CANTIDAD
				10 MTS
SUBBASE		ESCOMBROS	X	Nº REMISIÓN
BASE		ARENILLA		MARGEN izquierda
CRUDO		MEZCLA		
TRITURADO		ACPM		CANTIDAD X REMISIÓN
ARENA		ASFALTO		Robledo Acres
OTRO: FRESADO		MAQUINAS		

DESPACHA	RECIBE	CONDUCTOR
Diego Lopez		
