FECHA (D/M/A): 26-09-2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Pavimentación
RANGO:	Masivo
CANTIDAD:	270.44 TN - 112.22 m³
ZONA	5
COMUNA	14 El Poblado
BARRIO	1418 El Poblado
FRENTE DE TRABAJO:	16

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO:	8:00 pm
TERMINACIÓN:	5:30 am
JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:	Jornada nocturna

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	SOCO
NOCHE TARDE	SOCO

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Instalación señalización vertical PMT
- Demarcación de las áreas a intervenir
- Limpieza de las áreas a intervenir
- Irrigación con emulsión asfáltica
- Se realiza corte de junta transversal
- Aplicación mezclas asfáltica MSC-19 con fibra
- Se realiza vibrocompactación de mezcla asfáltica MSC-19 con fibra
- Se realiza sellado con compactador de llantas
- Topografía toma secciones de las superficies intervenidas
- Aseo y limpieza de las áreas intervenidas
- Retiro de la señalización instalada.
- Se realiza limpieza de sumideros 6 unidades, también se solicita al contratista el realce de los mismos
- Se solicita al contratista el realce de 1 MH CL 10A CR 42
- Se solicita al contratista el realce de 1 válvula CL 10A CR 42.
- Nota: En la CL 10A CR 42 carril izquierdo sentido oriente-occidente se evidencia socavación y hay una intervención al parecer de EPM, nos dan radicado 5843010

5. VISITANTES

Cristian D. Cano A

6. FIRMAS

NOMBRE:	Tamos S Taborda.
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA / Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	Andy Anaya M.
NOMBRE:	Ma Catalina Ochoa A
	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA / Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-09-2015

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000880		1	CL10A CR40 Y CR41	34.00	4.00	0.075	136.00	10.20	24.58
2000880		2	CL10A CR40 Y CR41	23.00	8.13	0.075	186.99	14.02	33.80
2000881		3	CL10A CR41 Y CR41A	49.60	10.70	0.075	530.72	39.80	95.93
2000882		4	CL10A CR41A Y CR42	26.00	10.70	0.075	278.20	20.87	50.28
2000882		5	CL10A CR41A Y CR42	25.30	6.00	0.075	151.80	11.39	27.44
2000882		6	CL10A CR41A Y CR42	25.50	7.70	0.075	196.35	14.73	35.49
2000881		7	CL10A CR41 Y CR41A	14.70	1.10	0.075	16.17	1.21	2.92
	Topografía		CL10A CR40 Y CR42	1					
TOTALES									270.44

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
525240	TRE714	24.53	24.53	146
525241	TRK324	24.57	49.10	147
525242	TRF301	24.56	73.66	149
525243	TRF432	24.59	98.25	148
525244	SWQ566	24.54	122.79	147
525245	TRK251	24.68	147.47	146
525246	TRF427	24.70	172.17	147

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): 26-04-2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
525247	STY652	24.80	196.97	145
525248	TRF398	24.55	221.52	148
525250	TDZ385	24.54	246.06	147
525251	EQW850	24.38	270.44	145


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

Powered by CamScanner


FECHA (D/M/A): 26-09-2025

10. ESQUEMAS

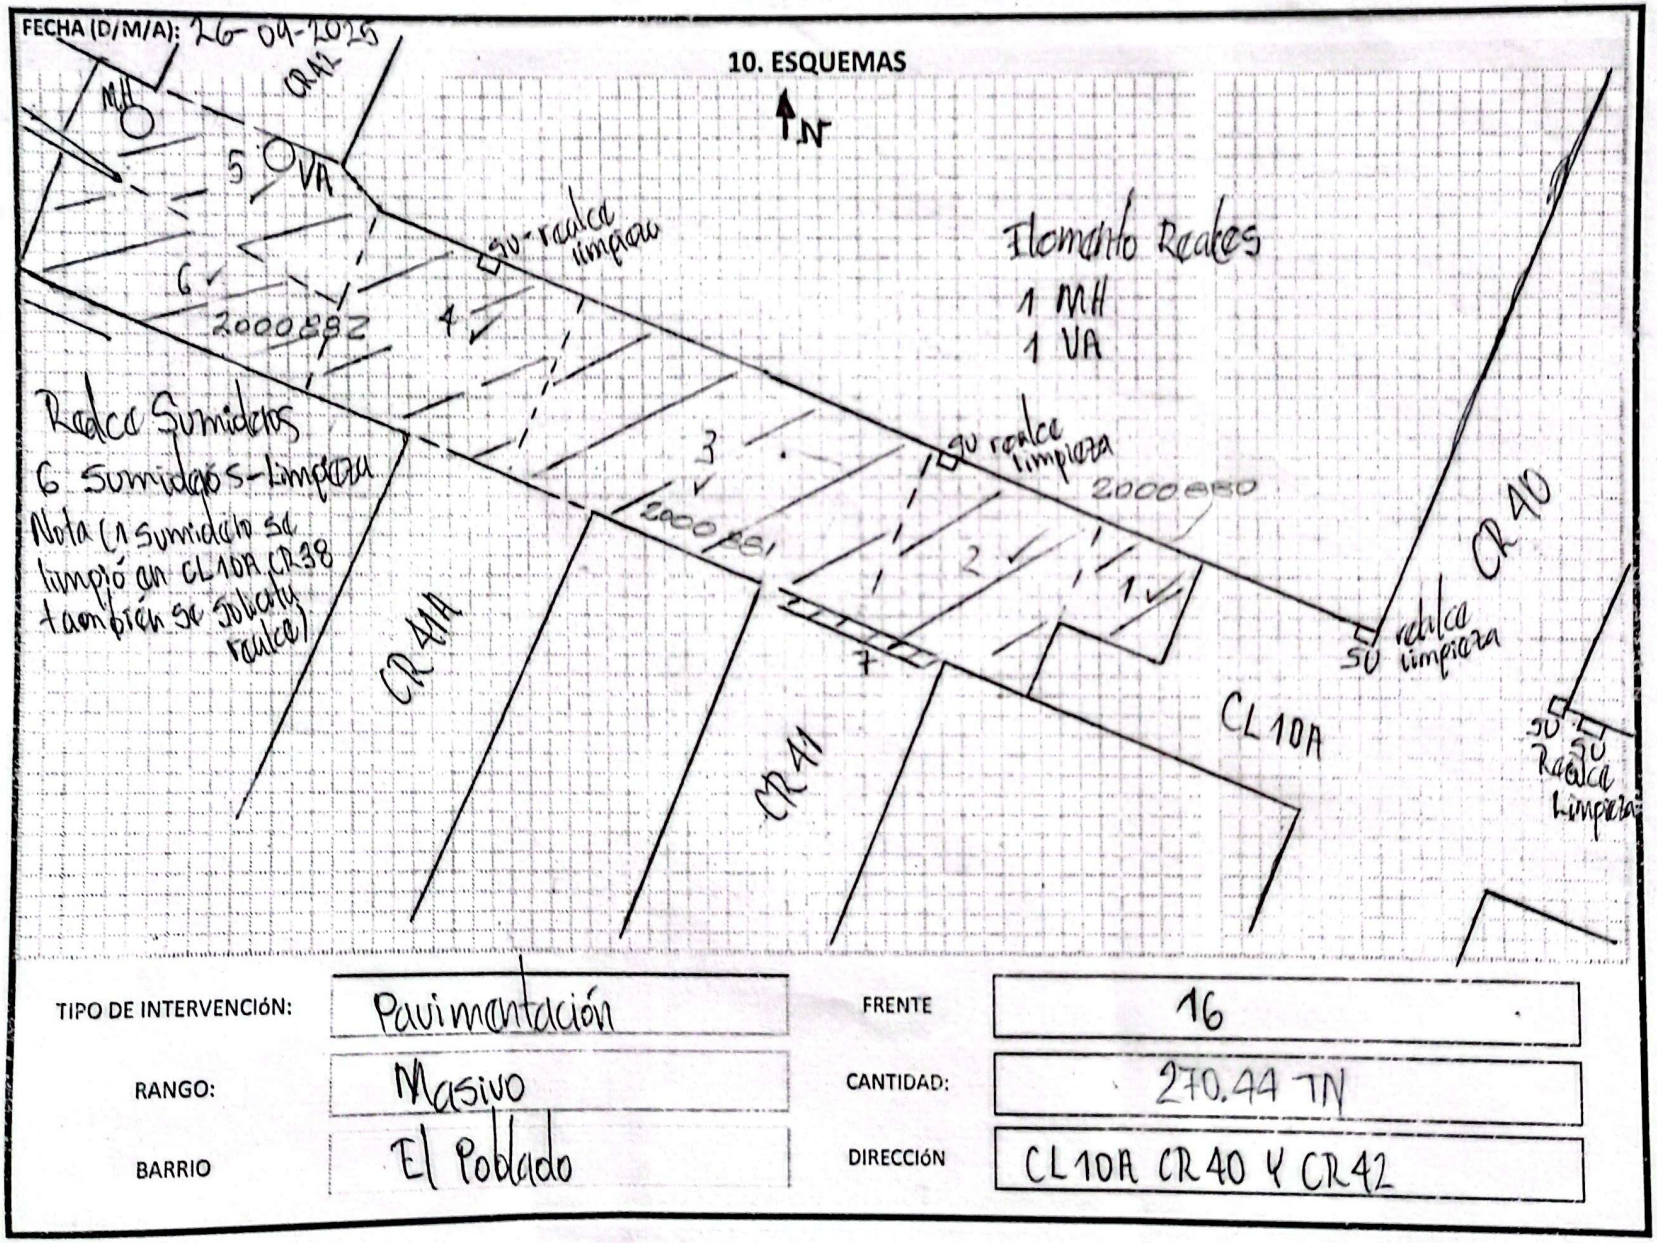

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Pavimentación	FRENTE	16
RANGO:	Masivo	CANTIDAD:	270.44 TN
BARRIO	El Poblado	DIRECCIÓN	CL10A CR40 Y CR42

Powered by CamScanner

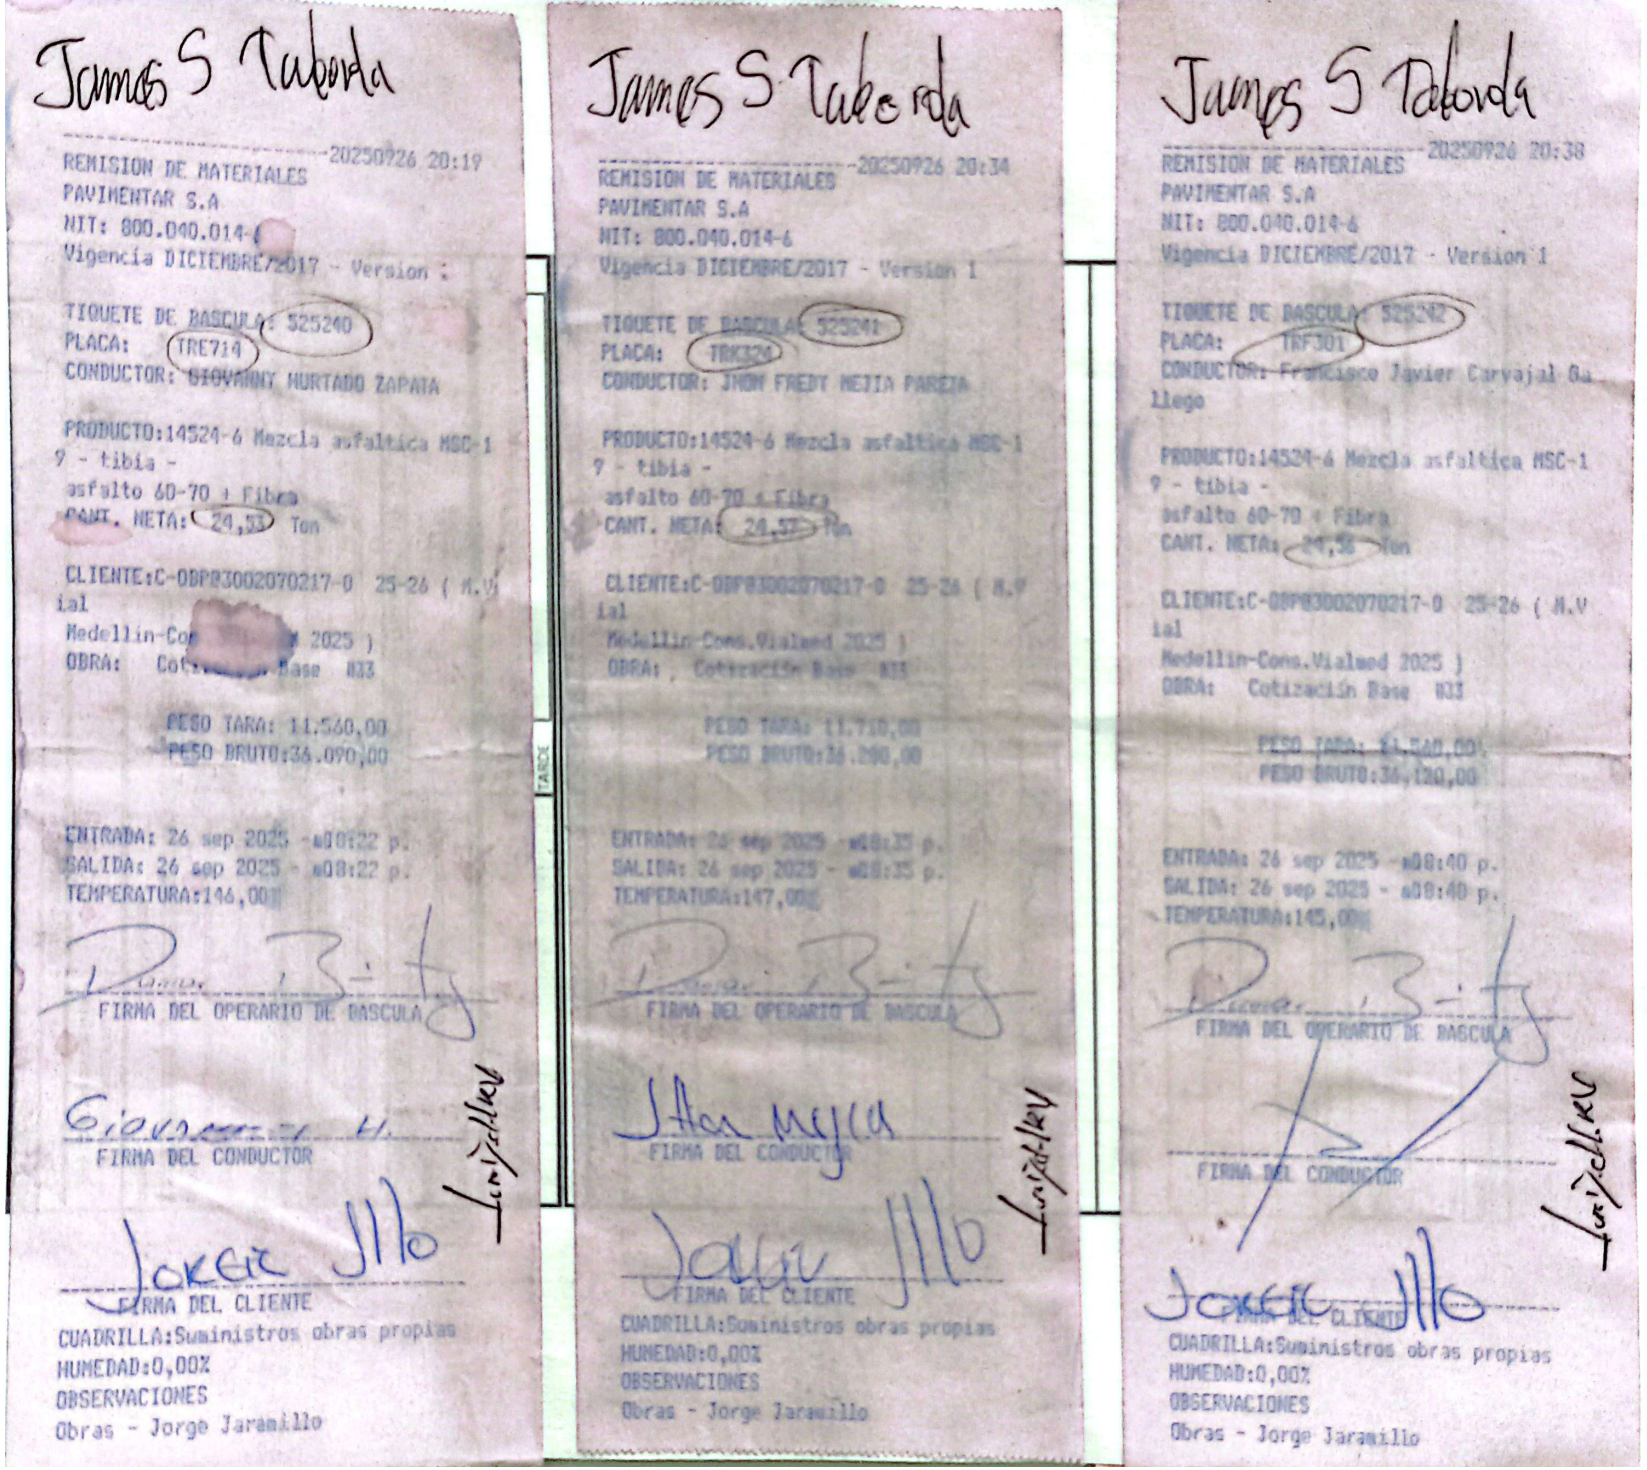

James S Taborda

20250926 20:19
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525240
PLACA: TRE714
CONDUCTOR: GIOVANNY HURTADO ZAPATA

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,53 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702l7-0 25-26 (M.V ial
Medellin-Co[illegible] 2025)
OBRA: Cot[illegible] Base H33

PESO TARA: 11.560,00
PESO BRUTO:36.090,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 08:22 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 08:22 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

James S Taborda

20250926 20:34
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525241
PLACA: TRK324
CONDUCTOR: JHON FREDY MEJIA PAREJA

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,53 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702l7-0 25-26 (M.V ial
Medellin-Cons.Vialand 2025)
OBRA: Cotización Base H33

PESO TARA: 11.710,00
PESO BRUTO:36.200,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 08:35 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 08:35 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

James S Taborda

20250926 20:38
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525242
PLACA: TRF301
CONDUCTOR: Francisco Javier Carvajal Gallego

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,53 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702l7-0 25-26 (M.V ial
Medellin-Cons.Vialand 2025)
OBRA: Cotización Base H33

PESO TARA: 11.540,00
PESO BRUTO:36,120,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 08:40 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 08:40 p.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Powered by CamScanner



Jumos S Tebovda

20250926 20:53
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525243
PLACA: TRF437
CONDUCTOR: JAIME AUGUSTO RODRIGUEZ QUI..

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,59 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.330,00
PESO BRUTO:35.920,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 08:53 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 08:53 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Jumos S Tebovda

20250926 20:57
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525244
PLACA: [illegible]
CONDUCTOR: GIAN CARLOS CAMAVERAL MORENO

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,54 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 12.250,00
PESO BRUTO:36.790,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 08:57 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 08:57 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Jumos S Tebovda

20250926 21:07
REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525245
PLACA: TRK251
CONDUCTOR: JAIRO ORLANDO ARBOLEDA YEPES

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1 9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,68 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base #33

PESO TARA: 11.890,00
PESO BRUTO:36.570,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 09:08 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 09:08 p.
TEMPERATURA:146,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Powered by CamScanner

James S Taborda

REMISION DE MATERIALES 20250926 21:15
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525246
PLACA: TRF427
CONDUCTOR: Roberto Jairo Rendon Aristizabal

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,70 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base N33

PESO TARA: 11.630,00
PESO BRUTO:36.330,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 09:17 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 09:17 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

TARDE

James S Taborda

REMISION DE MATERIALES 20250926 21:25
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525247
PLACA: STY652
CONDUCTOR: EDISON DIDI HERRERA LAMPREA

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,80 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base N33

PESO TARA: 13.000,00
PESO BRUTO:37.800,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 09:28 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 09:28 p.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

Edison Herrera
FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

James S Taborda

REMISION DE MATERIALES 20250926 21:38
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525248
PLACA: TRF398
CONDUCTOR: HUGO ANTONIO VELEZ AGUIRRE

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-19 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. NETA: 24,55 Ton

CLIENTE:C-OBP03002070217-0 25-26 (M.Vial
Medellin-Cons.Vialmed 2025)
OBRA: Cotización Base N33

PESO TARA: 11.540,00
PESO BRUTO:36.090,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 09:37 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 09:37 p.
TEMPERATURA:148,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Powered by CamScanner

James 5 Taborda

20250926 21:48

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525230
PLACA: TDZ385
CONDUCTOR: GIOVANNY HURTADO ZAPATA

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. META: 24,54 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702I7-0 25-26 (A.V
ial
Medellin-Cons.Vialand 2025)
OBRA: Cotización Base - #3

PESO TARA: 11.680,00
PESO BRUTO:36.220,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 09:49 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 09:49 p.
TEMPERATURA:147,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

Jorge Jilo

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

James 5 Taborda

20250926 21:56

REMISION DE MATERIALES
PAVIMENTAR S.A
NIT: 800.040.014-6
Vigencia DICIEMBRE/2017 - Version 1

TIQUETE DE BASCULA: 525231
PLACA: EOM864
CONDUCTOR: JHON FREDY MEJIA PAREJA

PRODUCTO:14524-6 Mezcla asfaltica MSC-1
9 - tibia -
asfalto 60-70 + Fibra
CANT. META: 24,30 Ton

CLIENTE:C-OBP830020702I7-0 25-26 (A.V
ial
Medellin-Cons.Vialand 2025)
OBRA: Cotización Base - #3

PESO TARA: 11.680,00
PESO BRUTO:37.790,00

ENTRADA: 26 sep 2025 - 09:56 p.
SALIDA: 26 sep 2025 - 09:56 p.
TEMPERATURA:145,00

FIRMA DEL OPERARIO DE BASCULA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE
CUADRILLA:Suministros obras propias
HUMEDAD:0,00%
OBSERVACIONES
Obras - Jorge Jaramillo

Powered by CamScanner
