FECHA (D/M/A): 19/09/2025

BITACORA DE OBRA

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	OBRAS COMPLEMENTARIAS.
RANGO: N/A.	CANTIDAD: 20,04 ml
ZONA: 5	FRENTE DE TRABAJO: 19
COMUNA: 5 POBLADO	
BARRIO: MANILA.	

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 a.m	N/A.
TERMINACIÓN: 3:30 p.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA	NUBLADO. SIN LLUVIA
TARDE	NUBLADO SIN LLUVIA.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. RALLADO Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.
2. ENVIO DE VIGUETA Y CILINDROS AL LABORATORIO.
3. CORTE JUNTAS DE DILATACION L=20.04 m.
4. CURADO SUPERFICIE PLACA EN CONCRETO.
5. LIMPIEZA Y ASEO DEL AREA INTERVENIDA.
6. DESCARGUE Y CARGUE DE HERRAMIENTA MENOR SEÑALIZACION VERTICAL, CORTADORA DE CONCRETO.

5. VISITANTES

—	—

6. FIRMAS

NOMBRE: [illegible] Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	NOMBRE: [illegible] Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Daniel Acuña G. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: CRISTIAN CORREA A. Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 19/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	MANUEL ALEJANDRO PANQUEBA	X		
2	Encargado				
3	Liguero				
4	Rastrillero				
5	Rastrillero - oficial	JUAN CARLOS BARANOA	X		
6	Ayudante - Ayud. mq	MARIA JOHANA SARMIENTA	X		
7	Ayudante - Camion	WILFREDO HERNANDEZ	X		
8	Ayudante	ROBERT ALEX JIMENEZ	X		
9	Ayudante	JHON JAIRO MENDEZA	X		
10	Ayudante	DAVID BRICEÑO	X		
11	Ayudante	JESUS DARIUS CASCO	X		
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto	JORGE MUNOZ MARIN	X		
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	FABIO PALOMINA	X		
29	Conductor Volqueta(s)	JOHAN GALLEGO	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto	CAMINATO CHIPPER	X		
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)	KENWORTH.	X		
17	TRACTOR	EGITE	X		
18	PLANTA ELECTRICA	NO RECIBIDA.	X		

FECHA (D/M/A): 19/09/2021

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
			CALZADA A x A	2,60	0.70	0.12		0,36	ATRAQUE M240
				7,60	7,29	0.20		11,08	CONCRETO M240
				5.22	0.14	0.14		0,11900	LLENO DE CONFINAMIENTO
				6.22	—	—	JUNTA DE MACADAM		
				6.22	—	—	JUNTA DE MACADAM		
				7.60	—	—	JUNTA DE MACADAM		
TOTALES									

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
					339818	TLY 806	SENCILLA	1	Mincivil

Somos Grandes Contribuyentes..

MINCIVIL S.A.

NIT: 890930545
PLANTA GIRARDOTA
AUTOPISTA NORTE KM 24 VEREDA
LA PALMA
ANTIOQUIA
GIRARDOTA, COLOMBIA
Recibo numero
GIRAR0339818

Fecha 22/09/2025 09:06

ID. Cliente 900958259
Cliente: INGEALQUIPOS S.A.S.
Dirección: INGEALQUIPOS S.A.S.

Vehiculo: TLY806
Conductor: JOHAN GALLEGO

MATERIAL	CANT	UND	TOTAL
MBROS	1	1vi	45.000,00


Subtotal: 37.815,00
Total Impuestos 7.185,00
Total: 45.000,00

Forma de pago

Gracias por su compra...

FECHA (D/M/A): 19/09/2025

10. ESQUEMAS

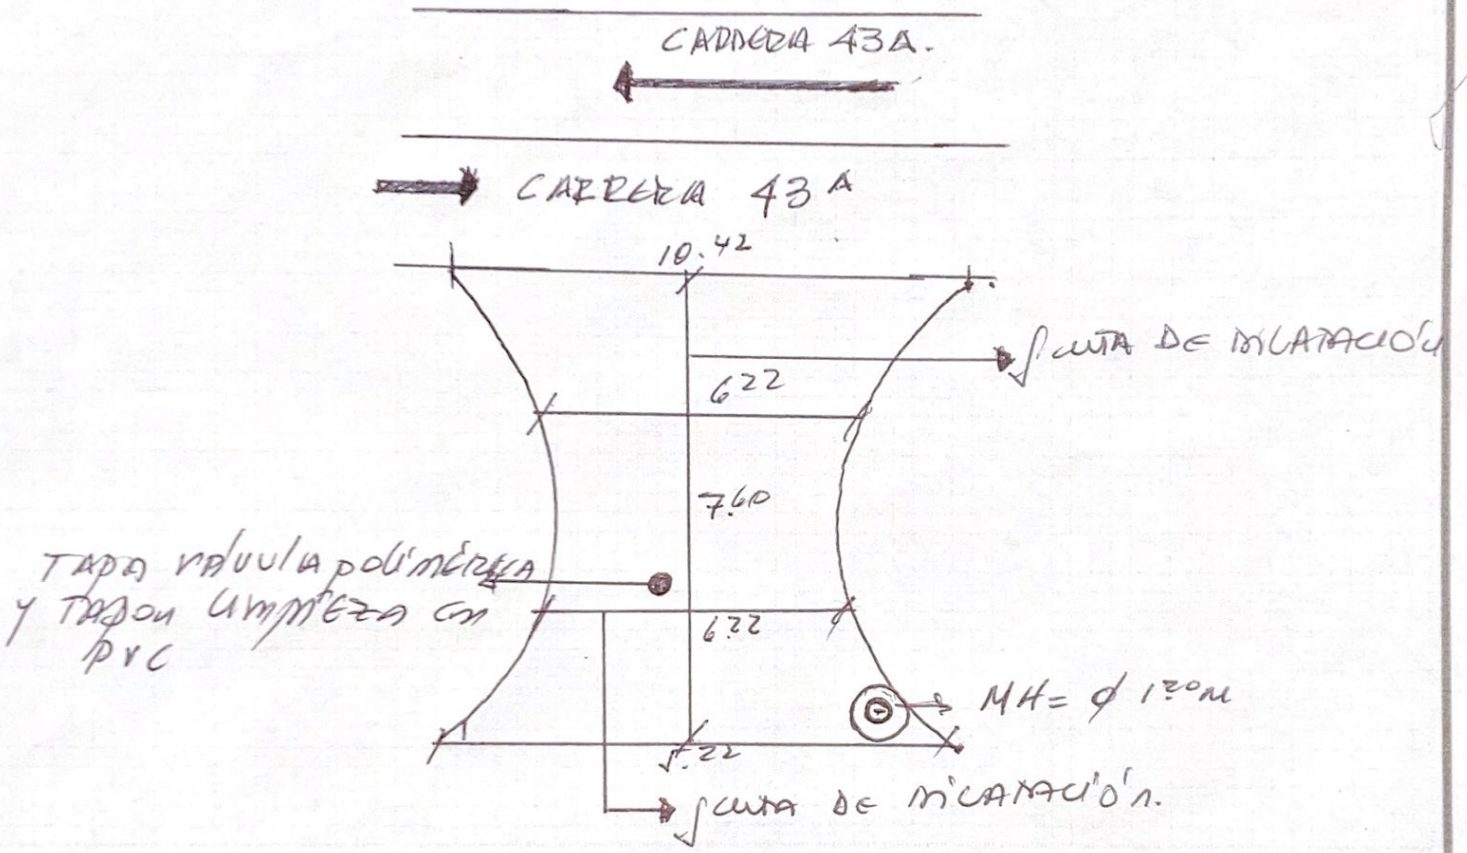

TIPO DE INTERVENCIÓN: OBRAS COMPLEMENTARIAS

RANGO: N. A

BARRIO MANILA

FRENTE 19.

CANTIDAD: 20,04 (JUNTA DE DILATACIÓN).

DIRECCIÓN CALLE 10A CON CRA 43A
