FECHA (D/M/A): 24/09/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	OBRAS COMPLEMEN. DARIAS.		
RANGO:	N.A	CANTIDAD:	321.90 Kg
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	19
COMUNA	16		
BARRIO	Robledo		

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 6:30 a. m	N. A.
TERMINACIÓN: 3:00 p. m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Soleada
	TARDE: Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

1. INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO EN AREA RAMPA UNA SOLA PARRILLA EN AMBOS SENTIDOS @ 0.15 m.
2. INSTALACIÓN DE CANALETAS EN ACERO DE REFUERZO ϕ = 1" LISA Y ϕ = 3/8 (J ONDULADA)
3. CHEQUEO DE ANCLAS
4. VACIADO DE CONCRETO MR 40 CON ACELERANTE
5. TOMA MUESTRAS DE CILINDROS Y VIGUETAS
6. TOMA DE ASENTAMIENTO ANTES DE MEDIR EL VACIADO
7. CAMUFLADO SOBRE SUPERFICIE DE PISO DE PAD. (SE UTILIZAN DOS (2) PLANTILLAS EN PERFIL METALICO REFORZADO)
8. CORTES SOBRE SUPERFICIE DE PLACA EN CONCRETO.
9. ASEO Y LIMPIEZA EN AREA INTERVENIDA.
10. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, TEORA TRAMA PMT. (Incluye señalización vertical).

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Alejandro Panqueba Rivas	Hecho con Todo Respeto
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA Cristian D. Cifuentes A.
NOMBRE: Damel Acuña B.	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 24/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Sí	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	MANUEL A. PAVAJEAU	X		
2	Encargado	JORGE MONSALVE	X		
3	Liguero / SST	JUAN CARLOS BARAÑOA	X		
4	Rastrillero - Oficial	JONAS SOLIS	X		
5	Rastrillero - Orion	WILFRIDO HERNANDEZ	X		
6	Ayudante - Ramon	JULIANA DIAZ RODILLA	X		
7	Ayudante - AUX. INV	MARIA JOHANA SARABIA	X		
8	Ayudante AUX. INV	JHON JAIRO MENDOZA	X		
9	Ayudante	ALEXIS CAMACHO PEÑA	X		
10	Ayudante	ROBERT JIMENEZ	X		
11	Ayudante	DOUGLAS BRICEÑO	X		
12	Ayudante	JAIR DAVID CHALO	X		
13	Ayudante	WILKERMAN ORLANDO	X		
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual				
17	Operador compresor				
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	FABIO VALENCIA	X		
29	Conductor Volqueta(s)				

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Sí	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual				
2	Compresor				
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación				
10	Placa vibratoria				
11	Soplador				
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	ISUZU	X		
16	Volqueta(s)				
17	VIBRADOR	NO DISPONIBLE	X		


FECHA (D/M/A): 24/09/2021

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	A (m)	e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
				CANALETA III/M3 - CANT = 1.0 UN.					ACERO DE REFUERZO
				1 X 4 X 3.34 X 0.16 = 37.18 Kg					Johnson Bond (3/8")
				1 X 22 X 0.22 X 1.0 = 24,20 Kg					CANALETAS (1/2")
				1 X 11 X 0,30 X 4,0 = 66,0 Kg					PASADORES (1")
				PARRILLA (CANT = 2,0 UN) Ø = 1/2"					
				50 X 1.90 X 1.0 = 95.0 Kg					
				28 X 3.54 X 1.0 = 99,12 Kg					
							321.90 Kg		
				10,0	3,54	0,20		7,08	CONCRETO
				4,0	3,56	0,20		2,83	MR 40
				2.0	3,54	0,2401		0,21	
								10,12 m3	
				OBSERVACIÓN: EL CONTRATISTA PREPARÓ EN OBRA ATOLFE PARA MEZCLA EN CONCRETO CON ADITIVO.					
			TOTALES						

CALLE 32 T 66B-166

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN

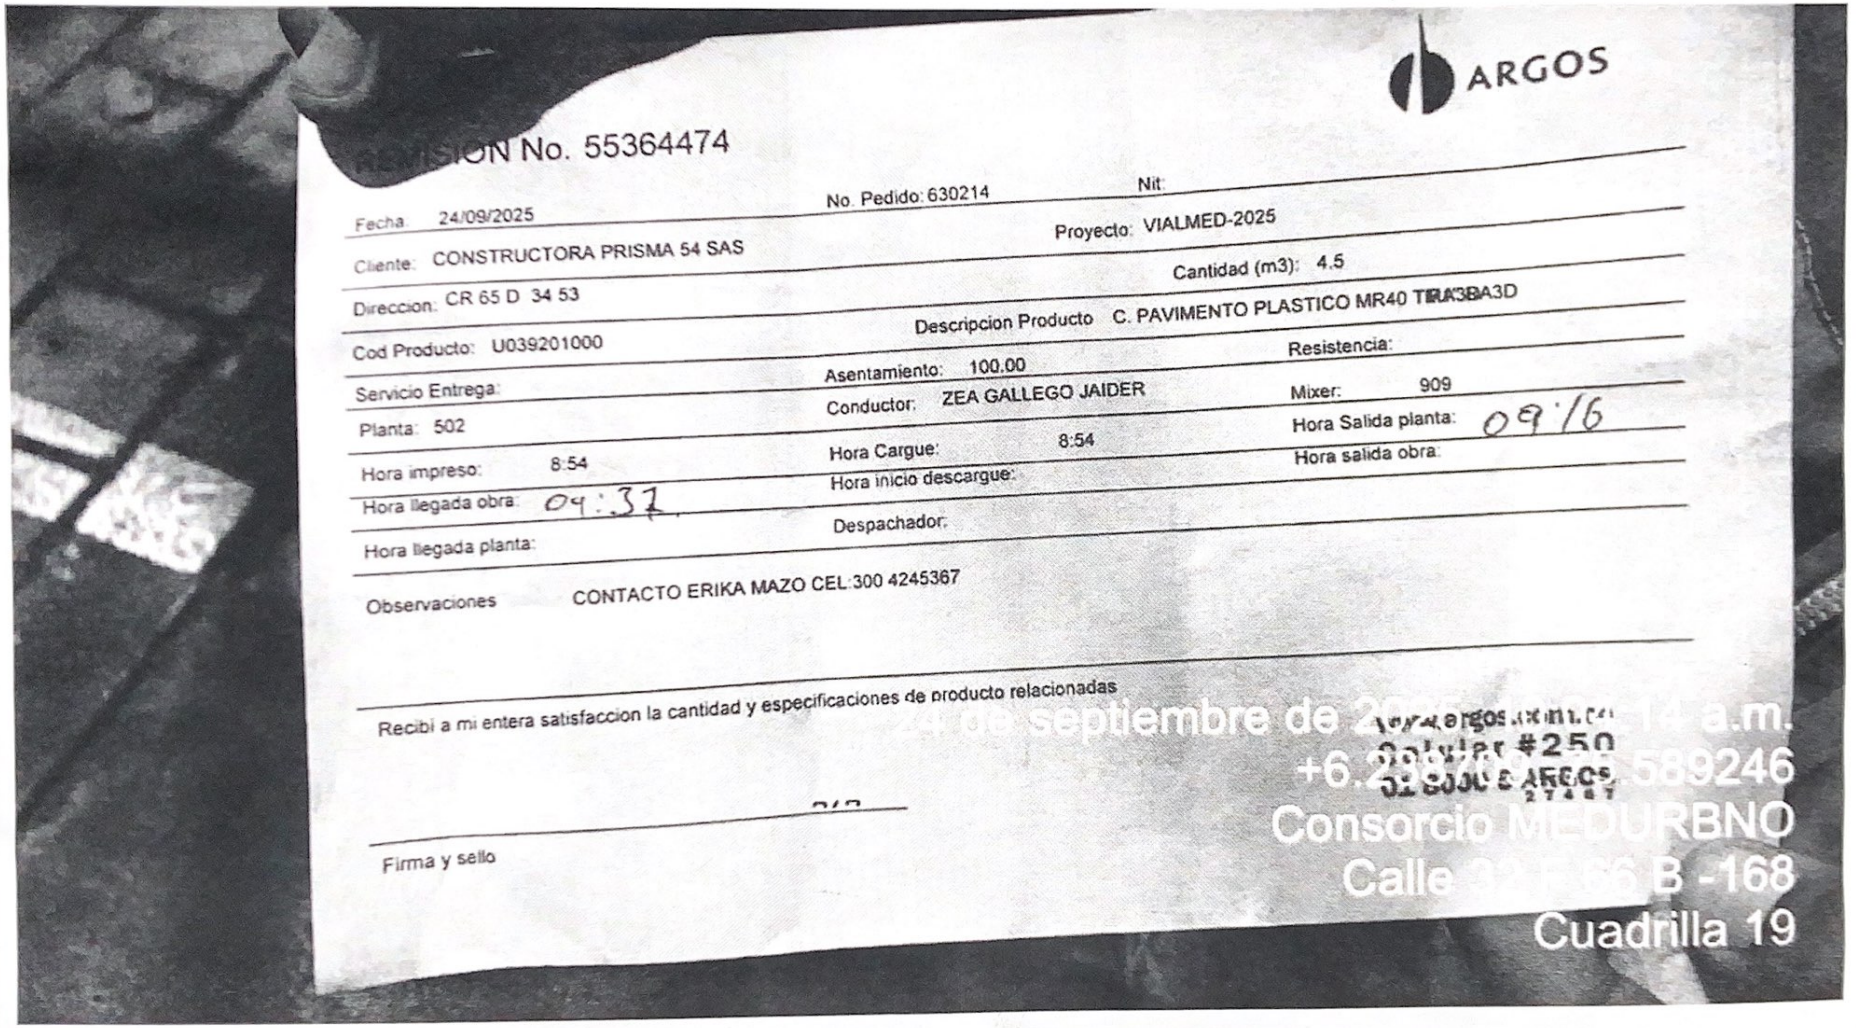

ARGOS

REMISION No. 55364474

Fecha: 24/09/2025 No. Pedido: 630214 Nit:

Cliente: CONSTRUCTORA PRISMA 54 SAS Proyecto: VIALMED-2025

Direccion: CR 65 D 34 53 Cantidad (m3): 4.5

Cod Producto: U039201000 Descripcion Producto C. PAVIMENTO PLASTICO MR40 TIRA3BA3D

Servicio Entrega: Asentamiento: 100.00 Resistencia:

Planta: 502 Conductor: ZEA GALLEGO JAIDER Mixer: 909

Hora impreso: 8:54 Hora Cargue: 8:54 Hora Salida planta: 09:16

Hora llegada obra: 09:37 Hora inicio descargue: Hora salida obra:

Hora llegada planta: Despachador:

Observaciones CONTACTO ERIKA MAZO CEL:300 4245367

Recibi a mi entera satisfaccion la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Firma y sello


de septiembre de 2025 14 a.m.

Calle 34 B -168

Cuadrilla 19

FECHA (D/M/A): 24/09/2025

10. ESQUEMAS

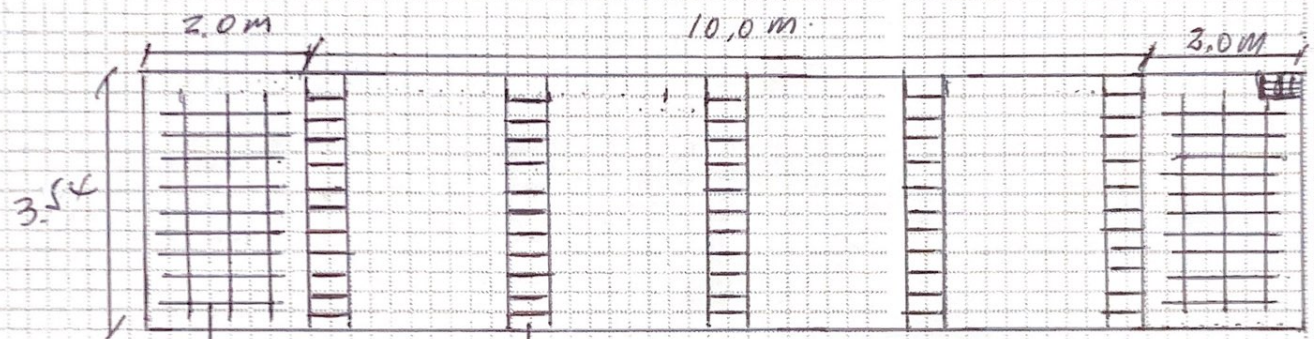

PARRILLA EN ACERO DE REFUERZO AREA PANTOJA (AMBAS DIRECCIONES) $\phi = 1/2''$

PARRILLAS EN ACERO DE REFUERZO $\phi = 1''$ LISO (GOLF) $\phi = 3/8''$ CORRUGADO.

TIPO DE INTERVENCIÓN:	OBRAS COMPLEMENTARIAS	FRENTE	19.
RANGO:	N.A.	CANTIDAD:	321.90 Kg
BARRIO	RONDA	DIRECCIÓN	CALLE 32 F 66 B 168

REMISION No. 55364470

ARGOS

Fecha: 24/09/2025 No. Pedido: 630214 Nit:

Cliente: CONSTRUCTORA PRISMA S4 SAS Proyecto: VIALMED-2025

Direccion: CR 65 D 34 53 Cantidad (m3): 5

Cod Producto: U039201000 Descripcion Producto: C PAVIMENTO PLASTICO MR40 TRUCK8-30

Servicio Entrega: Asentamiento: 100.00 Resistencia:

Planta: 502 Conductor: VASQUEZ VERGARA STALIN Mixer: 583

Hora impreso: 8:23 Hora Cargue: 8:23 Hora Salida planta:

Hora llegada obra: Hora inicio descargue: Hora salida obra:

Hora llegada planta: Despachador:

Observaciones: CONTACTO ERIKA MAZO CEL:300 4245367

Recibi a mi entera satisfaccion la cantidad y especificaciones de producto relacionadas

Firma y sello

www.argos.com.co
Celular #250
01 8000 5 ARGOS

24 de septiembre de 2025, 9:21:22 a. m.
+6.238693,-75.5[illegible]099
Consorcio MEDURBNO
Calle 32 F 66 B -168
Cuadrilla 19
