GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**3**			FECHA:	10	de	DICIEMBRE	de	2025		
PERIODO:	DEL	21	de	SEPTIEMBRE	de	2025	AL	20	de	OCTUBRE	de	2025

CONTRATO No:	**2338**	DE	2025	REGISTRO BP Y P No	**2024004150347 Y 2024004150279**

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, AL CONTRATO 4771 DE 2024 QUE TIENE POR OBJETO "REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL E HIDRÁULICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARCOS SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO MUZO Y DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JOSÉ RONDÓN SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE SOATÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACION:

Municipio de Muzo: Intervención correspondiente a la Institución Educativa San Carlos, ubicada en el área rural de este municipio.
Municipio de Soatá: Intervención correspondiente a la Institución Educativa Juan José Rondón, localizada en el casco urbano del municipio.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MEJÍA	**JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ MEJÍA**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA - UPTC	**LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	


VALOR INICIAL:	$ 0,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 0,00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	20	de	DICIEMBRE	de	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	20	de	DICIEMBRE	de	2025

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**74,5%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**98,0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**90,0%**

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

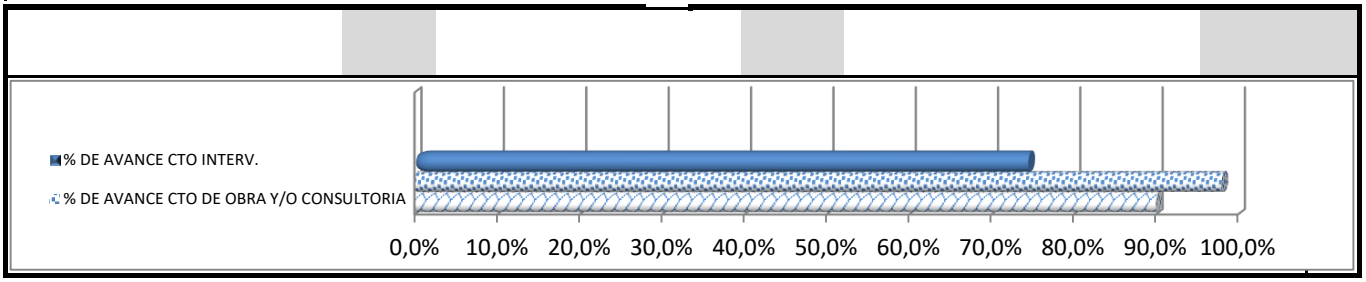

PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA								
No PÓLIZA	100064285		ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25	6	2025	25	5	2026	$ 3.300.312,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25	6	2025	25	11	2028	$ 825.078,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25	6	2025	25	11	2026	$ 3.300.312,00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	21	7	2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
REVISIÓN INFORMACIÓN GENERAL	MUZO SOATA
REVISIÓN CONDICIONES CONTRACTUALES	
VALIDACIÓN PERSONAL Y EQUIPOS	MUZO SOATA
REVISIÓN DE TOPOGRAFIA, GEOTECNIA, ARQUITECTURA, REDES HIDRAULICAS	MUZO SOATA
REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PATOLOGICA	MUZO SOATA

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
TOPCON – Prisma	Topografia	50%	
PROFOSCOPE	Deteccion acero	50%	
Ultrasonido lineal y facearray Equipo d	ensayos no destructivos	50%	
DD-150	Para extraer núcleos de concreto	30%	
HIKMICRO	identificar humedades	30%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO				
DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				
Acta Parcial No.				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

SOLICITUDES PRESENTADAS			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA											
NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO						
					DESDE			HASTA			
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
Juan Esteban Gonzalez Mejia	1053843728	x	x	x	1	9	2025	31	9	2025
Daniel Felipe Vasquez Giraldo	1053832131	x	x	x	1	9	2025	31	9	2025

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Profesional en Geotecnia (10%)	Daniel Felipe Vasquez Giraldo	1053832131
Profesional Patolólogo (15%)	Daniel Felipe Vasquez Giraldo	1053832132
Director de Interventoria (25%	Juan Esteban Gonzalez Mejia	1053843728
Profesional Hidraulico (10%)	Juan Esteban Gonzalez Mejia	1053843728

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 1	2	9	2025	

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	21	7	2025	20	8	2025	
Informe de Supervisión No. 2	21	8	2025	20	9	2025	

OBSERVACIONES: Durante el periodo comprendido entre el 21 de septimebre y el 20 de octubre de 2025, La ejecución del proyecto evidencia un avance técnico y administrativo satisfactorio, resultado del cumplimiento progresivo de las actividades programadas y del adecuado manejo del cronograma contractual. Con un avance de revisión acumulado del 74,5% frente a un 60% de tiempo transcurrido, se refleja una gestión eficiente y un desarrollo acorde con los objetivos planteados, manteniendo un estado general favorable.

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORÍA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	13
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	SI	12
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	SI	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	N.A.	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	YA SE RADICO	

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	Lourdes Marcela Blanco Pedroza

Gobernación de Boyacá Contratación PUBLICADO MARLYN ESMERALDA PACHECO BUENO Fecha: 27/12/2025
