INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA
CONTRATO SA-DLP-001-2025-585-2025

Informe Final: _____	Informe Parcial No. del Informe: 01 de 02
Periodo del informe:	Del 29 de noviembre al 05 de diciembre del 2025
Fecha en la que se rinde el informe:	18 de diciembre de 2025
Contrato No:	SA-DLP-001-2025-585-2025
Contratista:	MHEV INGENIERIA SAS
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO CREANDO UNA ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN TURISTA EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO-CUNDINAMARCA

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

	Obligaciones Específicas Contractuales	Descripción uno a uno de las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a la obligación contractual.
1	Garantizar la instalación y puesta en funcionamiento del alumbrado navideño a más tardar el día 5 de diciembre del 2.025.	Suministro e instalación de todos los elementos contratados en las distintas locaciones del municipio y sus inspectorías, conexión a la red de alumbrado público de estos elementos para su puesta en funcionamiento.
2	Presentar al supervisor del contrato informes sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, así: a) Informe final ejecutado; b) Informes eventuales solicitados por el supervisor del contrato; Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	Presentación del presente informe, con soporte fotográfico, donde se evidencien los elementos instalados en sitio.
3	Cumplir con la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y demás normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante la ejecución del presente CONTRATO.	Pago de planillas y aportes parafiscales de personal activo de MHEV Ingeniería. Conformación de comités COPASST y Convivencia Laboral Asignación de profesional responsable de Sistema de Gestión SST. Elaboración de actividades de inducción y reinducción para los trabajadores de MHEV Ingeniería.

4	Disponer del personal idóneo para el buen desarrollo del objeto del contrato.	Director de proyecto (Ingeniero electricista) con experiencia certificada en instalación de alumbrado Navideño Coordinador Logístico: Ingeniero Electromecánico con experiencia certificada en instalación de alumbrado Navideño
5	Entregar los elementos requeridos, garantizando que cumplan con las especificaciones, requisitos y calidades pactadas en las especificaciones técnicas.	Registro fotográfico de elementos instalados en parque, alcaldía, Iglesia, Rotonda Vehicular, Inspectoría: El triunfo, La Victoria y Pradilla.
6	Retiro de los materiales y elementos instalados después del siete (7) de enero de 2026 y en la fecha que fije el supervisor o el Alcalde Municipal.	Se realizará el retiro después del 07 de Enero conforme a los estipulado, luego de esto se hará el acta de entrega e informe final.
7	Cumplir con los plazos establecidos y condiciones de las garantías de los elementos de acuerdo con la oferta presentada por el contratista	Instalación de los elementos de iluminación navideña (Motivos luminosos y miniled) para poder realizar el encendido en la fecha prevista.
8	Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del contrato.	Notificaciones al supervisor del contrato por medio de llamadas telefónicas de posibles atrasos o dificultades en la instalación por condiciones climáticas.
9	Realizar el cargue de los documentos requeridos en la plataforma del SECOP II, respecto a la información de póliza, estampillas, documento equivalente y/o factura, informes de ejecución con soportes y evidencias de cumplimiento y terminación del contrato.	Cargue de pólizas requeridas por contrato para la ejecución del proyecto, cargue de cualquier otra información requerida por el contratante.
10	Atender las observaciones o requerimientos que le formule el Municipio a través del supervisor del contrato.	Solución de cualquier requerimiento técnico que derive de la instalación del alumbrado navideño o requerimiento de carácter documental.

Como Soporte de lo anterior, se anexan fotografías de los elementos instalados.

LOCALIZACIÓN	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
	ITEM	**PARQUE PRINCIPAL**				
1. PARQUE PRINCIPAL	1.01	S.I.M.D de árbol navideño 10m de altura con estrella de 2 m de altura en su punta, diametro de la base de 5m, incluye guirnalda color verde oscuro en toda su superficie (90m²), incluye motivos luminosos de figuras musicales fabricados en estructura metálica y manguera led, (32 motivos de 50cm de alto, 28 motivos de 80 cm de alto y 8 motivos de 1m de alto), la superficie se decora con miniled de colores roja, azul, amarilla, verde y blanca.	UND	1		
	1.02	S.I.M.D de extensiones de miniled de color rojo para decoración de árboles naturales de parque principal (extensiones de 10m).	UND	47		

	1.02	S.I.M.D de extensiones de miniled de color amarillo para decoración de árboles naturales de parque principal (extensiones de 10m).	UND	47		
	1.02	S.I.M.D de extensiones de miniled de color azul para decoración de árboles naturales de parque principal (extensiones de 10m).	UND	47		
	1.02	S.I.M.D de extensiones de miniled de color verde para decoración de árboles naturales de parque principal (extensiones de 10m).	UND	47	 	

	1.02	S.I.M.D de extensiones de miniled de color blanco cálido para decoración de árboles naturales de parque principal (extensiones de 10m).	UND	47		
	1.03	S.I.M.D de motivos luminosos de figura musical (semicorchea, corchea, negra, blanca, clave de sol) en arboles de parque conformada de estructura fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 1 m	UND	24		
	1.04	S.I.M.D de motivos luminosos de figura musical (semicorchea, corchea, negra, blanca, clave de sol) en arboles de parque. Incluye figura musical fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 80 cm	UND	37		



	1.05	S.I.M.D de motivos luminosos de figura musical (semicorchea, corchea, negra, blanca, clave de sol) en arboles de parque. Incluye figura musical fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 50 cm	UND	72		
	1.07	S.I.M.D de reflectores RGB de 50W para copas de arboles de parques.	UND	30	 	

ALCALDÍA	**2**	**FACHADA ALCALDÍA**				
	2.01	S.I.M.D de extensiones de 10m de miniled color rojo en fachada de edificio de alcaldía, incluye accesorios de conexión y sujeción.	UND	110		

	2.02	S.I.M.D de extensiones de 10m de miniled color blanco cálido en fachada de edificio de alcaldía, incluye accesorios de conexión y sujeción.	UND	110		
	2.03	S.I.M.D de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 2m de alto en fachada de alcaldía.	UND	8		
	2.04	S.I.M.D de TREN (LOCOMOTORA +VAGON CUBIERTO+VAGON REGALOS) en estructura metálica, cubierta decorada con tela tipo esponjillón e iluminacion tipo miniled, contornos de la figura decorado con manguera color blanco cálida. Dimensiones de locomotora: 3.30m de largo, 1.20m de ancho, 2.10 de alto. (capacidad para 3 personas de pie. (habitáculo de 1.20m ancho, 2.1m alto, 1.50 m largo).	GBL	1		

		Dimensiones de vagón 1: 2.00m largo, 1.20m ancho, 2.10m alto, (capacidd para 4 personas de pie. Dimensiones de vagón de regalos: 2.00m de largo, 1.20m ancho, 1,05 alto.				

IGLESIA	**3**	**IGLESIA**				
	3.01	S.I.M.D de extensiones 10m de miniled blanca cálida, con flasher, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	130		
	3.01	S.I.M.D de extensiones 10m de miniled azul, con flasher, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	70		

	3.02	S.I.M.D de reflector 50W color azul instalado en fachada, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	5	 	Reflectores ubicados en triunfo
	3.03	S.I.M.D de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 2m de alto en fachada de alcaldía.	UND	3		
	3.04	S.I.M.D strober led de 2W E27 blanco, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	60		

ROTONDA	**4**	**ROTONDA**				
	4.01	S.I.M.D de extensiones 10m de colores blanco cálido, incluye elementos de sujeción y conexión a tronco de árbol.	UND	10		

	4.02	S.I.M.D de motivos luminosos de figura musical (semicorchea, corchea, negra, blanca, clave de sol) en arboles de parque. Incluye figura musical fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 50 cm	UND	30		
	4.03	S.I.M.D de extensiones de miniled de 10m de color verde para techo luminoso desde arbol hasta borde de rotonda, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	90		
	4.04	S.I.M.D de extensiones de miniled de 10m de color amarillo para techo luminoso desde arbol hasta borde de rotonda, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	90		

	4.05	S.I.M.D de extensiones de miniled de 10m de color rojo para techo luminoso desde arbol hasta borde de rotonda, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	90		

EL TRIUNFO	**5**	**EL TRIUNFO**				
	5.01	S.I.M.D de arbol navideño de 10m de altura + estrella de 2 m de altura en su punta, conformado por estructura liviana metálica de perfiles de acero tubular decorado con extensiónes de miniled blanca cálida en el cuerpo del árbol y extensiones de miniled azul en estrella, incluye elementos de conexión y sujeción a suelo.	UND	1	 	
	5.02	S.I.M.D de cortina LED blanca cálida en fachada de iglesia,de 90 cm de caida y 6m de longitud, incluye elementos de conexión y sujeción.	UND	9		

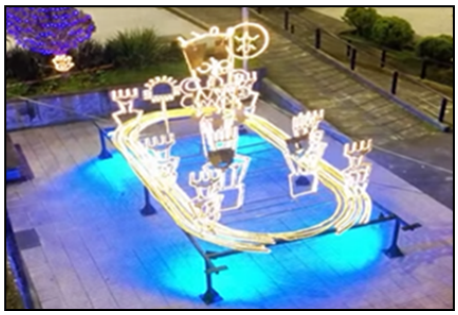
	5.03	S.I.M.D de manguera LED cálida para techo de tarima incluye elementos de sujeción y conexión.	m	16		
	5.04	S.I.M.D de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 2m de alto en borde de tarima.	UND	5		

PRADILLA	**6**	**INSPECTORIA PRADILLA**				
	6.01	S.I.M.D de reflector 50W RGB para iluminar techo de tarima, incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	18		

	6.02	S.I.M.D de cortina LED blanco fría, 90 cm de caida y 9m de longitud incluye elementos de sujeción y conexión.	UND	4		
	6.03	S.I.M.D de manguera LED cálida para techo de tarima incluye elementos de sujeción y conexión.	m	55		
	6.04	S.I.M.D de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 1,5m de alto en borde de tarima.	UND	4		
	6.05	S.I.M.D de juego de familia de 3 osos polares fabricados en fibra de vidrio. Incluye:-Oso a 4 patas de 1,2 m de alto-Oso sentado de 1,6 m de alto-Oso pequeño de pie de 1,1 m de alto	GBL	1		

	6.06	S.I.M.D de Iglú fabricado con estructura metálica liviana, cubierto con tela blanca e iluminado con extensiones en miniled blanco fría. Dimensiones aproximadas: 3,5m de diametro de base. Altura de 2,2m	UND	1		
	6.07	S.I.M.D de extensiones 10m color blanca fría, incluye lo necesario para su conexión y sujeción a arbol.	UND	30		
	6.08	S.I.M.D de meteoro blanco 90cm en copas de arbol, incluye los elementos necesarios para su conexión y sujeción a arbol.	UND	50		
	7	**INSPECTORIA LA VICTORIA**				

7.01	S.I.M.D de cortina LED blanco fría, 90 cm de caida y 6m de longitud para iluminación de contornos superiores de la fachada de la iglesia. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	UND	4		
7.03	S.I.M.D de extensiones 10m color blanca fría con flasher para iluminación de la cruz en fachada de la iglesia. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	UND	5		
7.04	S.I.M.D de manguera LED para contorno de cruz Incluye elementos para su conexión y sujeción.	UND	20		
7.04	S.I.M.D de estrella fabricada en estructura metálica, iluminada con miniled blanca fría de 1,5m de alto sobre puertas de ingreso a iglesia	UND	3	 	

7.05	S.I.M.D de Motivo luminoso de Balsa Muisca fabricado en perfilería metálica, decorada con manguera led amarilla, construida con perfil tubular redondo de 2" en base y tubular cuadrado de 1" para figuras sobre balsa. Dimensiones finales de balsa: 6m de largo, 3m de ancho, y 3,5m de alto.	UND	1		
7.06	S.I.M.D de figuras luminosas en arboles de parque. Incluye figura PRECOLOMBINA fabricada en varilla metálica decorada con manguera led de colores surtidos de 80 cm	UND	40		
7.07	S.I.M.D de extensiones 10m color rojo para arboles pequeños de plaza. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	UND	10		

7.07	S.I.M.D de extensiones 10m color amarillo para arboles pequeños de plaza. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	UND	10		
7.07	S.I.M.D de extensiones 10m color azul para arboles pequeños de plaza. Incluye elementos para su conexión y sujeción.	UND	10		

Nombre completo y firma del Contratista	**NOMBRE COMPLETO:** EDWARD ANÍBAL SANTOS DEL RÍO **CEDULA:** 79134747 de BOGOTA DC. REPRESENTANTE LEGAL MHEV INGENIERÍA SAS
