DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

INFORME MENSUAL 04 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA 4600105052 de 2025

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA









CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20005377 DE 2025
INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

PRESENTADO POR:

CONSORCIO MEDURBANO 20005377
Del 1 al 31 de octubre de 2025

INFORME No 04

CORRESPONDIENTE A LAS OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA DURANTE EL PERIODO DEL (1/10/2025) AL (31/10/2025).

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Información General de la Obra Pública**
   - **1.1.** Descripción general de la Obra Pública
   - **1.2.** Localización de la Obra Pública
   - **1.3.** Información básica de los contratos
     - **1.3.1.** Contrato de Obra
     - **1.3.2.** Contrato de Interventoría

2. **Informe Técnico de Seguimiento al Contrato de Obra Pública**
   - **2.1.** Control de ejecución
     - **2.1.1.** Análisis de cada una de las actividades de obra programadas, de conformidad con el cronograma vigente vs actividades de obra efectivamente ejecutadas
   - **2.2.** Control y seguimiento al cumplimiento y vigencia de licencias, permisos y uso de servicios públicos
     - **2.2.1.** PMT
   - **2.3.** Seguimiento al estado del tiempo
   - **2.4.** Control del material en obra
   - **2.5.** Control de ensayos de laboratorio
   - **2.6.** Control de equipos en obra
   - **2.7.** Control de entrega y cambios de estudios y diseños

3. **Informe de monitoreo y seguimiento social, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los contratos de ejecución de Obra Pública**
   - **3.1.** Informe social
     - **3.1.1.** Actividades de la interventoría relacionadas con la verificación, monitoreo y seguimiento de la ejecución del componente social, en el contrato de ejecución de obra pública
     - **3.1.2.** Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente social, al interior de su contrato
     - **3.1.3.** Consolidado de la gestión social
     - **3.1.4.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría, con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente social de su contrato de ejecución de la obra pública.
   - **3.2.** Informe ambiental
     - **3.2.1.** Programas del Plan de Acción Ambiental de la Obra Pública
     - **3.2.2.** Programa de capacitaciones y/o inducciones realizadas
     - **3.2.3.** Plan de monitoreo y seguimiento (Formato indicadores)
     - **3.2.4.** Seguimiento al presupuesto ambiental (Formato vigente)
     - **3.2.5.** Observaciones, recomendaciones y conclusiones de la interventoría, con relación a las labores realizadas por el contratista de obra en el desarrollo del componente ambiental de su contrato de ejecución de obra pública

3.2.6. Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente ambiental, al interior de su contrato.

3.3. Informe de Seguridad y Salud en el trabajo SST

3.3.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (contratista de obra)

3.3.1.1. Seguimiento a los hallazgos encontrados en la verificación del cumplimiento para la gestión, en el desarrollo del componente

4. Informe administrativo de seguimiento al contrato de obra pública

4.1. Control del personal del contratista de obra asociado al proyecto (administrativo y técnico) y de su pago de seguridad social integral

4.2. Control del cumplimiento de las responsabilidades del contratista de obra frente a la subcontratación

4.3. Informe de la materialización de riesgos previsibles del contrato de obra y su mitigación

4.4. Control a los compromisos definidos en los comités de obra

4.5. Correspondencia enviada y recibida

4.6. Copia de la Bitácora

5. Informe Financiero y Contable

5.1. Seguimiento financiero a la ejecución del contrato de obra

5.2. Relación de pagos y amortización de anticipo (si aplica) del contrato de obra

5.3. Control de inversión del anticipo y de los rendimientos financieros generados en el contrato de obra (si aplica)

5.4. Relación de las obligaciones en materia de impuestos y contribuciones.

5.5. Relación de los imprevistos causados, demostrados y facturados.

6. Informe Jurídico

6.1. Relación de reclamaciones

6.2. Relación de sanciones

6.3. Control al estado de las garantías del contrato de Obra

7. Registro Fotográfico del avance de la obra

8. Recomendaciones y conclusiones generales de la Interventoría sobre el desarrollo del contrato de Obra

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Distribución de cuadrillas. 14
Tabla 2 Resumen reportes en SIRO de octubre de 2025 16
Tabla 3 Distribución cuadrillas octubre 2025. 17
Tabla 4 Programación diaria de cuadrillas 18
Tabla 5 Atención baches mediáticos. 31
Tabla 6 Atención de baches rango 0 y rango 1, por barrio y comuna. 34
Tabla 7 Resumen de atención de baches comuna y reporte en SIRO octubre 2025. 37
Tabla 8 Atención de baches rango 3 por barrio y comuna. 38
Tabla 9 Atención de baches rango 4 por barrio y comuna. 39
Tabla 10 Rehabilitación de vías con MAM, SMA y FIBRA por barrio y por comuna. 39
Tabla 11 Instalación de mezcla MDC-19 para construcción de resaltos por barrio y comuna. 40
Tabla 12 Obras complementarias. 41
Tabla 13 Señalización. 44
Tabla 14 Resumen de Metas físicas CONSORCIO VIALMED 2025. 47
Tabla 15 Programación de obra al 31 de octubre de 2025. 48
Tabla 16 Cantidades ejecutadas al 31 de octubre de 2025. 53
Tabla 17 Gráfica programa de inversión mensual. 62
Tabla 18 Flujo de inversión mensual 62
Tabla 19 Programa de inversión acumulado 62
Tabla 20 Seguimiento inversión programada y ejecutado acumulado. 65
Tabla 21 Permisos ambientales. 65
Tabla 22 Manejo de residuos de construcción y demolición. 65
Tabla 23 Proveedores de materiales Pétreos. 66
Tabla 24. Relación de vehículos utilizado en el mes de octubre de 2025. 68
Tabla 25. Relación de los PMT solicitados al 31 de octubre de 2025. 68
Tabla 26 Gráfica de precipitaciones durante el mes de octubre de 2025 81
Tabla 27 Estado del tiempo mes de octubre de 2025 82
Tabla 28 Registro de control de espesores pintura acrílica 90
Tabla 29 Registro de control de espesores pintura plástico en frio 90
Tabla 30 Registro pruebas de retroflectividad pintura plástico en frio 90
Tabla 31 Relación de ensayos de densidades rango 0, 1 y rango 3 92
Tabla 32 Relación de ensayos de densidades rango 4 y masivos 110
Tabla 33 Relación toma muestras en campo ensayos resistencia compresión de concretos 123
Tabla 34 Relación toma muestras en campo ensayos resistencia compresión de concretos MR 124
Tabla 35 Registro resistencia a la flexión de vigas de concreto tipo MR 126
Tabla 36 Registro de toma de densidades en campo 129
Tabla 37 Relación equipo y maquinaria mes de **octubre de 2025** 131
Tabla 38 Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 135
Tabla 39 Granulometría mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 135
Tabla 40 Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 136
Tabla 41 Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 137
Tabla 42 Granulometría mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A. 137
Tabla 43 Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A 138
Tabla 44 Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A 139
Tabla 45 Granulometría mezcla asfáltica MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A 139
Tabla 46 Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A 140
Tabla 47. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MAM-25 PAVIMENTAR S.A. 141
Tabla 48. Granulometría mezcla asfáltica MAM-25 PAVIMENTAR S.A. 141
Tabla 49. Dosificación de materiales para gradación MAM-25 PAVIMENTAR S.A 142
Tabla 50. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica SMA PAVIMENTAR S.A 143
Tabla 51. Granulometría mezcla asfáltica SMA PAVIMENTAR S.A 143
Tabla 52. Dosificación de materiales para gradación SMA PAVIMENTAR S.A 144

Tabla 53. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A.....145
Tabla 54. Granulometría mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A.....146
Tabla 55. Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A.....147
Tabla 56. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A.....148
Tabla 57. Granulometría mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A.....149
Tabla 58. Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A.....150
Tabla 59. Consolidado de Actas de Vecindad.....152
Tabla 60. Consolidado Actas de entorno 152
Tabla 61. Relación de circulares 153
Tabla 62. Relación de volantes 165
Tabla 63. Relación de valla tijeras.....170
Tabla 64. Relación de e-card 172
Tabla 65. Relación de pasacalles.....180
Tabla 66. Relación de afiches 181
Tabla 67. Relación de carteleras y buzón 188
Tabla 68. Relación de PQRS 192
Tabla 69. Indicador de PQRS.....192
Tabla 70. Consolidado de socializaciones durante el mes.....193
Tabla 71. Consolidado de reuniones durante el mes 194
Tabla 72. Relación de CCO.....195
Tabla 73. Consolidado personal vinculado mano de obra.....195
Tabla 74. Consolidado de inducciones y capacitaciones al personal.....196
Tabla 75. Indicador de cumplimiento capacitaciones 197
Tabla 76. Relación actividades de sostenibilidad de las obras.....197
Tabla 77. Cumplimiento de actividades del programa de sostenibilidad 198
Tabla 78. Recorridos sociales realizados.....199
Tabla 79. Consolidado de reuniones.....205
Tabla 80. Actividades de la interventoria.....202
Tabla 81. Localización de las cuadrillas en el mes de octubre de 2025.....205
Tabla 82. Capacitaciones gestión ambiental.....226
Tabla 83. Relación personal vinculado al proyecto activo mes de **octubre 2025.**.....250
Tabla 84. Relación de planillas de seguridad social presentadas **octubre 2025**.....261
Tabla 85. Certificado de revisor fiscal actualizado del contratista:.....261
Tabla 86. Relación de actas de reunión y comités realizados en **octubre de 2025** 263
Tabla 87. Relación de correspondencia enviada **octubre 2025**.....265
Tabla 88. Relación correspondencia recibida **octubre 2025**.....293
Tabla 89. Relación de la imputación del gasto 331
Tabla 90. Relación pagos realizados.....341
Tabla 91. Relación pagos realizados por pago anticipado 341
Tabla 92. Relación de Pólizas Contrato de Obra.....343

LISTADO DE FIGURAS Y GRÁFICOS

Ilustración 1. Localización planta Procopal S.A. Fuente: Google maps.....9
Ilustración 2. Localización planta Pavimentar S.A. Fuente: Google maps. 10
Ilustración 3. Localización de puntos intervenidos app.powerbi.com - septiembre 2025. 11
Ilustración 4. Ejecución de baches con reporte de SIRO.....38
Ilustración 5. Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A. 138
Ilustración 6. Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A. 140
Ilustración 7. Curva granulométrica de diseño para mezcla MAM-25 PAVIMENTAR S.A. 142

Ilustración 8. Curva granulométrica de diseño para mezcla SMA PAVIMENTAR S.A.....144
Ilustración 9. Curva granulométrica de diseño para mezcla MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A. 147
Ilustración 10. Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A. 150

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 2.2.1 PMT Específico Av El Poblado, Cr43A x (Cl 7 – Cl 9Sur).
Anexo 2.2.2 PMT Específico CR 40 x (CL48 y 49A)
Anexo 2.2.3 PMT Específico CR 61x (CL32 y CL33) Av. Regional Calzada Occidental
Anexo 2.2.4 Informe contratista de obra

Anexo 3.1.1 Programa comunicaciones e información a la comunidad, circulares
Anexo 3.1.2 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, volantes
Anexo 3.1.3 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, valla tijeras
Anexo 3.1.4 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, E-Card
Anexo 3.1.5 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, Pasacalles
Anexo 3.1.6 Programa de comunicaciones a información a lacomunidad, PQRS
Anexo 3.1.7 Participación comunitaria, Socializaciones
Anexo 3.1.8 Programa de Contratación de Mano de Obra, Consolidado empleabilidad
Anexo 3.1.9 Programa de formación comunitaria, inducciones, capacitaciones
Anexo 3.1.10 Recorridos sociales
Anexo 3.1.11 Actas de reunión

Anexo 3.2.1 Programa para el manejo de los residuos sólidos
Anexo 3.2.2 Programa para el control de emisiones atmosféricas
Anexo 3.2.3 Programa para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción
Anexo 3.2.4 Programa para la protección del suelo
Anexo 3.2.5 Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra
Anexo 3.2.6 Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra
Anexo 3.2.7 Programa de prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos
Anexo 3.2.8 Programa para la gestión de la fauna y la flora
Anexo 3.2.9 Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía
Anexo 3.2.10 Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales
Anexo 3.2.11 Listados de asistencia, capacitaciones e inducciones
Anexo 3.2.12 Formatos de seguimiento de la Interventoria Ambiental

Anexo 3.3.1 Reglamento de higiene y seguridad industrial
Anexo 3.3.2 Medicina preventiva y del trabajo
Anexo 3.3.3 Entrega de dotación y elementos de protección personal
Anexo 3.3.4 Plan de inducciones y capacitaciones
Anexo 3.3.5 Programa de inspecciones
Anexo 3.3.6 Orden y aseo frentes de trabajo
Anexo 3.3.7 Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral
Anexo 3.3.8 Afiliaciones sistema de Seguridad Social
Anexo 3.3.9 Seguridad Social Consorcio Vial Med 2025

Anexo 4.1.1 Certificación Parafiscales Consorcio Vial Med 2025 y Consorciados
Anexo 4.4.1 Actas de comité técnico
Anexo 4.5.1 Correspondencia enviada octubre de 2025
Anexo 4.5.2 Correspondencia recibida octubre de 2025
Anexo 4.6.1 Copia digital de las bitácoras de obra

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

El proyecto de rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada es un proyecto estratégico de la Secretaría de Infraestructura Física, que busca preservar y mantener las condiciones de uso de los corredores viales del Distrito de Medellín, con el propósito de recuperar y prolongar su vida útil y garantizar las condiciones de seguridad y comodidad en el tránsito vehicular.

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Este proyecto contempla como una de las actividades principales el suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica para el tratamiento y atención de baches y fallos en toda la malla vial del distrito cuya intervención es necesaria para preservar y mantener las condiciones de uso de los corredores viales, estas intervenciones van desde la simple corrección de defectos superficiales en la capa de rodadura de las vías, hasta la colocación de nuevas carpetas o el reemplazo de las existentes con mezclas asfálticas y corresponde a actividades de conservación mediante mantenimiento, teniendo como insumo para la priorización de las actividades las necesidades registradas en SIRO, provenientes de los reportes de los ciudadanos mediante la aplicación ReportesMed y vía derecho de petición, previa validación y registro de la necesidad en visita técnica al lugar por personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura Física.

Para la recuperación de los corredores viales que sirven de eje para la movilidad de la ciudad, se cuenta con el programa de MANTENIMIENTO MASIVO soportado en el Sistema de Administración Vial (SGVial o SAV), el cual se cuenta con un diagnóstico del estado de cada uno de los 23556 segmentos viales que tiene a su cargo el Distrito de Medellín, la jerarquía, área, ubicación, condiciones estructurales, condiciones de servicio y condiciones de tránsito medidas en el momento del inventario y actualizada con información recaudada de las intervenciones, información que sirve como insumo para determinar los puntos a intervenir en el contrato de acuerdo a criterios técnicos, sociales y económicos. Estas intervenciones van desde la simple corrección de defectos superficiales en la capa de rodadura, hasta la colocación de nuevas carpetas o el reemplazo de las existentes con mezclas de alto modulo en el caso de pavimentos flexibles o de un nuevo pavimento rígido en el caso de las vías en concreto que permitan recuperar su capacidad estructural mediante labores de demolición y/o fresado y repavimentación.

La aparición de BACHES (conocidos como huecos) y fallos en la malla vial del distrito, es frecuente, periódico y cada vez más recurrente; ya que la malla vial en un gran porcentaje ya cumplió su vida útil y capacidad de servicio en forma eficiente; además su deterioro es constante debido a múltiples factores externos como son: el aumento del volumen vehicular, perdida de la capacidad estructural, construcción de brechas de servicios públicos, construcción de domiciliares y obras de entidades externas, empozamientos de agua, entre otras; que conllevan a la malla vial a un deterioro progresivo que se ve reflejado en la aparición de baches (huecos), razón por la cual la Secretaría de Infraestructura Física, debe velar por la atención de manera diligente en la

reparación de los mismos, mitigando el riesgo en la movilidad vehicular y el daño antijurídico.

Para la ejecución del PARCHEO DE BACHES, se deberá emplear mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30% que cumpla con los artículos 450.2.4 y 462 de la norma INVIAS 2022 y en particular con lo contemplado en el artículo 465 – 22. EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE.

Artículo 450.2.4 Aditivos para modificar la reología. Se permite la incorporación de productos o tecnologías que modifiquen la reología de una mezcla asfáltica elaborada con asfalto convencional o métodos tradicionales. Se permite el uso de fibras, aditivos para mezclas tibias, asfalto espumado o cualquier otra tecnología o modificador de las propiedades del concreto asfáltico, siempre y cuando se presenten informes técnicos que determinen su dosificación y se muestre evidencia de un comportamiento favorable en campo. Dichos informes deben ilustrar las mejoras obtenidas en el desempeño, en los procesos productivos, en los procesos constructivos, en la durabilidad o en las prestaciones mecánicas, al ser comparada la mezcla modificada respecto a la mezcla patrón sin incorporación de dichos productos. Además, el uso de estos productos o tecnologías debe ser respaldado con las respectivas fichas técnicas y hojas de seguridad proporcionadas por el fabricante para contar con la aprobación del interventor.

Artículo “465.1. Descripción. Este trabajo se refiere a la excavación de zonas deterioradas de un pavimento asfáltico, de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto y las indicaciones del Interventor; incluye, también, la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición de los materiales excavados, y la compactación del fondo de las excavaciones realizadas. 465.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 465.4.1 Demarcación de las áreas por excavar.

Antes de dar inicio a los trabajos de corte, el Interventor, o el Constructor bajo la supervisión de aquel, marcarán las áreas por someter a reparación, las cuales deberán abarcar las zonas dañadas del pavimento en reparación que puedan comprometer la intervención. La demarcación se efectuará haciendo uso de figuras geométricas, cuadradas o rectangulares, cuyas caras longitudinales y transversales deberán ser, respectivamente, paralelas y perpendiculares al eje de la vía.

Para la ATENCIÓN DE FALLOS, los cuales corresponden a daños en la carpeta y estructura del pavimento con fallas tipo piel de cocodrilo, hundimientos, abultamientos, ondulaciones, ahuellamientos, grietas y agrietamientos en bloque, su intervención debe garantizar una estabilidad mínima de 5 años y se realizará en cualquier tipo de vías presente en el Distrito de Medellín, que cumpla esta característica, definida y aprobada por la Interventoría, en cuyo caso deberá estar previamente aprobada y registrada en el Sistema Integral de Registro de obra – SIRO, sistema de apoyo para la toma de decisiones de la Secretaria de Infraestructura Física o soportada técnicamente por la Interventoría.

Para la ejecución del Parcheo de fallos, adicionalmente al cumplimiento de la norma INVIAS 2022 para la mezcla asfáltica, se deberá emplear maquina fresadora para el retiro del pavimento existente de acuerdo a la Norma 460-22 INVIAS 2022, el cual se realizará sobre el área y el espesor que apruebe el Interventor. En el desarrollo de la

actividad, se deberán garantizar cortes rectilíneos y la utilización de maquinaria contemplada en el análisis unitario de la actividad para el retiro de la capa de pavimento fallada.

En atención al proyecto, el contratista deberá suministrar, transportar y colocar la mezcla asfáltica, pavimento rígido y adoquines en las vías del distrito (urbana y Rural), en los sitios que requieran la reparación de huecos, fallos asociados al deterioro de la malla vial. Ahora bien, para el cumplimiento de las especificaciones de la mezcla, la oportunidad, condiciones de transporte y calidad de la mezcla, para la ejecución del proyecto se debe tener en cuenta la ubicación del punto de producción de la mezcla para garantizar las condiciones de la misma y poder transpórtala a los sitios de aplicación con la calidad y oportunidad requerida, se estima, de acuerdo con la necesidad a satisfacer y condiciones de ejecución, que la ubicación planta no debería estar a una distancia más allá de 35 km del punto cero de la ciudad de Medellín, localizado en el intercambio vial de Carabineros (Autopista Norte x Calle Barranquilla).

Para la ejecución del proyecto el CONSORCIO VIALMED 2025, dispone de las plantas de mezcla de PROCOPAL S.A. y PAVIMENTAR S.A.

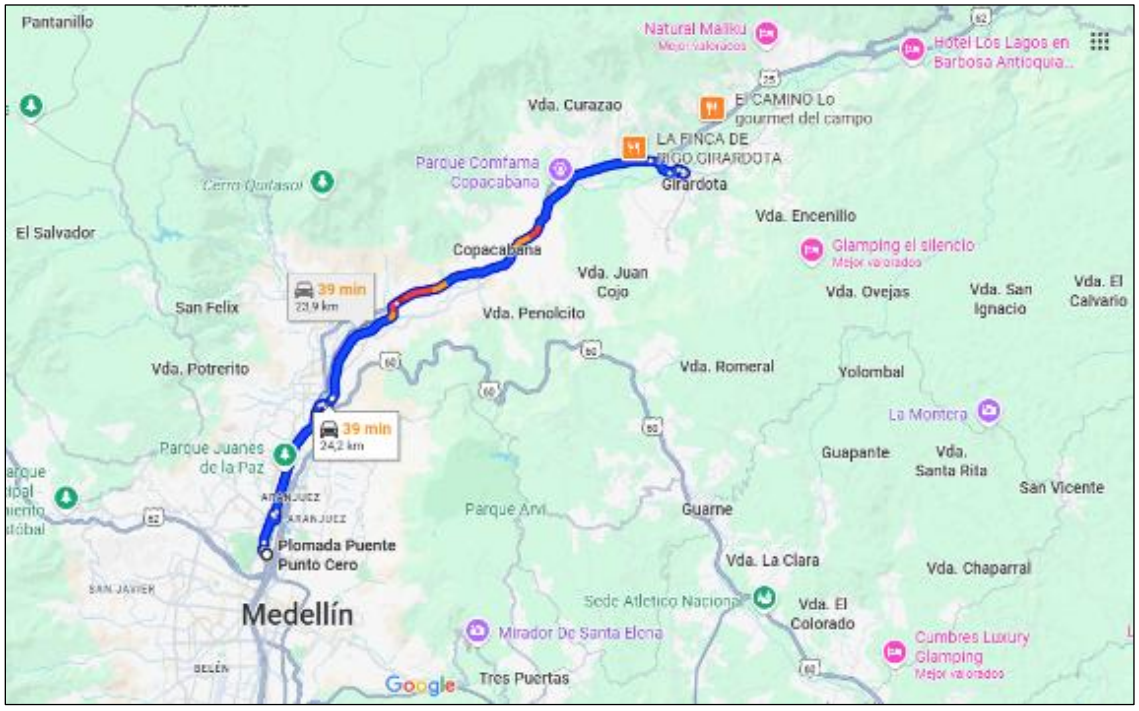


Ilustración 1. Localización planta Procopal S.A. Fuente: Google maps.



Ilustración 2. Localización planta Pavimentar S.A. Fuente: Google maps.

Para la ejecución del proyecto se deben seguir las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los anexos del proceso, cumpliendo con la norma INVIAS que se establecen para cada una de las actividades que componen el presupuesto oficial del proyecto.

1.2. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA:

Es de anotar, que el proyecto se ejecuta a lo largo de todo el Distrito en diferentes puntos de la zona urbana y rural.

La zona de intervención se distribuye a lo largo de todo el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en diferentes sitios de la zona urbana y rural, donde se encuentran los puntos que requieren las intervenciones asociadas con el objeto y alcance del contrato que se han venido atendiendo a la fecha con 14 frentes de trabajo simultáneos según programación con la Entidad y la Interventoría.

Durante el mes de **octubre de 2025,** operaron 21 cuadrillas distribuidas así: 1 para rango 0, 10 para rango 1, 1 para rango 3, 2 para rango 4, 2 cuadrillas para masivos, 4 en obras complementarias (pavimentos rígidos, mantenimiento de pompeyanos en adoquines, pasamanos), y 1 cuadrilla en señalización horizontal.

A continuación, se muestra imagen con la ubicación de los baches intervenidos a la fecha durante el desarrollo del presente contrato:

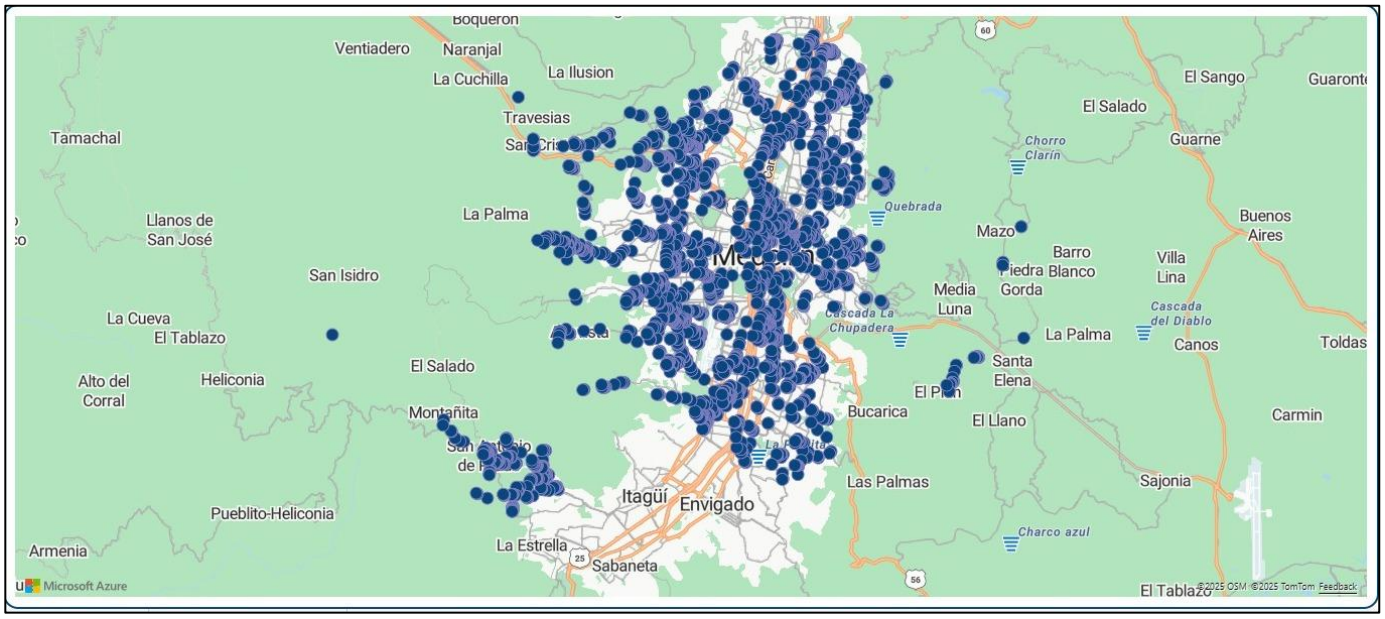


Ilustración 3. Localización de puntos intervenidos. Fuente: app.powerbi.com - **octubre 2025**.

Para definir los puntos a intervenir y orden de ejecución la Unidad de Construcción y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructura Física posee bases de datos del Sistema de Gestión Vial (SGVial) y del Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO) que se utilizan como herramientas para definir, clasificar y priorizar los puntos a intervenir con el contrato en el distrito, incluyendo sus 5 corregimientos teniendo en cuenta las diferentes intervenciones asociadas con el objeto y alcance del contrato, con los criterios donde prima el interés colectivo sobre el particular, la eficiencia y la economía. Teniendo como base esta información se realiza la programación de obra diaria, para la localización de las cuadrillas.

Los puntos, frentes, sitios o zonas de intervención, que se establecen a continuación, corresponden a la planeación inicial del proyecto según viabilidad y disponible de recursos.

Para el parcheo de huecos, intervención de fallos, rehabilitación de vías, mantenimiento, construcción e instalación de infraestructura asociada como andenes, cunetas, bordillos, pasamanos, barandas, defensas viales, entre otros, se priorizará en primer lugar, es decir prioridad alta, los corredores estructurantes del distrito por la jerarquía vial y el volumen de tránsito, los cuales representan un alto riesgo para la circulación vehicular, su atención se realizará de acuerdo a los horarios y tipos de cierre autorizados en el Plan de Manejo de Tránsito.

En segundo lugar, de priorización se encuentran las vías con rutas de buses, ya que su atención para mitigar el riesgo en la circulación es prioritaria para la administración y luego todas las demás vías que se encuentran a cargo del Distrito de Medellín que está conformado por 16 comunas y 5 corregimientos.

En tercer lugar, se tiene la información de las BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE OBRA “SIRO” programa que permite consultar, priorizar,

visualizar, gestionar y presentar alternativas de intervención de acuerdo a los parámetros técnicos y sociales, según el tipo de obra o intervención que se requiera para dar solución a la necesidad.

En cuarto lugar, todas las demás vías del Distrito de Medellín, cuya problemática cause un impacto negativo sobre la circulación vehicular y deba ser atendida para evitar riesgos sobre la ciudadanía.

La Secretaría de Infraestructura Física podrá intervenir cualquier vía del Distrito de Medellín, que esté debidamente inventariada y diagnosticada en el Sistema de Gestión (SGVial) y que cumplan las características técnicas para ser atendida por este tipo de intervención, también atenderá las solicitudes registradas en el Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO) en el cual se cargan los reportes de huecos realizados por la comunidad a través de la aplicación "ReportesMed" relacionadas con el mantenimiento de las vías e infraestructura asociada; Adicionalmente, cualquier inclusión de vía, deberá estar soportada por una visita de campo realizadas por personal adscrito a la Secretaría de Infraestructura Física o la Interventoría; podrán atenderse vías cuyas condiciones puedan generar en el corto plazo riesgos o dificultades para la movilidad vehicular; las cuales deben estar soportadas por un informe técnico elaborado por la Interventoría y avalado por la Supervisión.

En aquellas vías donde al momento de realizar las intervenciones sea necesario cubrir cámaras de inspección o válvulas con el fin de mejorar la rasante del segmento vial, se deberá realizar el realce de estos elementos de acuerdo a lo estipulado en las Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín.

NOTA: La Secretaría de Infraestructura Física podrá modificar o adicionar los sitios de acuerdo con las características de las obras a intervenir y con las prioridades detectadas al momento del desarrollo del contrato y al criterio técnico; así mismo la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con herramientas de gestión que permite determinar el deterioro estructural de las diferentes vías que conforman la malla vial de la ciudad, con la cual pueden priorizarse el mantenimiento de los diferentes segmentos viales, garantizando la optimización de los recursos y la atención de vías que por decisiones técnicas en el desarrollo del mismo requieran una inversión prioritaria.

1.3. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS:

1.3.1. CONTRATO DE OBRA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105052 de 2025
OBJETO:	Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIALMED 2025: - CONSTRUCTORA PRISMA 54 S.A.S (80%) - INGEALQUIPOS S.A.S (20%)
NIT:	901.949.183

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	Diego León Puerta Villegas C.C 98.523.266 de Itagüí.
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	Transversal 33 Sur No 32D-25, Envigado Ant.
TELÉFONOS DE CONTACTO:	300-2023109
EMAIL:	admon1.vialmed2025@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21/07/2025
PLAZO INICIAL:	Cuatro (4.0) meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21/11/2025
VALOR INICIAL:	Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Tres Millones Novecientos Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta y Siete pesos Moneda Legal ($39.403.924.837) Incluido AIU DEL 27.03%, equivalentes a 27.681,015 SMLMV2025
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

1.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

NÚMERO DEL CONTRATO:	4600105322 de 2025
OBJETO:	Interventoría a la rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MED URBANO 20005377: -CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ASOCIATIVAS S.A.S (65%) -MARÍA CATALINA OCHOA ÁLVAREZ (35%)
CÉDULA O NIT:	901.964.293
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	Andrea Alzate Rendón C.C 43.184.154
DIRECCIÓN CONTRACTUAL:	CL 29 # 41-105 OF 1206
TELÉFONOS DE CONTACTO:	3146262793 - 6043205229
EMAIL:	consorciomedurbano@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21/07/2025
PLAZO INICIAL:	Ciento Treinta y Cinco (135) días calendario.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	3/12/2025
SUSPENSIONES A LA FECHA	N/A
VALOR INICIAL:	Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Millones Setecientos Setenta y Un Mil Ciento Un pesos M.L ($1.858.771.101) IVA Incluido con un factor multiplicador (FM) ajustado de 1.80
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A

2. INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA:

2.1. CONTROL DE EJECUCIÓN:

Desde el pliego de condiciones y estudios previos del proceso 0070007715 este proyecto contempla la implementación de 21 cuadrillas de trabajo para la ejecución de las actividades objeto y alcance del contrato 4600105052 de 2025, entre las cuales se encuentran principalmente: parcheo de huecos rango 0, de 0,5 a 5 ton/jornada en horario diurno, parcheo de huecos rango 1, de 9,1 a 12,5 ton/jornada en horarios diurno y nocturno, parcheo de huecos rango 2, de 12,51 a 16 ton/jornada, rango 3, de 8 a 19,99 m^3/jornada, rango 4, de 20 a 50 m^3/jornada en horarios diurno y nocturno, rehabilitación en horarios diurno y nocturno, obras complementarias, sellados de grietas, concretos, adoquines, realces, señalización vial, barandas, defensas y pasamanos.

Durante la ejecución de este tercer periodo, el Contratista de Obra ha venido implementando hasta 19 cuadrillas de trabajo, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 1. Distribución de cuadrillas

DISTRIBUCIÓN DE CUADRILLAS	
(1 al 31 de octubre de 2025)	
RANGO 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 2
RANGO 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 3
	CUADRILLA 4
	CUADRILLA 5
	CUADRILLA 6
	CUADRILLA 7
	CUADRILLA 8
	CUADRILLA 9
	CUADRILLA 11
	CUADRILLA 12
	CUADRILLA 14
RANGO 3: De 8 a 19,99 m^3/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 13
RANGO 4: De 20 a 50 m^3/Jornada. Horario diurno	CUADRILLA 21
RANGO 4: De 20 a 50 m^3/Jornada. Horario nocturno	CUADRILLA 17

MASIVO/Horario nocturno	CUADRILLA 15
	CUADRILLA 16
OBRAS COMPLEMENTARIAS	CUADRILLA 1
	CUADRILLA 10
	CUADRILLA 18
	CUADRILLA 19
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	CUADRILLA 20

La Secretaría de Infraestructura Física para el presente contrato cuenta con la implementación de uso de diferentes plataformas donde se suministra las actividades relacionadas con labores de parcheo y pavimentación de la malla vial de la ciudad. Estos aplicativos son Reportes Med, Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO), APK Gestión de Baches, Formulario Seguimiento de Baches y Sistema de Gestión Vial (SGVIAL).

La aplicación Reportes Med tiene como función el reporte que todo ciudadano puede realizar sobre el estado de las vías en Medellín y toda el área Metropolitana, solicitando así que sean atendidos baches o mantenimiento masivo de estas. Para esta app se cuenta con registro fotográfico que evidencia del estado actual de la vía y a su vez luego de realizar el reporte se genera un código Id Bache o consecutivo arrojado por esta, para que con las cuadrillas dispuestas por el contrato se de atención oportuna a la solicitud presentada por la comunidad.

Por otro lado, el Sistema de Información de Registro de Obra (SIRO), permite revisar los reportes que se encuentran ya generados por la app Reportes Med o por ella misma. En este aplicativo se evidencia además los segmentos viales donde se encuentran ubicados cada consecutivo, junto con toda la información y registro fotográfico del bache que será programado para su pronta atención. En Siro se encuentra el módulo Baches activo tanto para Interventoría como para el contratista, con el fin que ambos trabajen sobre él; la interventoría como revisor y el contratista como ejecutor de las actividades realizadas durante el contrato de mantenimiento de la malla vial.

Para el trabajo en campo, se ha dispuesto de una APK llamada Gestión de Baches donde los tecnólogos de interventoría tienen acceso a identificar los reportes en estado Aceptado o Reportado, que se encuentran en un búfer de búsqueda entre 150 m a 200 m de su lugar de ubicación. Además, esta plataforma permite que en tiempo real se cambie el estado del bache de Aceptado a Ejecutado y que al finalizar las actividades de parcheo se suba el registro fotográfico final de cada Id Bache o consecutivo trabajado en la jornada.

Para este año el contrato de mantenimiento de la malla vial de la ciudad implementó un Formulario de Seguimiento de Baches (Share Point) para que el contratista en conjunto con la interventoría ingrese toda la información relacionada con los diferentes baches que ejecuten durante la programación de obra. En este formulario se deberá registrar cada Id Siro con el Tecnólogo de Obra responsable de dicha cuadrilla, así como las cantidades y el tipo de figura trabajada en campo sea simple o compuesta. Estos datos irán a una base de datos donde la interventoría aprobará, rechazará o anulará el Id ingresado y así poder dar paso al

suministro de esta información al módulo de Baches en la plataforma SIRO por parte del contratista donde el ejecutará cada consecutivo con su respectiva cantidad en toneladas, inversión según ítem del presupuesto de obra y contrato de obra actual.

Por último, el Sistema de Gestión Vial (SGVIAL), será manejado por el contratista donde suministrará toda la información y registro fotográfico relacionado con los segmentos viales atendidos por Rango 3, Rango 4, Pavimentación y obras complementarias durante el contrato.

En cuanto a la alcaldía con la ayuda de Siro, le permite realizar un seguimiento usando el número del contrato de obra para tener conocimiento de cuantos baches son atendidos diariamente, detallando su ubicación como comuna, barrio y coordenadas; además de contar con un registro fotográfico del estado en cómo queda la vía después de la actividad realizada.

La supervisión del contrato informa al contratista y a la interventoría que todos los baches que se realicen en campo deben contar con ID Siro, es por esto que los baches que no cuenten con este consecutivo se deberán crear en la plataforma Reportes Med con el correo creado por la interventoría "*consorciomedurbano@gmail.com"* para dicha solicitud.

Para el inicio del contrato se cuenta con una base de datos entregada por el contratista que fue exportada por la plataforma SIRO con un total de dos mil quinientos sesenta y cuatro (2564) baches en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. Este reporte fue generado con datos entre el 1 de enero al 8 de julio del presente año. En el mes de **septiembre de 2025** se han logrado ejecutar 1138 baches en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín, y un acumulado de 2453 baches.

Se genera el reporte en Siro para el periodo de **octubre de 2025**, dando el siguiente consolidado por comunas.

Tabla 2 Resumen reportes en SIRO de **octubre de 2025**

ZONA	COMUNA/BARRIO		REPORTES	REPORTES	Período octubre 2025	Total, Reportes Acumulados Mes a Mes	Total, Reportes Acumulados Ejecutados	Total, Reportes Activos
			Enero - Jul 2025	oct-25	Ejecutados			
1	1	Popular	107	68	49	304	135	169
	2	Santa Cruz	79	104	84	330	214	116
	3	Manrique	199	188	145	666	191	475
	4	Aranjuez	62	33	25	214	119	95
2	5	Castilla	200	23	0	312	118	194
	6	Doce de Octubre	75	51	55	157	65	92
	7	Robledo	195	97	86	451	272	179
3	8	Villa Hermosa	140	102	66	375	153	222
	9	Buenos Aires	125	30	5	254	79	175
	10	La Candelaria	274	122	81	648	303	345
4	11	Laureles-Estadio	113	56	35	340	208	132
	12	La América	70	23	26	202	123	79
	13	San Javier	78	72	51	261	121	140

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5	**14**	EL Poblado	269	186	100	704	359	345
6	**15**	Guayabal	100	91	66	389	279	110
	16	Belén	256	79	65	681	369	312
Corregimientos y veredas	**50**	San Sebastián de Palmitas	5	1	0	9	0	9
	60	San Cristóbal	91	30	5	223	65	158
	70	AltaVista	35	5	0	147	88	59
	80	San Antonio de Prado	65	105	119	288	220	68
	90	Santa Elena	26	14	1	70	36	34
		Total=	**2564**	**1480**	**1064**	**7025**	**3517**	**3508**

A corte del **31/10/2025** se cuenta con la siguiente distribución de cuadrillas implementadas:

Tabla 3 Distribución cuadrillas **octubre de 2025**

Tipo de Intervención	# Cuadrillas	En ejecución mes de septiembre 2025
Rango 0 (de 0,5 a 5 Ton/Jornada)	1	Diurna: C2
Rango 1 (de 9,1 a 12,5 Ton/jornada)	10	Diurnas C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C11, C12, C14
Rango 3 (de 8 a 19,99 m^3/jornada)	1	Diurnas: C13
Rango 4 (de 20 a 50 m^3/jornada)	2	Diurnas: C21
		Nocturna: C17
Masivos	2	Nocturna: C15, C16
Obras complementarias	4	Diurna: C1, C10, C18, C19
Señalización Horizontal	1	C20
Total, Cuadrillas	**21**	**Cuadrillas**

A continuación, se relaciona la programación diaria de las cuadrillas dispuestas entre el 01 y el 31 de octubre de 2025:

Tabla 4 Programación diaria de cuadrillas:

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
1/01/1900	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157240	2000753	AV 80 ENTRE CL 35 Y CL 37	12	SIMÓN BOLIVAR
1/01/1900	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	4001834	CR 42B CON CL 107	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
1/01/1900	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	2000640	CL 30 ENTRE CR 48 Y CR 50	10	PERPETUO SOCORRO
1/01/1900	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158036	2001452	CR 55 35 - 198 (GLORIETA EXPOSICIONES)	10	PERPETUO SOCORRO
1/01/1900	6	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	154624	5009419	CL 2B 75D - 30	16	LA MOTA
1/01/1900	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161958	5006677	CL 99 75 - 56	6	PEDREGAL
1/01/1900	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158759	4004185	CR 41 59 - 38	10	LOS ÁNGELES
1/01/1900	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161983	4004299	CR 83 20 - 17	16	ALTAVISTA
1/01/1900	11	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	158238	5019093	CL 57B 101A - 68	7	OLAYA HERRERA
1/01/1900	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	6000679	CL 41B SUR 59 - 30	80	SAN ANTONIO DE PRADO
1/01/1900	13	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CR 99 Y CL 100	2	MOSCÚ No. 1
1/01/1900	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 26C CON CL 97BB	1	LA ESPERANZA
1/01/1900	15	NOCTURNA	120	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
1/01/1900	16	NOCTURNA	90	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA
1/01/1900	17	DIURNA	74	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 46A ENTRE CL 94 Y # 94 - 35	4	BERLÍN
1/01/1900	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74B - 176 Y MURO EN PICACHITO	16	ROSALES
1/01/1900	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
1/01/1900	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 5 SUR CON CR 43A	14	LOS BALSOS No. 2
1/01/1900	21	DIURNA	95	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 87B ENTRE CL 47 Y CL 47A	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
2/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161893	5005118	AV 80 ENTRE CL 37 Y CL 44	12	SIMÓN BOLIVAR
2/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	115940	4002204	CR 46A CL 111	1	POPULAR
2/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	2000964	CL 37 ENTRE CR 55 Y 63	10	ALPUJARRA
2/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	159979	5008487	CR 54 60 - 76	10	JESÚS NAZARENO
2/10/2025	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	4001198	CL 3 78B - 16	16	EL RICÓN
2/10/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151657	4000227	CR 72 CON CL 98	6	LA ESPERANZA
2/10/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5013252	CR 32 84 -38	3	LAS GRANJAS
2/10/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	159469	5008971	CR 82A 20A - 55	16	ALTAVISTA
2/10/2025	11	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	160059	5019093	CL 57B 101A - 40	7	OLAYA HERRERA
2/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	162046	6000258	CR 79 CON CL 38 SUR	80	SAN ANTONIO DE PRADO
2/10/2025	13	DIURNA	30	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CR 99 Y CL 100	2	MOSCÚ No. 1
2/10/2025	14	DIURNA	30	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
2/10/2025	15	NOCTURNA	180	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
2/10/2025	16	NOCTURNA	150	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CL 44	10	GUAYAQUIL
2/10/2025	17	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 13 ENTRE CL 52 Y CL 53	8	VILLATINA
2/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74B - 176 Y MURO EN PICACHITO	16	ROSALES
2/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
2/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA
2/10/2025	21	DIURNA	115	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 87 Y CR 87B	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
3/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5000260	CR 43A CON CL 30 Y MITIGACIONES EN CR 43A ENTRE CL 10 Y CL 33	10	PERPETUO SOCORRO
3/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5001669	CR 45 ENTRE CL 100 Y CL 101	1	MOSCÚ No. 2
3/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	2000964	CL 37 ENTRE CR 55 Y 63	10	ALPUJARRA
3/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158201	5008506	CR 56 62 - 10	10	EL CHAGUALO
3/10/2025	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	153463	4001198	CL 3 ENTRE CR 78B Y CR 79	16	EL RINCÓN
3/10/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162125	4000125	CR 74 96 - 46	6	LA ESPERANZA
3/10/2025	8	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161377	5011293	CL 48B 14A - 20	9	LOS CERROS EL VERGEL
3/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5009117	CR 82A 28 - 16	16	LA PALMA
3/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	152773	5018414	CL 55 99 - 74	7	OLAYA HERRERA
3/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	76539	6000354	CR 67 54 SUR - 20	80	SAN ANTONIO DE PRADO
3/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CR 99 Y CL 100	2	MOSCÚ No. 1
3/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
3/10/2025	15	NOCTURNA	180	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
3/10/2025	16	NOCTURNA	150	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CL 44	10	GUAYAQUIL
3/10/2025	17	NOCTURNA	115	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 53 ENTRE CR 13 Y CR 15	8	VILLATINA
3/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74B - 176 Y MURO EN PICACHITO	16	ROSALES
3/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
3/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA
3/10/2025	21	DIURNA	115	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 87 Y CR 87B	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
4/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74D - 35	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
4/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74E - 78	16	ROSALES

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
6/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	143247	2000258	CR 43A ENTRE CL 25A Y CL 29	14	CASTROPOL
6/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5001669	CL 100 45 - 08	1	MOSCÚ No. 2
6/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	2000964	CL 37 ENTRE CR 55 Y 63	10	ALPUJARRA
6/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160051	5008625	CR 42 CON CL 58	10	LOS ÁNGELES
6/10/2025	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	1555540	4001197	CR 72 2B - 29	16	EL RINCÓN
6/10/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	150546	5006682	CL 99 74 - 74	6	PEDREGAL
6/10/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5013252	CR 32 84 -38	3	LAS GRANJAS
6/10/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162208	4002825	CL 28 81A - 30	16	LA PALMA
6/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	162206	5004491	CL 49A 97A - 16	13	LA PRADERA
6/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	157707	6000640	CR 55 54A SUR - 6	80	SAN ANTONIO DE PRADO
6/10/2025	13	DIURNA	37	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 99 Y CL 100	2	MOSCÚ No. 1
6/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
6/10/2025	15	NOCTURNA	170	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
6/10/2025	16	NOCTURNA	140	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CL 44	10	GUAYAQUIL
6/10/2025	17	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 13 ENTRE CL 52 Y CL 53	8	VILLATINA
6/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 49B ENTRE CL 105 Y CL 107	2	ANDALUCÍA
6/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74E - 78	16	ROSALES
6/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
6/10/2025	21	DIURNA	115	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
7/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 44 CON CL 25	14	BARRIO COLOMBIA
7/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	150676	5018013	CL 124 50B - 38	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
7/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 44 CR 60 Y CR 63D	10	CORAZÓN DE JESÚS
7/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161461	4004173	CL 54 41 - 77	10	BOSTON
7/10/2025	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158154	4003317	CL 9 SUR ENTRE CR 55D Y CR 59	16	LA COLINA
7/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5014062	CL 98C 84 - 31	6	PICACHO
7/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160924	4001895	CR 32 CON CL 75D	3	EL RAIZAL
7/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	4001099	CL 18 SUR ENTRE CR 24 Y CR 25B	14	SAN LUCAS
7/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	160556	4000358	CR 87 48A - 25	13	LOS ALCÁZARES
7/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	160658	-	CR 68 64 SUR - 17	80	SAN ANTONIO DE PRADO
7/10/2025	13	DIURNA	35	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 99 ENTRE CR 46B Y CR 47B	2	MOSCÚ No. 1
7/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
7/10/2025	15	NOCTURNA	180	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
7/10/2025	16	NOCTURNA	130	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CL 44	10	GUAYAQUIL
7/10/2025	17	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 13 ENTRE CL 52 Y CL 53	8	VILLATINA
7/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 49B ENTRE CL 105 Y CL 107	2	ANDALUCÍA
7/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74E - 78 Y CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A (LOS MANGOS)	16	ROSALES
7/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA
7/10/2025	21	DIURNA	115	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
8/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 44 ENTRE CL 24 Y CL 25	14	BARRIO COLOMBIA
8/10/2025	3	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151684	5018013	CL 124 50BB - 10	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
8/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 44 CR 60 Y CR 63D	10	CORAZÓN DE JESÚS
8/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161461	4004173	CL 54 41 - 77	10	BOSTON
8/10/2025	6	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	7000025	CL 9B SUR 82 - 07	16	LA HONDONADA
8/10/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160826	4000225	CR 72 95 - 135	6	LA ESPERANZA
8/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5002551	CL 68 43 - 16	3	MANRIQUE CENTRAL No. 2
8/10/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162350	4001099	CL 18 SUR 24 - 136	14	SAN LUCAS
8/10/2025	10	DIURNA	-	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 26C CON CL 99B	1	LA ESPERANZA
8/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	141344	5016450	CL 49A CON CR 99C	13	JUAN XXIII LA QUIEBRA
8/10/2025	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 67A 64 SUR - 17		SAN ANTONIO DE PRADO
8/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 99 ENTRE CR 46B Y CR 47B	2	MOSCÚ No. 1
8/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
8/10/2025	15	NOCTURNA	200	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
8/10/2025	16	NOCTURNA	120	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CL 44	10	GUAYAQUIL
8/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 49B ENTRE CL 105 Y CL 107	2	ANDALUCÍA
8/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
8/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA
8/10/2025	21	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
9/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 43 CON CL 33	10	SAN DIEGO
9/10/2025	3	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	150676	5018013	CL 124 50B - 38	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
9/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 44 ENTRE CR 60 Y CR 63D	10	CORAZÓN DE JESÚS
9/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160297	4004991	CL 62D 110 - 188	7	SANTA MARGARITA
9/10/2025	6	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	159874	4003319	CL 9 SUR ENTRE CR 55D Y CL 6 SUR	15	EL RODEO
9/10/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	141272	5009811	CR 71A 95A - 66	5	CASTILLA
9/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161062	5002332	CL 67 36A - 09	3	MANRIQUE ORIENTAL
9/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162454	5003375	CL 9B SUR 25 - 10	14	LOS BALSOS No. 1
9/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	141345	5016461	CL 49 99B - 20	13	JUAN XXIII LA QUIEBRA
9/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	160658	-	CR 68 64 SUR - 20	80	SAN ANTONIO DE PRADO
9/10/2025	13	DIURNA	30	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 99 ENTRE CR 46B Y CR 47B	2	MOSCÚ No. 1
9/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
9/10/2025	15	NOCTURNA	210	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
9/10/2025	16	NOCTURNA	150	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
9/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74D - 35	16	ROSALES
9/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
9/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA
9/10/2025	21	DIURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
10/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	154423	4003094	AV 80 CON CL 25	16	LA GLORIA
10/10/2025	3	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162380	5018012	CL 124 CON CR 50 BB	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
10/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160354	1000112	CL 58 ENTRE CR 57 Y CR 63	10	EL CHAGUALO
10/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158201	5008506	CR 56 62 - 10	10	EL CHAGUALO
10/10/2025	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	2001123	CL 2 SUR CON CR 65	15	EL RODEO
10/10/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162506	5007029	CR 71A 94 - 89	5	CASTILLA
10/10/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151363	5002863	CR 51A 93 - 36	4	SAN ISIDRO
10/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162458	5003375	CL 9B SUR 25 - 149	14	LOS BALSON No. 1
10/10/2025	10	DIURNA	-	-	-	-	5001257	CR 71 ENTRE CL 32B Y AV BOLIVARIANA	16	ROSALES
10/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	141345	5016461	CL 49 99B - 20	13	JUAN XXIII LA QUIEBRA
10/10/2025	12	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	161004	6000424	CL 48 SUR CON CR 62A	80	SAN ANTONIO DE PRADO
10/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 99 ENTRE CR 47 Y CR 48	2	MOSCÚ No. 1
10/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
10/10/2025	16	NOCTURNA	140	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
10/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74D - 35	16	ROSALES
10/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
10/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA
10/10/2025	21	DIURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
11/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74D - 35	16	ROSALES
11/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
14/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	93829	5003750	CR 42B ENTRE CL 31 Y CL 33	10	SAN DIEGO
14/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157354	2000085	CR 52 120 - 6	2	LA FRONTERA
14/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160354	1000112	CL 58 ENTRE CR 57 Y CR 63	10	EL CHAGUALO
14/10/2025	5	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	155358	6000189	CL 42 SUR 75B - 17	80	SAN ANTONIO DE PRADO
14/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	152683	5001126	CR 80A 28 - 117	16	LA PALMA
14/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	139561	2001512	CL 68 CON CR 86	7	PALENQUE
14/10/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160665	4002187	CR 43 81 - 80	3	CAMPO VALDÉS No. 2
14/10/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162572	5003373	CL 9A SUR 29 - 29	10	LOS BALSOS No. 1
14/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	162600	5004493	CL 49 99- 36	13	JUAN XXIII LA QUIEBRA
14/10/2025	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	155350	60000292	CR 73 42 SUR - 05	80	SAN ANTONIO DE PRADO
14/10/2025	13	DIURNA	30	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158317	5002370	CR 47BENGTRE CL 98A Y CL 99	2	MOSCÚ No. 1
14/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
14/10/2025	15	NOCTURNA	130	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
14/10/2025	16	NOCTURNA	180	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
14/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74D - 35	16	ROSALES
14/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
14/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
14/10/2025	21	DIURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
15/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151947	4003031	CR 43 ENTRE CL 30C Y CL 31	10	SAN DIEGO
15/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	145634	2000085	CR 52 120 - 26	2	LA FRONTERA
15/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160354	1000112	CL 58 ENTRE CR 57 Y CR 63	10	EL CHAGUALO
15/10/2025	5	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162309	6000728	CR 69 35A SUR - 47	80	SAN ANTONIO DE PRADO
15/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161660	5000446	CR 57 4 - 108	15	CAMPO AMOR
15/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	140585	2001515	CL 68 CON CR 89	7	PALENQUE
15/10/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	159347	5013425	CR 35 CON CL 70	3	MANRIQUE ORIENTAL
15/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162722	5003341	CR 29 9A SUR - 50	10	LOS BALSOS No. 1
15/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	5004493	CL 49 99 - 66	13	JUAN XXIII LA QUIEBRA
15/10/2025	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	155350	60000292	CR 73 42 SUR - 05	80	SAN ANTONIO DE PRADO
15/10/2025	13	DIURNA	30	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158317	5002370	CR 47B ENTRE CL 98A Y CL 99	2	MOSCÚ No. 1
15/10/2025	14	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23B ENTRE CL 84B Y CL 87	3	BELLO ORIENTE
15/10/2025	15	NOCTURNA	110	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
15/10/2025	16	NOCTURNA	150	SMA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
15/10/2025	17	NOCTURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 52 ENTRE CL 7 Y CL 10 (COSTADO OCCIDENTAL)	15	CAMPO AMOR
15/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74D - 35	16	ROSALES
15/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
15/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
15/10/2025	21	DIURNA	106	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
16/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5000833	TV 39A CON CL 33A	11	LAURELES
16/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5013502	CL 125 51D - 12	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
16/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157569	2001571	CL 67 ENTRE CR 57 Y CR 64	5	CARIBE
16/10/2025	5	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161679	6000753	CR 67 40A SUR - 41	80	SAN ANTONIO DE PRADO
16/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5000463	CL 2 CON CR 55	15	CRISTO REY
16/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	140585	2001515	CL 68 CON CR 89	7	PALENQUE
16/10/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	152827	5002324	CR 38 67 - 32	3	MANRIQUE ORIENTAL
16/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	154477	5009898	CR 16 12 SUR - 65	10	LOS BALSOS No. 1
16/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	5004493	CL 49 99 - 19	13	JUAN XXIII LA QUIEBRA
16/10/2025	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	155350	60000292	CR 73 42 SUR - 05	80	SAN ANTONIO DE PRADO
16/10/2025	13	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158317	5002370	CR 47B ENTRE CL 98A Y CL 99	2	MOSCÚ No. 1
16/10/2025	14	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 107FF - 64	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
16/10/2025	15	NOCTURNA	140	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
16/10/2025	16	NOCTURNA	130	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
16/10/2025	17	NOCTURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 52 ENTRE CL 7 Y CL 10 (COSTADO OCCIDENTAL)	15	CAMPO AMOR
16/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F 74D - 35	16	ROSALES
16/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
16/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
16/10/2025	21	DIURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 47D ENTRE CR 82 Y CR 87	12	LA FLORESTA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
17/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151497	4003031	CR 43 ENTRE CL 30C Y CL 31	10	SAN DIEGO
17/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5013502	CL 125 51D - 12	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
17/10/2025	4	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157569	2001571	CL 67 ENTRE CR 57 Y CR 64	5	CARIBE
17/10/2025	5	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	154779	7000759	CR 78A 45 SUR - 145	80	SAN ANTONIO DE PRADO
17/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5000422	CR 54 ENTRE CL 3 Y CL 4	15	CAMPO AMOR
17/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161840	2001517	CR 89 65 - 60	7	CUCARACHO
17/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160680	4004181	CR 43 60 - 82	8	SAN MIGUEL
17/10/2025	9	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	159081	5016538	CL 39BF 113B - 27	13	LAS INDEPENDENCIAS
17/10/2025	11	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	162207	5004391	CR 87 49C - 8	13	LOS ALCÁZARES
17/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	159019	6000269	CL 56 SUR 68A - 4	80	SAN ANTONIO DE PRADO
17/10/2025	13	DIURNA	4	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	158317	5002370	CR 47B ENTRE CL 98A Y CL 99	2	MOSCÚ No. 1
17/10/2025	14	DIURNA	40	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 107FF - 64	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
17/10/2025	15	NOCTURNA	130	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
17/10/2025	16	NOCTURNA	110	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
17/10/2025	17	NOCTURNA	100	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 52 ENTRE CL 7 Y CL 10 (COSTADO OCCIDENTAL)	15	CAMPO AMOR
17/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F CON TV 32E	16	ROSALES
17/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
17/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
17/10/2025	21	DIURNA	115	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	80581	5016265	CL 48DD ENTRE CR 99B Y CR 99C	13	JUAN XXIII LA QUIEBRA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
18/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F CON TV 32E	16	ROSALES
18/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
20/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162784	5007766	CR 42 39A - 26	10	SAN DIEGO
20/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 123A 51AA - 10	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
20/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23 56EH - 200	8	TRECE DE NOVIEMBRE
20/10/2025	5	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	143146	7001401	CR 88 36 SUR - 53	80	SAN ANTONIO DE PRADO / POTRERITO
20/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161671	4001191	CR 79 CON CL 1 SUR	16	EL RINCÓN
20/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157289	5006980	CR 73 CON CL 96	7	LA ESPERANZA
20/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	150845	5003232	CL 83 49 - 6	4	BRASILIA
20/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	3000471	CR 22 12 SUR - 145	14	LOS BALSON No. 1
20/10/2025	11	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	157936	5004618	CL 48A 84A - 15	13	LOS ALCÁZARES
20/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	145475	7001614	CL 56 SUR CON CR 75	80	SAN ANTONIO DE PRADO / LA FLORIDA
20/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 92C ENTRE CR 32 Y CR 36	3	LA SALLE
20/10/2025	14	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 107FF - 64	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
20/10/2025	15	NOCTURNA	160	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
20/10/2025	16	NOCTURNA	140	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
20/10/2025	17	NOCTURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 52 ENTRE CL 7 Y CL 10 (COSTADO OCCIDENTAL)	15	CAMPO AMOR
20/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F CON TV 32E	16	ROSALES
20/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
20/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
20/10/2025	21	DIURNA	115	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 37 ENTRE CR 93 Y CR 93A CL 38 CON CR 94	12	SANTA MÓNICA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
21/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5007765	CL 39D 40 - 40	10	LAS PALMAS
21/10/2025	3	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 51B 125 - 51	2	PLAYÓN DE LOS COMUNEROS
21/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 23 56EH - 200	8	TRECE DE NOVIEMBRE
21/10/2025	5	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	145471	7000660	CL 35 SUR 88 - 327	80	SAN ANTONIO DE PRADO
21/10/2025	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	152225	5001337	CL 33 63B - 15	16	CERRO NUTIBARA
21/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162506	5007029	CR 71A 94 - 89	5	CASTILLA
21/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157433	3000376	CR 49 76 - 67	4	BRASILIA
21/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162403	4001387	CR 44 28 - 4	14	BARRIO COLOMBIA
21/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	140444	5005944	CL 54 82B - 30	13	EL PESEBRE
21/10/2025	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	56000294	CL 40A SUR CON CR 67	80	SAN ANTONIO DE PRADO
21/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 92C ENTRE CR 32 Y CR 36	3	LA SALLE
21/10/2025	14	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 107FF - 64	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
21/10/2025	15	NOCTURNA	140	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
21/10/2025	16	NOCTURNA	130	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
21/10/2025	17	NOCTURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 52 ENTRE CL 7 Y CL 10 (COSTADO OCCIDENTAL)	15	CAMPO AMOR
21/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F CON TV 32E	16	ROSALES
21/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
21/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
21/10/2025	21	DIURNA	80	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 37 ENTRE CR 93 Y CR 93A CL 38 CON CR 94	12	SANTA MÓNICA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
22/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	159406	5003406	CR 29 CON CL 4	14	EL TESORO
22/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	153238	2000085	CR 52 120A - 63	2	LA FRONTERA
22/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 17B 56EE - 09	8	TRECE DE NOVIEMBRE
22/10/2025	5	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161734	6000669	CL 47 SUR 55 - 33	80	SAN ANTONIO DE PRADO
22/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163065	5000425	CR 54 CON CL 6	15	CAMPO AMOR
22/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161840	2001517	CR 89 65 - 60	7	CUCARACHO
22/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	153639	4002166	CR 43A 75 - 28	3	EL POMAR
22/10/2025	9	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	4001374	CL 24 CON CR 44	14	BARRIO COLOMBIA
22/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	160054	5006088	CR 81 CON CL 52B	12	FERRINI
22/10/2025	12	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 40A SUR CON CR 69	80	SAN ANTONIO DE PRADO
22/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 92C ENTRE CR 32 Y CR 36	3	LA SALLE
22/10/2025	14	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 ENTRE CL 107FF Y CL 108	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
22/10/2025	15	NOCTURNA	140	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
22/10/2025	16	NOCTURNA	130	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
22/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F CON TV 32E	16	ROSALES
22/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
22/10/2025	20	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
22/10/2025	21	DIURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 37 ENTRE CR 93 Y CR 93A CL 38 CON CR 94	12	SANTA MÓNICA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
23/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	137700	5017851	CR 17A 56H - 02	8	TRECE DE NOVIEMBRE
23/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	155376	5019065	CR 24 72 - 129	3	LA CRUZ
23/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 18 ENTRE CL 56EE Y CL 56EF	8	TRECE DE NOVIEMBRE
23/10/2025	5	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	159483	5001597	CR 71 5 - 21	11	BOLIVARIANA
23/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162708	2000802	CR 65 ENTRE CL 5 Y CL 6	15	CAMPO AMOR
23/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	C L 80A ENTRE CL 95AA Y CL 96	7	AURES No. 2
23/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157446	5002662	CL 68 48 - 48	4	MANRIQUE CENTRAL No. 1
23/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151028	5017820	CL 71B 24B - 10	3	VERSALLES No. 2
23/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	161157	5017820	CL 71B 24B - 46	3	VERSALLES No. 2
23/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	7000781	CR 75 CON CL 56 SUR	80	SAN ANTONIO DE PRADO
23/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 92C ENTRE CR 32 Y CR 36	3	LA SALLE
23/10/2025	14	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 ENTRE CL 107FF Y CL 108	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
23/10/2025	15	NOCTURNA	140	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
23/10/2025	16	NOCTURNA	90	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
23/10/2025	17	DIURNA	12	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	162961	5000464	CL 2 ENTRE CR 54 Y CR 555	15	CAMPO AMOR
23/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 32F CON TV 32E	16	ROSALES
23/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
23/10/2025	20	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
23/10/2025	21	DIURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43 ENTRE CL 63A Y CL 65	8	LA MANSIÓN

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
24/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	137700	5017851	CR 17A 56H - 02	8	TRECE DE NOVIEMBRE
24/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	149747	5019065	CR 24 72 - 130	3	LA CRUZ
24/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 18 ENTRE CL 56EE Y CL 56EF	8	TRECE DE NOVIEMBRE
24/10/2025	5	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162084	5004297	CL 42A CON CR 68A	11	SAN JOAQUIN
24/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162961	5000464	CL 2 55 - 4	15	CAMPO AMOR
24/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162938	5015376	CR 95 89 - 26	7	AURES No. 2
24/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5003145	CR 50 72 - 64	4	SAN PEDRO
24/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163203	-	CR 24BD 71 - 15	3	VERSALLES No. 2
24/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	163193	5017820	CL 71B 24B - 18	3	VERSALLES No. 2
24/10/2025	12	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 63 51A SUR - 08	80	SAN ANTONIO DE PRADO
24/10/2025	13	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 92C ENTRE CR 32 Y CR 36	3	LA SALLE
24/10/2025	14	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 ENTRE CL 107FF Y CL 108	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
24/10/2025	15	NOCTURNA	160	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
24/10/2025	16	NOCTURNA	100	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
24/10/2025	17	DIURNA	105	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	*	-	CR 15 19 SUR - 297	90	LAS PALMAS
24/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	DG 75B 32D - 46	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
24/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
24/10/2025	20	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 48 ENTRE CL 16 SUR Y 17A SUR	14	SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
24/10/2025	21	DIURNA	106	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43 ENTRE CL 63A Y CL 65	8	LA MANSIÓN

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
25/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	DG 75B 32D - 46	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
25/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
27/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163241	5011548	CL 56H ENTRE CR 17 Y CR 18C	8	TRECE DE NOVIEMBRE
27/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	149936	5012667	CR 24 72 - 172	3	LA CRUZ
27/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR18A 56 - EC	8	TRECE DE NOVIEMBRE
27/10/2025	5	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162698	5000827	DG 75B 33A - 70	11	LAURELES
27/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 7 ENTRE CR 58 Y CR 65	15	CAMPO AMOR
27/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	4003338	CR 76 91A - 55	7	KENNEDY
27/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151252	2002341	CR 44 ENTRE CL 69 Y CL 70	3	MANRIQUE CENTRAL No. 2
27/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162796	-	CR 24BD 71 - 26	3	VERSALLES No. 2
27/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	163263	5019064	CL 71B 24BD - 56	3	VERSALLES No. 2
27/10/2025	12	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 103 CON CR 36BB	1	GRANIZAL
27/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 59A CR 31 Y CR 32	8	ENCISO / LA LADERA
27/10/2025	14	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	162204	3000349	CR 28 ENTRE CL 107FF Y CL 108	1	SANTO DOMINGO SAVIO No. 1
27/10/2025	15	NOCTURNA	180	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
27/10/2025	16	NOCTURNA	100	MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
27/10/2025	17	DIURNA	105	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	*	-	CR 15 19 SUR - 297	90	LAS PALMAS
27/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	DG 75B 32D - 46	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
27/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
27/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
27/10/2025	21	DIURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43 ENTRE CL 63A Y CL 65	8	LA MANSIÓN

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
28/10/2025	1	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 30 CON CR 89DB	16	LAS VIOLETAS
28/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163241	5011548	CL 56H ENTRE CR 17 Y CR 18C	8	TRECE DE NOVIEMBRE
28/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.				3	LA CRUZ
28/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.				8	TRECE DE NOVIEMBRE
28/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 58 ENTRE CR 50C Y CR 51 CR 50A ENTRE CL 58 Y CL 59	10	PRADO
28/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.				15	CAMPO AMOR
28/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.				7	CUCARACHO
28/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.				3	LAS GRANJAS
28/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.				3	VERSALLES No. 2
28/10/2025	10	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 38 Y CR 40	10	EL POBLADO
28/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.				3	VERSALLES No. 2
28/10/2025	12	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 103 CON CR 36BB	1	GRANIZAL
28/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 59A CR 31 Y CR 32	8	ENCISO / LA LADERA
28/10/2025	14	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	155893	4001685	CR 33D 101 - 164	1	GRANIZAL
28/10/2025	15	NOCTURNA		MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
28/10/2025	16	NOCTURNA		MAM-25	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
28/10/2025	17	DIURNA	80	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	*	-	CR 15 19 SUR - 297	90	LAS PALMAS
28/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	DG 75B 32D - 46	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
28/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
28/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
28/10/2025	21	NOCTURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL80 ENTRE CR 86A Y CR 88	7	EL DIAMANTE
28/10/2025	22	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
29/10/2025	1	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 30 CON CR 89DB	16	LAS VIOLETAS
29/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163241	5011548	CL 56H ENTRE CR 17 Y CR 18C	8	TRECE DE NOVIEMBRE
29/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	149437	5019066	CR 24 72 - 152	3	LA CRUZ
29/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 17B CON CL 56EE	8	TRECE DE NOVIEMBRE
29/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 67 ENTRE CR 57 Y CR 63	4	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
3/01/1900	6	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	157491	5019546	CR 43G 19 - 142	10	VILLA CARLOTA
29/10/2025	7	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	88731	4003337	CR 76 91 - 04	7	KENNEDY
29/10/2025	8	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5013138	CR 32 91 - 52	3	LA SALLE
29/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163412	-	CR 24BD 71 - 15	3	VERSALLES No. 2
29/10/2025	10	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 38 Y CR 40	10	EL POBLADO
29/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	161161	5025029982	TV 71AB 71B - 2	3	VERSALLES No. 2
29/10/2025	12	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	163400	5001965	CL 103 36BB - 17	1	GRANIZAL
29/10/2025	13	DIURNA	45	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 59A CR 31 Y CR 32	8	ENCISO / LA LADERA
29/10/2025	14	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	155893	4001685	CR 33D 101 - 164	1	GRANIZAL
29/10/2025	15	NOCTURNA	180	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
29/10/2025	16	NOCTURNA	115	SMA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
29/10/2025	17	DIURNA	70	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	*	-	CR 15 19 SUR - 297	90	LAS PALMAS
29/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	DG 75B 32D - 46	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
29/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
29/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
29/10/2025	21	NOCTURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL80 ENTRE CR 86A Y CR 88	7	EL DIAMANTE
29/10/2025	22	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 36 Y CR 42	14	MANILA

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
30/10/2025	1	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 30 CON CR 89DB	16	LAS VIOLETAS
30/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163241	5011548	CL 56H ENTRE CR 17 Y CR 18C	8	TRECE DE NOVIEMBRE
30/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	5012667	CR 24 72 - 143	3	LA CRUZ
30/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 17B CON CL 56EE	8	TRECE DE NOVIEMBRE
30/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 67 ENTRE CR 57 Y CR 63	4	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
30/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 55 CON CL 5	15	CAMPO AMOR
30/10/2025	7	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163499	5006997	CR 72B 95 - 55	6	LA ESPERANZA
30/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161016	3000426	CR 39 75 - 23	3	EL POMAR
30/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	151022	-	CR 24BD 71 - 43	3	VERSALLES No. 2
30/10/2025	10	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 38 Y CR 40	10	EL POBLADO
30/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	161173	5019064	CL 71B 24BD - 120	3	VERSALLES No. 2
30/10/2025	12	DIURNA	11	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	151132	4001693	CR 37A 104-06	1	GRANIZAL
30/10/2025	13	DIURNA	30	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 59A CR 31 Y CR 32	8	ENCISO / LA LADERA
30/10/2025	14	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161860	5001976	CL 101C CON CR 33E	1	GRANIZAL
30/10/2025	15	NOCTURNA	120	MSC-19 + FIBRA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 43A ENTRE CL 7D Y CL 10	14	ASTORGA
30/10/2025	16	NOCTURNA	130	SMA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
30/10/2025	17	DIURNA	111	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	*	-	CR 16 12 SUR - 170	90	LAS PALMAS
30/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	DG 75B 32D - 46	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
30/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
30/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
30/10/2025	21	NOCTURNA	90	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL80 ENTRE CR 86A Y CR 88	7	EL DIAMANTE

FECHA (DD/MM/AAAA	CUADRILLA	JORNADA (DIURNA/ NOCTURNA)	TON	TIPO DE MEZCLA	PLANTA	ID - SIRO	CÓDIGO SEGMENTO VIAL	LOCALIZACION / DIRECCION (INICIO LABORES o PRINCIPAL)	COMUNA	BARRIO
31/10/2025	1	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 30 CON CR 89DB	16	LAS VIOLETAS
31/10/2025	2	DIURNA	5	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	DG 75 CR 70A-14	11	LAURELES
31/10/2025	3	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	161126	5012666	CR 24 75C - 18	3	LA CRUZ
31/10/2025	4	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 17B 56E - 62	8	TRECE DE NOVIEMBRE
31/10/2025	5	NOCTURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 45 CON CR 65 Y Cr 68 (CALZADA SUR) CL 47D CON CR 68A	11	NARANJAL
31/10/2025	6	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 5A CON CR 58	15	CAMPO AMOR
31/10/2025	7	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	163499	5006997	CR 72B 95 - 55	6	LA ESPERANZA
31/10/2025	8	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 39 84 - 39	3	LAS GRANJAS
31/10/2025	9	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CR 24BD 71 - 115	3	VERSALLES No. 2
31/10/2025	10	DIURNA	-	-	-	-	-	CL 10A ENTRE CR 38 Y CR 40	10	EL POBLADO
31/10/2025	11	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 71B 24D-156	3	VERSALLES No. 2
31/10/2025	12	DIURNA	12	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CL 93B CON CR 35	3	LA SALLE
31/10/2025	13	DIURNA	40	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	-	-	CL 59A CR 31 Y CR 32	8	ENCISO / LA LADERA
31/10/2025	14	DIURNA	10	MDC-19 (TIBIA) + RAP	PROCOPAL S.A.	160791	4001847	CL118 42B- 12	1	POPULAR
31/10/2025	16	NOCTURNA	125	SMA	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
31/10/2025	17	DIURNA	10	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	*	-	CL 17 SUR CON CR 43A	14	EL DIAMANTE No. 2
31/10/2025	18	DIURNA	-	-	-	-	-	DG 75B 32D - 46	16	EL NOGAL - LOS ALMENDROS
31/10/2025	19	DIURNA	-	-	-	-	-	CR 21 ENTRE CL 59 Y CL 59A	8	LOS MANGOS
31/10/2025	20	NOCTURNA	-	-	-	-	-	CR 55 CON CL 44	10	GUAYAQUIL
31/10/2025	21	NOCTURNA	110	MSC-19 (TIBIA) + RAP	PAVIMENTAR S.A.	-	-	CR 92 ENTRE CL 90 Y CL 92	7	AURES No. 2

Durante el mes de **octubre de 2025** la supervisión ha enviado correos electrónicos al email registrado de la interventoría, así como mensajes al chat de WhatsApp de la dirección del mismo, solicitando la atención de baches que requieren atención de forma inmediata.

Estos reportes son el punto de partida de cada una de las jornadas de las cuadrillas vinculadas al proyecto, y son la base para la realización de las actividades en las diferentes comunas, que se deben ir ampliando de acuerdo con los reportes de SIRO y la inspección que hacen los tecnólogos en campo.

En este periodo se atendieron los siguientes baches mediáticos:

Tabla 5 atención de baches mediáticos



CR 38 # 7A SUR 40



CL 49A x CR 97A



Cl 50 x CR 81



CL 33 x CR 66B



CL 67 # 36A - 9



CR 43 x CL 60



CL 33 x CR 66B



CL 39BF x CR113B



Av Regional x CL44



CL38 x CR48



CR 43G # 19 - 142



CL58 x CR50A

Durante este periodo de trabajo, el contratista CONSORCIO VIALMED 2025 ha brindado respuesta oportuna con evidencia fotográfica de la ejecución de las actividades de parcheo de baches mediáticos cuando es solicitada por la interventoría y/o la supervisión. Además, mediante control de los residentes de interventoría se ha mantenido al día las atenciones que se les presta a cada uno de los baches priorizados en las fechas enviadas.

Durante el mes de **octubre de 2025** la supervisión priorizo actividades de bacheo que cumplen las condiciones de rango 1, dado que esta característica es la de mayor cantidad reportada en las plataformas y aplicaciones de la alcaldía con relación al estado de las vías que conforman la malla vial de la Alcaldía de Medellín Distrito de ciencia y tecnología.

Durante el mes de **octubre de 2025**, para la ejecución de actividades de bacheo con rango 1, el contratista de obra ha implementado en campo **diez cuadrillas de obra**, las cuales atienden direcciones en las diferentes comunas que fueron programadas mediante visita de campo por el personal de la Secretaría de Infraestructura Física en compañía de la interventoría, además de reportes de Siro.

En la ejecución del Parcheo de baches, se ha instalado mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30% como se corrobora en los informes presentados por el contratista en los certificados de calidad de las plantas que suministran la mezcla asfáltica, estos soportes se dejan reflejados en los anexos del plan de calidad del presente informe.

En la siguiente tabla, se aprecia el resumen de intervenciones de baches con rango 0 y rango 1:

Tabla 6 Atención de Baches rango 0 y rango 1 por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Rango	Área	# Baches	Volumen m3	Toneladas	Inversión $/ton
Zona 1 - Nororiental	1	Granizal	Rango 1 Diurno	353,00	29	39,78	95,44	$ 88.828.965
		Popular	Rango 1 Diurno	25,66	6	4,17	10,01	$ 9.316.618
		Santo Domingo Savio No.1	Rango 1 Diurno	201,84	14	37,19	89,31	$ 83.123.586
	2	La Frontera	Rango 1 Diurno	101,78	23	13,70	32,87	$ 30.593.127
		Moscú No.2	Rango 1 Diurno	65,69	12	8,37	20,07	$ 18.679.773
		Playón de los Comuneros	Rango 1 Diurno	263,41	44	33,94	81,41	$ 75.770.814
		Villa del Socorro	Rango 1 Diurno	30,52	5	4,19	10,04	$ 9.344.538
	3	Campo Valdés No.2	Rango 1 Diurno	32,17	6	4,59	11,04	$ 10.275.270
		El Pomar	Rango 1 Diurno	52,60	9	8,16	19,59	$ 18.233.019
		El Raizal	Rango 1 Diurno	29,83	2	4,18	10,02	$ 9.325.925
		La Cruz	Rango 1 Diurno	253,36	27	29,29	70,28	$ 65.411.774
		La Salle	Rango 1 Diurno	97,86	12	9,64	23,16	$ 21.555.729
		Las Granjas	Rango 1 Diurno	89,59	10	11,20	26,88	$ 25.018.049
		Manrique Central	Rango 1 Diurno	26,48	8	4,16	10,01	$ 9.316.618
		Manrique Central No.1	Rango 1 Diurno	32,35	8	4,23	10,12	$ 9.418.997
		Manrique Central No.2	Rango 1 Diurno	39,55	6	4,20	10,08	$ 9.381.769
		Manrique Oriental	Rango 1 Diurno	118,88	16	13,47	32,34	$ 30.099.837
		San José de La Cima	Rango 1 Diurno	34,98	4	4,62	11,06	$ 10.293.886
		Versalles No.2	Rango 1 Diurno	486,73	37	58,12	139,47	$ 129.809.052
	4	Brasilia	Rango 1 Diurno	59,18	12	8,42	20,22	$ 18.819.381

		San Isidro	Rango 1 Diurno	40,08	7	4,66	11,15	$	10.377.650
		San Pedro	Rango 1 Diurno	36,74	6	4,17	10,02	$	9.325.924
Zona 2 - Noroccidental	6	La Esperanza	Rango 1 Diurno	264,44	36	33,58	80,48	$	74.905.229
		Pedregal	Rango 1 Diurno	81,16	7	9,90	23,76	$	22.114.168
		Picacho	Rango 1 Diurno	29,28	7	4,21	10,07	$	9.372.460
		San Martín de Porres	Rango 1 Diurno	40,72	5	5,01	12,04	$	11.206.001
	7	Aures No.1	Rango 1 Diurno	2,25	1	0,14	0,32	$	297.834
		Aures No.2	Rango 1 Diurno	69,71	11	8,37	20,08	$	18.689.079
		Cucaracho	Rango 1 Diurno	104,56	21	16,87	40,51	$	37.703.914
		Facultad de Minas	Rango 1 Nocturno	51,42	6	8,05	19,29	$	18.782.750
		Kennedy	Rango 1 Diurno	56,80	7	8,78	21,06	$	19.601.194
		Olaya Herrera	Rango 1 Diurno	85,34	13	11,83	28,36	$	26.395.530
			Rango 1 Nocturno	1,28	2	0,19	0,47	$	457.641
		Palenque	Rango 1 Diurno	72,93	14	11,78	28,29	$	26.330.379
		Robledo	Rango 1 Nocturno	28,86	7	4,19	10,06	$	9.795.463
		San Germán	Rango 1 Nocturno	26,78	2	4,02	9,64	$	9.386.507
		Universidad Nacional	Rango 1 Nocturno	29,42	2	1,77	4,24	$	4.128.505
Zona 3 - Centro oriental	8	Enciso	Rango 1 Nocturno	11,20	2	1,29	3,09	$	3.008.745
		San Miguel	Rango 1 Diurno	30,06	5	4,19	10,05	$	9.353.846
		Trece de Noviembre	Rango 0	132,63	28	11,96	28,66	$	36.372.692
			Rango 1 Diurno	260,51	29	33,18	79,63	$	74.114.109
		Villatina	Rango 1 Diurno	42,27	2	4,17	10,01	$	9.316.617
	9	Los Cerros El vergel	Rango 1 Diurno	37,30	5	5,04	12,08	$	11.243.230
	10	Boston	Rango 0	4,72	1	0,66	1,58	$	2.005.194
			Rango 1 Nocturno	31,34	6	4,30	10,29	$	10.019.414
		Corazón de Jesús	Rango 0	1,40	1	0,14	0,34	$	431.497
			Rango 1 Diurno	1,49	1	0,37	0,90	$	837.658
			Rango 1 Nocturno	24,07	1	4,09	9,82	$	9.561.773
		El Chagualo	Rango 1 Diurno	41,62	4	4,53	10,86	$	10.107.738
			Rango 1 Nocturno	72,21	7	10,41	24,98	$	24.323.127
		Jesús Nazareno	Rango 1 Nocturno	40,32	6	4,16	9,99	$	9.727.303
		La Alpujarra	Rango 1 Nocturno	73,92	3	11,54	27,69	$	26.961.863
		La Candelaria	Rango 0	2,54	4	0,20	0,45	$	571.099
			Rango 1 Diurno	36,70	4	4,60	11,06	$	10.293.885
		Las Palmas	Rango 0	27,35	8	3,21	7,69	$	9.759.457
		Los Ángeles	Rango 1 Nocturno	27,85	5	3,26	7,81	$	7.604.628
		Perpetuo Socorro	Rango 0	0,48	1	0,03	0,07	$	88.838
			Rango 1 Nocturno	50,98	7	6,20	14,89	$	14.498.453

		Prado	Rango 1 Nocturno	38,88	5	4,18	10,01	$	9.746.776
		San Diego	Rango 0	54,62	17	6,46	15,49	$	19.658.516
Zona 4 - Centro occidental	11	Bolivariana	Rango 1 Diurno	72,85	11	9,41	22,58	$	21.015.907
		Laureles	Rango 0	27,78	10	3,30	7,91	$	10.038.661
			Rango 1 Diurno	29,43	4	5,00	12,00	$	11.168.771
		Los Conquistadores	Rango 0	2,56	1	0,23	0,55	$	698.011
			Rango 1 Nocturno	8,46	2	1,05	2,51	$	2.443.996
		Naranjal	Rango 1 Nocturno	33,47	7	4,40	10,59	$	10.311.525
	12	Calasanz	Rango 0	5,83	1	0,76	1,82	$	2.309.780
		Calasanz Parte Alta	Rango 0	8,68	4	1,26	3,03	$	3.845.404
		Ferrini	Rango 1 Diurno	28,76	5	4,17	10,01	$	9.316.617
		Simón Bolívar	Rango 0	37,23	16	4,02	9,65	$	12.246.913
	13	El Pesebre	Rango 1 Diurno	35,27	5	4,17	10,03	$	9.335.232
		Juan Pablo XXIII La Quiebra	Rango 1 Diurno	170,62	21	20,91	50,20	$	46.722.696
		La Independecia	Rango 1 Diurno	38,81	1	4,66	11,18	$	10.405.573
		La Pradera	Rango 1 Diurno	35,04	1	4,20	10,10	$	9.400.383
		Los Alcázares	Rango 1 Diurno	103,82	23	13,29	31,95	$	29.736.855
Zona 5 - Suroriental	14	Barrio Colombia	Rango 0	49,54	15	5,61	13,44	$	17.056.841
			Rango 1 Diurno	62,53	4	9,26	22,26	$	20.718.073
			Rango 1 Nocturno	31,68	3	2,74	6,55	$	6.377.762
		Castropol	Rango 0	42,23	25	1,53	3,68	$	4.670.330
		El Diamante No.2	Rango 0	3,23	1	0,16	0,39	$	494.953
			Rango 1 Diurno	23,75	2	4,18	10,04	$	9.344.540
		El Tesoro	Rango 0	28,59	11	1,93	4,66	$	5.914.054
		Lalinde	Rango 0	0,91	2	0,04	0,11	$	139.603
		Las Lomas No.1	Rango 0	2,38	1	0,12	0,29	$	368.042
		Los Balsos No.1	Rango 1 Diurno	204,88	21	26,01	62,34	$	58.021.771
		Los Balsos No.2	Rango 0	5,39	2	0,70	1,68	$	2.132.105
		San Lucas	Rango 1 Diurno	64,56	10	9,21	22,11	$	20.578.462
		Villa Carlota	Rango 0	1,28	3	0,07	0,15	$	190.367
Zona 6 - Suroccidental	15	Campo Amor	Rango 1 Diurno	461,89	57	58,46	140,35	$	130.628.095
		Cristo Rey	Rango 1 Diurno	37,01	5	4,99	12,00	$	11.168.773
		La Colina	Rango 1 Nocturno	25,04	4	3,61	8,65	$	8.422.540
	16	Altavista	Rango 1 Diurno	39,96	5	6,99	16,77	$	15.608.359
		Cristo Rey	Rango 1 Diurno	26,74	4	4,17	10,04	$	9.344.540
		El Nogal Los Almendros	Rango 0	8,32	1	1,08	2,60	$	3.299.686
		El Rincón	Rango 1 Diurno	101,29	16	17,54	42,09	$	39.174.468
		La Hondanada	Rango 1 Diurno	92,35	14	13,35	31,97	$	29.755.472

		La Mota	Rango 1 Diurno	37,82	6	4,61	11,04	$ 10.275.270
		La Palma	Rango 1 Diurno	124,71	18	17,25	41,31	$ 38.448.498
		Rosales	Rango 0	4,59	1	0,69	1,65	$ 2.094.032
Corregimiento San Cristóbal	60	AE San Cristóbal	Rango 1 Diurno	48,20	5	5,73	13,76	$ 12.806.859
Corregimiento San Antonio de Prado	80	Montañita	Rango 1 Diurno	102,54	8	9,98	23,99	$ 22.328.237
		San Antonio de Prado	Rango 1 Diurno	680,99	100	80,70	193,67	$ 180.254.675
			Rango 1 Nocturno	66,98	11	8,81	21,15	$ 20.593.840
Corregimiento Santa Elena	90	Piedras Blancas	Rango 1 Diurno	2,21	1	0,29	0,69	$ 642.204
			Total=	**7481,89**	**1064**	**951,95**	**2284,24**	**$ 2.170.942.188**

Tabla 7 Resumen de atención de baches comuna y reporte en SIRO **octubre 2025**

ZONA	COMUNA/BARRIO		Baches Ejecutados octubre 2025	
			Id Siro Octubre	Id Siro Acumulado Ejecutado
1	1	Popular	49	135
	2	Santa Cruz	84	214
	3	Manrique	145	191
	4	Aranjuez	25	119
2	5	Castilla	0	118
	6	Doce de Octubre	55	65
	7	Robledo	86	272
3	8	Villa Hermosa	66	153
	9	Buenos Aires	5	79
	10	La Candelaria	81	303
4	11	Laureles – Estadio	35	208
	12	La América	26	123
	13	San Javier	51	121
5	14	El Poblado	100	359
6	15	Guayabal	66	279
	16	Belén	65	369
Corregimientos y Veredas	50	San Sebastián de Palmitas	0	0
	60	San Cristóbal	5	65
	70	AltaVista	0	88
	80	San Antonio de Prado	119	220
	90	Santa Elena	1	36
TOTAL			**1064**	**3517**

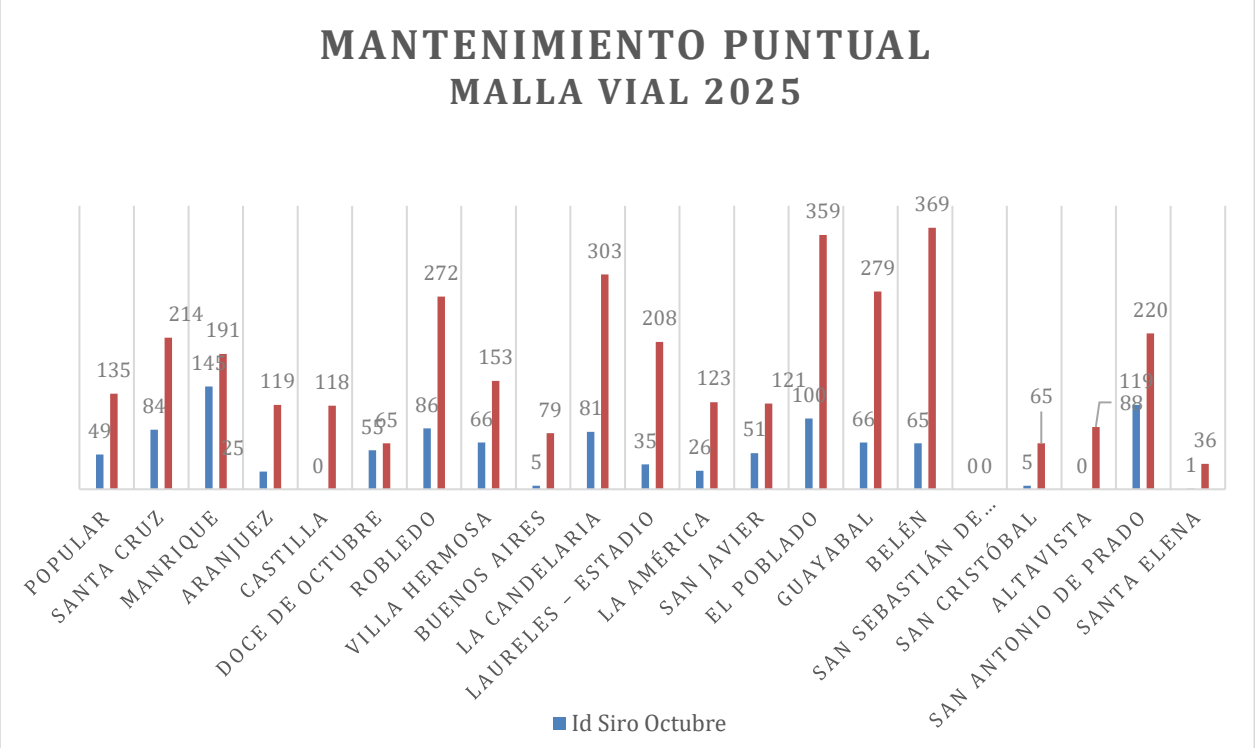


Ilustración 4 Ejecución de baches con reporte de SIRO

Para el mantenimiento puntual con mezcla asfáltica semidensa tibia MSC-19 con RAP, entre el 20% y el 30%, durante el mes de **octubre de 2025** con Rango 3, se intervinieron las siguientes direcciones:

Tabla 8 Atención de baches rango 3 por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Rango	Área	Volumen m³	Toneladas	Inversión $/m³
Zona 1 - Nororiental	1	Aldea Pablo VI	Rango 3	213,70	14,95	35,15	$ 27.706.444
	2	Moscú No.1	Rango 3	1721,19	191,48	453,47	$ 354.627.660
	3	Carambolas	Rango 3	11,73	1,18	2,76	$ 2.185.401
		La Salle	Rango 3	615,08	92,77	218,05	$ 171.813.286
		Oriente	Rango 3	759,85	113,20	266,05	$ 209.650.361
Zona 3 - Centro oriental	8	Enciso	Rango 3	722,30	86,37	204,73	$ 159.960.265
			Total=	**4043,85**	**499,95**	**1180,21**	**$ 925.943.417**

Para el mantenimiento puntual con mezcla asfáltica semidensa tibia MSC-19 con RAP, entre el 20% y el 30%, durante el mes de **octubre de 2025** con Rango 4, se intervinieron las siguientes direcciones:

En la siguiente tabla, se aprecia el resumen de intervenciones rango 4:

Tabla 9 Atención de baches rango 4 por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Rango	Área	Volumen m³	Toneladas	Inversión $/m³
Zona 1 - Nororiental	4	Berlín	Rango 4 Diurno	381,88	34,10	80,12	$ 61.547.158
Zona 2 - Noroccidental	7	El Diamante	Rango 4 Nocturno	1060,84	111,70	269,26	$ 206.395.127
	8	La Mansión	Rango 4 Diurno	939,71	82,74	199,37	$ 149.337.591
			Rango 4 Nocturno	415,74	37,42	90,18	$ 69.143.291
		Villatina	Rango 4 Diurno	1302,80	131,79	309,69	$ 237.868.034
			Rango 4 Nocturno	426,20	42,62	100,16	$ 78.751.658
Zona 4 - Centro occidental	12	Campo Alegre	Rango 4 Diurno	749,68	78,80	189,91	$ 142.226.278
		La Floresta	Rango 4 Diurno	5024,11	466,45	1119,22	$ 841.896.539
		Santa Mónica	Rango 4 Diurno	434,24	37,00	89,14	$ 66.781.374
	13	Juan Pablo XXIII La Quiebra	Rango 4 Diurno	483,42	48,34	113,60	$ 87.248.963
		La Pradera	Rango 4 Diurno	3,82	0,31	0,74	$ 559.520
Zona 5 - Suroriental	15	Campo amor	Rango 4 Nocturno	1474,59	153,90	370,91	$ 284.370.725
Corregimiento Santa Elena	90	Las Palmas	Rango 4 Diurno	2307,50	195,77	471,86	$ 353.345.665
			Total=	**15004,53**	**1420,94**	**3404,16**	**$ 2.579.471.923**

En la rehabilitación de vías con mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, con asfalto modificado con polímeros, durante el mes de **octubre de 2025**, se intervinieron las siguientes direcciones:

Tabla 10 Rehabilitación de vías con MAM, SMA y FIBRA por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Segmento	Área	Volumen m³	Ton	Tipo de Mezcla	Inversión $/m³
Zona 3 - Centro oriental	10	Calle nueva	2000767	1301,44	91,10	218,65	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 168.051.350
				1320,55	52,82	126,77	SMA TIBIA	$ 118.052.330
		Centro Administrativo	2001686	805,60	56,39	135,33	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 104.022.126
				832,00	33,28	79,87	SMA TIBIA	$ 74.380.567
		Guayaquil	2001685	951,26	66,59	159,81	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 122.837.974
				945,05	37,80	90,72	SMA TIBIA	$ 84.482.735
		La Alpujarra	2000776	234,73	16,43	39,43	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 30.308.273
				228,80	9,15	21,96	SMA TIBIA	$ 20.450.186
			2001459	230,14	16,11	38,66	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 29.717.972

				220,00	8,80	21,12	SMA TIBIA	$ 19.667.938
			2001461	2385,29	166,98	400,73	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 308.026.504
				1835,15	73,41	176,17	SMA TIBIA	$ 164.070.837
			2001464	1048,87	73,42	176,22	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 135.437.213
				1435,78	57,43	137,83	SMA TIBIA	$ 128.355.648
Zona 5 - Suroriental	14	Astorga	2001031	1022,91	102,29	246,52	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 188.693.443
				1370,50	119,92	289,02	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 214.457.972
			2001032	1378,31	98,36	237,04	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 175.901.319
		El Poblado	2001030	408,39	40,84	98,42	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 75.337.180
				500,50	45,05	108,56	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 80.564.807
			4002537	245,62	20,64	49,73	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 36.911.379
			5003860	133,20	11,19	26,97	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 20.011.547
			5003949	105,75	8,88	21,41	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 15.880.477
		La Florida	2001029	906,10	108,73	262,05	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 200.573.253
				923,45	83,11	200,3	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 148.629.104
		Santa María de Los Angeles	2000034	546,14	71,00	171,11	MAM-25 TIBIA NOCTURNO	$ 130.973.061
				1989,91	175,48	422,91	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 313.818.255
			2000035	500,00	45,00	108,45	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 80.475.390
			2000036	1657,70	149,41	360,06	MSC-19 FIBRA TIBIA NOCTURNA	$ 267.196.179
Total=							$	3.457.285.019

En el suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para la construcción de resaltos, durante el mes de **octubre de 2025**, se intervinieron las siguientes direcciones:

Tabla 11 Instalación de mezcla MDC-19 para construcción de resaltos por barrio y comuna.

Zona	Comuna / Barrio		Rango	Área	Volumen m³	Toneladas	Inversión $/m³
Zona 1 - Nororiental	3	Las Granjas	Resaltos	17,36	1,39	3,33	$ 3.074.933
		Oriente	Resaltos	27,50	2,89	6,80	$ 6.393.206

Zona 3 - Centro oriental	8	Trece de Noviembre	Resaltos	1,93	0,15	0,37	$	331.827
		Villatina	Resaltos	10,24	0,82	1,93	$	1.813.989
Zona 4 - Centro occidental	13	Juan Pablo XXIII La Quiebra	Resaltos	9,20	0,74	1,73	$	1.637.015
		La Pradera	Resaltos	14,40	1,15	2,78	$	2.544.009
			Total=	**80,63**	**7,14**	**16,94**	**$**	**15.794.979**

En cuanto a la ejecución de obras complementarias, durante el mes de **octubre de 2025**, se realizaron las siguientes actividades:

Tabla 12. Obras Complementarias

ITEM	Descripción de la actividad	Zona	Comuna	Barrio	Cantidad	Inversión
1.4.5	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.	Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	73,66	$ 2.430.706
1.4.6	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	13,5	$ 130.289
		Zona 2 - Noroccidental	6	Picacho	3,36	$ 32.427
		Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	178,22	$ 1.720.001
1.5.1	Realce de caja válvula de compuerta incluye tapa polimérica.	Zona 1 - Nororiental	1	Aldea Pablo VI	2	$ 1.039.162
			3	La Salle	1	$ 519.581
1.5.3	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	Zona 1 - Nororiental	1	Aldea Pablo VI	7	$ 11.910.990
			2	Moscú No.1	5	$ 8.507.850
1.5.6	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.	Zona 1 - Nororiental	1	Aldea Pablo VI	5	$ 7.509.120
2.1.6	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	3,66	$ 872.486
			3	Manrique Oriental	0,13	$ 30.990
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	44,09	$ 10.510.350
		Zona 4 - Centro occidental	11	Los Conquistadores	1,27	$ 302.748
		Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	2,01	$ 479.151

		Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	0,31	$ 73.899
				El Nogal Los Almendros	2,25	$ 536.364
				Rosales	0,26	$ 61.979
2.1.7	Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	15,33	$ 286.702
2.1.8	Desmonte y reinstalación de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	10,72	$ 1.218.328
				El Nogal Los Almendros	118,28	$ 13.442.525
				Rosales	261,76	$ 29.749.039
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	3,47	$ 226.025
			3	Manrique Oriental	0,11	$ 7.165
		Zona 3 - Centro oriental	8	Enciso	29,78	$ 1.939.780
				Los Mangos	21,41	$ 1.394.585
		Zona 4 - Centro occidental	11	Los Conquistadores	0,23	$ 14.982
		Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	4,02	$ 261.850
		Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	0,61	$ 39.734
				El Nogal Los Almendros	4,94	$ 321.777
				Rosales	8,78	$ 571.903
2.2.4	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A	Zona 2 - Noroccidental	6	Picacho	0,83	$ 208.223
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	33,54	$ 8.414.247
		Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	0,07	$ 17.561
				El Nogal Los Almendros	5,05	$ 1.266.903
				Rosales	1,18	$ 296.029
2.2.6	Recuperación y perfilación de subrasante, incluye sellado y compactación mecánica.	Zona 6 - Suroccidental	16	El Nogal Los Almendros	2,2	$ 85.826
				Rosales	40,38	$ 1.575.305
2.2.7	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	7,13	$ 58.687
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	42,95	$ 353.522
		Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	4,06	$ 33.418
		Zona 6 - Suroccidental	16	El Nogal Los Almendros	1,25	$ 10.289
				Rosales	43,14	$ 355.085
2.2.8	Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado.	Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	25,67	$ 68.205
2.3.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado.	Zona 1 - Nororiental	1	Aldea Pablo VI	32,14	$ 237.386
			2	Andalucía	536,52	$ 3.962.737
				Moscú No.1	34,22	$ 252.749
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	778,73	$ 5.751.700

		Zona 4 - Centro occidental	11	Los Conquistadores	95,7	$ 706.840
		Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	16,23	$ 119.875
				Rosales	14,46	$ 106.802
2.4.1	Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 para construcción pavimento rígido.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	7,87	$ 9.734.261
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	51,92	$ 64.218.914
2.4.2	Suministro, transporte y colocación de Concreto vaciado de 28 Mpa para construcción pavimento rígido.	Zona 1 - Nororiental	3	Manrique Oriental	0,67	$ 841.708
		Zona 4 - Centro occidental	11	Los Conquistadores	1,5	$ 1.884.420
		Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	0,46	$ 577.889
				Rosales	0,3	$ 376.884
2.4.3	Suministro, transporte y aplicación de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	7,87	$ 637.651
		Zona 2 - Noroccidental	6	Picacho	0,54	$ 43.752
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	51,92	$ 4.206.715
		Zona 4 - Centro occidental	11	Los Conquistadores	1,5	$ 121.534
		Zona 6 - Suroccidental	16	Belén	0,46	$ 37.271
				Rosales	0,3	$ 24.307
2.4.4	Suministro, transporte y colocación de Concreto 21 Mpa Ciclópeo 50% de piedra, para recinte, espesor 20-30 cm.	Zona 2 - Noroccidental	6	Picacho	2,1	$ 436.361
2.5.3	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	1	$ 1.701.570
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	1	$ 1.701.570
2.5.7	Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM.	Zona 1 - Nororiental	2	Andalucía	1	$ 865.486
		Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	4	$ 3.461.944
3.2.5	Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 15 x 45 x 80 cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, tres caras. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega y todo lo necesaria para su correcta instalación.	Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	44,51	$ 5.066.796
3.2.6	Construcción de cordón - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De acuerdo a diseño y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	Zona 1 - Nororiental	1	Aldea Pablo VI	0,76	$ 1.051.413

3.2.13	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolítico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	Zona 3 - Centro oriental	8	Los Mangos	0,29	$ 368.930
		Zona 1 - Nororiental	2	Moscú No.1	0,51	$ 648.808
3.3.1	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	Zona 1 - Nororiental	3	Manrique Oriental	5,73	$ 88.529
4.3.4	Retiro mecánico de pintura de barandas tipo pingüino y/o defensas metálicas, para la correcta aplicación e instalación de pintura nueva.	Zona 6 - Suroccidental	16	Las Violetas	15	$ 267.990
					Total=	**$ 218.388.580**

Durante el mes de **octubre de 2025**, se ejecutaron las siguientes actividades correspondientes a la señalización horizontal:

Tabla 13. Señalización

ITEMS	OCTUBRE	CANTIDAD
4.1.1	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros).	98,16
4.1.2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros).	293,46
4.1.3	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante.	244,63
4.1.4	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras.	3800,18
4.1.5	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante.	177,94
4.1.6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras.	1352,14

Estas intervenciones de señalización se llevaron a cabo en los siguientes barrios y comunas de la ciudad:

ITEM	ZONA	COMUNA	BARRIO	CANTIDAD	TOTAL
4.1.1	Zona 2 - Noroccidental	6	La Esperanza	8,88	$ 1.116.900
		7	Bello Horizonte	25,13	$ 3.160.776
	Zona 3 - Centro oriental	10	La Candelaria	10,63	$ 1.337.009
	Zona 4 - Centro occidental	11	Laureles	1,2	$ 150.932
	Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	15	$ 1.886.655
			La Florida	2,1	$ 264.132
	Zona 6 - Suroccidental	15	La Colina	35,22	$ 4.429.866
4.1.2	Zona 1 - Nororiental	1	Moscú	36,98	$ 1.400.136
		3	Las Granjas	18,34	$ 694.389
	Zona 2 - Noroccidental	6	La Esperanza	10,95	$ 414.588
	Zona 3 - Centro oriental	10	Centro Administrativo	4,6	$ 174.165
	Zona 4 - Centro occidental	12	La Floresta	15,8	$ 598.218
			Santa Lucia	25,8	$ 976.837
			Santa Mónica	18,67	$ 706.883
		13	El Corazón	11,16	$ 422.540
			Juan XXIII La Quiebra	10,96	$ 414.968
			La Pradera	17,68	$ 669.400
			Los Alcázares	15,88	$ 601.246
	Zona 5 - Suroriental	14	Alejandría	7,43	$ 281.315
			El Poblado	65,11	$ 2.465.192
			Lalinde	5,4	$ 204.455
			Manila	12,8	$ 484.633
			Santa María de los Ángeles	15,9	$ 602.006
4.1.3	Zona 3 - Centro oriental	10	La Candelaria	89,22	$ 1.917.249
	Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	137,2	$ 2.948.290
	Zona 6 - Suroccidental	15	La Colina	18,21	$ 391.315
4.1.4	Zona 1 - Nororiental	1	Moscú	37,68	$ 317.039
	Zona 3 - Centro oriental	10	Centro Administrativo	536,38	$ 4.513.101

	Zona 4 - Centro occidental	12	La Floresta	196,52	$	1.653.519
			Santa Lucia	599,89	$	5.047.475
			Santa Mónica	114,58	$	964.076
		13	Los Alcázares	162,18	$	1.364.583
	Zona 5 - Suroriental	14	Alejandría	18	$	151.452
			El Poblado	832,95	$	7.008.442
			Manila	448,11	$	3.770.398
			Santa María de los Ángeles	853,89	$	7.184.630
4.1.5	Zona 3 - Centro oriental	10	La Candelaria	45,72	$	1.947.215
	Zona 4 - Centro occidental	11	Laureles	82,39	$	3.508.990
	Zona 5 - Suroriental	14	El Poblado	49,83	$	2.122.259
4.1.6	Zona 1 - Nororiental	1	Moscú	30,79	$	624.483
	Zona 2 - Noroccidental	6	La Esperanza	4,1	$	83.156
	Zona 3 - Centro oriental	10	Centro Administrativo	53,18	$	1.078.597
	Zona 4 - Centro occidental	12	La Floresta	71	$	1.440.022
			Santa Lucia	146,89	$	2.979.223
			Santa Mónica	$ 51	$	1.038.438
		13	Los Alcázares	94,74	$	1.921.518
	Zona 5 - Suroriental	14	Alejandría	75,65	$	1.534.334
			El Poblado	417,01	$	8.457.799
			Lalinde	1,5	$	30.423
			Manila	302,75	$	6.140.373
			Santa María de los Ángeles	103,33	$	2.095.739
				Total=	**$**	**95.691.379**

2.1.1. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS, DE CONFORMIDAD CON EL CRONOGRAMA VIGENTE VS ACTIVIDADES DE OBRA EFECTIVAMENTE EJECUTADAS:

Desde los estudios previos y pliegos de condiciones del proceso de licitación No. 70007715 de 2025, se informan las metas físicas a cumplir en el contrato, a las cuales se les hará el debido seguimiento para su cumplimiento.

Durante el mes de **octubre de 2025**, se realizaron principalmente actividades relacionadas con la atención de baches en Rango 0, Rango 1, Rango 3, Rango 4, masivas, obras complementarias y actividades de señalización, demarcación de marcas viales y líneas con pintura acrílica.

Tabla 14 Resumen de Metas físicas CONSORCIO VIALMED 2025.

Intervención	Metas Físicas			Ejecutado a octubre 2025	Porcentaje de cumplimiento
Rangos	Inversión a octubre 31/2025	%	Cantidad Ton / m3	Cantidad Ton / m3	Cantidad ton / m3
Rango 0: De 0.5 a 5 Ton/Jornada.	$391.931.029	88,24%	308,82	424,22	100,00%
Rango 1: De 9.1 a 12,5 Ton/Jornada diurna	$7.284.667.290	84,71%	7.826,82	5733,41	62,05%
Rango 1: De 9.1 a 12,5 Ton/Jornada nocturna	$651.958.330	79,71%	669,57	1091,80	100,00%
Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.	$772.975.616	80,00%	896,00	0,00	0,00%
Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	$2.037.238.500	78,57%	1.100,00	897,41	64,10%
Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	$3.970.960.400	78,57%	2.200,00	2508,04	97,21%
Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	$1.016.269.650	78,57%	550,00	1256,16	100,00%
MSC-25 con RAP entre el 20% y 30%	$78.978.864	84,62%	53,31	0,00	0,00%
SMA (Stone Mastic Asphalt)	$397.141.064	84,62%	177,69	272,69	100,00%
MAM-19 y/o MAM-25. Diurno	$432.033.732	84,62%	236,92	0,00	0,00%
MAM-19 y/o MAM-25. Nocturno	$3.933.448.809	84,62%	2.132,31	1929,83	76,58%
Mezcla tibia con Fibra. Diurno.	$366.352.910	84,62%	207,31	0,00	0,00%
Mezcla tibia con Fibra. Nocturno.	$3.336.633.478	84,62%	1.865,77	1245,05	56,46%
MDC-19 para resaltos	$185.312.784	84,62%	83,77	25,06	25,31%
Fresado de vías	$615.455.373	84,62%	2.941,99	2469,12	78,38%
Mantenimiento vías en concreto y adoquín.	$1.105.450.814	100,00%			56,69%
Obras complementarias	$698.412.831	100,00%			32,17%
Señalización	$1.807.603.701	76,92%			12,90%

Fuente: Presentación CONSORCIO VIALMED 2025, Presupuesto contractual y seguimiento de obra.

El CONSORCIO VIALMED 2025 aporto su programa de obra el día 21/07/2025, y de acuerdo a esta programación presentada se lleva el siguiente control de obra:

Durante este periodo se ha cumplido el 82,93% del plazo total de ejecución, mientras que el avance físico alcanza el 59,21% y la inversión ejecutada asciende al 61,70%. Según la programación del contratista, al 31 de octubre de 2025 se debía alcanzar un avance físico acumulado del 79,38%, por lo que se registra un atraso del 17,68%.

Durante el período comprendido entre el 21 de julio a la fecha, se han presentado condiciones de lluvia recurrentes y prolongadas, las cuales han impactado negativamente el rendimiento de las actividades programadas, ocasionando incluso la cancelación de jornadas de trabajo. Estas condiciones se pueden evidenciar en los registros de precipitaciones en Antioquia,

donde se observa una reducción significativa de los días hábiles efectivos, afectando la productividad prevista y limitando la ejecución continúa de las capas estructurales del pavimento y de los componentes asociados.

Estas condiciones climáticas adversas dificultan el cumplimiento de los cronogramas establecidos, afectando tanto la calidad como la continuidad de las intervenciones, especialmente en lo relacionado con la compactación, adherencia de mezclas asfálticas y ejecución de obras complementarias, las cuales presentan actualmente mayores afectaciones**.**

Adicionalmente los frentes para atender Rango 3 y Rango 4, han estado muy limitados en su definición debido a intervenciones que viene realizando las cuadrillas de EPM en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha retrasado el avance sustancial de ejecución financiera del contrato. Se espera que, para el mes de octubre de 2025, esta diferencia sea subsanada por el contratista.

Tabla 15 Programación de obra acumulado al **31 de octubre de 2025**

ITEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Presupuesto	Estado programado al 31 de octubre	
						Avance acumulado de obra programado	Avance acumulado programado en inversión
	MALLA VIAL 2025.	**90 días**	**lun 21/07/25**	**vie 21/11/25**	**$ 37.396.028.081,00**	**81%**	**$ 29.685.407.086**
	Inicio	0 días	lun 21/07/25	lun 21/07/25	$ 0,00	100%	
1.1	PRELIMINARES	80 días	lun 28/07/25	vie 14/11/25	$ 67.312.000,00	86%	$ 58.898.000
1.2.1	**Mantenimiento puntual con mezcla asfáltica densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30%**	**90 días**	**lun 21/07/25**	**vie 21/11/25**	**$ 10.828.273.820,00**	**82%**	
1.2.1.1	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	85 días	lun 21/07/25	vie 14/11/25	$ 444.188.500,00	88,24%	$ 391.931.029
1.2.1.2	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	90 días	lun 21/07/25	vie 21/11/25	$ 8.599.954.440,00	84,71%	$ 7.284.667.290
1.2.1.3	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	80 días	lun 28/07/25	vie 14/11/25	$ 817.911.360,00	79,71%	$ 651.958.330
1.2.1.4	Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.	85 días	lun 21/07/25	vie 14/11/25	$ 966.219.520,00	80,00%	$ 772.975.616
1.2.2	**Mantenimiento puntual con mezcla asfáltica Semidensa tibia MSC-19 con RAP entre el 20% y 30%**	**70 días**	**lun 18/08/25**	**vie 21/11/25**	**$ 8.940.232.700,00**	**77%**	
1.2.2.1	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	70 días	lun 18/08/25	vie 21/11/25	$ 2.592.849.000,00	78,57%	$ 2.037.238.500
1.2.2.2	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	70 días	lun 18/08/25	vie 21/11/25	$ 5.053.949.600,00	78,57%	$ 3.970.960.400

1.2.2.3	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	70 días	lun 18/08/25	vie 21/11/25	$ 1.293.434.100,00	78,57%	$ 1.016.269.650
1.3	**OTRAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN**	**65 días**	**lun 18/08/25**	**vie 14/11/25**	**$ 10.317.156.486,00**	**83%**	
1.3.1	Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia Semidensa MSC-25 con RAP entre el 20% y 30%	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 93.338.658,00	84,62%	$ 78.978.864
1.3.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica discontinua tibia SMA (Stone Mastic Asphalt)	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 469.348.530,00	84,62%	**$ 397.141.064**
1.3.3	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros. HORARIO DIURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 510.585.320,00	84,62%	**$ 432.033.732**
1.3.4	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros. HORARIO NOCTURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 4.648.621.320,00	84,62%	**$ 3.933.448.809**
1.3.5	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19. HORARIO DIURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 432.962.530,00	84,62%	**$ 366.352.910**
1.3.6	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19. HORARIO NOCTURNO	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 3.943.294.110,00	84,62%	**$ 3.336.633.478**
1.3.7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcción de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 219.006.018,00	84,62%	**$ 185.312.784**
1.4	**OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACIÓN**	**69 días**	**lun 18/08/25**	**jue 20/11/25**	**$ 924.146.731,00**	**76%**	
1.4.1, 1.4.2	Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor).	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 727.356.350,00	84,62%	$ 615.455.373
1.4.3, 1.4.4	Sellado de grietas, aplicación de sello CON O SIN ruteado de grieta de 16 mm de espesor por 19 mm	24 días	lun 20/10/25	jue 20/11/25	$ 53.356.000,00	41,67%	$ 22.231.667

	de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas.						
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 1.4.9, 1.4.10	Demoliciones y corte carpeta asfáltica, llenos con fresado, transporte fresado, cargue y disposición final	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 143.434.381,00	84,62%	$ 121.367.553
1.5	**REALCES**	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 297.332.781,00	84,62%	$ 251.589.276
1.6	**ENSAYOS Y DISEÑOS**	84 días	lun 28/07/25	jue 20/11/25	$ 178.194.496,00	83,33%	$ 148.495.413
2	**MANTENIMIENTO DE VÍAS EN CONCRETO Y ADOQUÍN**	20 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25	$ 1.105.450.814,00	100,00%	$ 1.105.450.814
3	**OBRAS COMPLEMENTARIAS (DEMOLICIONES, ACTIVIDADES EN CONCRETO Y PREFABRICADOS, ACEROS, REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, MANTENIMIENTO REPARACIONES Y SUMINISTROS, REALCES, BOTADA)**	20 días	lun 1/09/25	vie 26/09/25	$ 698.412.831,00	100,00%	$ 698.412.831
4	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN**	**69 días**	**lun 18/08/25**	**jue 20/11/25**	**$ 4.039.515.422,00**	**71%**	
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8	**SEÑALIZACIÓN (DEMARCACIÓN DE MARCAS VIALES Y LÍNEAS CON PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO O ACRÍLICA, BORRADO DE MARCAS VIALES)**	65 días	lun 18/08/25	vie 14/11/25	$ 2.349.884.811,00	76,92%	$ 1.807.603.701
4.2, 4.3, 4.4	**BARANDAS, DEFENSAS Y PASAMANOS**	4 días	lun 17/11/25	jue 20/11/25	$ 1.689.630.611,00	0%	$ 0
	Fin	0 días	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$ 0,00	0%	
					VALOR ACUMULADO:	$29.685.407.086	
					VALOR CORTE DE OBRA MES:	$10.939.583.220	

ACTA DE MODIFICACIÓN 2

Se presenta el acta de modificación 2, de menores y mayores cantidades de obra, con la cual se ajustan los ítems necesarios para proceder a la realización del acta de obra No.4, debido a que se sobrepasaban algunas cantidades de los ítems contractuales:

	CAMBIO DE OBRA OCTUBRE		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD (+/-)**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN POR RANGOS				$ -
Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	74,22	$ 94.193.344,00	424,22	$ 538.381.844,0000
Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.		$ -	9240,00	$ 8.599.954.440,0000
Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	211,72	$ 206.152.611,00	1091,80	$ 1.063.090.027,0000
Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.	-1074,77	-$ 927.199.780,00	0,00	$ -
Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.		$ -	1400,00	$ 2.592.849.000,0000
Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.		$ -	2579,90	$ 4.656.673.062,0000
Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	341,16	$ 630.382.825,00	1256,16	$ 2.321.085.970,0000
Suministro, transporte y aplicación de mezcla asfáltica tibia Semidensa MSC-25 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física. Al Contratista se le reconocerá el transporte desde el sitio de almacenamiento hasta la planta de producción) que cumpla con los artículos 462 y 450.2.4 de la norma INVIAS 2022, con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	0,00	$ -	63,00	$ 93.338.658,0000
Suministro y aplicación de mezcla asfáltica discontinua tibia SMA (Stone Mastic Asphalt), las cuales se pueden obtener bajo el resultado de la combinación de material bituminoso, agregados de granulometría discontinua con gran cantidad de gruesos, poco tamaño medio y gran cantidad de finos, con fibras de celulosa y eventualmente aditivos, bajo las normas SMA internacionales y en concordancia con lo estipulado en la norma INVIAS 2022 para estos casos especiales y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificados. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	62,69	$ 140.111.711,00	272,69	$ 609.460.241,0000

Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografia. HORARIO DIURNO	-80,00	-$	145.881.520,00	200,00	$ 364.703.800,0000
IMPORTE DE OTRAS ACTIVIDADES DE PAVIMENTACIÓN					$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA PAVIMENTACIÓN					$ -
Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado.	189,72	$	1.830.988,00	210,72	$ 2.033.659,0000
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	-92,44	-$	22.036.667,00	358,56	$ 85.474.517,0000
Desmonte y reinstalación de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	164,90	$	18.740.885,00	514,90	$ 58.518.385,0000
MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y LLENOS					$ -
EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.	9,90	$	644.856,00	114,90	$ 7.484.241,0000
ACERO DE REFUERZO					$ -
Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	180,04	$	1.329.775,00	3540,04	$ 26.146.735,0000
REALCES					$ -
Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM.	2,00	$	1.730.972,00	5,00	$ 4.327.430,0000
IMPORTE DE SEÑALIZACIÓN VIAL				**Ajuste al peso**	**$ 1.173,000**
IMPORTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SEÑALIZACIÓN					
SUBTOTAL OBRAS		**$**	**-**		**$ 37.396.028.077,00**
SUBTOTAL OBRAS				**$**	**37.396.028.077**

Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados	**$**	**1.248.611.898**
Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable -	**$**	**642.315.597**
Pólizas - Gasto Reembolsable-	**$**	**116.969.261**
VALOR TOTAL	**$**	**39.403.924.833**

A continuación, se presentan las cantidades de obra ejecutadas y conciliadas entre el contratista e interventoría que soportan el acta parcial de obra No.4, con corte al **31 de octubre de 2025**:

Tabla 16 Cantidades ejecutadas al **31 de octubre de 2025**

			ACTA N°4 (1 al 31 de octubre)		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos.	día	18,00	$ 17.308.800,00	36,00	$ 34.617.600,00
1.2.1.1	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	TON	105,89	$ 134.386.058,00	424,22	$ 538.381.844,00
1.2.1.2	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	TON	1966,63	$1.830.403.507,00	5733,41	$ 5.336.262.424,00
1.2.1.3	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	TON	211,72	$ 206.152.611,00	1091,80	$ 1.063.090.027,00
1.2.1.4	Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.	TON		$ -	0,00	$ -
1.2.2.1	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	m3	499,95	$ 925.924.898,00	897,41	$ 1.662.042.848,00
1.2.2.2	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	m3	1075,33	$1.940.956.287,00	2508,04	$ 4.526.974.354,00
1.2.2.3	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	m3	345,64	$ 638.667.726,00	1256,16	$ 2.321.082.937,00

1.3.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica discontinua tibia SMA (Stone Mastic Asphalt), las cuales se pueden obtener bajo el resultado de la combinación de material bituminoso, agregados de granulometría discontinua con gran cantidad de gruesos, poco tamaño medio y gran cantidad de finos, con fibras de celulosa y eventualmente aditivos, bajo las normas SMA internacionales y en concordancia con lo estipulado en la norma INVIAS 2022 para estos casos especiales y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificados. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	m3	272,69	$ 609.467.393,00	272,69	$ 609.467.393,00
1.3.4	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	m3	809,88	$ 1.493.979.860,00	1929,83	$ 3.559.941.545,00
1.3.6	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	m3	757,04	$ 1.353.846.428,00	1245,05	$ 2.226.579.882,00
1.3.7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	m3	7,14	$ 15.801.616,00	25,06	$ 55.431.396,00

1.4.2	Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO NOCTURNO	m3	1313,19	$ 274.716.211,00	2469,12	$ 516.532.706,00
1.4.3	Sellado de grietas, comprende suministro, aplicación de sello SIN ruteado de grieta, de 16 mm de espesor por 19 mm de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas.	m	1977,00	$ 20.206.917,00	1977,00	$ 20.206.917,00
1.4.5	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.	m2	73,66	$ 2.430.706,00	111,35	$ 3.674.471,00
1.4.6	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado.	m	195,08	$ 1.882.717,00	210,72	$ 2.033.659,00
1.4.7	Transporte, aplicación y compactación de llenos con material reciclado de fresado de pavimento; compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellín. Medido en sitio.	m3		$ -	43,40	$ 3.557.151,00
1.4.8	Transporte de material fresado desde el punto de acopio indicado por la interventoria hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP	m3/km		$ -	13452,08	$ 23.204.838,00
1.4.9	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	1912,85	$ 15.744.668,00	5236,99	$ 43.105.628,00
1.5	**REALCES**					
1.5.1	Realce de caja válvula de compuerta incluye tapa polimérica.	un	3,00	$ 1.558.743,00	3,00	$ 1.558.743,00
1.5.3	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	12,00	$ 20.418.840,00	12,00	$ 20.418.840,00

1.5.6	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	5,00	$ 7.509.120,00	5,00	$ 7.509.120,00
1.6	**ENSAYOS Y DISEÑOS**					
1.6.1	Diseño estructural de pavimentos, incluye: Exploración de campo, ejecución de apiques, ensayos de laboratorio, exploración con georradar y evaluación de deflexiones con FWD, análisis estructural y diseños necesarios.	km/calzada		$ -		$ 29.825.251,00
2.1.6	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m3	53,98	$ 12.867.451,00	77,59	$ 18.496.174,00
2.1.7	Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	15,33	$ 286.664,00	165,41	$ 3.093.516,00
2.1.8	Desmonte y reinstalación de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	m2	390,76	$ 44.409.874,00	514,90	$ 58.518.226,00
2.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y LLENOS**					
2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.	m3	73,35	$ 4.777.799,00	114,90	$ 7.484.242,00

2.2.3	Suministro, transporte, colocación y compactación de Subbase granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 95% del ensayo Proctor modificado. Que cumpla con el artículo 320-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3		$ -	14,72	$ 3.398.689,00
2.2.4	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 98% del ensayo Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	40,67	$10.203.455,00	75,41	$18.918.912,00
2.2.5	Suministro, transporte y colocación de ARENILLA compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Su medida será en sitio.	m3		$ -	1,21	$177.684,00
2.2.6	Recuperación y perfilación de subrasante, incluye sellado y compactación mecánica.	m3	42,58	$1.661.131,00	42,63	$1.663.094,00
2.2.7	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	98,53	$ 810.976,00	98,53	$ 810.976,00
2.2.8	Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	25,67	$ 68.205,00	25,67	$ 68.205,00
2.3	**ACERO DE REFUERZO**					
2.3.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	1508,00	$ 11.138.105,00	3540,04	$ 26.146.746,00
2.4	**CONCRETOS Y ADOQUINES**					

2.4.1	Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. Curado con Antisol.	m3	59,79	$ 73.951.627,00	94,81	$ 117.272.689,00
2.4.2	Suministro, transporte y colocación de Concreto vaciado de 28 Mpa para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido, se debe seguir las recomendaciones y precauciones del productor; formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	2,93	$ 3.680.900,00	15,29	$ 19.211.536,00
2.4.3	Suministro, transporte y aplicación de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos. Aplica para concretos premezclados o realizados en obra. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de aplicación, de manejo, de almacenamiento dadas por el productor. Se pagará por m3 de concreto con aditivo colocado en obra.	m3	62,59	$ 5.071.468,00	112,29	$ 9.098.421,00
2.4.4	Suministro, transporte y colocación de Concreto 21 Mpa Ciclópeo 50% de piedra, para recinte, espesor 20-30 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	2,10	$ 436.361,00	23,41	$ 4.863.556,00
2.5	**REALCES**					
2.5.3	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	2,00	$ 3.403.140,00	2,00	$ 3.403.140,00

2.5.4	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1 Incluye anillo , mezcla asfáltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye transporte e instalación de la tapa que será suministrada por la entidad en el lugar indicado por la interventoría.	un		$ -	4,00	$ 4.884.776,00
2.5.5	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.	un		$ -	1,00	$ 1.501.824,00
2.5.7	Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM.	un	5,00	$ 4.327.430,00	5,00	$ 4.327.430,0000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3.1.3	Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante.	un	8,00	$ 1.726.080,00	50,00	$ 10.788.000,0000
3.2	**ACTIVIDADES EN CONCRETO Y PREFABRICADOS**					
3.2.5	Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 15 x 45 x 80 cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, tres caras. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega y todo lo necesaria para su correcta instalación.	m	44,51	$ 5.066.796,00	44,51	$ 5.066.796,0000
3.2.6	Construcción de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De acuerdo a diseño y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m3	0,76	$ 1.049.643,00	0,76	$ 1.049.643,0000
3.2.13	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolitico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	0,80	$ 1.022.826,00	0,80	$ 1.022.826,0000
3.3	**ACEROS Y MALLAS**					

3.3.1	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	5,73	$ 88.498,00	5,73	$ 88.498,0000
3.4	**REDES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS**					
3.4.2	Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.	m2		$ -	18,00	$ 266.958,0000
3.7	**CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA**					
3.7.1	Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km		$ -	8,36	$ 22.202,0000
3.7.2	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3		$ -	8,36	$ 68.779,0000
4.1	**SEÑALIZACIÓN**					
4.1.1	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	m2	98,16	$ 12.346.270,00	160,82	$ 20.227.872,0000
4.1.2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	m2	293,46	$ 11.110.899,00	668,72	$ 25.319.076,0000
4.1.3	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.	m	244,63	$ 5.256.854,00	326,80	$ 7.022.605,0000

4.1.4	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. HORARIO NOCTURNO.	m	3800,18	$ 31.974.715,00	4679,07	$ 39.369.695,0000
4.1.5	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	m	177,94	$ 7.578.465,00	225,21	$ 9.591.694,0000
4.1.6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	m	1352,14	$ 27.424.103,00	2209,78	$ 44.818.757,0000
4.3	**RETIRO, REPARACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS Y OTROS**					
4.3.4	Retiro mecánico de pintura de barandas tipo pingüino y/o defensas metálicas, para la correcta aplicación e instalación de pintura nueva.	m	15,00	$ 267.990,00	15,00	$ 267.990,0000

SUBTOTAL OBRAS	**COSTO CON AIU**	**$ 9.793.370.831,00**	**COSTO CON AIU**	**$ 23.073.830.801,00**	
	COSTO DIRECTO	**$ 7.709.494.474,53**	**COSTO DIRECTO**	**$ 18.164.079.982,00**	
	DESCUENTO IMPREVISTOS	**-$ 77.094.944,75**		**-$ 181.640.800,00**	
		$ 2.083.876.356,47	**AIU**	**$ 4.909.750.819,00**	

SUBTOTAL OBRAS			
Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados			**$ -**
Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable -			**$ 328.533.103,27**
Pólizas - Gasto Reembolsable-			**$ 109.138.173,00**
VALOR TOTAL ACTA 4		**$ 9.716.275.886,25**	**$ 23.329.861.277,27**

Al corte del **31 de octubre de 2025**, el Plan de Inversión debería encontrarse en un avance acumulado del 79,38%; no obstante, el avance real ejecutado es del 61,70%, lo que evidencia un atraso de 17,68 % frente a la programación inicial.

Este atraso es motivo de gran preocupación, ya que compromete el cumplimiento de las metas establecidas y genera un riesgo significativo para el desarrollo del contrato.

El CONSORCIO VIALMED 2025 aporto el flujo de inversión el día 21/07/2025 por valor a invertir mes a mes, y de acuerdo con la programación presentada.

A continuación, se presenta el programa y el flujo de inversión vigentes al **31 de octubre de 2025:**

Tabla 17 Gráfica programa de inversión mensual.

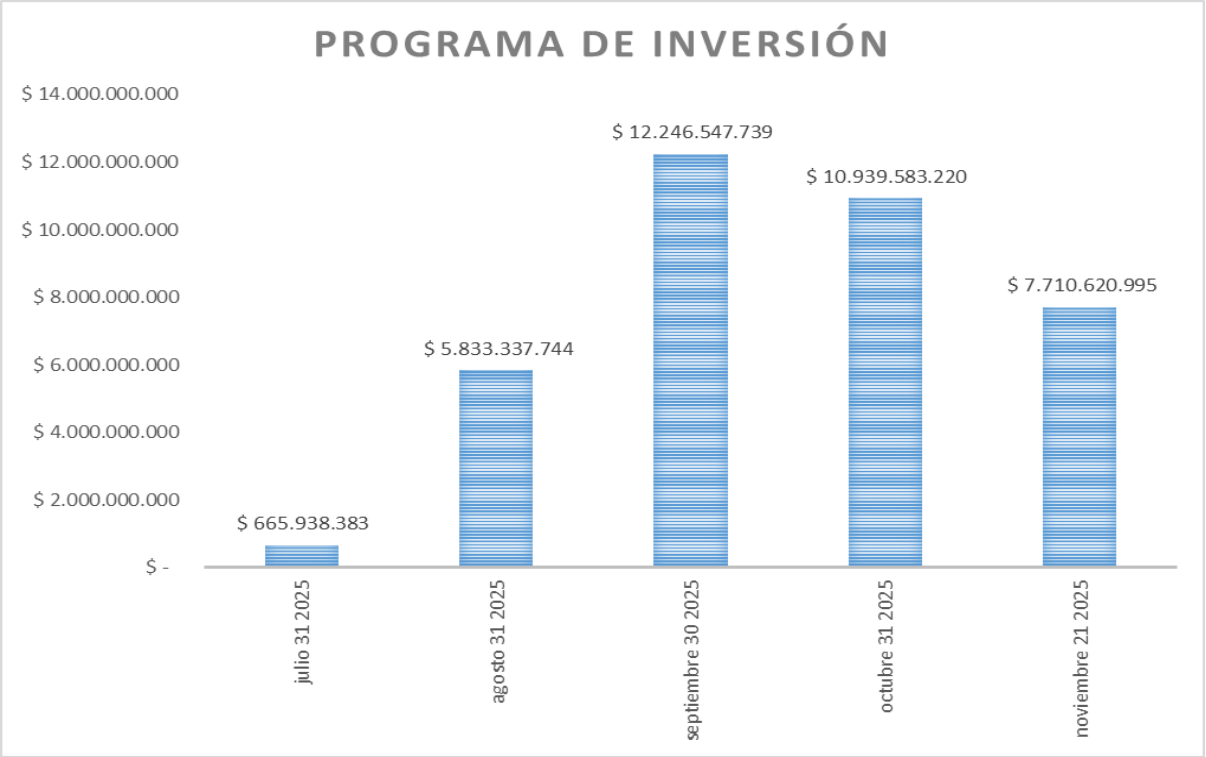


Tabla 18 Flujo de inversión mensual

OBJETO DEL CONTRATO:	**MANTENIMIENTO MALLA VIAL 2025**			
Fecha inicio:	Fecha fin:	**LÍNEA BASE DE INVERSIÓN**		
21/07/2025	21/11/2025			
Período	LÍNEA BASE V1		SEGUIMIENTO	

	Inversión programada mensual	Inversión programada acumulada V1	Inversión ejecutada mensual	Inversión ejecutada acumulada V1
Inicio	$ 0	$ 0		
Julio 31 de 2025	$ 665.938.383	$ 665.938.383	$ 530.951.936	$ 530.951.936
Agosto 31 de 2025	$ 5.833.337.744	$ 6.499.276.128	$ 3.598.144.787	$ 4.129.096.723
Septiembre 30 de 2025	$ 12.246.547.739	$ 18.745.823.867	$ 9.151.363.247	$ 13.280.459.970
Octubre 31 de 2025	$ 10.939.583.220	$ 29.685.407.086	$ 9.793.370.831	$ 23.073.830.801
Noviembre 21 de 2025	$ 7.710.620.995	$ 37.396.028.081		

Tabla 19 Programa de inversión acumulado

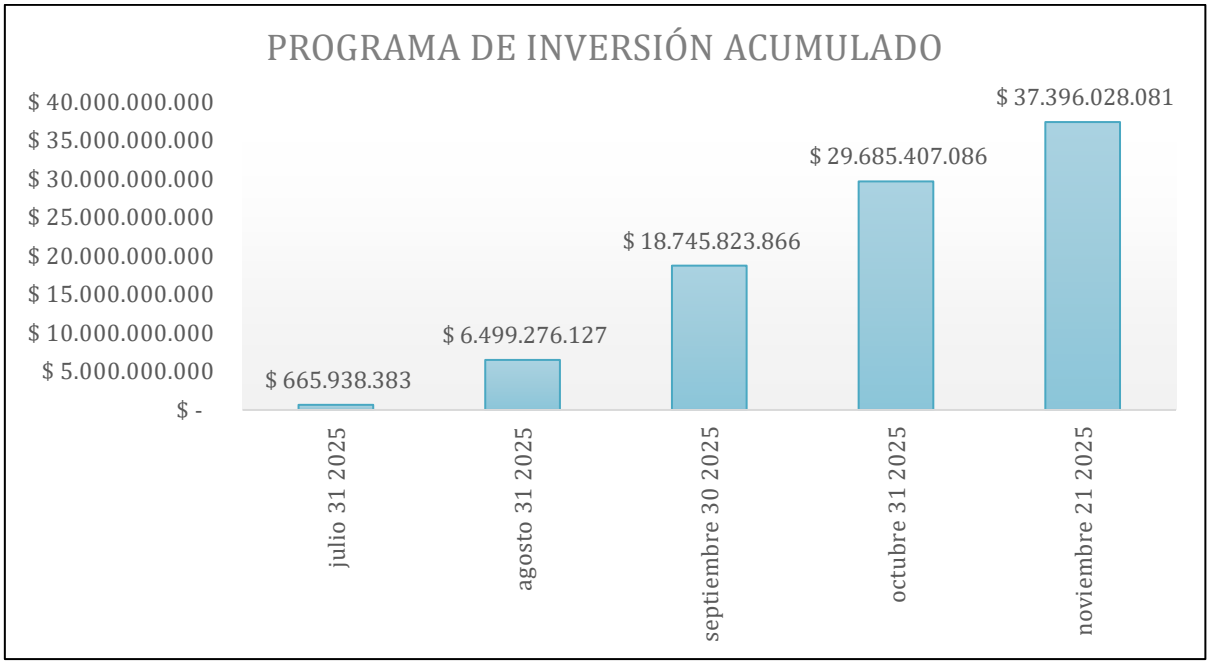
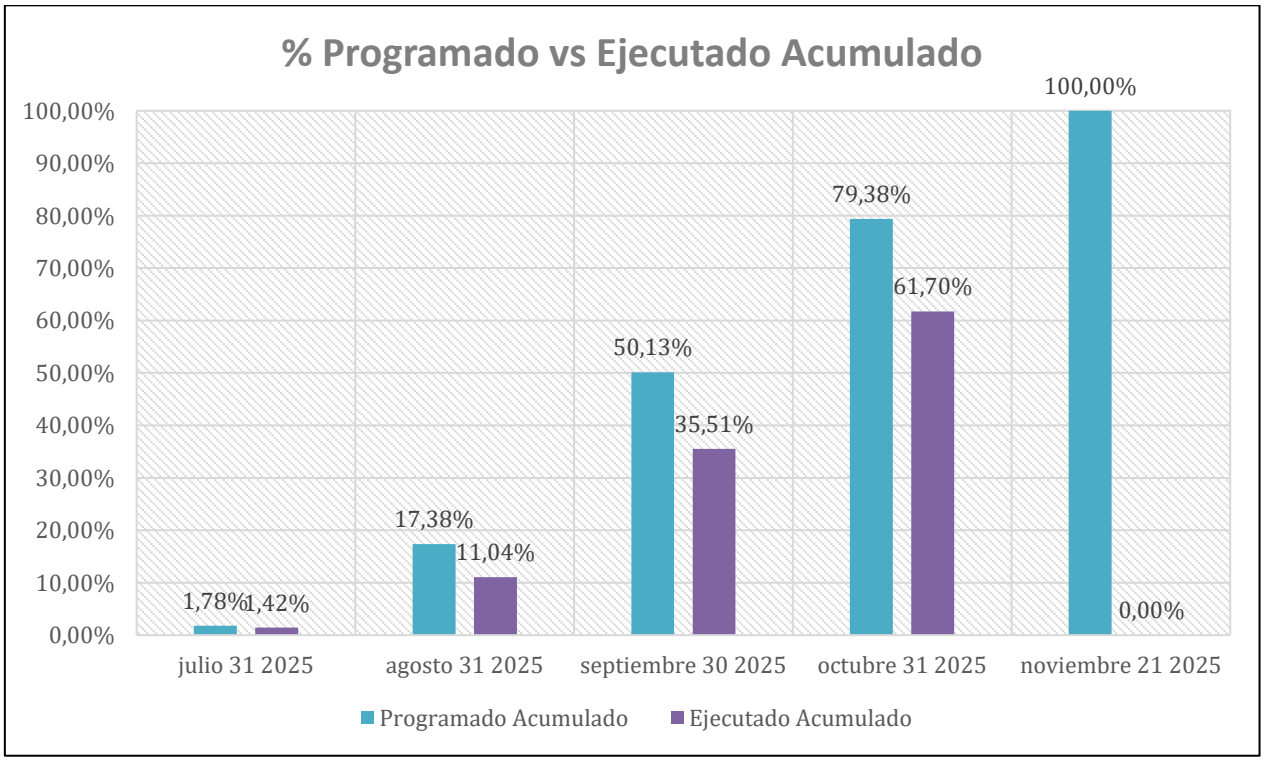


Tabla 20 Seguimiento inversión programada y ejecutado acumulada



Con base en el diagrama que representa el programa de obra del contrato y en donde se especifican para cada uno de los componentes, las actividades detalladas que lo conforman, el avance actual en cada una de las actividades, las relaciones entre ellas y la identificación de la ruta crítica; se debe realizar el análisis, las observaciones y conclusiones de la interventoría con respecto al cumplimiento del mismo.

2.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y VIGENCIA DE LICENCIAS, PERMISOS Y USO DE SERVICIOS PÚBLICOS:

Permisos Ambientales.

Para la ejecución del Contrato de Obra No. 4600105052 de 2025 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA y de acuerdo con la evaluación de impactos relacionados en el PASAO en el periodo reportado en el siguiente informe, no fueron necesarios trámites de permisos ambientales ante la Autoridad Ambiental competente Área metropolitana del Valle de Aburra – AMVA u otra entidad ambiental, situación que sigue vigente para la ejecución del contrato durante el mes de **octubre de 2025**.

Para el periodo de referencia, la interventoría realiza el respectivo control y seguimiento al cumplimiento de cada uno de los programas contenidos en el PASAO de obra y a la

normatividad ambiental vigente para la ejecución de proyectos de infraestructura, enfatizando el componente vial, manejo de sumideros, señalización, control de emisiones, manejo de maquinaria y vehículos.

Tabla 21 Permisos ambientales.

Tipo de permiso	No Resolución y fecha	Fecha de vencimiento	Observaciones
PASAO	N.A.	N.A	Una vez aprobadas la realización de las correcciones con base en las observaciones de la interventoría del documento PASAO, se envía la versión final mediante OFICIO No.014 4600105322 de 2025, a la supervisión.
Aprovechamiento forestal	N.A	N.A	De acuerdo a las actividades contempladas para la ejecución de la obra no es necesario tramitar Permiso de aprovechamiento Forestal; sin embargo, se hace recomendación al contratista sobre la importancia de la protección de raíces con el fin de no afectar los árboles. Así mismo, no hay autorización de intervención o aprovechamiento forestal en este momento.
Ocupación de cauce	N.A	N.A	No es necesario tramitar permiso de ocupación de cauce ante las autoridades competentes. No se contempla la ejecución de actividades constructivas en cercanías o inmediaciones de cauces.
Concesión de aguas	N.A	N.A	De acuerdo con las actividades contempladas para la ejecución de la obra de concesión de aguas ante las autoridades competentes; sin embargo, la empresa contratista obtuvo **PERMISO** por parte de EPM para tomar agua de los hidrantes que se encuentren en cada una de las cuadrillas en operación. Este permiso se encuentra en el informe presentado por el contratista. En el mes de agosto de 2025, se renovó el permiso, se obtuvo la autorización de epm para continuar con el uso de hidrantes, se encuentra pendiente el reporte del consumo y facturación de dicho recurso por la utilización de hidrantes.
Vertimientos	N.A	N.A	De acuerdo a las actividades contempladas para la ejecución de la obra no requiere permiso de vertimientos ante las autoridades competentes.

Tabla 22 Manejo de residuos de construcción y demolición.

Sitios de Disposición Final	Dirección	No de Resolución Ambiental
PROCOPAL	Autopista Norte Kilómetro 25, Entrada a Girardota	AN282022-8
PAVIMENTAR	Vereda Ancón Norte	AN282022-11
MINCIVIL	MINERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES DE COLOMBIA S.A. - MINCIVIL S.A.	AN282022-22

Tabla 23 Proveedores de materiales Pétreos.

Tipo de material	Nombre del proveedor y/o comercializador	Certificado RUCOM	Resolución Ambiental	Título Minero
Material Pétreo pavimentos	PAVIMENTAR S.A	HJHH-01	Resolución N°130AN-1406-15107 del 9 de junio de 2014: Por la cual se otorga un permiso de emisiones atmosféricas, el cual se otorga por un término de cinco (5) años (vigencia junio de 2019). • Resolución N°130AN-1405-15088 DEL 27 DE MAYO DE 2014, “Por la cual se adopta una decisión”. Se amplía el termino de vigencia del Plan de Manejo Ambiental por un tiempo igual al de la duración o vida útil del proyecto. • Resolución 160AN-RES2006-3162 del 09 de junio de 2020: “Por la cual se prorroga un permiso” Resuelve: “Artículo 1°: Prorrogar el permiso de emisiones atmosféricas para la emisión de gases contaminantes por fuentes fijas y para la emisión fugitiva o dispersa de contaminantes por actividades de explotación minera a cielo abierto, para el procesamiento de mezcla asfáltica y el beneficio de materiales pétreos…” La prórroga del presente permiso se otorga por un término de cinco (5) años contados a partir del 26 de junio de 2019. Ubicada en el Municipio de Copacabana - Sector Ancón Norte Carrera 103 #46-65 Autopista Norte. (Licencia ambiental contrato de concesión Minera Pavimentar). • Oficio con consecutivo 2207-2024, en el cual se solicita la Renovación de un Permiso de Emisiones	GALK-09

			Atmosféricas a la Corporación Autónoma Regional del centro de Antioquia.	
Material Pétreo pavimentos	PROCOPAL S.A.	Contrato de concesión minera N° 6871	Resolución N°130AN-1109-12530, por la cual se otorga una licencia ambiental a la sociedad PROCOPAL S.A del 29 de septiembre de 2011, para las actividades mineras de montaje, construcción, extracción o captación de los minerales yacentes en el suelo y subsuelo del área de interés minero, transporte interno, cierre y abandono de los materiales de construcción, amparados en el contrato de concesión minera N° 6871. La presente Licencia Ambiental se otorga por la vida útil del proyecto, esto es 24 años. Resolución N° 160 AN-RES1705-2658 del 20 de mayo de 2017, por el cual se prorroga un permiso de emisiones, el cual se renueva por un término de (5) cinco años, contados a partir de esta resolución (mayo 2022). Radicado N°160AN-COE2208-29292, Correo de la oficina Territorial Aburra Norte – CORANTIOQUIA, Continuidad al trámite de prórroga del permiso de emisiones.	H525005

Fuente: anexos PASAO.

Tabla 24. Relación de vehículos utilizado en el mes de **octubre de 2025**.

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
1	VOLQUETA	GTY061	2020	17/10/2025	17/10/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
2	VOLQUETA	TTO095	2013	25/10/2026	26/10/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	SI
3	VOLQUETA	WLW714	2015	13/7/2026	8/7/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
4	VOLQUETA	SSZ557	2012	18/2/2026	18/2/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
5	VOLQUETA	SNZ150	2015	24/5/2026	20/6/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
6	VOLQUETA	TDZ899	2013	9/12/2025	17/7/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
7	VOLQUETA	UVL600	2013	30/11/2025	28/8/2025	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
8	VOLQUETA	TJZ 305	2015	23/1/2026	17/6/2026	CDA DIAGNOSTIMAX	SI
9	VOLQUETA	SMV 676	2012	7/9/2025	22/5/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
10	VOLQUETA	SMV 677	2012	7/9/2025	6/6/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
11	VOLQUETA	SNR969	2013	27/7/2025	19/9/2025	COMERCIALIZADOREA SERVISUPER LTDA	SI
12	VOLQUETA	EQX167	2015	9/7/2026	7/7/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
13	CAMION	ESP 079	2018	3/4/2026	5/4/2026	CDA LA POSESION S.A.S.	SI
14	CAMION	SVO 420	2012	16/9/2026	8/9/2025	CDA DE ITAGUI	SI
15	CAMION	WCS 338	2014	17/7/2026	18/7/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
16	CAMION	TTT 997	2013	10/10/2025	20/1/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
17	CAMION	SZP 329	2012	25/10/2025	23/9/2025	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
18	CAMION	TNG 712	2010	4/4/2026	11/1/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
19	CAMION	GTX 043	2020	30/1/2026	1/2/2026	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO SUR S.A.S	SI
20	CAMION	TRI 504	2012	21/7/2026	18/7/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
21	CAMION	TSZ 903	2013	16/12/2025	13/6/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
22	VOLQUETA	EQX188	2015	16/07/2026	12/08/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
23	VOLQUETA	WEX535	2013	6/09/2025	9/09/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
24	CAMION	WCV774	2014	4/10/2025	3/09/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	SI
25	VOLQUETA	ZNM449	2015	23/02/2026	7/06/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
26	VOLQUETA	STH139	2013	28/06/2026	26/07/2026	CDA SAN GERMAN S.A.S	SI
27	VOLQUETA	UQE121	2012	22/11/2025	25/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
28	VOLQUETA	ZNM196	2015	21/07/2026	31/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
29	VOLQUETA	TMP284	2013	17/07/2026	19/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
30	CAMIÓN ESTACAS	EKU971	2006	11/04/2026	21/04/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
31	CAMION ESTACAS	TMX834	2007	16/03/2026	21/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
32	CAMIÓN TANQUE	GTX054	2020	28/01/2026	6/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
33	CAMIÓN TANQUE	TEK016	2013	14/03/2026	11/07/2026	REVISION PLUS CDA DEL MAGDALENA MEDIO	SI
34	CAMIÓN TANQUE IRRIGADOR	VKK868	1999	31/10/2025	12/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	NO
35	CAMIÓN TANQUE IRRIGADOR	WLX298	2016	12/12/2025	12/10/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
36	TRACTO CAMIÓN	TRF399	2008	27/12/2025	10/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
37	TRACTO CAMIÓN	TRF400	2008	26/12/2025	30/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
38	VOLQUETA DOBLE TROQUE	EQW848	2015	3/05/2026	19/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
39	VOLQUETA DOBLE TROQUE	EQW849	2015	3/05/2026	27/05/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
40	VOLQUETA DOBLE TROQUE	EQW857	2015	3/05/2026	11/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
41	VOLQUETA DOBLE TROQUE	SNQ565	2012	19/08/2026	24/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
42	VOLQUETA DOBLE TROQUE	SNZ330	2015	25/05/2026	10/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
43	VOLQUETA DOBLE TROQUE	SNZ331	2015	26/05/2026	28/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
44	VOLQUETA DOBLE TROQUE	STY652	2011	14/03/2026	19/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
45	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF301	2008	28/09/2025	16/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
46	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF302	2008	28/09/2025	20/09/2020	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
47	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF304	2008	28/09/2025	8/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
48	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF426	2008	6/02/2026	13/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
49	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF427	2008	6/02/2026	5/03/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
50	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF429	2008	8/09/2025	2/09/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
51	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF430	2008	30/01/2026	5/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
52	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRF432	2008	25/07/2026	24/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
53	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK250	2013	7/07/2026	28/09/2025	CDA LA CEJA	SI
54	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK251	2013	26/06/2026	22/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
55	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK254	2013	26/06/2026	27/06/2027	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
56	VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRK330	2013	10/07/2026	8/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
57	CAMION VOLCO	KAI128	1946	31/07/2026	5/06/2026	CDA SUROESTE S.A.S.	NO
58	VOLQUETA PLATON	KBD209	1955	16/06/2026	29/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	NO
59	CAMIÓN	IAT466	2015	17/12/2025	29/07/2026	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
60	VOLQUETA (REPOTENCIACIÓN 21-07-2025)	TMG156	1997	3/12/2025	17/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LOS BUCAROS	SI
61	VOLQUETA	TFW399	2011	17/06/2026	15/06/2026	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
62	AUTOMOVIL	KPQ732	2022	15/07/2026	NO APLICA	NO APLICA	SI
63	VOLQUETA	SMV677	2012	7/09/2026	6/06/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
64	VOLQUETA	SMV676	2012	7/09/2026	22/05/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
65	VOLQUETA	SMX568	2012	29/05/2026	6/06/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
66	VOLQUETA	TRL738	2014	2/12/2025	28/02/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
67	VOLQUETA	TRL740	2014	8/11/2025	16/01/2026	IVESUR COLOMBIA - MEDELLIN	SI
68	VOLQUETA	TAP993	2012	14/02/2026	26/06/2026	COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA	SI
69	AUTOMOVIL	GHY406	2020	25/01/2026	10/01/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
70	VOLQUETA	SXY151	2011	8/04/2026	6/06/2026	CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10	SI
71	CAMIONETA	WLY295	2017	28/11/2025	24/11/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	SI
72	CARRO TANQUE	EQX651	2018	16/12/2025	22/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
73	CARRO TANQUE	STZ803	2012	24/10/2025	18/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
74	IMPRIMADOR	TRM849	2015	4/12/2025	22/03/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
75	VOLQUETA	SRN501	2008	24/07/2026	3/08/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
76	VOLQUETA	NNL624	2023	30/08/2026	NO APLICA	NO APLICA	SI
77	VOLQUETA	LCL916	2023	18/03/2026	18/03/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
78	VOLQUETA	TRG809	2010	7/12/2025	28/05/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
79	CAMIÓN ESTACAS	TRM015	2013	24/04/2026	27/05/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
80	VOLQUETA	EQW850	2015	3/05/2026	6/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
81	VOLQUETA	EQW855	2015	3/05/2026	18/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
82	VOLQUETA	SNQ566	2012	19/08/2026	23/04/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
83	VOLQUETA	SNZ328	2015	24/05/2026	9/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
84	VOLQUETA	SNZ329	2015	24/05/2026	16/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
85	VOLQUETA	SRL786	2007	23/08/2026	21/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
86	VOLQUETA	SRM029	2007	14/09/2025	18/10/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	NO
87	VOLQUETA	STS110	2012	13/12/2025	5/03/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
88	VOLQUETA	STZ403	2011	20/06/2026	25/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
89	VOLQUETA	TDZ385	2012	8/06/2026	5/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
90	VOLQUETA	TEK570	2013	20/11/2025	28/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
91	VOLQUETA	TRE712	2007	16/08/2026	20/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
92	VOLQUETA	TRE714	2007	16/08/2026	26/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
93	VOLQUETA	TRE716	2007	16/08/2026	11/03/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
94	VOLQUETA	TRE929	2007	12/08/2026	12/08/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
95	VOLQUETA	TRE988	2007	21/03/2026	27/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
96	VOLQUETA	TRE989	2007	21/03/2026	7/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
97	VOLQUETA	TRF303	2008	28/09/2025	11/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
98	VOLQUETA	TRF394	2008	15/04/2026	25/04/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
99	VOLQUETA	TRF395	2008	29/11/2025	14/04/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
100	VOLQUETA	TRF396	2008	15/01/2026	16/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
101	VOLQUETA	TRF397	2008	29/11/2025	28/11/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
102	VOLQUETA	TRF398	2008	29/11/2025	23/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
103	VOLQUETA	TRF428	2008	6/02/2026	9/06/2026	CDA AUTOVIAL DEL CARIBE	SI
104	VOLQUETA	TRF431	2008	30/01/2026	17/06/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
105	VOLQUETA	TRF433	2008	13/03/2026	25/09/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
106	VOLQUETA	TRF434	2008	3/06/2026	17/01/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
107	VOLQUETA	TRF941	2009	27/01/2026	18/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
108	VOLQUETA	TRG946	2009	31/01/2026	7/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
109	VOLQUETA	TRK249	2013	26/06/2026	7/10/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
110	VOLQUETA	TRK250	2013	7/07/2026	28/09/2025	CDA LA CEJA	SI
111	VOLQUETA	TRK252	2013	26/06/2026	10/10/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
112	VOLQUETA	TRK253	2013	26/06/2026	14/07/2026	CDA EL WAALEKAI S.A.S	SI
113	VOLQUETA	TRK256	2013	26/06/2026	1/10/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
114	VOLQUETA	TRK257	2013	26/06/2026	9/04/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
115	CAMIONETA	TMW127	2008	26/07/2026	6/09/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
116	CAMION	TTT651	2016	30/10/2025	5/10/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICOS LOS BUCAROS	SI
117	VOLQUETA SENCILLA	SRN462	2008	4/06/2026	4/03/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
118	VOLQUETA SENCILLA	TRG336	2009	16/12/2025	30/09/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
119	CAMIÓN ESTACAS	STE198	2015	26/10/2025	19/09/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
120	VOLQUETA DOBLE TROQUE	WCP320	2015	25/06/2026	21/06/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
121	CAMPERO WAGON RAV 4	LCZ253	2022	13/05/2026	NO APLICA	NO APLICA	SI

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Consecutivo	TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	MODELO	VIGENCIA SEGURO OBLIGATORIO	CERTIFICADO EMISIÓN DE GASES / REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA		Aprobado S/N
					Fecha	CDA	
122	VOLQUETA	STY159	2011	31/10/2025	2/12/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	SI
123	VOLQUETA SENCILLA	TLY806	2014	5/02/2026	6/06/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
124	VOLQUETA SENCILLA	SNW324	2014	22/12/2025	23/12/2025	CDA LOS BUCAROS	SI
125	VOLQUETA	TRK324	2013	9/07/2026	8/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
126	VOLQUETA	SNZ329	2015	24/05/2026	16/07/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
127	VOLQUETA	LCL811	2023	17/02/2026	14/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
128	VOLQUETA	SRN461	2008	4/06/2026	29/08/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
129	VOLQUETA	SRO430	2008	8/04/2026	29/05/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
130	VOLQUETA	STE519	2024	13/01/2026	NO APLICA	NO APLICA	SI
131	VOLQUETA	STE520	2024	13/01/2026	NO APLICA	NO APLICA	SI
132	VOLQUETA	TRG817	2010	7/12/2025	9/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
133	VOLQUETA	TRH821	2011	14/01/2026	26/12/2025	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
134	VOLQUETA	TRM050	2015	4/06/2026	5/03/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
135	CAMIÓN ESTACAS	JYY370	2023	17/08/2026	NO APLICA	NO APLICA	SI
136	VOLQUETA	STX105	2013	5/07/2026	25/08/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
137	VOLQUETA	TJZ677	2015	25/04/2026	18/06/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
138	VOLQUETA	TJZ679	2015	25/04/2026	25/06/2026	CDA LOS BUCAROS	SI
139	VOLQUETA	WPT376	2017	28/12/2025	3/12/2025	C.D.A HANGARES S.A.S. PALACE	SI
140	VOLQUETA	SNX167	2015	17/11/2025	18/02/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
141	CAMIÓN	UFZ690	2012	25/08/2026	3/08/2026	C.D.A LIVIANOS Y PESADOS GIRARDOTA	SI
142	VOLQUETA	WNX494	2015	18/12/2025	2/12/2025	CENTRO DE DIAGNOSTICO LOS BUCAROS S.A.S	SI
143	VOLQUETA	LKK838	2023	1/04/2026	5/04/2026	CDA MI RIO	SI

Fuente: anexos Informe Ambiental

2.2.1 PMT (Plan De Manejo De Tránsito)

En cumplimiento a sus obligaciones contractuales indicadas en el numeral 4. de la Cláusula 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, en el que se indica *"Formular y ejecutar el Plan de Manejo de Tránsito y las especificaciones técnicas y normatividad vigente, previa aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial"*, el Consorcio Vialmed 2025 radicó el 17 de julio del presente año ante la secretaría de movilidad del municipio de Medellín, el Plan de Manejo de Tránsito General validado previamente por la interventoría para su posterior implementación. Mediante la resolución No. 202510238348 del 21 de julio, fue aprobada este PMT, y posteriormente ajustada el día 22 de julio, para incluir las intervenciones en horarios nocturnos. Esta resolución de aprobación otorga una vigencia desde el 22 de julio al 22 de noviembre del presente año, y ha sido la guía de seguimiento y control de la implementación de la señalización de obras para las intervenciones en rangos 0, 1, 2 y 3.

En intervenciones particulares con alto impacto a la movilidad ha sido necesaria la elaboración de Planes de Manejo de Tránsito específicos que detallen el tipo de señalización a implementar, cierres, desvíos, planes de divulgación entre otros. Para el periodo comprendido entre el **01 y el 31 de octubre** del presente año, se requirió realizar la solicitud de aprobación de los PMT específicos para:

- El cierre parcial de la avenida El Poblado (Carrera 43A) Calzada occidental entre calle 9 y calle 10, y calle 3 Sur y calle 9 Sur. Y el cierre parcial de la calzada oriental entre calle 7 y calle 10, el cual fue aprobado por la secretaría de movilidad del municipio de Medellín mediante radicado No. 202530499706 del 14 de octubre de 2025.

- Cierre total de la Carrera 40 entre calle 48 y calle 49A, el cual fue aprobado por la secretaría de movilidad del municipio de Medellín mediante radicado No. 202530539259 del 31 de octubre de 2025.

- Cierre parcial de la Avenida Regional Carrera 61 – Vía de travesía entre Puente de Guayaquil (Calle 32) y Calle 33 (Calle 37), el cual fue aprobado por la secretaría de movilidad del municipio de Medellín mediante radicado No. 202530539251 del 31 de octubre de 2025.

Por otra parte, se tiene que, para el periodo del presente informe de interventoría, el contratista de obra, el Consorcio VialMed 2025, ejecutó parte del presupuesto contractual del proyecto dentro del rubro de *"Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable"* los elementos indicados en la siguiente tabla, los cuales fueron debidamente evaluados por la interventoría:

Cantidades ejecutadas y cobradas en Acta No.4 dentro del rubro *Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable:*

ITEM	UN.	CANT.	VR UNI.	VR TOTAL
Señales preventivas. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015. Vías secundarias. 60x60 *	un	2	$ 174.675,00	$ 299.280
Paleta de PARE y SIGA. Dimensiones y características según lo establecido por el Manual de Señalización Vial 2015 - Numeral 4.10.5 *	un	2	$ 42.080,00	$ 116.144
Maletín (1,60 m x 1,0 m)	un	6	$ 289.274,00	$ 1.177.386
Flasher luminoso grande	un	28	$ 79.135,00	$ 2.215.780
Flasher luminoso grande	un	10	$ 79.135,00	$ 791.350
SUBTOTAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				**$ 4.599.940**

Lo indicado en la tabla anterior totaliza una ejecución acumulada de elementos de PMT en un valor de $144'264.030

En el mes de **octubre de 2025** se realizaron las siguientes actividades con respecto al área de Manejo de tránsito:

Se realizó acompañamiento en los diferentes frentes de obra, donde se verificó la adecuada implementación del esquema de señalización vertical y dispositivos de canalización de tráfico, los cuales se estuvo ajustando con los esquemas completos y dispositivos de canalización de tránsito requeridos.

Por otra parte, se tiene la relación del inventario de las marcas viales intervenidas por la obra y en proceso de restitución con pintura acrílica al día siguiente de realizada la rehabilitación de la carpeta asfáltica y 30 días después en pintura plástica en frío. En la siguiente tabla se relacionan las marcas viales intervenidas durante el mes de **octubre de 2025**:

DIRECCIÓN PLACA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CL 49A CR 87 CR 87A	Los Alcázares	01/10/2025	Línea de eje amarilla 0.12
CL 49A CR 87 CR 87A	Los Alcázares	01/10/2025	Texto PARE (1un)
CL 49A CR 87 CR 87A	Los Alcázares	01/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CL 49A CR 87 CR 87A	Los Alcázares	01/10/2025	Flecha de doble giro (1un)
CL 49A CR 87 CR 87A	Los Alcázares	01/10/2025	Flecha de frente (1 un)
CL 49A CR 87A CR 88A	Los Alcázares	01/10/2025	Línea de eje amarilla 0.12
CL 49A CR 87A CR 88A	Los Alcázares	01/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 49A CR 87A CR 88A	Los Alcázares	01/10/2025	Línea de detención 0.4
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	01/10/2025	Línea de eje amarilla 0.12
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	01/10/2025	Flecha de frente (1 un)
CL 49A CR 87A CR 88A	Los Alcázares	02/10/2025	Línea de detención 0.4
CL 49A CR 87A CR 88A	Los Alcázares	02/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	02/10/2025	Flecha doble giro (1 und)
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	02/10/2025	Línea de eje amarilla 0.12
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	02/10/2025	Texto PARE (2un)
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	02/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	02/10/2025	Línea externa achurado 0.12
CL 49A CR 88A CR 88B	Los Alcázares	02/10/2025	Línea interna achurado 0.4
CR 89A CL 49 CL 49A	Los Alcázares	02/10/2025	Línea de eje amarilla 0.12
CR 89A CL 49 CL 49A	Los Alcázares	02/10/2025	Texto PARE (1un)
CR 89A CL 49 CL 49A	Los Alcázares	02/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CR 89A CL 49 CL 49A	Los Alcázares	02/10/2025	Línea de eje amarilla 0.12
CL 49DD CR 95 CR 95AA	Los Alcázares	02/10/2025	Línea de eje amarilla 0.12, dirección real CR 89 CL49AA-07
CR 94 CL 48DD CL 48E	La Pradera	02/10/2025	Resalto
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	02/10/2025	Línea separadora de carril 0.12
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	02/10/2025	Flecha de frente (2un)
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	02/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
LAZO CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	02/10/2025	Línea de detención 0.4
LAZO CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	02/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
LAZO CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	02/10/2025	Triángulo ceda el paso (1un)
LAZO CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	02/10/2025	Dados ceda el paso 0.4
CR 47 CL 52 CL 53	La Candelaria	02/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CR 47 CL 52 CL 53	La Candelaria	02/10/2025	Flecha de frente (2un)
CR 47 CL 52 CL 53	La Candelaria	02/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CR 47 CL 52 CL 53	La Candelaria	02/10/2025	Línea de detención 0.4
CR 47 CL 52 CL 53	La Candelaria	02/10/2025	Pictograma prohibido parquear (3un)
CR 47 CL 52 CL 53	La Candelaria	02/10/2025	Líneas delimitantes celdas de parqueo 0.12
CR 47 CL 52 CL 53	La Candelaria	02/10/2025	Flecha de frente y giro (1un)
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	03/10/2025	Línea separadora de carril 0.12
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	03/10/2025	Flecha de frente (1un)
CL 5 SUR CR 42 CR 43A	Alejandría	03/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 5 SUR CR 38 CR 42	Alejandría	03/10/2025	Flecha de frente (2un)
CR 53 CL 12AA SUR CL 12B SUR	La Colina	03/10/2025	Texto ZONA ESCOLAR (1 un)
CR 53 CL 12AA SUR CL 12B SUR	La Colina	03/10/2025	Pictograma zona escolar (1un)
CR 53 CL 12AA SUR CL 12B SUR	La Colina	03/10/2025	Línea de borde blanca 0.12
CR 53 12B SUR CL 12C SUR	La Colina	03/10/2025	Resalto
CR 53 12B SUR CL 12C SUR	La Colina	03/10/2025	Flecha de frente (1 un)
CL 12C SUR CR 53 CR 53+83	La Colina	03/10/2025	Texto PARE (1un)

DIRECCIÓN PLACA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CL 12C SUR CR 53 CR 53+83	La Colina	03/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CL 10A CR 37 CR 38	El Poblado	03/10/2025	Resalto
CL 11 CR 42 CR 43A	Lalinde	06/10/2025	Flecha de frente (2 un)
CL 11 CR 42 CR 43A	Lalinde	06/10/2025	Flecha de solo giro (2 un)
CL 11 CR 42 CR 43A	Lalinde	06/10/2025	Líneas de división carril 0.20
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4 (Cruce Cr36)
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	RAB 0.4
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Línea de eje blanco 0.12
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Línea de borde izquierdo blanca 0.12
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Línea de borde derecho blanca 0.12
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Flecha de frente (1un)
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Flecha de frente y giro (1un)
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Línea de detención 0.4
CL 10A CR 36 CR 37	El Poblado	06/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 10A CR 37 CR38	El Poblado	06/10/2025	Línea de eje blanco 0.12
CL 10A CR 37 CR38	El Poblado	06/10/2025	Línea de borde derecho blanca 0.12
CL 10A CR 37 CR38	El Poblado	06/10/2025	Línea de borde izquierdo blanca 0.12
CL 10A CR 37 CR38	El Poblado	06/10/2025	Línea de detención 0.4
CL 10A CR 37 CR38	El Poblado	06/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 10A CR 37 CR38	El Poblado	06/10/2025	Flecha de frente y giro (1un)
CL 10A CR 37 CR38	El Poblado	06/10/2025	Flecha de frente (1un)
CR 37 CL 10A CL10B	El Poblado	06/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CR 37 CL 10 CL 10A	El Poblado	06/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CR 37 CL 10 CL 10A	El Poblado	06/10/2025	Texto PARE (1un)
CR 38 CL 10A CL 10B	El Poblado	06/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 10A +CR 42 CR 43A	El Poblado	07/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CL 10A +CR 42 CR 43A	El Poblado	07/10/2025	Línea punteada bahía 0.12
CL 10A +CR 42 CR 43A	El Poblado	07/10/2025	Flecha solo giro (2 un)
CL 10A +CR 42 CR 43A	El Poblado	07/10/2025	Línea de detención 0.4
CL 10A +CR 42 CR 43A	El Poblado	07/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CL 10A CR 38 CR 40	El Poblado	07/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 10A CR 38 CR 40	El Poblado	07/10/2025	Línea de eje blanco 0.12
CL 10A CR 38 CR 40	El Poblado	07/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 10A CR 38 CR 40	El Poblado	07/10/2025	Flecha de frente (2 un)
CR 40 CL 10A CL 10B	El Poblado	07/10/2025	Prohibido parquear (1 un)
CR 40 CL 10A CL 10B	El Poblado	07/10/2025	Línea de detención 0.4
CR 40 CL 10A CL 10B	El Poblado	07/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CR 40 CL 10 CL 10A	El Poblado	07/10/2025	Flecha de solo giro (1 un)
CR 40 CL 10 CL 10A	El Poblado	07/10/2025	Línea de detención 0.4
CR 40 CL 10 CL 10A	El Poblado	07/10/2025	Líneas de paso peatonal 0.4
CR 40 CL 10 CL 10A	El Poblado	07/10/2025	Celda TAXI 0.12
CL 10A + CR 42 CR 43A	El Poblado	08/10/2025	Línea de borde 0.2
CL 10A + CR 42 CR 43A	El Poblado	08/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CL 10A CR 40 CR 41	El Poblado	08/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CL 10A CR 40 CR 41	El Poblado	08/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 10A CR 40 CR 41	El Poblado	08/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 10A CR 40 CR 41	El Poblado	08/10/2025	Flecha de frente (1 un)
CL 10A CR 40 CR 41	El Poblado	08/10/2025	Flecha de frente y giro (1 un)
CL 10A CR 41 CR 41A	El Poblado	08/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 10A CR 41 CR 41A	El Poblado	08/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CL 10A CR 41 CR 41A	El Poblado	08/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 10A CR 41 CR 41A	El Poblado	08/10/2025	Línea segmentada división de carril 0.12
CL 10A CR 41 CR 41A	El Poblado	08/10/2025	Flecha de frente (3 un)
CL 10A CR 41A CR 42	El Poblado	08/10/2025	Línea de borde derecho 0.12

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DIRECCIÓN PLACA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CL 10A CR 41A CR 42	El Poblado	08/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CL 10A CR 41A CR 42	El Poblado	08/10/2025	Línea segmentada división de carril 0.12
CL 10A CR 41A CR 42	El Poblado	08/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 10A CR 41A CR 42	El Poblado	08/10/2025	Flecha de frente (3 un)
CR 41A CL 10 CL 10A	El Poblado	08/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CR 41A CL 10 CL 10A	El Poblado	08/10/2025	Texto PARE (2 un)
CR 41A CL 10 CL 10A	El Poblado	08/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CR 41A CL 10 CL 10A	El Poblado	08/10/2025	Flecha de solo giro (2 un)
CR 41A CL 10 CL 10A	El Poblado	08/10/2025	Pictograma prohibido parquear (1 un)
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Flecha de frente (3 un)
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea de eje blanca 0.12
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Flecha terminación de carril (2 un)
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea externa isla 0.12
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea interna isla 0.12
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Texto PARE (1 un)
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea externa achurado 0.12
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea interna achurado 0.4
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea externa isla 0.12
CL 11 + CR 43A CR 43B	El Poblado	10/10/2025	Línea interna isla 0.12
CL 11 CR 43A CR 43B	Manila	10/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 11 CR 43A CR 43B	Manila	10/10/2025	Línea de eje 0.12
CL 11 CR 43A CR 43B	Manila	10/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Línea división de carril 0.12
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Línea de eje 0.12
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Flecha de frente y giro (1 un)
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Flecha de frente (2 un)
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Línea de detención 0.4
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	10/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
CR 43B CL 10A CL 11	Manila	10/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CR 43B CL 10A CL 11	Manila	10/10/2025	Línea de borde 0.12
CL 11 CR 43B CR 43C	Manila	14/10/2025	RAB 0.4
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Línea división de carril 0.12
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Línea de eje 0.12
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Flecha de frente y giro (1 un)
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Flecha de frente (5 un)
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Línea de detención 0.4
CL 11 CR 43C CR 43D	Manila	14/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
CR 43C CL 10 CL 11	Manila	14/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
CR 43C CL 11 CL 11+	Manila	14/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
CR 48 CL 16A SUR CL 17A SUR	Santa María de los Ángeles	14/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
CR 48 CL 16A SUR CL 17A SUR	Santa María de los Ángeles	14/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
TV 5A CR 39 + 200 CL 5A	La Florida	16/10/2025	Texto PARE (1 un)
CL 47D CR 86B CR 87	La Floresta	16/10/2025	RAB 0.4
CL 47D CR 86B CR 87	La Floresta	16/10/2025	Líneas paso peatonal 0.4
CL 47D CR 86B CR 87	La Floresta	16/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 47D CR 86B CR 87	La Floresta	16/10/2025	Línea eje 0.12
CL 47D CR 86B CR 87	La Floresta	16/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

DIRECCIÓN PLACA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CL 47D CR 86B CR 87	La Floresta	16/10/2025	Flecha de frente (3 un)
CL 47D CR 86B CR 87	La Floresta	16/10/2025	Flecha de frente y giro (1un)
CR 86B CL 47A CL 47D	La Floresta	16/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CR 86B CL 47A CL 47D	La Floresta	16/10/2025	Texto PARE (1 un)
CL 47D CR 86A CR 86B	La Floresta	16/10/2025	Línea de borde derecho 0.12
CL 47D CR 86A CR 86B	La Floresta	16/10/2025	Línea eje 0.12
CL 47D CR 86A CR 86B	La Floresta	16/10/2025	Línea de borde izquierdo 0.12
CL 47D CR 86A CR 86B	La Floresta	16/10/2025	Flecha de frente (3 un)
CL 47D CR 86A CR 86B	La Floresta	16/10/2025	Flecha de frente y giro (1un)
CR 86A CL 47A CL 47D	La Floresta	16/10/2025	Línea de PARE de 0.4
CR 86A CL 47A CL 47D	La Floresta	16/10/2025	Texto PARE (1 un)
CR 47 B CL 98A Y 99	MOSCU	21/10/2025	RESALTO
CR 47 B CL 98A Y 99	MOSCU	21/10/2025	RESALTO
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	21/10/2025	LINEA EJE AMARILLA 0,12
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	21/10/2025	Flecha doble giro (1 und)
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	21/10/2025	Pictograma Zona escolar (1 un)
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	21/10/2025	Texto ZONA ESCOLAR (1 un)
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	21/10/2025	linea paso peatonal 0,40
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	21/10/2025	linea detención 0,40
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	21/10/2025	linea detención 0,40
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	22/10/2025	LINEA EJE AMARILLA 0,12
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	22/10/2025	Texto ZONA ESCOLAR (1 un)
CR 48 CL 99 Y 100	MOSCU	22/10/2025	flecha frente doble giro
CL 99 CR 74	AV. VEGAS	23/10/2025	texto pare 1un
CL 99 CR 47B	AV. VEGAS	23/10/2025	flecha frente giro
CL 96 CR 72	AV. VEGAS	23/10/2025	Flecha frente doble giro
CL 96 CR 72	AV. VEGAS	23/10/2025	texto PARE
CL 96 CR 72	AV. VEGAS	23/10/2025	linea de pare 0,40
CR 48 CL 17ASUR DG 47A	AV. VEGAS	23/10/2025	linea borde amarillo 0.12
CR 48 CL 17ASUR DG 47A	AV. VEGAS	23/10/2025	linea división carril 0.12
CR 48 CL 17ASUR DG 47A	AV. VEGAS	23/10/2025	flecha frente y giro
CR 48 CL 17ASUR DG 47A	AV. VEGAS	23/10/2025	linea división carril 0.12
CR 48 CL 17ASUR DG 47A	AV. VEGAS	23/10/2025	linea división carril 0.12
CR 48 CL 17ASUR DG 47A	AV. VEGAS	23/10/2025	flecha frente giro
CR 48 CL 17ASUR DG 47A	AV. VEGAS	23/10/2025	Linea de bahía segmen 0,12
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	linea borde amarillo 0.12
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	linea división carril 0.12
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	flecha frente
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	linea división carril 0.12
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	linea inter achurado 0.40
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	linea externa achurado 0,12
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	linea división carril 0.12
CR 48 DG 47A CL 15SUR	AV. VEGAS	23/10/2025	flecha frente y giro
CR 48 DG 47	AV. VEGAS	23/10/2025	Texto pare
CR 48 DG 47	AV. VEGAS	23/10/2025	linea pare 0,40
CR 48 DG 47	AV. VEGAS	23/10/2025	linea eje amarilla 0.12
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	24/10/2025	Linea borde izq 0.12
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	24/10/2025	linea división carril 0.12
CR 48 DG 47A CL 15 SUR	AV. VEGAS	27/10/2025	Linea borde blanca 3.12
CR 48 DG 47A CL 15 SUR	AV. VEGAS	27/10/2025	linea bahía segm 0.12
CR 48 DG 47A CL 15 SUR	AV. VEGAS	27/10/2025	paradero W bus convertido en 0,40 (28,63*0.25/0.40)
CR 48 DG 47A	AV. VEGAS	27/10/2025	Dados ceda paso 0.40
CR 48 DG 47A	AV. VEGAS	27/10/2025	linea eje amarillo 0.12
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	linea división carril 0.12

DIRECCIÓN PLACA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	linea borde derecho 0.12
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	paradero W bus convertido en 0,40 (27.55*0.25/0.40)
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	paradero W bus convertido en 0.40 (27.73*0.25/0.40)
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	flecha de frente
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	flecha frente y giro
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	linea pare 0.40
CR 55 CL 44	GUAYAQUIL	27/10/2025	linea división carril 0.12
CL 34B 118-118			RESALTO (anexo ing Jose Camilo)
CL 47D CR 86 Y 86A	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea borde izq 0.12
CL 47D CR 86 Y 86A	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea borde derecho 0.12
CL 47D CR 86 Y 86A	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea eje 0.12
CL 47D CR 86 Y 86A	SANTA LUCIA	28/10/2025	flecha frente
CL 47D CR 86 Y 86A	SANTA LUCIA	28/10/2025	flecha frente y giro
CL 47D CR 86 Y 86A	SANTA LUCIA	28/10/2025	Dados ceda paso 0.40
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea pare 0.40
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea paso peatonal 0,40
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea eje amarilla 0.12
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea detención 0.40
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea detención 0.40
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	flecha solo giro
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	flecha frente giro
CR 86 CL 47C 47D	SANTA LUCIA	28/10/2025	Texto pare
CR 86 CL 47B 47C	SANTA LUCIA	28/10/2025	Linea eje amarilla 0.12
CR 86 CL 47B 47C	SANTA LUCIA	28/10/2025	flecha frente y giro
CL 47D CR 83 Y 86	SANTA LUCIA	28/10/2025	Linea borde izq 0.12
CL 47D CR 83 Y 86	SANTA LUCIA	28/10/2025	linea eje 0.12
CL 48 DD 99B	JUAN XXIII	28/10/2025	RESALTO
CR 76 CL 35	LAURELES	28/10/2025	linea paso peatonal 0.40 plástico frio
CR 77 CL 35	LAURELES	28/10/2025	flecha frente
CR 23 B 84B-188	BELLO HORIZONTE	29/10/2025	resalto plástico frio
CR 26C 98-05	BELLO HORIZONTE	29/10/2025	resalto plástico frio
CR 26C 98-89	LA ESPERANZA	29/10/2025	resalto plástico frio
CR 23B 84B-62	LA ESPERANZA	29/10/2025	triángulos blanco resalto acrílico
CR 36 91-11	LAS GRANJAS	29/10/2025	resalto acrílico
CL 47D CR 83/86	SANTA LUCIA	30/10/2025	Linea borde izq 0.12 blanco
CL 47D CR 83/86	SANTA LUCIA	30/10/2025	linea eje 0.12 blanco
CL 47D CR 83/86	SANTA LUCIA	30/10/2025	linea borde der 0.13
CL 47D CR 83/86	SANTA LUCIA	30/10/2025	flecha frente giro
CL 47D CR 83/86	SANTA LUCIA	30/10/2025	flecha frente
CR 83 CL 47C/47D	SANTA LUCIA	30/10/2025	LINEA PASO PEATONAL 0.40
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	Linea borde der 0.12
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	line eje 0.12
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	RAB. 0,40
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	linea paso peatonal 0.40
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	linea pare 0.40
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	texto pare
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	flecha frente y giro
CL 47D CR 82/83	SANTA LUCIA	30/10/2025	linea borde izq 0.12
CL 38 CR 94	SANTA MONICA	31/10/2025	linea PARE 0.40
CL 38 CR 94	SANTA MONICA	31/10/2025	Texto PARE
CL 38 CR 94	SANTA MONICA	31/10/2025	Flecha doble giro

DIRECCIÓN PLACA	BARRIO	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CL 38 CR 94	SANTA MONICA	31/10/2025	linea eje amarilla 0.12
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	linea eje amarilla 0.12
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	Linea externa achurado amarilla 0.12
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	linea interna achurado amarilla 0.40
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	linea externa achurada blanca 0.12
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	linea interna achurada blanca 0.40
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	dado ceda el paso 0.40
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	flecha de frente
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	flecha frente y giro
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	triangulo ceda el paso
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	dado ceda el paso de 0.4
CR 94 CL 37A Y 38	SANTA MONICA	31/10/2025	linea celda taxi 0.12
CL 37 CR 93 Y 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	Flecha de frente
CL 37 CR 93 Y 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	flecha frente y giro
CL 37 CR 93 Y 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	linea paso peatonal 0.40
CL 37 CR 93 Y 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	linea detención 0.40
CL 37 CR 93 Y 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	linea detención 0.40
CL 37 CR 93 Y 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	linea eje amarilla 0.12
CL 37 CR 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	linea PARE 0.40
CL 37 CR 93A	SANTA MONICA	31/10/2025	linea eje amarilla 0.12

En relación con los trámites de radicación y aprobación de PMT relacionados con la Construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada, se tiene para el periodo que comprende el presente informe de interventoría, los siguientes:

Tabla 25 Relación de los PMT solicitados al **31 de octubre de 2025**

Consecutivo	Tipo De Cierre	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Final	Hora Inicio	Hora Final	Fecha Aprobación PMT	Estado	Actividad
1	PARCIAL	Vías arterías e intervenciones de cruces semafóricos	22 julio de 2025	22 nov de 2025	21:00	04:00	Res2025102 38348 Del 21/07/2025	Aprobado	PMT GENERAL
		Vías con presencia transporte público diferentes de vías arterías			20:00	04:00			
		Carril de Metroplús			00:00	04:00			
		Vías con presencia transporte público diferentes de vías arterías			07:00	15:00			
		Vías con presencia transporte público en zonas residenciales, y Vías sin presencia transporte público			07:00	17:00			
2	PARCIAL	Calle 10A entre carrera 36 y 43D. COSTADO NORTE	29 agosto 2025	14 octubre 2025	9:00	16:00	Res2025304 11393 Del 29/08/2025	Aprobado	PMT ESPECÍFICO
		Calle 10A entre carrera 36 y 43D. COSTADO SUR							
3	PARCIAL	Diagonal 65D entre Transversal 34B y calle 34. AMBOS COSTADOS	08 de sept de 2025	21 de sept de 2025	24 horas	24 horas	N/A	Aprobado	PMT ESPECÍFICO
4	PARCIAL	Cra 48 x (Cl15Sur-17Asur)	15 de sep de 2025	03 de oct 2025	9:00 pm	4:00 am	18 sept 2025	Aprobado	PMT ESPECÍFICO
		Cra 48 x (Cl12Sur – 16Asur)							

Consecutivo	Tipo De Cierre	Dirección	Fecha Inicio	Fecha Final	Hora Inicio	Hora Final	Fecha Aprobación PMT	Estado	Actividad
5	TOTAL	Cl32F x (Cra66-Dg74B)	22 sep 2025	26 sep 2025	24 horas		25 sept 2025	Aprobado	PMT ESPECÍFICO
6	TOTAL	Cr 49B x (Cl105a – 107)	02 oct 2025	09 oct 2025	24 horas		03 de oct de 2025	Aprobado	PMT ESPECÍFICO
7	PARCIAL	Cr 43A x (Cl 9 – Cl10) – Calzada occidental	14 oct 2025	31 oct 2025	9:00 pm	4:00 am	Res2025304 99706 del 14/oct/2025	Aprobado	PMT ESPECÍFICO
	PARCIAL	Cr 43A x (Cl3Sur – Cl9Sur) – Calzada occidental	14 oct 2025	31 oct 2025	9:00 pm	4:00 am			
	PARCIAL	Cr 43A x (Cl 7 – Cl10) – Calzada oriental	14 oct 2025	31 oct 2025	9:00 pm	4:00 am			
8	TOTAL	Cr40 x (Cl48 y 49A)	04 nov 2025	20 nov 2025	24 horas		Res2025305 39259 del 31/oct/2025	Aprobado	PMT ESPECIFICO
9	PARCIAL	Cra 61 x (Cl32 y Cl33) – Av Regional calzada occidental	04 nov 2025	18 nov 2025	9:00 pm	4:00 am	Res2025305 39251 del 31/oct/2025	Aprobado	PMT ESPECIFICO

Se adjuntan al presente informe los siguientes anexos:

Anexo 2.2-1: PMT Específico Av El Poblado, Cr43A x (Cl 7 – Cl 9Sur)

Anexo 2.2-2: PMT Específico Cr40 x (Cl48 y 49A)

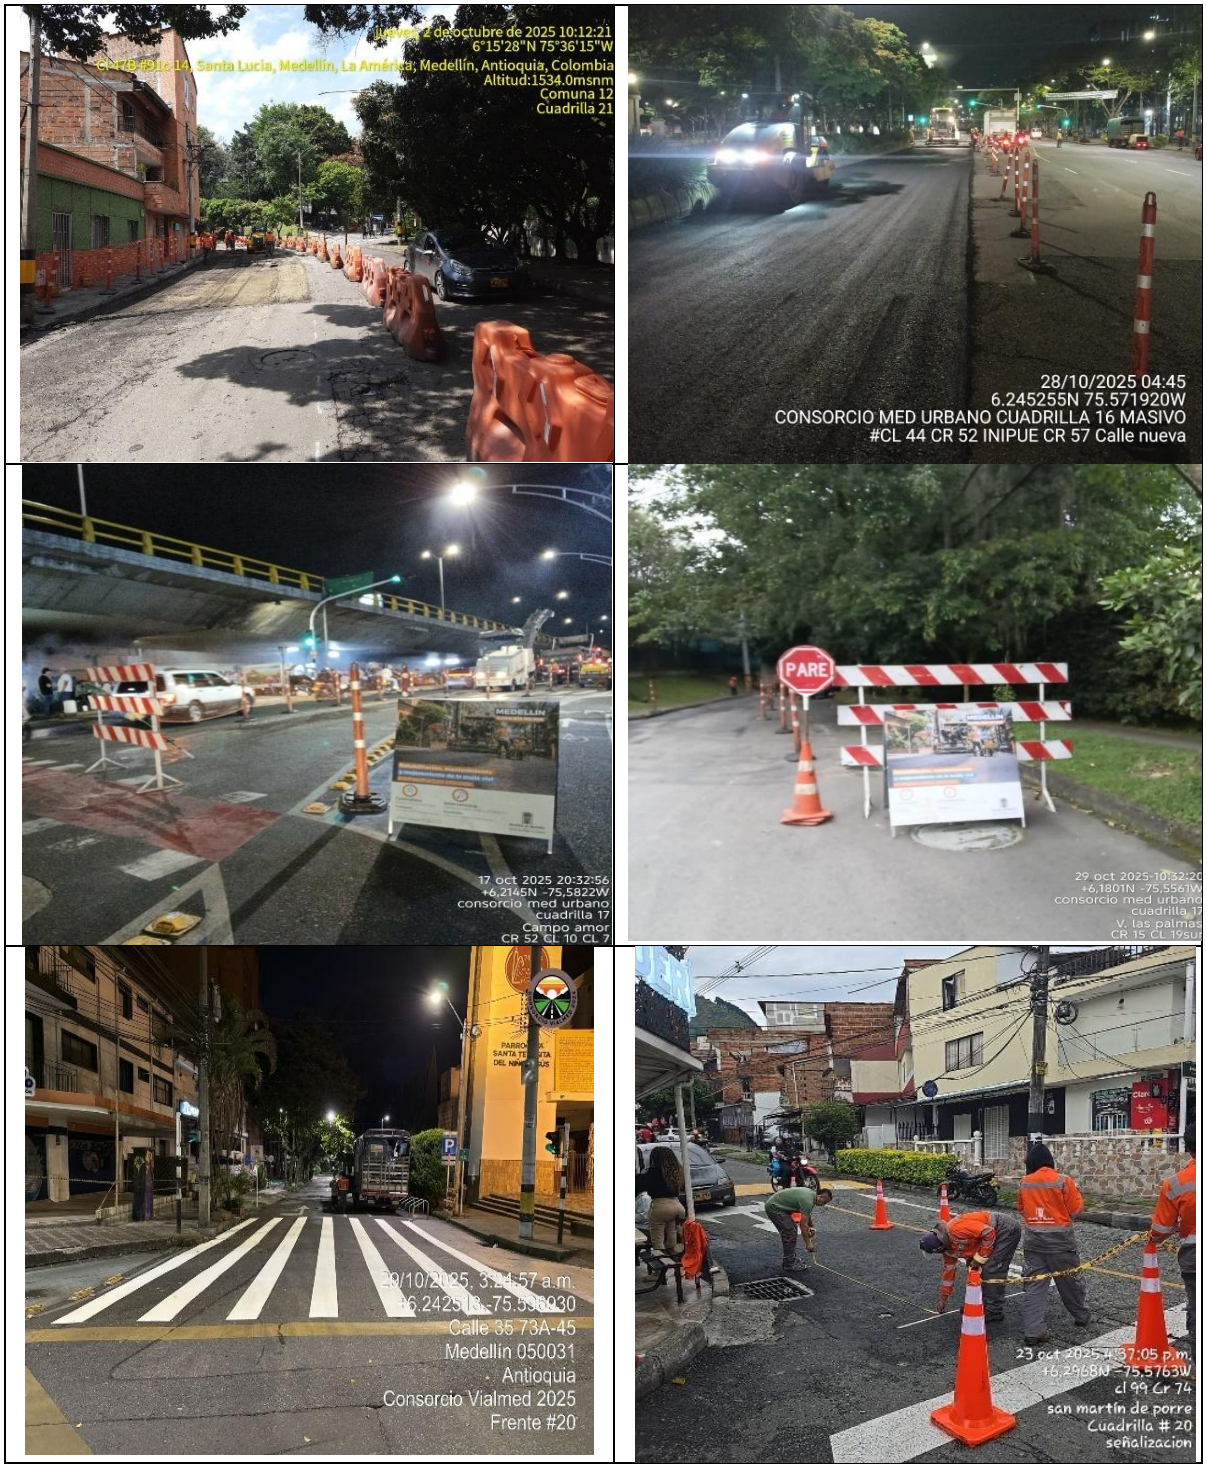
Anexo 2.2-3: PMT Específico Cr 61 x (Cl32 y Cl33) – Av Regional calzada occidental

Anexo 2.2-4: Informe Contratista de Obra

A continuación, se presenta registro fotográfico de algunos de los frentes intervenidos durante el periodo del presente informe:

Evidencia fotográfica de PMT en algunos frentes de intervención:




Jueves, 2 de octubre de 2025 10:12:21
6°15'28"N 75°36'15"W
CL 17B #91c-14, Santa Lucía, Medellín, La América, Medellín, Antioquia, Colombia
Altitud:1534.0msnm
Comuna 12
Cuadrilla 21
28/10/2025 04:45
6.245255N 75.571920W
CONSORCIO MED URBANO CUADRILLA 16 MASIVO
#CL 44 CR 52 INIPUE CR 57 Calle nueva
17 oct 2025 20:32:56
+6.2145N -75.5822W
consorcio med urbano
cuadrilla 17
Campo amor
CR 52 CL 10 CL 7
PARE
29 oct 2025 10:32:20
+6.1801N -75.5561W
consorcio med urbano
cuadrilla 17
v. las palmas
CR 15 CL 19sur
29/10/2025, 3:24:57 a.m.
+6.242518, -75.536930
Calle 35 73A-45
Medellín 050031
Antioquia
Consorcio Vialmed 2025
Frente #20
23 oct 2025 4:37:05 p.m.
+6.2968N -75.5763W
cl 99 Cr 74
san martín de porre
Cuadrilla # 20
señalizacion

2.3. SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TIEMPO:

Desde el punto de vista climático se asume que el área del Valle de Aburrá, en la que se ubica la Ciudad de Medellín y en la cual se desarrolla el proyecto, presenta características homogéneas y comportamiento similar a lo largo de los diferentes periodos secos o de lluvias a través del año. Sin embargo, es posible diferenciar circunstancias específicas de acuerdo la ubicación geográfica en la ciudad. Para una descripción más específica en cada uno de los frentes en que se fue laborando se puede remitir a la descripción consignada en la bitácora de obra o informe diario por cuadrilla que es diligenciado por el tecnólogo inspector dispuesto por la Interventoría en cada una de éstas.

Para ilustrar de una manera práctica el estado del tiempo, más específicamente el régimen de lluvias, la temperatura máxima y mínima que se presentó en la ciudad, en la tabla y gráficos siguientes, se presenta el Cuadro “Estado del Tiempo” correspondiente al mes de **octubre de 2025**, en el cual se discriminan a diario la precipitación en mm y la temperatura en grados Celsius **(°C)**, de acuerdo con los promedios para la ciudad en el periodo correspondiente.

Para el periodo reportado, correspondiente al mes de **octubre de 2025**, se observa un periodo predominantemente lluvioso, por lo cual en varias ocasiones se ha tenido que suspender temporalmente las actividades de los frentes de obra, y reanudando los trabajos una vez se haya superado el mal clima.

En resumen, tenemos que, durante este período se presentaron lluvias 23 días del mes, siendo los días más fuertes el 9, 11, 15, 19, y 20 respectivamente; desde el **1 hasta el 31 de octubre** de 2025 se presentó una precipitación acumulada de 207,70 mm, la temperatura máxima promedio fue de 27,57°C y la temperatura mínima promedio de 17,56°C.

Tabla 26 Gráfica de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas durante el mes de **octubre de 2025**

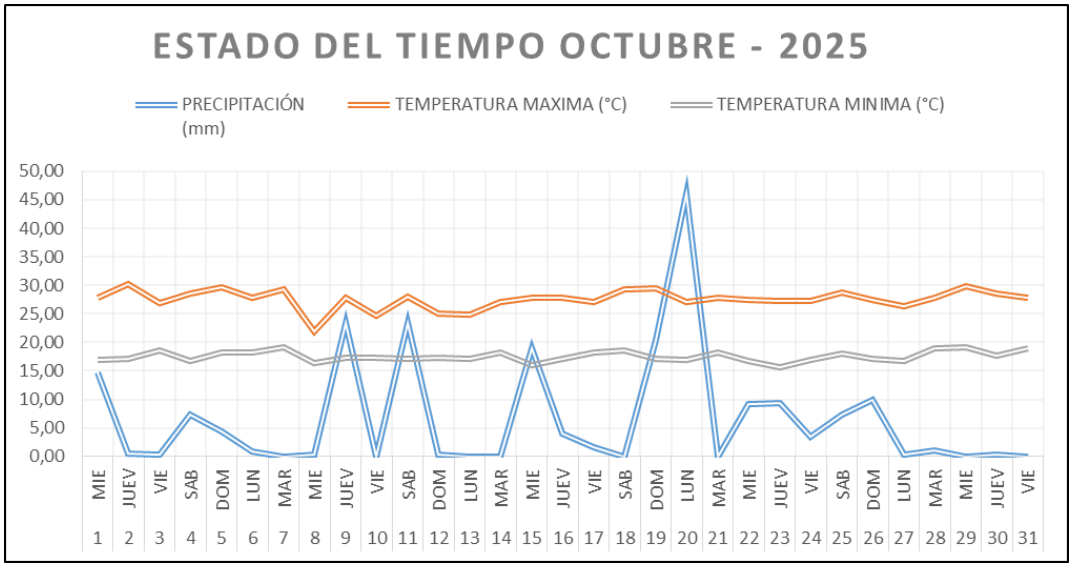


Tabla 27 Estado del tiempo mes de **octubre de 2025**

CONSORCIOMEDURBANO 20005377	**"INTERVENTORIA A LA REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

ESTADO DEL TIEMPO PARA LA CIUDAD DE MEDELLIN

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

DIA DE LA SEMANA		PRECIPITACIÓN (mm)	TEMPERATURA MAXIMA (°C)	TEMPERATURA MINIMA (°C)
1	MIE	14,80	27,80	16,90
2	JUEV	0,50	30,20	17,10
3	VIE	0,40	26,90	18,60
4	SAB	7,30	28,50	16,80
5	DOM	4,40	29,60	18,20
6	LUN	0,80	27,90	18,20
7	MAR	0,00	29,30	19,20
8	MIE	0,30	22,00	16,40
9	JUEV	23,40	27,80	17,30
10	VIE	0,00	24,60	17,30
11	SAB	23,30	28,00	17,20
12	DOM	0,40	25,10	17,30
13	LUN	0,00	24,90	17,20
14	MAR	0,00	27,00	18,30
15	MIE	19,00	27,80	16,00
16	JUEV	4,00	27,80	17,10
17	VIE	1,70	27,00	18,30
18	SAB	0,00	29,30	18,60
19	DOM	20,40	29,50	17,20
20	LUN	46,00	27,10	16,90
21	MAR	0,00	27,90	18,30
22	MIE	9,20	27,40	16,70
23	JUEV	9,30	27,20	15,60
24	VIE	3,40	27,30	17,00
25	SAB	7,40	28,80	18,00
26	DOM	9,90	27,50	17,20
27	LUN	0,40	26,30	16,80
28	MAR	1,00	27,80	18,90
29	MIE	0,00	29,90	19,20
30	JUEV	0,40	28,60	17,70
31	VIE	0,00	27,80	18,90
PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm)		**207,70**		
TEMPERATURAS PROMEDIO (°C)			**27,57**	**17,56**

2.4. CONTROL DEL MATERIAL EN OBRA:

- **Plan de Calidad.**

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra N° 4600105052 de 2025 en la CLÁUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA numeral 50, establece que: *"El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los quince (15) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato".*

Considerando lo anterior, el contratista Consorcio VialMed 2025 mediante comunicado N° CVM-002-2025 de fecha de radicado 30 de julio de 2025 realizó la entrega del plan de calidad en su versión N° 1.

Surtido el proceso de revisión de la versión N° 1 del plan de calidad por parte de la Interventoría, se realizó a través de correo electrónico de fecha 15 de agosto de 2025 las siguientes observaciones al Contratista:

- ✓ Incluir en el anexo 9 Plan de inspección y ensayos, un resumen con la relación de cantidad y periodicidad de extracción de núcleos para las actividades de extensión de mezcla asfáltica clasificado por rangos 0, 1, 2, 3, 4 y masivos; teniendo en cuenta lo tratado en mesas de trabajo o reuniones con la Interventoría y la normatividad aplicable al proyecto.

- ✓ Relacionar el nombre de la Interventoría en la tabla N° 1 Información del proyecto.

- ✓ Actualizar la tabla N° 3 Equipos asignados, incluyendo la relación de la maquinaria mínima del proyecto según el Anexo 1 Anexo Técnico y el alcance de las actividades a desarrollar con el contrato de obra N° 4600105252 de 2025. Describir las especificaciones de los equipos, modelo, serie, capacidad, tipo, potencia y/o si es repotenciado.

- ✓ Ajustar la tabla N° 4 Proveedores, relacionando los nombres de los proveedores con los que actualmente el Consorcio Vial Med 2025 tienen relación comercial para la ejecución del proyecto. También ajustar la descripción del título de la columna 3, el plan de inspección y ensayos se describe en el anexo 9.

El 1 de septiembre de 2025, el contratista hizo entrega de la versión N° 2 del Plan de Calidad atendiendo las observaciones realizadas por la Interventoría, siendo este documento aprobado el 3 de septiembre de 2025.

En el plan de calidad se documentan los procesos que se implementarán en el proyecto cuyo objeto es "REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA", con el fin de gestionar la calidad durante todas las etapas de su ciclo de vida, de manera que se pueda asegurar el cumplimiento de todos los objetivos planteados. En el documento se definen procedimientos, procesos y sistemas de gestión que deberán ser puestos en práctica por el equipo del Consorcio VialMed 2025.

Los objetivos del plan de calidad están enfocados específicamente en:

- ✓ Garantizar que todos los entregables del proyecto se lleven a cabo de conformidad con los requisitos del Cliente.
- ✓ Definir metodologías y procedimientos para llevar a cabo la planeación, la ejecución, el seguimiento y control, la mejora continua y la entrega del Proyecto a satisfacción del Cliente.

Anexo al plan de calidad, se encuentra las listas de procedimientos e instructivos que se implementarán en la gestión de la calidad durante el desarrollo del contrato, resumidos de la siguiente manera:

- ✓ Requisitos contractuales, normativos y legales. Anexo 2 - CVM-GP-FT-54 Matriz rastreabilidad de requisitos.
- ✓ Selección de personal. Anexo 3 - CVM-GTH-PD-01 Procedimiento de gestión de talento.
- ✓ Inducciones y capacitaciones. Anexo 4 - Formatos de inducciones y de registro de capacitación.
- ✓ Evaluación del personal. Anexo 5 - CVM-GTH-FT-17 Evaluación de Personal Operativo y Evaluación de personal administrativo.
- ✓ Mantenimientos preventivos a maquinaria y equipos. Anexo 6 - CVM-GI-SST-PR-06 Programa de mantenimiento.
- ✓ Compras y adquisiciones. Anexo 7 - CVM-GC PD-01 Procedimiento gestión compras.
- ✓ Dotación de cuadrillas con herramientas. Anexo 8 - CMVGI-CA-PD-01 Procedimiento planificación de recursos.
- ✓ Revisión de requisitos relacionados con el cliente. Anexo 9 – Plan de inspección y ensayos.
- ✓ Lecciones aprendidas. Anexo 11 - CVM-GP-FT-52 Formato de Lección Aprendida.
- ✓ Auditorías internas. Anexo 12 - CVM-GI-GM-PD-03 Procedimiento Auditoría Interna y Anexo 13 - CVM-GI-GM-PD-04 Procedimiento de Acciones, Correctivas, Preventivas y de Mejora.
- ✓ Gestión de no conformidades. Anexo 14 - CVM-GI-CA-PD-16 Procedimiento Control Salidas No Conformes y Anexo 15 - CVM-GI-GM-FT-06 Registro y seguimiento de Acciones ACPM.
- ✓ Producción y provisión del servicio. Anexo 16 - Caracterización de procedimientos e instructivos, Anexo 17 - CVM-GI-CA-FT-15 Matriz de control de calidad y alcance del proyecto, Anexo - 18 FORMATOS/Lista de liberación actividades constructivas y Anexo 19 PRESUPUESTO.
- ✓ Gestión de la información documentada. Anexo 21 - CVM-GI-GM-FT-08 Listado Maestro de Información Documentada todos los procesos.
- ✓ Gestión del cambio asociados al alcance del proyecto. Anexo 22. CVM-GI-GM-PD-02 Procedimiento Gestión del Cambio, CVM-GI-CA-FT-20 Formato para el registro de gestión del cambio en calidad.
- ✓ Control de procesos para la identificación trazabilidad del producto. Anexo 23 - CVM-GI-CA-I-03 Instructivo para el diligenciamiento de la bitácora de obra y Anexo 16 “PROCESO CONSTRUCTIVO Y INSTRUCTIVOS”.
- ✓ Enfoque del cliente (expectativas). Anexo 24 - CVM-GI-CA-FT-05 Encuesta de satisfacción del cliente.

Con el fin cumplir con lo descrito anteriormente, la Interventoría verifica que el contratista realiza un permanente control sobre la calidad de los materiales e insumos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del contrato y se efectúan los siguientes controles en obra:

- ✓ Inspección visual previa a la instalación corroborando la limpieza del área a intervenir realizada por cada cuadrilla.
- ✓ Recepción de tiquetes o remisiones de cada volqueta para corroborar tipo de mezcla y cantidad de despacho diariamente, en el cual se evidencia la hora de salida de la planta de todos los vehículos.
- ✓ Hora de llegada de las volquetas a los frentes de obra, hora de inicio de riego y fin de riego.
- ✓ Toma de temperatura antes y durante la instalación de la mezcla y verificación de la temperatura de salida de la mezcla asfáltica.
- ✓ Al principio y al final de la jornada se toma el respectivo registro fotográfico para la presentación de informes diarios, semanales y mensuales, para luego subir a la plataforma del SGVial y SIRO.
- ✓ Revisión de la documentación de controles de calidad internos diarios a las mezclas asfálticas entregadas.
- ✓ Para este periodo se realizó la instalación de mezcla MDC-19 (Tibia) + RAP en rangos 0 y 1, MSC-19 (Tíbia) + RAP para rango 3 y 4 y en los frentes de masivos se hace uso de mezclas tipo MAM-25, MSC-19 + FIBRA y SMA.

El material de RAP utilizado para la producción de mezclas asfálticas es suministrado por el Municipio de Medellín y transportado por el Consorcio VIALMED 2025 desde las instalaciones de la planta localizada en la calle 30 hacia las plantas de PROCOPAL S.A y PAVIMENTAR S.A.

A través de comunicado N° CVM-036-2025 de fecha 8 de agosto de 2025 y con asunto *"Informe Mensual de Calidad 1 al 31 de Julio",* el contratista Consorcio VialMed 2025 informó sobre el seguimiento al cumplimiento de los requisitos de calidad del contrato de obra N° 4600105052 de 2025, describiendo los controles y actividades realizadas durante el mes de julio de 2025 en pro de garantizar que los trabajos en ese periodo se lleven a cabo dentro del marco de las especificaciones, diseños y calidad esperada. Posteriormente, hizo entrega del informe mensual de calidad N° 2 y 3 correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025.

Como insumo para la elaboración del presente informe mensual de interventoría, se tuvo presente el informe mensual de calidad del mes de octubre de 2025, suministrado por el contratista Consorcio Consorcio VialMed 2025 por correo electrónico de fecha 7 de noviembre de 2025.

2.1. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO:

La calidad de los insumos se realizó con base en los soportes entregados por el contratista, mediante el aporte de los ensayos y certificados de calidad realizados en las plantas de Pavimentar S.A y Procopal S.A y sus laboratorios internos, también acorde a los certificados de asfalto aportados por el proveedor MPI y ECOPETROL; informes de resultados de ensayos a los agregados; certificados de la Emulsión asfáltica por la firma CRL-1 CB COLBITUMEN Colombiana de Bitumen S.A.S e informes de resultados de laboratorio realizados a núcleos extraídos a las mezclas asfálticas que fueron aplicadas durante el mes de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025.

Los resultados del control diario de laboratorio realizados a las mezclas asfálticas y los cuadros de revisión de las especificaciones, se incluyen en el Anexo N° 1 del informe del plan de calidad

del mes de **octubre de 2025** suministrado por el contratista, el cual se adjunta al presente informe mensual de Interventoría.

De acuerdo a los resultados obtenidos de los ensayos diarios de mezcla asfáltica suministradas por Pavimentar S.A y Procopal S.A, además de la verificación de la fórmula de trabajo, se concluye que las mezclas instaladas en el mes de octubre de 2025 cumplen con los parámetros de diseños y especificaciones del INVIAS 2022.

2.5.1 Certificados Mezclas Asfálticas

Se realizó seguimiento a las mezclas asfálticas suministradas según lo define el artículo 450 de la norma INVIAS 2022 para NT3; para ello el contratista entregó a la interventoría los certificados de calidad de la mezcla asfáltica MDC-19 + RAP (Tibia) aplicada en las intervenciones a nivel de rango 0 y 1, mezcla asfáltica MSC-19 + RAP (Tibia) aplicadas en rango 3 y 4 y a mezclas tipo MAM-25, MSC-19+FIBRA y SMA en los frentes de masivos o rehabilitación durante el mes de octubre de 2025.

Los certificados de calidad se relacionan a continuación:

Planta PAVIMENTAR S.A:

- ✓ MDC-19 + RAP TIBÍA.
- ✓ MSC-19 + RAP TIBÍA.
- ✓ MSC-19 + FIBRA TIBÍA.
- ✓ MAM-25.
- ✓ SMA.

Planta PROCOPAL S.A:

- ✓ MDC-19 + RAP TIBÍA.
- ✓ MSC-19 + RAP TIBÍA.

El contratista Consorcio VialMed 2025 incluyó en el informe de calidad del mes de octubre los resultados de los ensayos realizados a los agregados utilizados para la producción de mezclas asfálticas en las plantas de PAVIMENTAR S.A Y PROCOPAL S.A, los cuales cumplen para las especificaciones INVIAS 2022 y NT3. Los ensayos se relacionan a continuación:

- ✓ Combinación- Granulometría, análisis granulométrico agregados gruesos y finos.
- ✓ Límite plástico e índice de plasticidad.
- ✓ Equivalente de arena de suelos y agregados finos.
- ✓ Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados.
- ✓ Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso.
- ✓ Proporción de partículas planas, alargadas o planas y alargadas en agregados gruesos.
- ✓ Determinación de la limpieza superficial de las partículas de agregado grueso.
- ✓ Fracción Gruesa.
- ✓ Fracción Fina.

- ✓ Combinación, perdida de solidez en sulfatos.

2.5.2 Certificado de calidad para el asfalto

Se realizó seguimiento al cemento asfaltico suministrado por Asfaltos y Emulsiones de Colombia S.A.S, Ecopetrol y MPI, según lo define el artículo 410 de la norma INVIAS 2022.

- ✓ Certificado de calidad del asfalto modificado con polímeros tipo III, suministrado por Asfaltos y Emulsiones de Colombia S.A.S, utilizado para la producción de mezcla asfáltica en la planta PAVIMENTAR S.A en el mes de octubre de 2025.
- ✓ Certificado de calidad para el asfalto modificado con polímeros tipo V son aportados, entregado por MPI como proveedor de asfalto para la producción de mezcla asfáltica en la planta PAVIMENTAR S.A, mes de octubre de 2025.
- ✓ Certificado de calidad para el asfalto AC-30 son aportados, entregado por Ecopetrol como proveedor de asfalto para la producción de mezcla asfáltica en la planta PAVIMENTAR S.A, mes de octubre de 2025.
- ✓ Certificado de calidad para el asfalto MPI 60-70 normalizado, entregado por el proveedor MPI para la producción de mezclas asfálticas en la planta PROCOPAL S.A, mes de octubre de 2025.

2.5.3 TSR Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfáltico utilizando la prueba de tracción indirecta.

- ✓ Certificado de evaluación de la susceptibilidad al agua de la mezcla de concreto asfáltico tipo MDC-19 + RAP Tibia, MSC-19 + RAP Tibia, MAM-25, SMA y MSC-19 + FIBRA Tibia producida por la planta PAVIMENTAR S.A, mes de octubre de 2025.

- ✓ Certificado de evaluación de la susceptibilidad al agua de la mezcla de concreto asfáltico MDC-19 + RAP Tibia y MSC-19 + RAP Tibia producida por la planta PROCOPAL S.A, mes de octubre de 2025.

2.5.4 Certificado de calidad para la emulsión asfáltica

Se realizó seguimiento a los certificados de emulsión asfáltica, para ello el contratista suministró a la interventoría los siguientes certificados de calidad:

- ✓ Proveedor CB COLBITUMEN Colombiana de Bitumen S.A.S, producto emulsión CRL-1.
- ✓ Proveedor Asfaltos y Emulsiones de Colombia S.A.S, producto emulsión CRR-1.

2.5.5 Certificado de calidad para la Señalización vial y pruebas de campo

La señalización vial horizontal, se realiza atendiendo la norma NTC 1360, NTC 4744-3, NTC 5129, la resolución 1885 de 2015 de Ministerio de Transporte, norma Invias 2022.

A continuación, se relaciona los certificados de calidad de los materiales utilizados en las actividades de aplicación de pintura en el mes de octubre de 2025 para las obras de REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA:

- ✓ Pintura tráfico plástico en frio tipo llana blanco microesfera
- ✓ Pintura tráfico plástico en frio tipo llana amarillo con microesfera
- ✓ Trafico base solvente premium Orbitex® amarillo
- ✓ Trafico base solvente premium Orbitex® blanco

En el presente periodo se tomó registros en campo de espesores y pruebas de retroreflectividad durante la actividad de aplicación de pintura plástico en frio; mediciones que cumplen con las especificaciones técnicas

Registro fotográfico.

	
Control de espesores, CR 47 CL 52 CL 53.	Control de espesores, CR 47 CL 52 CL 53.

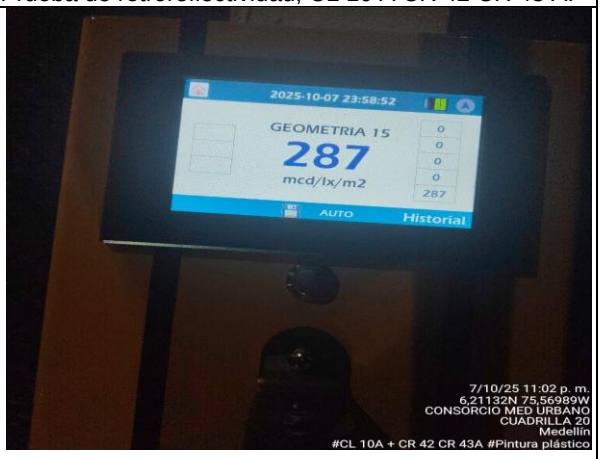
	
Control de espesores, CL 11 CRA 43A Y CR 43B.	Control de espesores, CL 11 CRA 43A Y CR 43B.
	
Prueba de retroreflectividad, CL 10 A CR 42 CR 43 A.	Prueba de retroreflectividad, CL 10 A CR 42 CR 43 A.
	
Prueba de retroreflectividad, CL 10 A CR 42 CR 43 A.	Prueba de retroreflectividad, CL 10 A CR 42 CR 43 A.

Tabla 28 Registro de control de espesores durante la aplicación de pintura acrílica.

FECHA	DIRECCIÓN	CUADRILLA	COMUNA	SECTOR	MARCA VIAL	COLOR	ESPESOR MÍNIMO POR NORMA (Mils)	ESPESOR MEDIDO EN CAMPO (Mils)	OBSERVACION
4-sep-25	Calle 53 entre Carreras 46 y 47	20	10	La Candelaria	Línea de detención	Blanco	12	35	Cumple
5-sep-25	Carrera 47 con calle 52	20	10	La Candelaria	Flecha de frente	Blanco	12	35	Cumple
11-sep-25	Carrera 47 con calle 57A	20	10	La Candelaria	Rab	Amarilla	12	18	Cumple
27-sep-25	Carrera 42 entre calles 5 sur y 6 sur	20	14	Poblado	Flecha de frente	Blanco	12	16	Cumple
27-sep-25	Calle 5 sur entre Carreras 42 y 43A	20	14	Poblado	Rab	Amarilla	12	24	Cumple

Tabla 29 Registro de control de espesores durante la aplicación de pintura plástico en frio.

FECHA	DIRECCIÓN	CUADRILLA	COMUNA	SECTOR	MARCA VIAL	COLOR	ESPESOR MÍNIMO POR NORMA (Mils)	ESPESOR MEDIDO EN CAMPO (Mils)	OBSERVACION
15-sep-25	CR 69 entre CL 95 y 96	20	5	Castilla	Prohibido parquear	Blanco	40	40	Cumple
22-sep-25	CRA 42 CL 9 CL 10	20	14	Poblado	Paso peatonal	Blanco	40	45	Cumple
3-oct-25	CR 47 CL 52 CL 53	20	10	La Candelaria	Línea de detención	Blanco	40	40	Cumple
11-oct-25	CL 11 CRA 43A Y CR 43B	20	14	Poblado	Flecha de frente	Blanco	40	45	Cumple

Tabla 30 Registro pruebas de retroreflectividad durante la aplicación de pintura plástico en frio.

FECHA	DIRECCIÓN	CUADRILLA	COMUNA	SECTOR	MARCA VIAL	COLOR	VALOR MÍNIMO POR NORMA - BLANCA (milicandelas/m2/lux)	VALOR OBTENIDO EN CAMPO - BLANCA (milicandelas/m2/lux)	OBSERVACIÓN
15-sep-25	Carrera 69 entre calles 95 y 96	20	5	Castilla	Línea de frente	Blanca	250	275	Cumple
15-sep-25	Carrera 69 entre calles 95 y 96	20	5	Castilla	Línea de eje	Blanca	250	357	Cumple

FECHA	DIRECCIÓN	CUADRILLA	COMUNA	SECTOR	MARCA VIAL	COLOR	VALOR MÍNIMO POR NORMA - BLANCA (milicandelas/m2/lux)	VALOR OBTENIDO EN CAMPO - BLANCA (milicandelas/m2/lux)	OBSERVACIÓN
22-sep-25	Carrera 42 entre calles 8 y 9	20	14	Poblado	Prohibido parquear	Blanca	250	341	Cumple
7-oct-25	CL 10A CR 42 CR 43A	20	14	Poblado	Línea punteada	Blanca	250	298	Cumple
7-oct-25	CL 10A CR 42 CR 43A	20	14	Poblado	Línea punteada	Blanca	250	284	Cumple
7-oct-25	CL 10A CR 42 CR 43A	20	14	Poblado	Flecha	Blanca	250	350	Cumple

2.5.6 Resultados de extracción de núcleos en campo y ensayos densidades

Para realizar el control de la compactación de las mezclas asfálticas aplicadas durante los meses de julio, agosto, septiembre y noviembre de 2025, se calculó el grado de compactación a partir de los resultados de los ensayos de densidad en terreno y la densidad máxima de la mezcla asfáltica obtenida en laboratorio de las plantas de producción.

De acuerdo a los anterior, se efectuó extracción de núcleos sobre baches ejecutados en las jornadas de rango 0, 1 y 3; así como en las jornadas de rango 4 y masivos, como se describe a continuación:

Tabla 31 Relación de ensayos de densidades – Rango 0, 1 y 3.

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
1	Cl 48 # 39-96 (sentido E-O)	1	23-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2353,0	2405,0	97,8%	≥93	Cumple
2	Cl 46 # 39-69 O-E	1	22-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2362,0	2406,5	98,2%	≥93	Cumple
3	Cl 11B # 34-160 (sentido O-E)	1	30-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2377,0	2402,0	99,0%	≥93	Cumple
4	Cl 10B # 28-146	1	29-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2406,0	97,4%	≥93	Cumple
5	Av. 80 x Cl 15 (Calzada oriental, carril derecho, en la bifurcación hacia Cl 16 despué de ingreso colegio La Inmaculada)	2	22-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2398,0	2406,0	99,7%	≥93	Cumple
6	Cl 31A x Cr 78 (Sobre la cicloruta en la interección de ambas vías)	2	24-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2329,0	2402,0	97,0%	≥93	Cumple
7	Cr 80 # 20A - 178 (Calzada oriental, carril izquierdo, cerca al separador)	2	30-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2452,0	2402,0	102,1%	≥93	Cumple
8	Cr 52 # 6 Sur - 91 (Calzada occidental Av Guayabal carril derecho, cerca al ochave del giro	2	29-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2419,0	2406,0	100,5%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
	derecho hacia Continental Gold)									
9	Cr 117C #64BG-52	3	22-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2422,0	2406,0	100,7%	≥93	Cumple
10	Cl 68 #86-52	3	23-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2418,0	2405,0	100,5%	≥93	Cumple
11	Cr 22 Este #9B - 101	3	29-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2406,0	97,4%	≥93	Cumple
12	Cl 19 #35-956	3	30-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2372,0	2402,0	98,8%	≥93	Cumple
13	Cr 64AA x Cl 113 + 43 m (primera intervención, Sentido S-N, Junto a franja paisajismo movilidad, entrada Terpel)	4	24-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2317,0	2402,0	96,5%	≥93	Cumple
14	Cr 64C x Cl 67 + 350 m (Sentido N-S, Adyacente a MH, Argos al Occidnete Primax al oriente)	4	25-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2503,0	2403,0	104,2%	≥93	Cumple
15	Cl 53 #71A - 80 (esquina Tortas del Gordo, sobre ciclo ruta, sentido E-W)	4	30-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2372,0	2402,0	98,8%	≥93	Cumple
16	Cr 65 #80 + 70m (primera intervención sentido N-S, entrada	4	1-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2352,0	2405,0	97,8%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
	cementerio Universal, junto a parada de bus)									
17	Cl 49A # 55A - 37	5	24-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2369,0	2402,0	98,6%	≥93	Cumple
18	Cr 56A #59A-14	5	26-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2405,0	97,5%	≥93	Cumple
19	Cr 46 x Cl 46 + 33m (Av Oriental sentido S-N, paradero de buses)	5	29-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2360,0	2406,0	98,1%	≥93	Cumple
20	Cr 35 x Cl 18-14 m (Av Las Palmas sentido Or-Occ)	5	30-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2368,0	2402,0	98,6%	≥93	Cumple
21	Cr 85 #68B-10	6	24-jul-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2389,0	2442,0	97,8%	≥93	Cumple
22	Cr 86 #68A-10	6	25-jul-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2424,0	2464,0	98,4%	≥93	Cumple
25	Cr 63 # 48-95	7	29-jul-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2361,0	2406,0	98,1%	≥93	Cumple
26	Cr 89C #68A-178	7	31-jul-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2400,0	2454,0	97,8%	≥93	Cumple
27	Cl 19 #43B-166	8	31-jul-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2374,0	2454,0	96,7%	≥93	Cumple
28	Cr 43D #11-47	8	1-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2435,0	2446,0	99,6%	≥93	Cumple
29	Cr 48C # 12S-148 sentido S-N	1	4-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2354,0	2403,0	98,0%	≥93	Cumple
30	Cl 9S # 53-71 sentido E-O	1	8-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2355,0	2402,0	98,0%	≥93	Cumple
31	Av. 80 x Cl 59 (Calzada occidental (Sentido norte-	2	4-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2352,0	2403,0	97,9%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
	sur) en Av. 80 sobre carril izquierdo)									
32	Cr 72 # 17 - 16 (Bache de forma compuesta)	2	8-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2356,0	2402,0	98,1%	≥93	Cumple
33	Cl 39 x Cr 44	3	4-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2353,0	2403,0	97,9%	≥93	Cumple
34	Cl 49 # 20B - 21	3	6-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2357,0	2397,0	98,3%	≥93	Cumple
35	Cr 65 x Cl80 -26 m (Primera intervención, Sentido N-S, entrada cementerio Universal, junto a ciclovia, junto a demarcación giro a la derecha, carril izquierdo)	4	4-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2424,0	2403,0	100,9%	≥93	Cumple
36	Cr 65 #49 - 41 - 17m (Primera intervención, sentido N-S, entrada Universiad Nacional, después de paso peatonal, carril derecho)	4	5-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2456,0	2402,0	102,2%	≥93	Cumple
37	Cr 61 entre Cl 48 y 49 (Tercera intervención, en la Av. Regional calzada rápida, frente a la	5	5-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2365,0	2399,0	98,6%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
	estación libertadores de bomberos, sentido Sur-Norte)									
38	Cr 64A x Cl 80 + 600 (Primera intervención, en el paradero de buses de la terminal del norte por la Av. Regional)	5	6-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2340,0	2397,0	97,6%	≥93	Cumple
39	Cl 80 x Cr 49	6	4-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2429,0	2458,0	98,8%	≥93	Cumple
40	Cl 32C # 81B - 99	6	6-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2413,0	2445,0	98,7%	≥93	Cumple
41	Cr 90 # 65C-10 + 90m (Primera intervencion subiendo)	7	4-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2450,0	2458,0	99,7%	≥93	Cumple
42	Cr 90 #65C-10 (Entrada a la unidad residencial Mirador Barcelona)	7	6-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2425,0	2445,0	99,2%	≥93	Cumple
43	Cl 2 #20-22	8	5-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2476,0	2452,0	101,0%	≥93	Cumple
44	Cl 3B Sur #29C-135	8	8-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2397,0	2439,0	98,3%	≥93	Cumple
45	Cl 32B # 83A24	9	4-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2405,0	2458,0	97,8%	≥93	Cumple
46	Cl 38 #94 - 10	9	6-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2439,0	2445,0	99,8%	≥93	Cumple
47	Cl 8 cl 42-73 Sentido O-E	1	12-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2433,0	2402,0	101,3%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
48	Cr 52 cl 14-107	1	15-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2345,0	2408,0	97,4%	≥93	Cumple
49	Cl 18 # 83-310 (Cebra peatonal frente Aparta casas unidas zona C)	2	12-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2385,0	2410,0	99,0%	≥93	Cumple
50	Cl 30 # 42A-21 (Frente al ingreso de Torres de San Diego)	2	14-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2384,0	2403,0	99,2%	≥93	Cumple
51	Cr 75 #115 - 13	3	13-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2438,0	2407,0	101,3%	≥93	Cumple
52	Cr 52 #120 - 4	3	15-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2402,0	2404,0	99,9%	≥93	Cumple
53	Cl 47 sur Cr 58 - 33M (Primera intervención, Sentido O-E, San Antonio de prado, intervención sobre reductor de velocidad, A 36M de Ensitar SAS Sentido E-O)	4	11-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2406,0	2408,0	99,9%	≥93	Cumple
54	Cl 113 #75 - 103 (Primera intervención, Sentido O-E, Carril izquierdo, barrio florencia, Entre Panadería y Farmacia)	4	16-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2383,0	2438,0	97,7%	≥93	Cumple
55	Av Regional calzada rapida sentido sur-norte. 300m antes de la	5	12-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2371,0	2402,0	98,7%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
	Cl 58 (Puente Horacio Toro) (Fente a la plaza minorista)									
56	Cr 63 #101C-4 (Av Regional sentido Sur-Norte)	5	15-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2343,0	2408,0	97,3%	≥93	Cumple
57	Cr 69 # 30A - 59	6	11-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2449,0	2461,0	99,5%	≥93	Cumple
58	Cr 65C # 25 - 96	6	14-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2407,0	2462,0	97,8%	≥93	Cumple
59	Cl 65C #97-45	7	14-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2460,0	2462,0	99,9%	≥93	Cumple
60	Cl 65BB #95-67	7	15-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2415,0	2445,0	98,8%	≥93	Cumple
61	CL10A #41A-37, Cerca al Carulla Poblado	8	11-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2397,0	2461,0	97,4%	≥93	Cumple
62	Cr24D CL16-50, Mas debajo de la Parroquia Beato Marinano	8	16-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2460,0	2438,0	100,9%	≥93	Cumple
63	Cl 34B Cr 128 - 86	9	16-ago-25	Pavinentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2444,0	2438,0	100,2%	≥93	Cumple
64	Cl 34B Cr 118 - 112	9	14-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2399,0	2462,0	97,4%	≥93	Cumple
65	CR 80AA CL 36-57	10	11-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2425,0	2461,0	98,5%	≥93	Cumple
66	CR 112 CL 13-20	10	12-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2399,0	2452,0	97,8%	≥93	Cumple
67	CLL 36 #80A-21	11	15-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2406,0	2445,0	98,4%	≥93	Cumple
68	CLL 36 80A-02	11	15-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2387,0	2445,0	97,6%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
	Cl 43bb cl 120b-227 Sentido s-n	1	19-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2348,0	2404,0	97,7%	≥93	Cumple
	Cr 120b cl 43ba-21 sentido s-n	1	20-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2369,0	2405,0	98,5%	≥93	Cumple
69	TV 33AA DG 74A - 18	2	20-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2445,0	2405,0	101,7%	≥93	Cumple
70	CL 53A CR 79 - 31	2	19-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2337,0	2404,0	97,2%	≥93	Cumple
71	Cr 52 #109B - 40	3	20-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2475,0	2405,0	102,9%	≥93	Cumple
72	Cr 52 #100 - 84	3	22-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2349,0	2402,0	97,8%	≥93	Cumple
73	Cr 47 Cl 53 - 10(Ultima intervención sentido N-S, carril izquierda, antes del semaforo, en frente de Las vegas panaderia reposteria y territorio visual)	4	19-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2355,0	2404,0	98,0%	≥93	Cumple
74	CR 47 CL 54 - 53 (Primera intervencion, sentido N-S, en el medio de los carriles, junto a optica electronica por la izquierda y New laser Optica por la derecha)	4	20-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2362,0	2406,0	98,2%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
75	Cr 64C (Autopista Norte sentido sur-norte, carril izquierdo) entre Cl 111EE y Cl 112. (300m antes de la estación de gasolina Terpel Autopista Norte)	5	20-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2406,0	97,4%	≥93	Cumple
76	Cr 63 #101C-4 (Av Regional sentido Sur-Norte, carril derecho)	5	21-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2376,0	2406,0	98,8%	≥93	Cumple
77	Cr 143A # 62B - 108	6	19-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2441,0	2459,0	99,3%	≥93	Cumple
78	Cl12C SUR # 53 - 12	6	22-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2402,0	2447,0	98,2%	≥93	Cumple
79	Cr 94C Cl 64-8	7	21-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2451,0	2453,0	99,9%	≥93	Cumple
80	Cr 77 Cl 60-164	7	23-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2448,0	2444,0	100,2%	≥93	Cumple
81	CR 49 CL 89A-14	8	20-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2471,0	2453,0	100,7%	≥93	Cumple
82	CL 16A SUR CR 32B- 20+10	8	20-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2450,0	2453,0	99,9%	≥93	Cumple
83	Cl 34B Cr 116D - 25	9	22-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2433,0	2447,0	99,4%	≥93	Cumple
84	Cl 34B Cr 125 - 175	9	20-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2443,0	2453,0	99,6%	≥93	Cumple
85	CR 91 CL 15-30	10	19-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2442,0	2459,0	99,3%	≥93	Cumple
86	CL 5 SUR CR 90-113	10	20-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2394,0	2453,0	97,6%	≥93	Cumple
87	Tv 39D # 74A-12	11	21-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2448,0	2453,0	99,8%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
88	Calle 28 #75D-42	11	22-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2375,0	2447,0	97,1%	≥93	Cumple
89	Cl 6 Sur #50EE - 30 sentido este-oeste	12	22-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2385,0	2447,0	97,5%	≥93	Cumple
90	Cl 6 Sur #50C - 37 sentido sur-norte	12	22-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2415,0	2447,0	98,7%	≥93	Cumple
103	Cr 125A cl 55-72 Sentido s-n	1	25-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2352,0	2403,0	97,9%	≥93	Cumple
104	Cr 125A cl 55-82 Sentido s-n	1	25-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2359,0	2403,0	98,2%	≥93	Cumple
105	CR 42 B CL 31	2	25-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2486,0	2403,0	103,5%	≥93	Cumple
106	CR 51 CL 10 B SUR 02	2	28-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2499,0	2400,0	104,1%	≥93	Cumple
107	CR 55 #95A - 17	3	26-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2430,0	2400,0	101,3%	≥93	Cumple
108	CL 101 #33D - 38	3	28-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2423,0	2400,0	101,0%	≥93	Cumple
109	CL 49 CR 55-68 (Primera intervención sentido W-O, figura compuesta, carril derecho, Frente a Parroquia San Juan Bosco)	4	25-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2354,0	2412,0	97,6%	≥93	Cumple
110	CL 24 CR 43F-42(Segunda intervención Sentido O-W, en curva frente a entrada Martin Echeverría Vehículos)	4	28-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2370,0	2405,0	98,5%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
111	Cr 62 #80C-176 (Av Regional, sentido Sur-Norte, carril central)	5	25-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2351,0	2412,0	97,5%	≥93	Cumple
112	Av Regional calzada rápida sentido sur-norte, carril central . 200m antes del puente de la calle 67 (Puente Calle Barranquilla).	5	27-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2378,0	2404,0	98,9%	≥93	Cumple
113	Cl 1 Sur # 50D - 172	6	25-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2414,0	2470,0	97,7%	≥93	Cumple
114	Cl 29 # 65 - 16	6	27-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2425,0	2464,0	98,4%	≥93	Cumple
115	Cl 72 Cr 91D-93	7	25-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2468,0	2470,0	99,9%	≥93	Cumple
116	Cl 63 Cr 98B-143	7	27-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2412,0	2464,0	97,9%	≥93	Cumple
117	CR 49 CL 98-11	8	28-ago-25	PROCOPAL	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2377,0	2400,0	99,0%	≥93	Cumple
118	CL 95 CR 47-20	8	29-ago-25	PROCOPAL	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2363,0	2403,0	98,3%	≥93	Cumple
119	Cl34B Cr 113D 227	9	26-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2502,0	2474,0	101,1%	≥93	Cumple
120	Cl34B Cr 113D 91	9	28-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2416,0	2400,0	100,7%	≥93	Cumple
121	CR 26 CL 48-45	10	25-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2420,0	2470,0	98,0%	≥93	Cumple
122	CR 9A CL 49B-50	10	28-ago-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2358,0	2400,0	98,3%	≥93	Cumple
123	CLL 35 CR 80B-25	11	27-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2449,0	2464,0	99,4%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
124	CR76 TV34A-110	11	27-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2406,0	2464,0	97,6%	≥93	Cumple
125	Cl 6s 51-64 sentido sur - norte (Estación gasolina Terpel antes de cruzar guayabal por Av 80)	12	28-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2411,0	2469,0	97,7%	≥93	Cumple
126	Cl. 3 Sur # 50C-46 sentido oeste - este	12	26-ago-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2437,0	2474,0	98,5%	≥93	Cumple
127	Cr 81 # 30A - 27 (Avenida 80 frente a gasolinera Terpel)	14	27-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2411,0	2464,0	97,8%	≥93	Cumple
128	Cr 81 # 30A - 27 (Avenida 80 frente a gasolinera Terpel)	14	29-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2443,0	2465,0	99,1%	≥93	Cumple
139	CL 5A CR 39+12M	2	2-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2400,0	2406,0	99,8%	≥93	Cumple
140	CR 74 CL 44-03	2	5-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2452,0	2408,0	101,8%	≥93	Cumple
141	CR 44A CL 104A	3	1-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2467,0	2403,0	102,7%	≥93	Cumple
142	CL 103B CR 45A - 61	3	4-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2423,0	2402,0	100,9%	≥93	Cumple
143	CR 32 CL 51-18 +5.00m (intervención de figura compuesta en el medio del puente de la toma)	4	4-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2370,0	2406,0	98,5%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
144	CL 9 CR 50-99 (primera intervención bahía, carril derecho, figura compuesta, Frente a autoservicio Rozo)	4	3-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2347,0	2406,0	97,5%	≥93	Cumple
145	Cr 56C #50-11 (Barrio San Benito)	5	3-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2454,0	2406,0	102,0%	≥93	Cumple
146	Cr 53 #53-71 (Barrio Estación Villa)	5	5-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2361,0	2408,0	98,0%	≥93	Cumple
147	Cl 21 A # 78-10	6	2-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2349,0	2406,0	97,6%	≥93	Cumple
148	Cl 21 A # 76-37	6	4-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2368,0	2402,0	98,6%	≥93	Cumple
149	Cl 64BF Cr 117C-43	7	2-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2453,0	2440,0	100,5%	≥93	Cumple
150	Cr 88 Cl 78B-12	7	4-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2379,0	2443,0	97,4%	≥93	Cumple
151	CR 51A CL 94-07	8	2-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2380,0	2440,0	97,5%	≥93	Cumple
152	CR 39 CL 85A-23	8	4-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2448,0	2443,0	100,2%	≥93	Cumple
153	Cl34B Cr 93B 15	9	1-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2439,0	2453,0	99,4%	≥93	Cumple
154	Cl34AA Cr 125 48	9	4-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2426,0	2402,0	101,0%	≥93	Cumple
155	CL 32 CR 32A-02	10	2-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2411,0	2440,0	98,8%	≥93	Cumple
156	CL 46 CR 26-38	10	4-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2378,0	2443,0	97,3%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
157	CR83-32EE-15	11	2-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2431,0	2440,0	99,6%	≥93	Cumple
158	CR82B CLL32E-104	11	3-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2425,0	2455,0	98,8%	≥93	Cumple
159	Cl 6Sur #50FF-07 sentido norte-sur	12	3-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2465,0	2455,0	100,4%	≥93	Cumple
160	Cl 8Sur #50FF-16 sentido este-oeste	12	2-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2414,0	2440,0	98,9%	≥93	Cumple
161	Cr 50B # 5sur - 27	14	2-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2427,0	2403,0	101,0%	≥93	Cumple
162	Cl 103 # 42B - 6	14	4-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2379,0	2403,0	99,0%	≥93	Cumple
178	Aveni da 80 c on c a l l e 15	2	8-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2359,0	2404,0	98,1%	≥93	Cumple
179	Aveni da 80 c on c a l l e 11	2	8-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2355,0	2404,0	98,0%	≥93	Cumple
180	Ca l l e 104 c on c a rrera 36BB Popul a r 2 (La l s l a)	3	9-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2437,0	2412,0	101,0%	≥93	Cumple
181	Ca l l e 104 #36B-51	3	9-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2460,0	2412,0	102,0%	≥93	Cumple
182	Ca l l e 26 #44-57 s enti do W-E Ba rri o Col ombi a	4	8-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2357,0	2404,0	98,0%	≥93	Cumple
183	Ca l l e 25 #44-45 s enti do W-E Ba rri o Col ombi a	4	8-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2368,0	2404,0	98,5%	≥93	Cumple
184	Ca rrera 51D #55-23	5	8-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2364,0	2404,0	98,3%	≥93	Cumple
185	Ca rrera 51D #55-52	5	8-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2391,0	2404,0	99,5%	≥93	Cumple
186	Ca l l e 26A #70A-29	6	9-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2393,0	2412,0	99,2%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
187	Ca l l e 26A #71-49	6	9-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2344,0	2412,0	97,2%	≥93	Cumple
188	Ca rrera 84 #79-11	7	9-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2398,0	2443,0	98,2%	≥93	Cumple
189	Ca rrera 84 #79-85	7	9-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2389,0	2443,0	97,8%	≥93	Cumple
190	Ca rrera 39 #75-40	8	10-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2417,0	2453,0	98,5%	≥93	Cumple
191	Ca rrera 39 #72-92	8	10-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2397,0	2453,0	97,7%	≥93	Cumple
192	Ca rrera 125 #34AA-61	9	10-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2396,0	2453,0	97,7%	≥93	Cumple
193	Ca rrera 125 #34AA-56	9	10-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2416,0	2453,0	98,5%	≥93	Cumple
194	Ca l l e 59C #27-25	10	10-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2452,0	2453,0	100,0%	≥93	Cumple
195	Ca l l e 59C #27-27	10	10-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2425,0	2453,0	98,9%	≥93	Cumple
196	Ca rrera 74 #1-03	11	11-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2428,0	2402,0	101,1%	≥93	Cumple
197	Ca rrera 74 #2-11	11	11-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2330,0	2402,0	97,0%	≥93	Cumple
198	Ca l l e 57s ur #54E-38 s enti do Occ-Ori	12	11-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2399,0	2402,0	99,9%	≥93	Cumple
199	Ca l l e 57s ur #54E-53 s enti do Occ-Ori	12	11-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2436,0	2402,0	101,4%	≥93	Cumple
200	Ca rrera 28 #99B-35	14	11-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2381,0	2414,0	98,6%	≥93	Cumple
201	Ca rrera 28 #99B-35 +7m	14	11-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2359,0	2414,0	97,7%	≥93	Cumple
217	CL 18 CR 43G - 138	2	15-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2368,0	2406,0	98,4%	≥93	Cumple
218	CL 18 CR 43G - 90+5m	2	15-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2350,0	2406,0	97,7%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
219	CR 43A CL 103 - 34	3	16-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2387,0	2402,0	99,4%	≥93	Cumple
220	CR 43A CL 103 - 21	3	16-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2355,0	2402,0	98,0%	≥93	Cumple
221	DG 75B CL 1 +22m	4	15-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2385,0	2406,0	99,1%	≥93	Cumple
222	DG 75B CL 1 +7m	4	15-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2349,0	2406,0	97,6%	≥93	Cumple
223	CR 52 #54-35 (Estación Villa)	5	15-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2444,0	2406,0	101,6%	≥93	Cumple
224	Cl 54 #52-32 (Estación Villa)	5	15-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2335,0	2406,0	97,0%	≥93	Cumple
225	Cl 19 # 72 - 90	6	16-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2370,0	2402,0	98,7%	≥93	Cumple
226	Cl 19 # 73 - 4	6	16-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2336,0	2402,0	97,3%	≥93	Cumple
227	Cl 77CC Cr 82-20	7	16-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2434,0	2462,0	98,9%	≥93	Cumple
228	Cl 77CC-31	7	16-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2394,0	2462,0	97,2%	≥93	Cumple
229	CL 91 CR 54-05	8	17-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2438,0	2469,0	98,7%	≥93	Cumple
230	CL 91 CR 54-17	8	17-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2406,0	2469,0	97,4%	≥93	Cumple
231	Cr 88 cl 31CC-36	9	17-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2397,0	2469,0	97,1%	≥93	Cumple
232	Cr 89C cl 31E-99	9	17-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2474,0	2469,0	100,2%	≥93	Cumple
233	CL 57C CR 22-21	10	17-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2494,0	2469,0	101,0%	≥93	Cumple
234	CL 57C CR 22-23	10	17-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2427,0	2469,0	98,3%	≥93	Cumple
235	CL 57F CR92CC - 11	11	18-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2445,0	2478,0	98,7%	≥93	Cumple
236	CL 57F CR92CC - 13	11	18-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2417,0	2478,0	97,5%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
237	Cr 82 CL 38Sur - 62 sentido sur norte	12	18-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2420,0	2478,0	97,7%	≥93	Cumple
238	Cr 82 CL 38Sur - 56 sentido sur norte	12	18-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2451,0	2478,0	98,9%	≥93	Cumple
239	Cr 28 Cl 100 + 60M	14	18-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2441,0	2409,0	101,3%	≥93	Cumple
240	Cr 28 Cl 100 + 65M	14	18-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2452,0	2409,0	101,8%	≥93	Cumple
261	CR 44 CL 17C SUR - 40	2	22-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2398,0	2402,0	99,8%	≥93	Cumple
262	CL 17C SUR CR 44 - 117	2	22-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2362,0	2402,0	98,3%	≥93	Cumple
263	CL 118 CR 42B - 24	3	23-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2362,0	2406,0	98,2%	≥93	Cumple
264	CL 118 CR 42B - 34+3m	3	23-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2367,0	2406,0	98,4%	≥93	Cumple
265	DG 75B CL 2A-71, sentido N S, Intervención Transversal al sentido de la vía, junto a paradero de buses, frente a La Rebaja Plus Mall La Mota, Sobre Av 80.	4	22-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2384,0	2402,0	99,3%	≥93	Cumple
266	DG 75B CL 2A-169, Sentido N S, 1ra intervención carril izquierdo, figura compuesta forma de zapato, iniciando Mall La Mota	4	22-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2389,0	2402,0	99,5%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
267	Cr 51 #32-160 (Barrio Calle Nueva)	5	22-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2365,0	2402,0	98,5%	≥93	Cumple
268	Cr 51 #34-65 (Barrio Calle Nueva)	5	22-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2349,0	2402,0	97,8%	≥93	Cumple
269	Cl 12 # 70 - 16	6	23-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2358,0	2406,0	98,0%	≥93	Cumple
270	Cl 12 # 70 - 19	6	23-sep-25	Procopal	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2384,0	2406,0	99,1%	≥93	Cumple
271	Cr 93A Cl 77F-57	7	23-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2427,0	2466,0	98,4%	≥93	Cumple
272	Cl 78A Cr 93-10	7	23-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2424,0	2466,0	98,3%	≥93	Cumple
273	CR 34 CL 96-24	8	24-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2473,0	2464,0	100,4%	≥93	Cumple
274	CL 98 CR 34-13	8	24-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2427,0	2464,0	98,5%	≥93	Cumple
275	Cl 30B Cr 89C-49	9	24-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2453,0	2464,0	99,6%	≥93	Cumple
276	Cl 30B Cr 89B-94	9	24-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2394,0	2464,0	97,2%	≥93	Cumple
277	Cl 55B Cr 25C-10	10	24-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2400,0	2464,0	97,4%	≥93	Cumple
278	Cl 55B Cr 25C-12	10	24-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2431,0	2464,0	98,7%	≥93	Cumple
279	CL 58D CR 92C-14	11	25-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2448,0	2479,0	98,7%	≥93	Cumple
280	CL 58D CR 92D-05	11	25-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2418,0	2479,0	97,5%	≥93	Cumple
281	Cl 48sur Cr 61D - 10 sentido noreste suroeste	12	25-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2442,0	2479,0	98,5%	≥93	Cumple
282	Cl 48sur Cr 61C - 22 sentido suroeste noreste	12	25-sep-25	Pavimentar	MDC-19 (TIBIA) + RAP	2417,0	2479,0	97,5%	≥93	Cumple

						RESULTADOS				
N° NUCLEO	**DIRECCIÓN**	**CUADRILLA N°**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Densidad briqueta (Kg/m3)**	**% compactación**	**Rango cumplimiento**	**Observación**
283	Crr 26c # 98 - 47 + 10M	14	25-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2392,0	2409,0	99,3%	≥93	Cumple
284	Crr 26c # 98 - 47	14	25-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2407,0	2409,0	99,9%	≥93	Cumple

Tabla 32 Relación de ensayos de densidades – Rango 4 y masivos.

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
91	Calle 45C Con CL 46 y CR 21 Este-Oeste (esquina calle 46)	20-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2420	2,600	93,4%	94,1%	0,0144	0,686	93,1%	≥93%	Cumple
92	Calle 45C Con CL 46 y CR 21 Este-Oeste (parte posterior unidad serranias frente al # 19A 8 (1001)	19-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2410	2,600	93,0%						
93	Calle 45C Con CL 46 y CR 21 Este-Oeste (Cr 20C # 45 80 Hermanas franciscanas)	19-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2495	2,600	96,3%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
94	Calle 45C Con CL 46 y CR 21 Este-Oeste (Cl 45C # 20C 21)	22-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2471	2,609	95,0%						
95	Calle 45C Con CL 46 y CR 21 Este-Oeste (Cl 45C # 20C 91 esquina con cr 21)	21-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2415	2,602	93,1%						
96	CR69 #95-97, Carril derecho Norte-Sur (93,24ml)	19-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2518	2,600	97,1%						
97	CR69 #95-120, Carril izquierdo Norte-Sur (72,37ml)	20-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2482	2,600	95,7%						
98	CL95 #68-46, Carril izquierdo toda la cuadra (81,25ml)	21-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2463	2,602	94,9%	95,2%	0,0147	0,686	94,2%	≥93%	Cumple
99	CL95 #68-57, Carril derecho toda la cuadra (81,25ml)	22-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2421	2,609	93,1%						
100	CR69 #95-56, Carril izquierdo Norte-Sur (65,5ml)	23-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2477	2,609	95,2%						
129	Diagonal 75 TV 39CB-40 Burger King (Carril derecho)	29-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2416	2,601	93,2%	93,2%	0,0019	0,686	93,1%	≥93%	Cumple
130	Diagonal 75 TV 39CB-20 Jatisa	29-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2416	2,601	93,2%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
	Living (Carril derecho)												
131	Intersección de la DG 75 con la 39CB (Carril derecho)	29-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2413	2,601	93,1%						
132	Tv 39 # 74-20 Ed Plaza del Parque (Carril derecho)	29-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2426	2,601	93,6%						
133	Tv 39 # 74-05 Fisio Esthetic (Carril derecho)	29-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2419	2,601	93,3%						
134	CR47 #52-172, Carril derecho en sentido del flujo.	26-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2439	2,612	93,7%						
135	CR47 #52-140, Carril derecho en sentido del flujo.	26-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2429	2,612	93,3%						
136	CR47 #52-109, Carril derecho en sentido del flujo.	26-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2471	2,612	94,9%	94,2%	0,0106	0,686	93,5%	≥93%	Cumple
137	CR47 #52-58, Carril derecho en sentido del flujo.	26-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2493	2,612	95,7%						
138	CR47 #52-62, Carril derecho en sentido del flujo.	26-ago-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2434	2,612	93,5%						
163	ESQUINA CR 47 CON CR 46 (NORTE SUR	4-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2421	2,591	93,7%	93,7%	0,0076	0,686	93,2%	≥93%	Cumple

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
	CARRIL IZQUIERDO)												
164	FRENTE CRA 47 # 57A 34 (NORTE SUR CARRIL IZQUIERDO)	4-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2387	2,591	92,4%						
165	FRENTE A CRA 47 # 57A 06 (NORTE SUR CARRIL IZQUIERDO)	4-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2437	2,591	94,3%						
166	FRENTE A CRA 47 CON CL 57 A CRUCE	4-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2433	2,591	94,2%						
167	FRENTE A CRA 47 CON CL 57 CRUCE	4-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2421	2,591	93,7%						
168	CL10A con CR42 + 0mts, Carril derecho en sentido del flujo.	3-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2420	2,605	93,2%						
169	CL10A con CR42 + 15,30mts, Carril derecho en sentido del flujo.	3-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2423	2,605	93,3%	93,4%	0,0036	0,686	93,1%	≥93%	Cumple
170	CL10A con CR42 + 30,85mts, Carril derecho en sentido del flujo.	3-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2440	2,605	93,9%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
171	CL10A con CR42 + 50,67mts, Carril derecho en sentido del flujo.	3-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2415	2,605	93,0%						
172	CL10A con CR42 + 75,87mts, Carril derecho en sentido del flujo.	3-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2426	2,605	93,4%						
173	CL10A #43A-43, Vía del deprimido carril derecho en sentido del flujo.	5-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2500	2,596	96,6%						
174	CL11 con CR43B, Carril central en sentido del flujo.	5-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2477	2,596	95,7%						
175	CL11 #43B-37, Carril central en sentido del flujo.	5-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2508	2,596	96,9%	95,8%	0,0151	0,686	94,8%	≥93%	Cumple
176	CL11 #43B-55, Carril central en sentido del flujo.	5-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2501	2,596	96,6%						
177	CL11 con CR43C, Carril central en sentido del flujo. (Esquina)	5-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2413	2,596	93,2%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
202	Carrera 94a entre calles 78a y 79a frente al predio # 78B 04	12-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2524	2,589	97,8%	94,9%	0,0174	0,686	93,7%	≥93%	Cumple
203	Carrera 94a entre calles 78a y 79a frente al predio # 78B 28	12-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2426	2,589	94,0%						
204	Carrera 94a entre calles 78a y 79a frente al predio # 78B 46	12-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2455	2,589	95,1%						
205	Carrera 94a entre calles 78a y 79a frente al predio # 78B 66	12-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2410	2,589	93,4%						
206	Carrera 94a entre calles 78a y 79a frente al predio # 79 14	12-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2429	2,589	94,1%						
207	CL10A con CR36 + 10 mts, Carril derecho en sendito del flujo.	8-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2459	2,611	94,5%	95,5%	0,0118	0,686	94,7%	≥93%	Cumple
208	CL10A #36-19, Carril derecho en sendito del flujo.	8-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2467	2,611	94,8%						
209	CL10A #36-53+2mts, Carril derecho en sendito del flujo.	8-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2531	2,611	97,2%						
210	CL10A #37-8, Carril derecho	8-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2507	2,611	96,3%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
	en sendito del flujo.												
211	CL10A #37-64, Carril derecho en sendito del flujo.	8-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2472	2,611	95,0%						
212	Calle 5 sur entre carreras 43 a y 42 carril izquierdo sentido del flujo.	10-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2374	2,528	94,2%						
213	Calle 5 sur entre carreras 43 a y 42 carril izquierdo sentido del flujo.	10-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2383	2,528	94,5%						
214	Calle 5 sur entre carreras 43 a y 42 carril izquierdo sentido del flujo.	10-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2348	2,528	93,2%	95,4%	0,0211	0,686	94,0%	≥93%	Cumple
215	Calle 5 sur entre carreras 43 a y 42 carril izquierdo sentido del flujo.	10-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2448	2,528	97,1%						
216	Calle 5 sur entre carreras 43 a y 42 carril izquierdo sentido del flujo.	10-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2474	2,528	98,2%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
241	CL 78A frente a 94-09 carril sur (Aures 1 Cl 78A cr 94 cr 94a)	19-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2420	2,609	93,0%	93,6%	0,0056	0,686	93,2%	≥93%	Cumple
242	CL 78A frente a 94-31 carril sur (Aures 1 Cl 78A cr 94 cr 94a)	19-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2456	2,609	94,4%						
243	CL 78A frente a 94-61 carril sur (Aures 1 Cl 78A cr 94 cr 94a)	19-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2444	2,609	94,0%						
244	CL 78A frente a 94a-13 carril sur (Aures 1 Cl 78A cr 94 a cr 95)	19-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2425	2,609	93,2%						
245	CL 78A frente a 94a-37 carril sur (Aures 1 Cl 78A cr 94 a cr 95)	19-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2431	2,609	93,5%						
246	CL10A #40-30, Carril derecho en sendito del flujo.	15-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2468	2,609	94,9%	95,5%	0,0135	0,686	94,6%	≥93%	Cumple
247	CL10A #40-36, Carril derecho en sendito del flujo.	15-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2520	2,609	96,9%						
248	CL10A #40-44+2mts, Carril derecho en sendito del flujo.	15-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2437	2,609	93,7%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
249	CL10A #40-52+5mts, Carril derecho en sendito del flujo.	15-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2518	2,609	96,8%						
250	CL10A #40-68+7mts, Carril derecho en sendito del flujo.	15-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2479	2,609	95,3%						
251	Calle 5 sur entre carreras 38 y 37 carril derecho sentido del flujo.	17-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2364	2,526	93,9%						
252	Calle 5 sur entre carreras 38 y 37 carril derecho sentido del flujo.	17-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2356	2,526	93,6%						
253	Calle 5 sur entre carreras 38 y 37 carril derecho sentido del flujo.	17-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2350	2,526	93,3%	93,5%	0,0023	0,686	93,3%	≥93%	Cumple
254	Calle 5 sur entre carreras 38 y 37 carril derecho sentido del flujo.	17-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2352	2,526	93,4%						
255	Calle 5 sur entre carreras 38 y 37 carril	17-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2351	2,526	93,4%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
	derecho sentido del flujo.												
256	CR 92B CON CLL 48 (bocacalle)	19-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2350	2,524	93,4%	95,2%	0,0140	0,686	94,2%	≥93%	Cumple
257	CLL 48 # 92A-09	19-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2376	2,524	94,4%						
258	CLL 48 CON 92A	19-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2444	2,524	97,1%						
259	CLL 48 # 92A + 10m oriente	19-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2399	2,524	95,3%						
260	CLL 48 CON CRA 92	19-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2408	2,524	95,7%						
285	CRA 48 entre calles 16 sur y 17 A sur + 10m	23-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2534	2,603	97,6%	96,7%	0,0054	0,686	96,4%	≥93%	Cumple
286	CRA 48 entre calles 16 sur y 17 A sur + 30m	23-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2497	2,603	96,2%						
287	CRA 48 entre calles 16 sur y 17 A sur + 50m	23-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2512	2,603	96,8%						
288	CRA 48 entre calles 16 sur y 17 A sur + 70m	23-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2508	2,603	96,6%						
289	CRA 48 entre calles 16 sur y 17 A sur + 90m	23-sep-25	Pavimentar	MAM-25	2503	2,603	96,4%						
290	CL10A #36-11 (Emerald Tatto),Carril izquierdo en	23-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2398	2,595	92,7%	94,0%	0,0100	0,686	93,3%	≥93%	Cumple

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
	sendito del flujo.												
291	CL10A #36-37(Andrea Landa), Carril izquierdo en sendito del flujo.	23-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2442	2,595	94,4%						
292	Cr37 #10a-03 (frijoles y sancohcos), Carril derecho en sendito del flujo en todo el cruce.	23-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2413	2,595	93,3%						
293	CL10A #37-28, Carril derecho en sendito del flujo.	23-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2458	2,595	95,0%						
294	CL10A #37-60(La10amigos), Carril derecho en sendito del flujo.	23-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2452	2,595	94,8%						
295	CL10A #40-27(Dancefree), Carril derecho en sendito del flujo.	26-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2458	2,616	94,2%	93,7%	0,0052	0,686	93,4%	≥93%	Cumple
296	CL10A #40-55(CascosYC), Carril derecho en sendito del flujo.	26-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2457	2,616	94,2%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
297	Cl10A #40-70(La fragua), Carril derecho en sendito del flujo en todo el cruce.	26-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2427	2,616	93,1%						
298	CL10#41-19(Agencia de viajes), Carril izquierdo en sendito del flujo.	26-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2435	2,616	93,4%						
299	Cl10A #41-64(Edificio la poblada), Carril iquierdo en sendito del flujo.	26-sep-25	Pavimentar	MSC-19 (TIBIA) + FIBRA	2446	2,616	93,8%						
300	CARRERA 37 ENTRE CALLES 10 Y 10A CARRIL IZQUIERDO SENTIDO DEL FLUJO.	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2363	2,524	93,9%						
301	CALLE 5 SUR ENTRE CARRERAS 38 Y 37 CARRIL DERECHO SENTIDO DEL FLUJO.	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2349	2,524	93,3%	93,6%	0,0022	0,686	93,5%	≥93%	Cumple
302	CALLE 5 SUR ENTRE CARRERAS 38 Y 37 CARRIL DERECHO	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2357	2,524	93,7%						

					RESULTADOS								
N°	**DIRECCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**PLANTA**	**TIPO DE MEZCLA**	**Densidad (Kg/m3)**	**Gravedad específica máxima de la mezcla (Gmm)**	**Valor individual de compactación (GCi, %)**	**Densidad promedia GCm**	**Desviación estandar, s**	**Factor que establece el límite inferior del intervalo de confianza, K**	**GCi (90)**	**Rango cumplimiento GCmin %**	**Observación**
	SENTIDO DEL FLUJO.												
303	CALLE 5 SUR ENTRE CARRERAS 38 Y 37 CARRIL DERECHO SENTIDO DEL FLUJO.	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2354	2,524	93,5%						
304	CALLE 5 SUR ENTRE CARRERAS 38 Y 37 CARRIL DERECHO SENTIDO DEL FLUJO.	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2360	2,524	93,8%						
305	CL 49A # 88-1	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2410	2,524	95,8%						
306	Cl 49A # 88-19	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2356	2,524	93,6%						
307	CL 49A con CRA 88A	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2376	2,524	94,4%	94,5%	0,0085	0,686	93,9%	≥93%	Cumple
308	CL 49A CR 89	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2387	2,524	94,9%						
309	CRA 89A # 49-61	24-sep-25	Procopal	MSC-19 (TIBIA) + RAP	2362	2,524	93,9%						

2.5.7 Control de calidad de estructuras de concreto

Para el control de calidad de las estructuras en concreto, se tomó muestras de cilindros para ensayos de resistencia a la compresión y resistencia a la flexión, durante la construcción de pavimento rígido y pompeyanos.

En el informe de calidad del mes de octubre de 2025, que se adjunta al presente informe mensual, se incluye los informes de resultados de ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto a los 7 y 28 días de edad realizados por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.S.

El contratista Consorcio VialMed 2025 hizo entrega de los diseños de mezcla de concreto para resistencias de 21 y 28 MPa, con triturado y arena procedente de cantera Sinifaná Piedra Verde y cantera Santa Rita, con adición de aditivos Plastol HR-DM y Accelguard HE de Toxement, los cuales fueron recogidos el día 26 de septiembre de 2025. El cemento utilizado fue Argos estructural. Los diseños fueron elaborados por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS S.A.

A continuación, se relaciona el resumen de los resultados de las resistencias obtenidas en los ensayos de resistencia a compresión realizado a cilindros de concreto y resistencia a la flexión de vigas de concreto, y su cumplimiento frente a las especificaciones técnicas y diseños aplicables a proyecto:

Tabla 33 Resumen de los informes de resultados de resistencia a la compresión de cilindros de concreto.

N° MUESTRA	CILINDRO N°	DIRECCIÓN	SECTOR	ELEMENTO VACIADO	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	FECHA FUNDIDO	FECHA DE ENSAYO	Edad en días	RESULTADOS	
									(Mpa)	%
1	1	CL 30 CON CR 89DB	Las Violetas	Viga de muro de contención (Ciclópeo)	21	5-sep-25	12-sep-25	7	25,50	121%
	2				21	5-sep-25	12-sep-25	7	28,10	134%
	3				21	5-sep-25	3-oct-25	28	27,10	129%
	4				21	5-sep-25	3-oct-25	28	25,70	122%
2	7	CL 30 CON CR 89DB	Las Violetas	Vástago muro de contención (Ciclópeo)	21	6-sep-25	13-sep-25	7	22,40	107%
	8				21	6-sep-25	13-sep-25	7	16,40	78%
	9				21	6-sep-25	4-oct-25	28	20,30	97%
	10				21	6-sep-25	4-oct-25	28	19,30	92%
3	1	Carrera 47 con calle 107	Andalucia	Losa pompeyano	28	12-sep-25	19-sep-25	7	15,20	54%
	2				28	12-sep-25	19-sep-25	7	17,10	61%
	3				28	12-sep-25	10-oct-25	28	22,00	79%
	4				28	12-sep-25	10-oct-25	28	21,80	78%

N° MUESTRA	CILINDRO N°	DIRECCIÓN	SECTOR	ELEMENTO VACIADO	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	FECHA FUNDIDO	FECHA DE ENSAYO	Edad en días	RESULTADOS	
									(Mpa)	%
4	13	Calle 30 con carrera 89BD	Las Violetas	Losa pavimento	28	13-sep-25	20-sep-25	7	36,10	129%
	14				28	13-sep-25	20-sep-25	7	40,00	143%
	15				28	13-sep-25	11-oct-25	28	43,90	157%
	16				28	13-sep-25	11-oct-25	28	43,00	154%
5	19	CL 30 CON CR 89DB	Las Violetas	Vastago muro de contención (Ciclópeo)	21	16-sep-25	23-sep-25	7	23,20	110%
	20				21	16-sep-25	23-sep-25	7	24,50	117%
	21				21	16-sep-25	14-oct-25	28	30,10	143%
	22				21	16-sep-25	14-oct-25	28	30,50	145%
6	31	Calle 98 C # 84-31	Picachito	Vastago muro de contención	21	2-oct-25	9-oct-25	7	15,00	71%
	32				21	2-oct-25	9-oct-25	7	15,60	74%
	33				21	2-oct-25	30-oct-25	28	23,30	111%
	34				21	2-oct-25	30-oct-25	28	22,40	107%
7	43	Calle 67 # 36A - 09	Manrique	Andén	21	17-oct-25	24-oct-25	7	10,10	48%
	44				21	17-oct-25	24-oct-25	7	14,00	67%
	45				21	17-oct-25	14-nov-25	28		0%
	46				21	17-oct-25	14-nov-25	28		0%
8	47	Calle 33 # 63B - 14		Losa Pueblito Paisa	28	24-oct-25	31-oct-25	7	41,60	149%
	48				28	24-oct-25	31-oct-25	7	40,40	144%
	49				28	24-oct-25	21-nov-25	28		0%
	50				28	24-oct-25	21-nov-25	28		0%

Observación: Se observa en la tabla anterior, que las resistencias a compresión de cilindros de concreto obtenidos en laboratorio el 10 de octubre de 2025, correspondiente al concreto de 28 Mpa utilizado el 12 de septiembre de 2025 durante el vaciado del pompeyano localizado carrera 47 con calle 107, no cumple con las resistencias esperadas; por lo anterior, se solicitó al contratista fallar los cilindros testigo tomados de esa misma jornada para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Tabla 34 Resumen de los informes de resultados de resistencia a la compresión de concretos tipo MR.

N° MUESTRA	CILINDRO N°	DIRECCIÓN	SECTOR	ELEMENTO VACIADO	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	FECHA FUNDIDO	FECHA DE ENSAYO	Edad en Dias	RESULTADOS	
									(Mpa)	%
1	7	Carrera 43A con calle 10A	Poblado	Losa pompeyano	28	18-sep-25	25-sep-25	7	30,00	107%
	8				28	18-sep-25	25-sep-25	7	28,20	101%
	10				28	18-sep-25	16-oct-25	28	31,40	112%
	11				28	18-sep-25	16-oct-25	28	29,70	106%
2	25	Diagonal 65D # 34-53	Conquistadores	Losa pompeyano	28	22-sep-25	29-sep-25	7	31,90	114%
	25				28	22-sep-25	29-sep-25	7	30,90	110%
	27				28	22-sep-25	20-oct-25	28	38,10	136%
	28				28	22-sep-25	20-oct-25	28	39,60	141%
3	12	Calle 32F # 66B-168	Rosales	Losa pompeyano	28	24-sep-25	1-oct-25	7	38,90	139%
	13				28	24-sep-25	1-oct-25	7	37,80	135%
	14				28	24-sep-25	22-oct-25	28	45,80	164%
	15				28	24-sep-25	22-oct-25	28	37,60	134%
4	18	Diagonal 65D # 34-53	Conquistadores	Losa pompeyano	28	29-sep-25	6-oct-25	7	34,30	123%
	19				28	29-sep-25	6-oct-25	7	37,00	132%
	20				28	29-sep-25	27-oct-25	28	36,30	130%
	21				28	29-sep-25	27-oct-25	28	34,40	123%
5	37	CR 49B CON CL 107	Andalucía	Losa pompeyano	28	8-oct-25	15-oct-25	7	17,20	61%
	38				28	8-oct-25	15-oct-25	7	38,50	138%
	39				28	8-oct-25	5-nov-25	28		0%
	50				28	8-oct-25	5-nov-25	28		0%
6	24	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	28	11-oct-25	18-oct-25	7	32,70	117%
	25				28	11-oct-25	18-oct-25	7	32,90	118%
	26				28	11-oct-25	8-nov-25	28		0%
	27				28	11-oct-25	8-nov-25	28		0%
7	29	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	28	15-oct-25	22-oct-25	7	43,80	156%
	30				28	15-oct-25	22-oct-25	7	26,30	94%
	31				28	15-oct-25	12-nov-25	28		0%
	32				28	15-oct-25	12-nov-25	28		0%
8	36	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	28	22-oct-25	29-oct-25	7	27,50	98%
	37				28	22-oct-25	29-oct-25	7	43,60	156%
	38				28	22-oct-25	19-nov-25	28		0%
	39				28	22-oct-25	19-nov-25	28		0%
9	41	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	28	27-oct-25	3-nov-25	7	19,00	68%
	42				28	27-oct-25	3-nov-25	7	21,40	76%
	43				28	27-oct-25	24-nov-25	28		0%
	44				28	27-oct-25	24-nov-25	28		0%

N° MUESTRA	CILINDRO N°	DIRECCIÓN	SECTOR	ELEMENTO VACIADO	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	FECHA FUNDIDO	FECHA DE ENSAYO	Edad en Dias	RESULTADOS	
									(Mpa)	%
10	47	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	28	28-oct-25	4-nov-25	7	37,00	132%
	48				28	28-oct-25	4-nov-25	7	43,00	154%
	49				28	28-oct-25	25-nov-25	28		0%
	50				28	28-oct-25	25-nov-25	28		0%

Observación: Las resistencias a compresión relacionadas en la tabla anterior cumplen con las resistencias esperadas de acuerdo a las especificaciones y diseños aplicables al proyecto.

Tabla 35 Resumen de los informes de resultados de resistencia a la flexión de vigas de concreto tipo MR.

N° MUESTRA	CILINDRO N°	DIRECCIÓN	SECTOR	ELEMENTO VACIADO	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	FECHA FUNDIDO	FECHA DE ENSAYO	Edad en días	RESULTADOS	
									(Mpa)	%
3	1	Carrera 47 con calle 107	Andalucía	Losa pompeyano	4	12-sep-25	19-sep-25	7	3,15	79%
	2				4	12-sep-25	19-sep-25	7	3,40	85%
	3				4	12-sep-25	10-oct-25	28	3,65	91%
	4				4	12-sep-25	10-oct-25	28	3,65	91%
4	1	Calle 30 con carrera 89BD	Las Violetas	Losa pavimento	4	13-sep-25	20-sep-25	7	4,55	114%
	2				4	13-sep-25	20-sep-25	7	4,25	106%
	3				4	13-sep-25	11-oct-25	28	4,60	115%
	4				4	13-sep-25	11-oct-25	28	4,55	114%
1	1	Carrera 43A con calle 10A	Poblado	Losa pompeyano	4	18-sep-25	25-sep-25	7	3,40	85%
	2				4	18-sep-25	25-sep-25	7	3,90	98%
	3				4	18-sep-25	16-oct-25	28	4,40	110%
	4				4	18-sep-25	16-oct-25	28	4,35	109%
2	1	Diagonal 65D # 34-53	Conquistadores	Losa pompeyano	4	22-sep-25	29-sep-25	7	4,00	100%
	2				4	22-sep-25	29-sep-25	7	3,95	99%
	3				4	22-sep-25	20-oct-25	28	4,55	114%
	4				4	22-sep-25	20-oct-25	28	4,70	118%
3	1	Calle 32F # 66B-168	Rosales	Losa pompeyano	4	24-sep-25	1-oct-25	7	4,75	119%
	2				4	24-sep-25	1-oct-25	7	4,40	110%
	3				4	24-sep-25	22-oct-25	28	5,00	125%

N° MUESTRA	CILINDRO N°	DIRECCIÓN	SECTOR	ELEMENTO VACIADO	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	FECHA FUNDIDO	FECHA DE ENSAYO	Edad en días	RESULTADOS	
									(Mpa)	%
	4				4	24-sep-25	22-oct-25	28	4,90	123%
4	1	Diagonal 65D # 34-53	Conquistadores	Losa pompeyano	4	29-sep-25	6-oct-25	7	4,60	115%
	2				4	29-sep-25	6-oct-25	7	4,65	116%
	3				4	29-sep-25	27-oct-25	28	4,95	124%
	4				4	29-sep-25	27-oct-25	28	5,00	125%
5	1	CR 49B CON CL 107	Andalucía	Losa pompeyano	4	8-oct-25	15-oct-25	7	4,35	109%
	2				4	8-oct-25	15-oct-25	7	4,45	111%
	3				4	8-oct-25	5-nov-25	28		0%
	4				4	8-oct-25	5-nov-25	28		0%
6	1	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	4	11-oct-25	18-oct-25	7	4,60	115%
	2				4	11-oct-25	18-oct-25	7	4,45	111%
	3				4	11-oct-25	8-nov-25	28		0%
	4				4	11-oct-25	8-nov-25	28		0%
7	1	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	4	15-oct-25	22-oct-25	7	4,90	123%
	2				4	15-oct-25	22-oct-25	7	4,15	104%
	3				4	15-oct-25	12-nov-25	28		0%
	4				4	15-oct-25	12-nov-25	28		0%
8	1	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	4	22-oct-25	29-oct-25	7	5,05	126%
	2				4	22-oct-25	29-oct-25	7	5,30	133%
	3				4	22-oct-25	19-nov-25	28		0%
	4				4	22-oct-25	19-nov-25	28		0%
9	1	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	4	27-oct-25	3-nov-25	7	5,10	128%
	2				4	27-oct-25	3-nov-25	7	4,10	103%
	3				4	27-oct-25	24-nov-25	28		0%
	4				4	27-oct-25	24-nov-25	28		0%
10	1	CR 21 ENRE CL 59 Y 59A	Los Mangos	Pavimento rígido	4	28-oct-25	4-nov-24	7	5,00	125%
	2				4	28-oct-25	4-nov-25	7	4,85	121%
	3				4	28-oct-25	25-nov-25	28		0%
	4				4	28-oct-25	25-nov-25	28		0%

Observación: Se observa en la tabla anterior, que las resistencias a flexión de vigas de concreto obtenidas en laboratorio el 19 de septiembre de 2025, correspondiente al concreto de 28 Mpa utilizado el 12 de septiembre de 2025 durante el vaciado del pompeyano localizado carrera 47 con calle 107, no cumple con las resistencias esperadas; por lo anterior, se solicitó al contratista fallar las vigas testigo tomadas de esa misma jornada para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

2.5.8 Control de densidades y porcentajes de compactación de capas granulares

Se realizó acompañamiento al Contratista a realizar pruebas de campo para verificar porcentajes de compactación del material de base granular utilizado en la construcción de pavimento rígido y pompeyanos. Las pruebas cumplen con los porcentajes exigidos en las especificaciones técnicas.

Registro fotográfico.

	
Toma de densidades y chequeo porcentajes de compactación, carrera 21 entre calles 59 y 59 A.	Toma de densidades y chequeo porcentajes de compactación, carrera 21 entre calles 59 y 59 A.
	
Toma de densidades y chequeo porcentajes de compactación, carrera 21 entre calles 59 y 59 A.	Toma de densidades y chequeo porcentajes de compactación, carrera 21 entre calles 59 y 59 A.

	
Toma de densidades y chequeo porcentajes de compactación, carrera 21 entre calles 59 y 59 A.	Toma de densidades y chequeo porcentajes de compactación, carrera 21 entre calles 59 y 59 A.

Tabla 36. Registro de toma de densidades en campo.

FECHA	Dirección	Cuadrilla	Comuna	Sector	Material	RESULTADOS		
						% compactación requerida	% de compactación obtenida en campo	Observación
13-sep-24	Calle 30 con carrera 89BD	18	16	Las Violetas	Base	98,0%	104,6%	Cumple
13-sep-24	Calle 30 con carrera 89BD	18	16	Las Violetas	Base	98,0%	102,7%	Cumple
10-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	98,0%	Cumple
14-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	100,4%	Cumple
14-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	99,9%	Cumple
21-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	100,2%	Cumple
21-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	100,4%	Cumple
25-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	98,6%	Cumple
25-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	98,0%	Cumple
30-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	98,4%	Cumple

FECHA	Dirección	Cuadrilla	Comuna	Sector	Material	RESULTADOS		
						% compactación requerida	% de compactación obtenida en campo	Observación
30-oct-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	98,3%	Cumple
7-nov-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	100,2%	Cumple
7-nov-25	Carrera 21 entre calles 59 y 59A	19	8	Los Mangos	Base	98,0%	98,1%	Cumple

2.5.9 Certificados de calidad de materiales

A continuación, se relaciona los certificados de calidad de los materiales utilizados en la obra en el mes de octubre de 2025 para las obras de REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA:

- ✓ Agregados ARGOS.
- ✓ Arena para concretos.
- ✓ Triturado para concretos.
- ✓ Arenilla.
- ✓ Base granular.
- ✓ Cuellos y tapas de MHs.
- ✓ Piedra Gavión.
- ✓ Cemento estructural.
- ✓ Acero de refuerzo.

2.6 CONTROL DE EQUIPOS EN OBRA:

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico, capitulo 7, Maquinaría Mínima del Proyecto, el CONSORCIO VIALMED 2025 se compromete a contar con el equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato, relacionado a continuación:

- ✓ Planta productora de Mezcla asfáltica.
- ✓ Compresores.
- ✓ Pulidoras manuales.
- ✓ Vibro compactadores.
- ✓ Ranas y/o placas vibratorias.
- ✓ Concretadoras.
- ✓ Cortadoras de elementos metálicos.
- ✓ Cortadoras para pavimento.
- ✓ Volquetas.
- ✓ Plantas Eléctricas.

- ✓ Taladros percutores.
- ✓ Hincadora.
- ✓ Pulidoras.
- ✓ Soplador.
- ✓ Equipo imprimador.
- ✓ Carro tanque de agua.
- ✓ Ruteadora.
- ✓ Vibrador eléctrico.

Para la ejecución de actividades en el mes de **octubre de 2025**, el contratista Consorcio VialMed 2025 cuenta en obra con el siguiente listado equipos y maquinaría.

Tabla 37. Relación equipo y maquinaria mes de **octubre de 2025**

DATOS DE MAQUINARIA.			
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIAL
compresor	doosan	ref c185wkub modelo 2014,	4670000uiye04, 7eg4503
compresor	doosan	ref c185wkub modelo 2014	466050uhye04, 7eg4496
compresor	doosan	ref c185wwk modelo 2012	444362ugwe04, cg0995
compresor	kaeser	m31	motor wka0n0758e5129174
finisher	caterpillar	ap 800d - 2007	a5p00216 - catap800ka5p00216
finisher	vogele	súper 1303-3 modelo: 2018	no.serie 15110285 , no.
fresadora	wirtgen	w100 - 2014	serial 11100121
fresadora	wirtgen	w100 - 2018	serie:11100217 - tcd 2012 l04/06
fresadora	wirtgen	w100 - 2012	11100008
pavimentadora	atlas copco dynapc	sd2500w	10002013p0g001437
vibrocompactador para mezclas asfálticas	hamm	referencia hamm hd 75k año 2016	motor: h1871516 chasis
vibro compactador	hamm	hd90 - 2018	no registra
rodillo compactador de neumáticos	hamm	hamm hp 280, - 2019	motor: 12466021 chasis: wgh0h249lhaa00068
minicargador new holland	new holland	d linea l218a modelo 2020	chasis jaf0l218hkm472337
fiat allis 65b modelo 1985 placa zpx 52	fiat	allis 65b modelo 1985 placa zpx 52	motor 237526 chasis 75a02943

DATOS DE MAQUINARIA.			
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIAL
retroexcavadora	new holland	2009	n8gh20533
retroexcavadora retroexcavadora new holland-b95b	new holland	2009	585829
rodillo vibratorio combinado rd40- 130c	wacker neuson	2018	no hay información
rodillo vibratorio combinado rd40- 130c	wacker neuson	2018	no hay información
tanque irrigador de asfalto de 250 t sobre trailer	leeboy	2014	no hay información
vibrocompactador ingersol rand	ingersol rand	no registra	chasis:46387270
compactador de pavimentos dynapac-a	dynapac	ca-150d	10008104p0b003921
compresor portátil m50 (1253)	kam | kama	m50	1253
fresadora wirtgen w-100 (21086)	wir | wirtgen	2012	11100008
f121-4w	dyn | dynapac	2006	654486
cc3800	dyn | dynapac	2015	10000319v0e002519
m50	kae | kaeser	2015	1194
w-1000	wir | wirtgen	2006	5100734
super 1303-3	wir | wirtgen	2015	11110238
rodillo	ingersoll rand	dx 60	no registrado
retroexcavadora	new holland	2009	n8gh20533
rodillo compactador	wacker neuson	2018	wncr0701ehaa00271
rx 500 fresadora de asfalto	roadtec	2020	79027880
fresadora	wirtgen	2007	9200271
finisher	dynapac	2011	100020003jg000342
equipo de imprimación	leeboy	2009	1b9aa111501309
fresadora	wirtgen	2017	0-7130046
compactador pavimento	ingersoll rand	2007	196625

DATOS DE MAQUINARIA.			
DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIAL
compactador pavimento	atlas copco	2017	101000319che04308
tanque imprimador	leeboy	2010	t-500-63266
minicargador caterpillar	caterpillar	2008	cat0236behen08790
minicargador llantas no neumaticas.	bobcat s570	2019	aznb12673
retroexcavadora	new holland	2009	n8gh20522
rd 40 130c	wacker neuson	2018	wngr0701ehaa00271
zx 75 us - a	hitachi	2005	hcm1cg00p00042787
cc1200 vi rodillos tándem para asfalto referencia: 4812142926	dynapac	2019	serial maquina / pin: 10000395cka024619, serial motor: d1703-7jz4749, marca motor: kubota,
minicargador caterpillar tipo bobcat	caterpillar	2015	cat0236dvmpw01125
retroexcvadora	caterpillar	2015	cat0416epmfg13253
compactador y apisonador	hamm	2009	h1870448

El listado de equipos y maquinaría relacionados en la tabla anterior para la ejecución de actividades en el mes de **octubre de 2025**, cumple con la relación del equipo mínimo requerido que el contratista debe disponer en obra para el desarrollo de las obras objeto del presente contrato.

El contratista Consorcio ViaMed 2025 hizo entrega del certificado de calibración de equipo utilizado por la comisión de topografía durante la ejecución de trabajos a nivel de masivos. La información del equipo utilizado se relaciona a continuación:

- ✓ Estación total marca TOPCON.
- ✓ Modelo ES-105.
- ✓ N° de Serial BSO164.
- ✓ Aumentos 30X.
- ✓ Precisión 5”.
- ✓ Empresa que certifica Nova Servicio Tecnico Nova S.A.S.
- ✓ Fecha de generación del certificacdo 27 de julio de 2025.
- ✓ N° de certificado 2330.
- ✓ Fecha de expiración del certificado 24 de enero de 2026.

2.7 CONTROL DE ENTREGA Y CAMBIOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:

La entidad hizo entrega las especificaciones técnicas y anexos aplicables al proyecto de acuerdo al alcance del contrato, los cuales se encuentran en los documentos del contrato, específicamente en el ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO: REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA.

Diseños de Mezclas Asfálticas

Al inicio del proyecto, el CONSORCIO VIALMED 2025 aportó la documentación relacionada con diseños de mezcla asfáltica tipo MDC-19 + RAP a utilizar en proyecto para rangos de 0 a 2, los cuales fueron revisados por la Interventoría.

En resumen, los diseños de mezclas asfálticas aprobadas por la Interventoría a través de la firma INTEINSA PAVIMENTOS a la fecha son las siguientes:

- **MDC-19 + RAP de la planta PAVIMENTAR S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Surtido el proceso de revisión del diseño por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS, se requirió al contratista ajustar los diseños de acuerdo a las siguientes observaciones:

- ✓ En el informe, numeral 2.2.3 Astec Warm Mix System, mencionan los beneficios de la mezcla asfáltica tibia y como se logra, pero en ninguna otra parte del diseño indican que la mezcla es tibia, inclusive las temperaturas a las que hacen referencia en el numeral 3.1 Fabricación de briquetas Marshall, corresponden a las de una mezcla asfáltica convencional, por lo anterior es importante que aclaren si este diseño corresponde a mezcla tibia o no.
- ✓ Para la verificación del diseño preliminar, la especificación del Invías en el numeral 450.4.2.2.2, estipula que se deben realizar los ensayos que se enuncian a continuación, estos ensayos no se presentan en los diseños de las mezclas: Resistencia a la deformación plástica (INV E-756-13); módulo complejo (UNE-EN 12697-26 Anexo D) y leyes de fatiga (INV E-808, INV E-784, UNE-EN 12697-24).

Las observaciones en mención fueron remitidas al contratista por medio de correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, respuesta a los comunicados CVM-011 -2025 y CVM-013-2025.

Procedencia de los materiales:

- ✓ La planta de mezclas objeto del presente diseño posee cuatro subtipos de agregados: Triturado 3/4", Arena de trituración, Arena Procesada de planta Copacabana (Antioquia) y material fresado suministrado por el municipio de Medellín el cual es triturado y clasificado en planta para su uso industrial.
- ✓ Como ligante asfáltico se ha usado asfalto 60/70.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 38. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	5,2
Densidad Bulk (g/cm3)	2,464
Estabilidad (N)	14514
Flujo (mm)	2,9
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4,96
Vacíos con aire (%)	4,9
Vacíos en los agregados (%)	16,4
Vacíos llenos con asfalto (%)	70,3
Relación llenante/ligante efectivo	0,97
Concentración real del llenante	0,277
Espesor promedio de película de asfalto	8
Gravedad específica máxima	2.589

Tabla 39. Granulometría mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
3/4”	**100**	100	100	100	100
1/2”	**88,5**	80	95	84	92
3/8”	**78,6**	70	88	75	83
No. 4	**53,7**	49	65	50	58
No. 10	**37,1**	29	45	34	40
No. 40	**19,6**	14	25	17	23
No. 80	**10,7**	8	17	8	14
No. 200	**5,5**	4	8	4	7,5

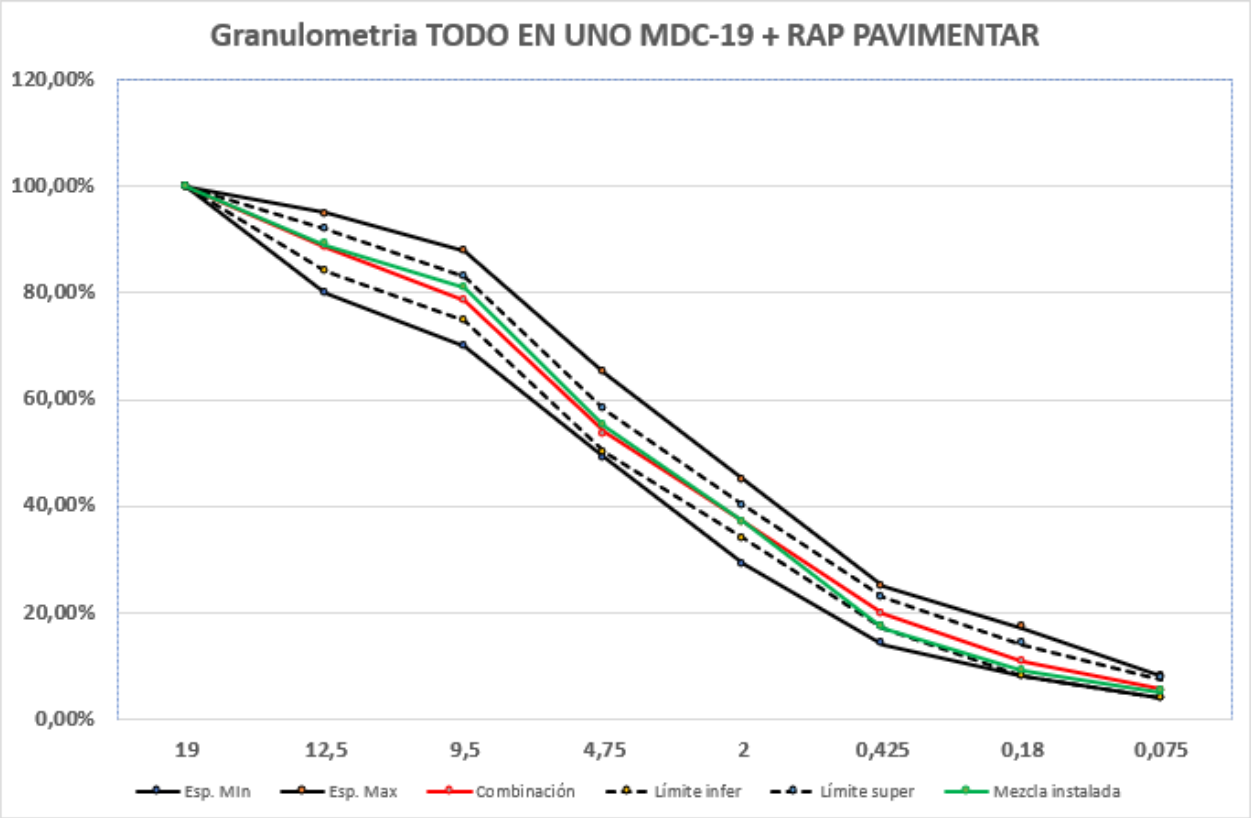


Ilustración 5 Curva granulométrica de diseño para mezcla MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Tabla 40. Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Material	Triturado de 3/4"	Arena triturada	Arena procesada	Material fresado
Dosificación	22%	35%	28%	15%

- **MSC-19 + RAP de la planta PAVIMENTAR S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Procedencia de los materiales:

- ✓ La planta de mezclas objeto del presente diseño posee cuatro subtipos de agregados: Triturado 3/4", Arena de trituración, Arena Procesada de planta Copacabana (Antioquia) y material fresado suministrado por el municipio de Medellín.
- ✓ Como ligante asfáltico se ha usado asfalto 60/70.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 41. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	4,9
Densidad Bulk (Kg/m3)	2.476
Estabilidad (N)	13491
Flujo (mm)	3
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4,4
Vacíos con aire (%)	4,8
Vacíos en los agregados (%)	15,8
Vacíos llenos con asfalto (%)	69,7
Relación llenante/ligante efectivo	0,93
Concentración real del llenante	0,264
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	9,2
Gravedad específica máxima	2.608

Tabla 42. Granulometría mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
3/4”	**100**	100	100	100	100
1/2”	**87**	80	95	83	91
3/8”	**75,6**	65	80	72	80
No. 4	**45,8**	40	55	42	50
No. 10	**29,9**	24	38	27	33
No. 40	**14,9**	9	20	12	18
No. 80	**8,3**	6	12	6	11
No. 200	**4,9**	3	7	3	6,9

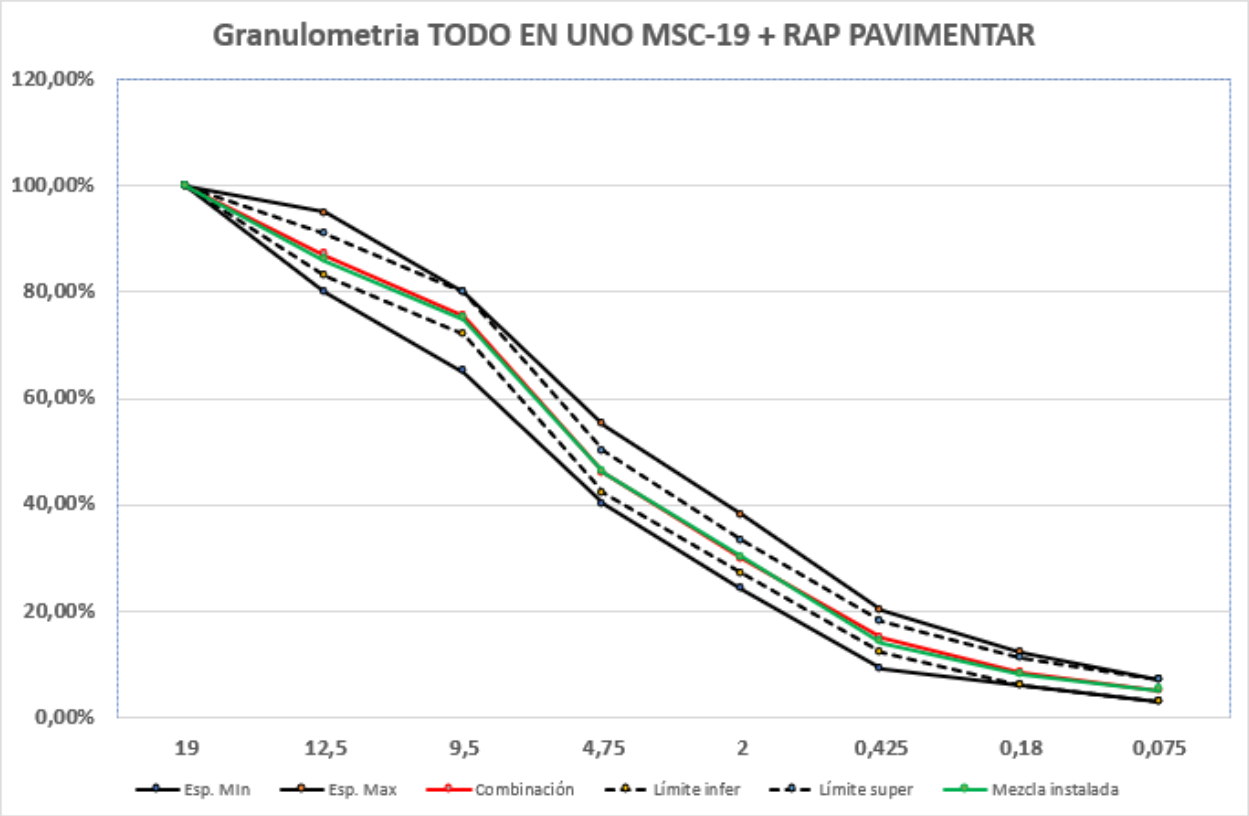


Ilustración 5 Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Tabla 43. Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + RAP PAVIMENTAR S.A

Material	Triturado de 3/4"	Arena triturada	Arena procesada	Material fresado
Dosificación	30%	30%	15%	25%

- **MSC-19 + FIBRA de la planta PAVIMENTAR S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Procedencia de los materiales:

- ✓ La planta de mezclas objeto del presente diseño posee cuatro subtipos de agregados: Triturado 3/4", Arena de trituración y Arena Procesada de planta Copacabana (Antioquia).
- ✓ Como ligante asfáltico se ha usado asfalto 60/70.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 44. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	4,9
Densidad Bulk (Kg/m3)	2.469
Estabilidad (N)	14516
Flujo (mm)	3,00
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	4,75
Vacíos con aire (%)	4,8
Vacíos en los agregados (%)	15,8
Vacíos llenos con asfalto (%)	70,0
Relación llenante/ligante efectivo	0,97
Concentración real del llenante	0,27
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	9,0
Gravedad específica máxima	2.590

Tabla 45. Granulometría mezcla asfáltica MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
3/4”	**100**	100	100	100	100
1/2”	**88**	80	95	84	92
3/8”	**76**	65	80	72	80
No. 4	**47,7**	40	55	44	52
No. 10	**31,2**	24	38	28	34
No. 40	**15,1**	9	20	12	18
No. 80	**8,9**	6	12	6	12
No. 200	**5,1**	3	7	3,1	7

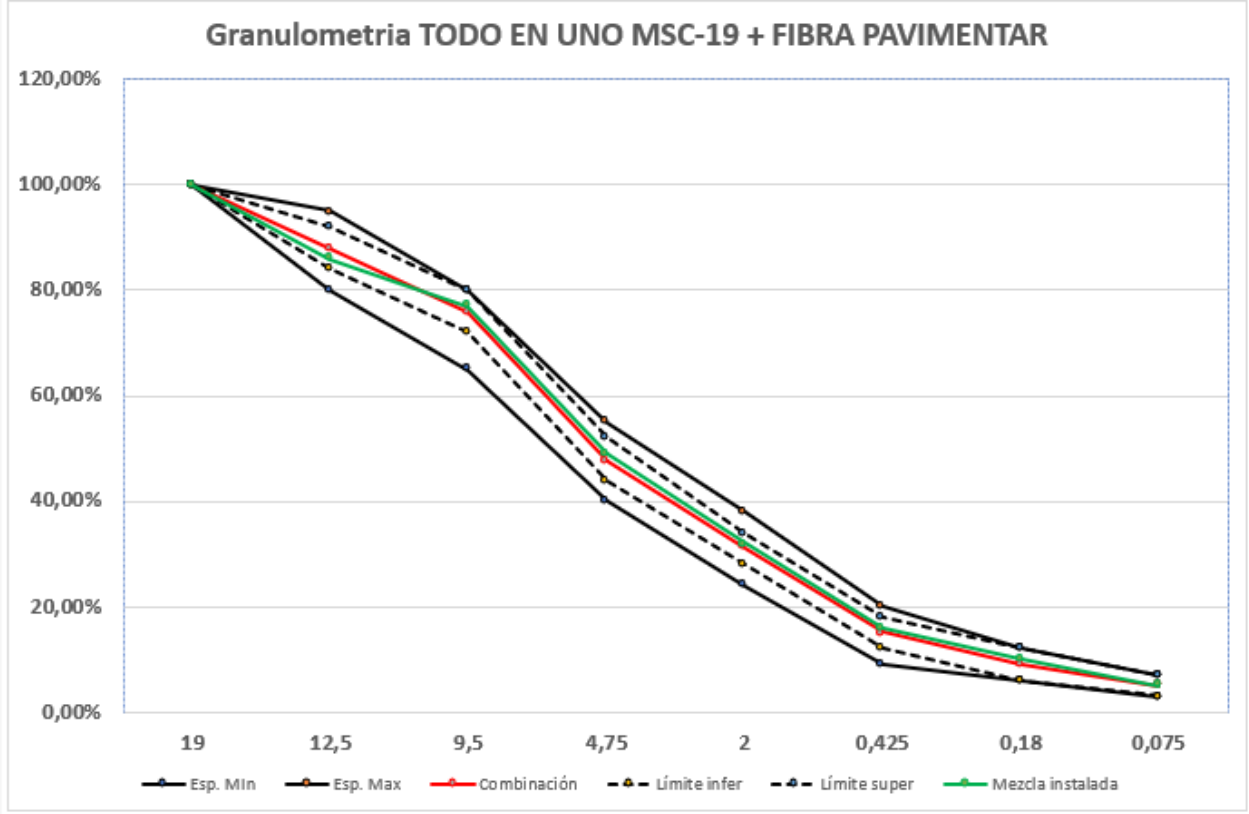


Ilustración 6 Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A

Tabla 46. Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + FIBRA PAVIMENTAR S.A

Material	Triturado de 3/4"	Arena triturada	Arena procesada
Dosificación	30%	50%	20%

- **MAM-25 de la planta PAVIMENTAR S.A.**

Procedencia de los materiales:

- ✓ La planta de mezclas objeto del presente diseño posee cuatro subtipos de agregados: Triturado 1", Arena de trituración, Arena Procesada y Filler aportado por el extractor de finos de la planta Astec y producto de los finos en exceso de los materiales que integran la mezcla de la planta Copacabana (Antioquia).

- ✓ Como ligante asfáltico se ha usado asfalto CAM-1.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 47. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MAM-25 PAVIMENTAR S.A

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	5
Densidad Bulk (g/cm3)	2,473
Estabilidad (N)	16537
Flujo (mm)	2,7
Estabilidad/Flujo (kN/mm)	6,1
Vacíos con aire (%)	4,6
Vacíos en los agregados (%)	16,1
Vacíos llenos con asfalto (%)	70,8
Relación llenante/ligante efectivo	1,3
Concentración real del llenante	0,33
Espesor promedio de película de asfalto (µm)	8,1
Gravedad específica máxima	2.593

Tabla 48. Granulometría mezcla asfáltica MAM-25 PAVIMENTAR S.A

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
1"	100%	100	100	100	100
3/4”	86,6%	80	95	83	91
1/2”	70,20%	65	80	66	74
3/8”	62,90%	55	70	59	67
No. 4	44,60%	40	55	41	49
No. 10	30,10%	24	38	27	33
No. 40	16,30%	10	20	13	19
No. 80	10,40%	8	12	8	13
No. 200	6,90%	6	9	6	8,9

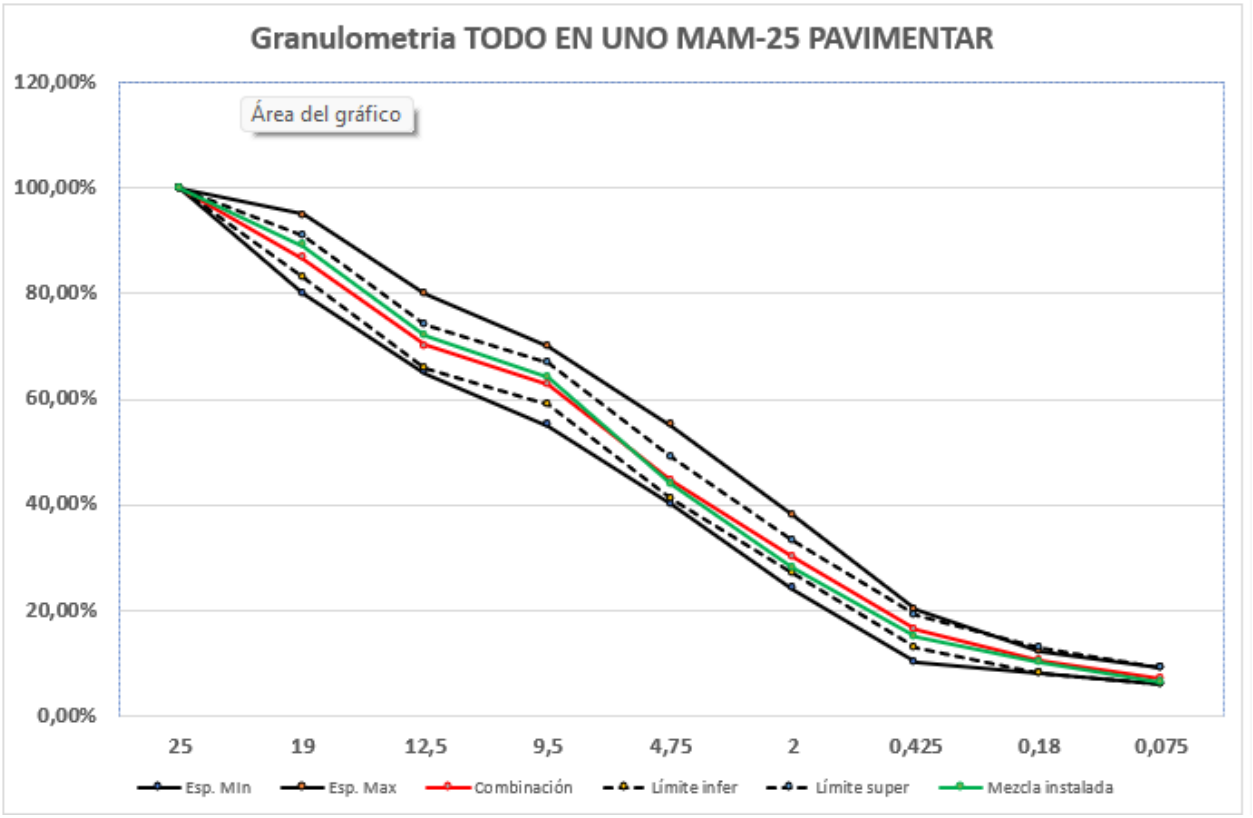


Ilustración 7 Curva granulométrica de diseño para mezcla MAM-25 PAVIMENTAR S.A

Tabla 49. Dosificación de materiales para gradación MAM -25 PAVIMENTAR S.A

Material	Triturado de 1"	Arena triturada	Arena procesada	Filler Planta Astec
Dosificación	45%	39%	13,2%	2,8%

- **SMA de la planta PAVIMENTAR S.A.**

Procedencia de los materiales:

- ✓ La planta de mezclas objeto del presente diseño posee cuatro subtipos de agregados: Triturado 1/2", Arena de trituración, Arena ultra fina de planta Copacabana (Antioquia) y carbonato de calcio (cal) como llenante mineral.
- ✓ Como ligante asfáltico se ha usado asfalto tipo III.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 50. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica SMA PAVIMENTAR S.A

Parámetro	Especificación Invias artículo 450-22
Contenido óptimo de asfalto (%)	6.3
Densidad (Kg/cm3)	2.488
Vacíos con aire (%)	3,8
Vacíos en los agregados (%)	17,3
Vacíos llenos con asfalto (%)	78,4
Gravedad específica máxima	2.581

Tabla 51. Granulometría mezcla asfáltica SMA PAVIMENTAR S.A

Tamiz	Combinación	Especificación		Tolerancias	
1/2”	100	100	100	100	100
3/8”	75	70	95	71	81
No. 4	36	30	50	32	40
No. 8	26	20	30	24	28
No. 200	9,1	8	12	8,1	10,1

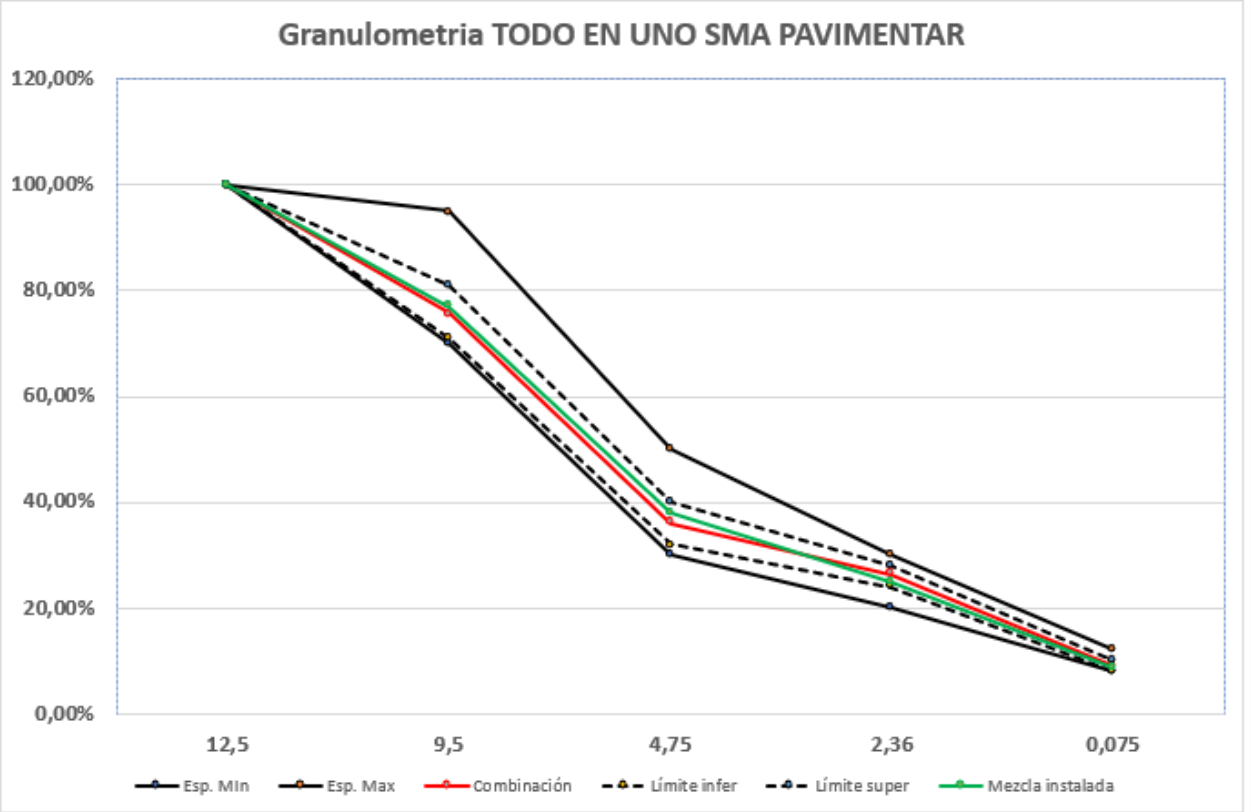


Ilustración 8 Curva granulométrica de diseño para mezcla SMA PAVIMENTAR S.A

Tabla 52. Dosificación de materiales para gradación SMA PAVIMENTAR S.A

Material	Triturado de 1/2"	Arena triturada	Arena ultra fina	Carbonato de cálcio (cal)
Dosificación	65%	20%	10%	5,0%

- **MDC-19 + RAP de la planta PROCOPAL S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Una vez revisado el diseño por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS, se requirió al contratista ajustar los diseños de acuerdo a las siguientes observaciones:

- ✓ En cuanto a los parámetros de diseño, el rango tomado para los vacíos con aire fue entre 3% y 5%, el Invías emitió fe de errata, donde este rango debe ser entre 4% y 6%, por lo tanto, en el diseño se debe realizar el ajuste en cuanto a este parámetro y determinar si afecta o no la obtención del contenido óptimo de asfalto de la mezcla.

- ✓ Para la verificación del diseño preliminar, la especificación del Invías en el numeral 450.4.2.2.2, estipula que se deben realizar los ensayos que se enuncian a continuación, estos ensayos no se presentan en los diseños de las mezclas: Resistencia a la deformación plástica (INV E-756-13); Módulo complejo (UNE-EN 12697-26 AnexoD) y Leyes de fatiga (INV E-808, INV E-784, UNE-EN 12697-24).

Las observaciones en mención fueron remitidas al contratista por medio de correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, respuesta a los comunicados CVM-011 -2025 y CVM-013-2025.

Procedencia de los materiales:

- ✓ Asfalto: Cemento asfáltico de penetración 60/70 normalizado, suministrado por MPI con aditivo reductor de temperatura (MT) y aditivo mejorador de adherencia.

- ✓ Materiales pétreos: Procopal, planta Girardota.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 53. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Parámetro	***Fórmula de trabajo***	***Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MDC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22***	
		Tránsito NT2	***Tránsito NT3***
Número de golpes por cara	***75***	*75*	*75*
Contenido óptimo de asfalto total (%CAME), %	***5.6%***		
Contenido de asfalto 60-70 MT a adicionar (%MBA), %	***4.85%***		
Contenido de asfalto que aporta el RAP (%MBR)	***0.75%***		
Gravedad específica bulk de la mezcla	***2.420***	-	-
Gravedad específica teórica máxima	***2.530***	-	-
Estabilidad Marshall	***11896 N***	*≥ 7500 N*	*≥ 9000 N*
Fluencia	***3.37 mm***	*2 mm-4 mm*	*2 mm-3.5 mm*
Vacíos con aire	***4.4%***	*3% - 5%*	*3% - 5%*
Vacíos en los agregados minerales	***15.8%***	*≥ 15%*	*≥ 15%*
Vacíos llenos con asfalto	***72.4%***	*65% - 78%*	*65% - 75%*

Parámetro	***Fórmula de trabajo***	***Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MDC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22***	
		Tránsito NT2	***Tránsito NT3***
Relación llenante/ligante efectivo	***1.19***	*0.8 a 1.2*	*0.8 a 1.2*
Relación estabilidad/flujo	***3.5 kN/mm***	*3 a 5 kN/mm*	*3 a 6 kN/mm*
Espesor promedio de película de asfalto	*8 μm*	*≥ 7.5 μm*	*≥ 7.5 μm*
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	***83%***	*≥ 80%*	*≥ 80%*

Tabla 54. Granulometría mezcla asfáltica MDC-19 + RAP PROCOPAL

Tamiz	**Combinación**	**Especificación**		**Tolerancias**	
3/4”	**100**	100	100	100	100
1/2”	**90**	80	95	86	94
3/8”	**77**	70	88	73	81
No. 4	**53**	49	65	49	57
No. 10	**33**	29	45	30	36
No. 40	**17**	14	25	14	20
No. 80	**11**	8	17	8	14
No. 200	**6,1**	4	8	4,1	8

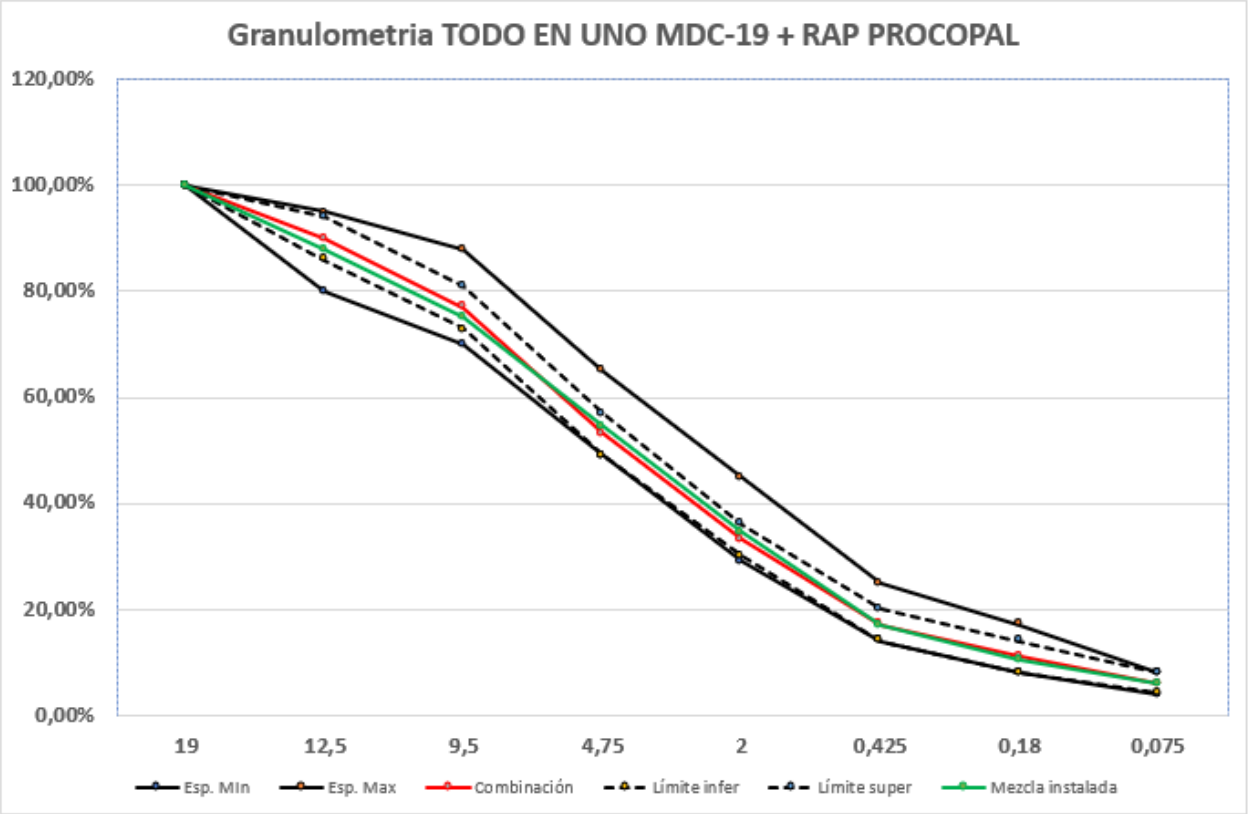


Ilustración 9 Curva granulométrica de diseño para mezcla MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Tabla 55. Dosificación de materiales para gradación MDC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Material	***Triturado ¾"***	***Arena mezclada***	***Material reciclado -RAP ¾"***
Proporciones	***32%***	***48%***	***20%***

- **MSC-19 + RAP de la planta PROCOPAL S.A.**

El diseño presentado cumple con los requerimientos del artículo 450-22 Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico), en cuanto a las propiedades de los agregados y el asfalto que hacen parte de la mezcla asfáltica.

Una vez revisado el diseño por la empresa INTEINSA PAVIMENTOS, se requirió al contratista ajustar los diseños de acuerdo a las siguientes observaciones:

- ✓ En cuanto a los parámetros de diseño, el rango tomado para los vacíos con aire fue entre 3% y 5%, el Invías emitió fe de errata, donde este rango debe ser entre 4% y 6%, por lo tanto, en el diseño se debe realizar el ajuste en cuanto a este parámetro y determinar si afecta o no la obtención del contenido óptimo de asfalto de la mezcla.

- ✓ Para la verificación del diseño preliminar, la especificación del Invías en el numeral 450.4.2.2.2, estipula que se deben realizar los ensayos que se enuncian a continuación, estos ensayos no se presentan en los diseños de las mezclas: Resistencia a la deformación plástica (INV E-756-13); Módulo complejo (UNE-EN 12697-26 Anexo D) y Leyes de fatiga (INV E-808, INV E-784, UNE-EN 12697-24)).

Las observaciones en mención fueron remitidas al contratista por medio de correo electrónico de fecha 29 de julio de 2025, respuesta a los comunicados CVM-011 -2025 y CVM-013-2025.

Procedencia de los materiales:

- ✓ Asfalto: Cemento asfáltico normalizado 60-70 aditivado M.T. (reductor de temperatura) + 0.8% M.A. (mejorador de adherencia), suministrado por MPI.

- ✓ Materiales pétreos: Procopal, planta Girardota.

La Fórmula de Trabajo queda definida por los siguientes parámetros:

Tabla 56. Fórmula de trabajo mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Parámetro	***Fórmula de trabajo***	***Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MSC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22***	
		Tránsito NT2	***Tránsito NT3***
Número de golpes por cara	***75***	*75*	*75*
Contenido óptimo de asfalto total (%CAME), %	***5.5%***		
Contenido de asfalto 60-70 MT a adicionar (%MBA), %	***4.74%***		
Contenido de asfalto que aporta el RAP (%MBR)	***0.76%***		
Gravedad específica bulk de la mezcla	***2.400***	-	-
Gravedad específica teórica máxima	***2.516***	-	-

Parámetro	***Fórmula de trabajo***	***Especificación INVÍAS Mezcla Tibia MSC-19 Rodadura - Art. 450-22/462-22***	
		Tránsito NT2	***Tránsito NT3***
Estabilidad Marshall	***11182 N***	*≥ 7500 N*	*≥ 9000 N*
Fluencia	***3.38 mm***	*2 mm-4 mm*	*2 mm-3.5 mm*
Vacíos con aire	***4.6%***	*3% - 5%*	*3% - 5%*
Vacíos en los agregados minerales	***16.7%***	*≥ 15%*	*≥ 15%*
Vacíos llenos con asfalto	***72.3%***	*65% - 78%*	*65% - 75%*
Relación llenante/ligante efectivo	***1.06***	*0.8 a 1.2*	*0.8 a 1.2*
Relación estabilidad/flujo	***3.3 kN/mm***	*3 a 5 kN/mm*	*3 a 6 kN/mm*
Espesor promedio de película de asfalto	*9 μm*	*≥ 7.5 μm*	*≥ 7.5 μm*
Adherencia, resistencia retenida en tracción indirecta	***86%***	*≥ 80%*	*≥ 80%*

Tabla 57. Granulometría mezcla asfáltica MSC-19 + RAP PROCOPAL

Tamiz	**Combinación**	**Especificación**		**Tolerancias**	
3/4”	**100**	100	100	100	100
1/2”	**88**	80	95	84	92
3/8”	**71**	65	80	67	75
No. 4	**45**	40	55	41	49
No. 10	**29**	24	38	26	32
No. 40	**15**	9	20	12	18
No. 80	**10**	6	12	7	12
No. 200	**5,5**	3	7	3,5	7

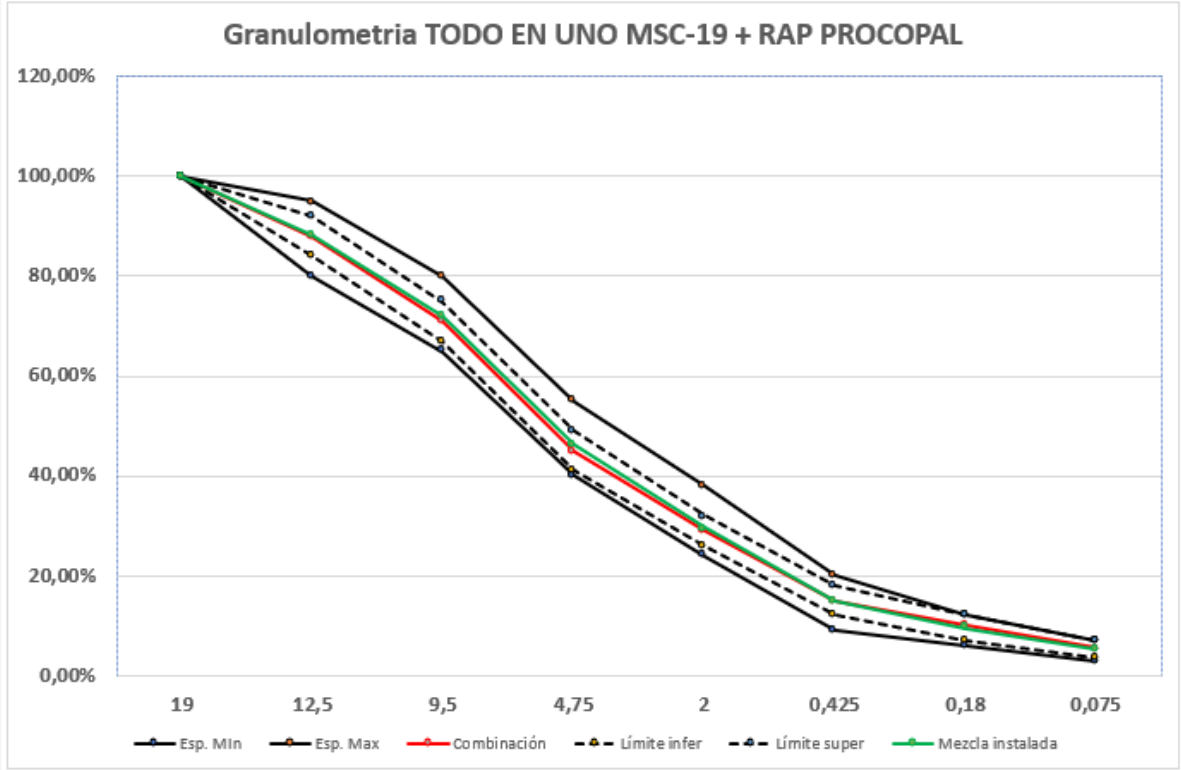


Ilustración 10 Curva granulométrica de diseño para mezcla MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Tabla 58. Dosificación de materiales para gradación MSC-19 + RAP PROCOPAL S.A

Material	Triturado de 3/4"	Arena triturada	Arena procesada	Material fresado
Dosificación	30%	30%	15%	25%

Para la ejecución del contrato en las actividades relacionadas con pavimentación, la Secretaría de Infraestructura Física cuenta con varias alternativas de diseño, para tramos y corredores de vías que requieren rehabilitación de la estructura. Estas alternativas fueron elaboradas por la firma Inteinsa Pavimentos y son relacionadas a continuación:

- ✓ Rediseño de la rehabilitación de la intersección de la calle 50 “Av Colombia” con la carrera 52 “Carabobo” Medellín, Antioquia.
- ✓ Estudio y diseño de alternativas de rehabilitación del corredor Avenida Poblado entre calle 10 y calle 7 sur Medellín, Antioquia.
- ✓ Estudio y diseño de alternativas de rehabilitación de la calle 10A entre carreras 36 y 43D.
- ✓ Estudio y diseño de alternativas de rehabilitación de la avenida regional entre puente guayaquil y avenida 33 Medellín, Antioquia.

3. INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA:

A continuación relacionamos las actividades ejecutadas por parte de la Interventoría en cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, supervisando todo lo concerniente al cumplimiento de la Normatividad Ambiental vigente en el país , el cumplimiento del PASAO en aspectos ambientales , sociales y SST; en el periodo ejecutado se pudo verificar que no se han ocasionado impactos ambientales de mayor relevancia sobre el medio ambiente, los recursos naturales y la comunidad del área de influencia del proyecto.

3.1 INFORME SOCIAL:

Actividades de la Interventoría relacionadas con la verificación, monitoreo y seguimiento de la ejecución del componente social, en el contrato de ejecución de obra pública.

Para la entrega de informes por parte del equipo social del contratista, se acordó que se hará el corte al 25 de cada mes, con el fin de dar cumplimiento en la entrega del informe a interventoría.

3.1.1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA VERIFICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL, EN EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Desde el componente social de la interventoría se realiza el seguimiento y la verificación del cumplimiento del Plan de Acción Socio Ambiental, propuesto por el contratista de obra, el Consorcio VIALMED 2025, este plan de acción constituye un instrumento básico para la gestión social que debe cumplirse durante las actividades constructivas de la "**REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA"** evitándose de esta forma, alteraciones ambientales, sociales y laborales en el marco del proyecto.

Seguimiento al plan de gestión social en obra: Periodo reportado del 1 al 31 de octubre del 2025

En el documento "PASAO" se plasmaron las diferentes estrategias y actividades sociales que se desarrollan durante la ejecución del proyecto Malla Vial en los diferentes programas, los cuales se relacionan a continuación.

Seguimiento etapa previa al inicio de obra: Acompañamiento y verificación del levantamiento de actas de vecindad y entorno.

Actas de Vecindad:

El propósito fundamental de la elaboración de las actas de vecindad es tener un soporte fotográfico y escrito del estado como están las viviendas, propiedades aledañas a la zona a intervenir; donde se describe detalladamente el estado general de las viviendas (piso, techo, grietas, fisuras, entre otros). Con esta actividad se busca garantizar el bienestar de la comunidad,

sus inmuebles y su entorno; además de evitar futuras reclamaciones que no tengan que ver con los trabajos ejecutados.

Para el presente informe el contratista, CONSORCIO VIALMED2025 no realizó el levantamiento de actas de vecindad, ya que las obras no requirieron de esta actividad. El día **8 de octubre** el contratista remitió a través del oficio (CVM-067-2025) las actas levantadas de inicio de obras durante la ejecución del proyecto para la revisión y aprobación de firma por parte de la interventoría.

Tabla 59. Consolidado de Actas de Vecindad.

CONSOLIDADO DE ACTAS DE VECINDAD SEPTIEMBRE			
Ubicación (dirección del frente)	**Frente**	**Cantidad**	**Fecha de levantamiento**
TOTAL	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Actas de Entorno:

El propósito fundamental de la elaboración de las actas de entorno es tener un soporte tanto fotográfico como escrito, del estado inicial de los espacios que se van a intervenir o se encuentran en el área de influencia del proyecto. Se describen detalladamente los accesos a predios, el estado del pavimento, las zonas verdes, y el estado en general de la zona.

Para el presente informe el contratista, CONSORCIO VIALMED2025 no realizó el levantamiento de actas de entorno, de acuerdo con el área técnica de la obra, no se requirió de esta actividad. El día **8 de octubre** el contratista remitió a través del oficio (CVM-067-2025) las actas levantadas de inicio de obras durante la ejecución del proyecto para la revisión y aprobación de firma por parte de la interventoría.

Tabla 60. Consolidado Actas de Entorno.

CONSOLIDADO DE ACTAS DE ENTORNO			
Corregimiento/dirección	**Frente**	**Fecha de realización**	**Observación general de lo encontrado**
TOTAL	**N/A**		

Programa de Información y Comunicación a la Comunidad:

Con este programa se buscar establecer una comunicación directa y efectiva con la comunidad, promoviendo su participación activa en el desarrollo de las actividades en la zona de intervención. Para ello, se implementarán diferentes piezas comunicativas como volantes, circulares de obra, vallas informativas, afiches, pasa calles y entre otros elementos que permitan divulgar e informar oportunamente las acciones del proyecto.

Las piezas comunicacionales son revisada y ajustada por interventoría y enviadas al área de comunicaciones de la secretaría de infraestructura física del Distrito de Medellín para su revisión y aprobación.

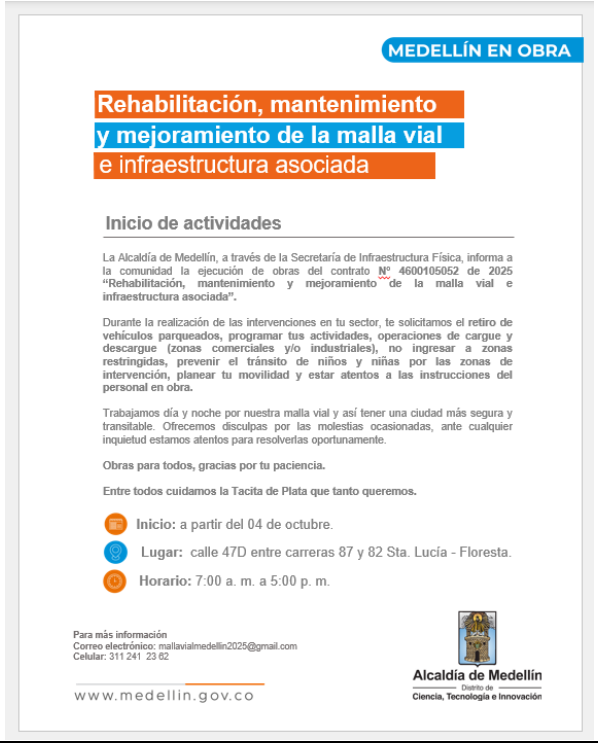
Para el presente informe el equipo social del contratista realizó la entrega de 31 Circulares informativas divulgadas en 21 frentes de obra, en cada frente se entregaron alrededor 100 circulares, 100 afiches, implementados en 13 frentes de obra, 3 pasacalles y 80 Volantes, implementados en 8 frentes de obra, se enviaron 22 E Card a diferentes grupos de chats de líderes y JAC de los diferentes frentes de obra para difundir las actividades e inicios de obra.

A continuación, se reporta las piezas entregadas.

Piezas Comunicacionales generadas en este periodo.

Tabla 61. Relación de circulares:

No	Ubicación-Dirección	Fecha entrega	Imagen de la pieza
1	Villatina 1 Calle 13 entre 52 y 53 + vehículos	Entrega 01 octubre Frente #17	 

2	Villatina #2 Carrera 53 entre calles 13 y 15	Entrega 02 octubre Frente #17	
3	Santa Lucía – Floresta Calle 47D entre 87 y 82	Entrega 03 octubre Frente #21	

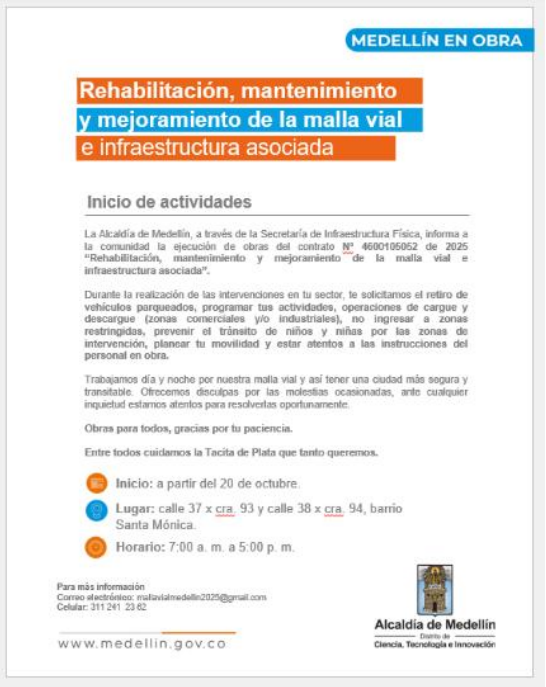
4	Moscú #1 Calle 99 entre 46B y 47B + vehículos	Entrega 06 octubre Frente #13	 

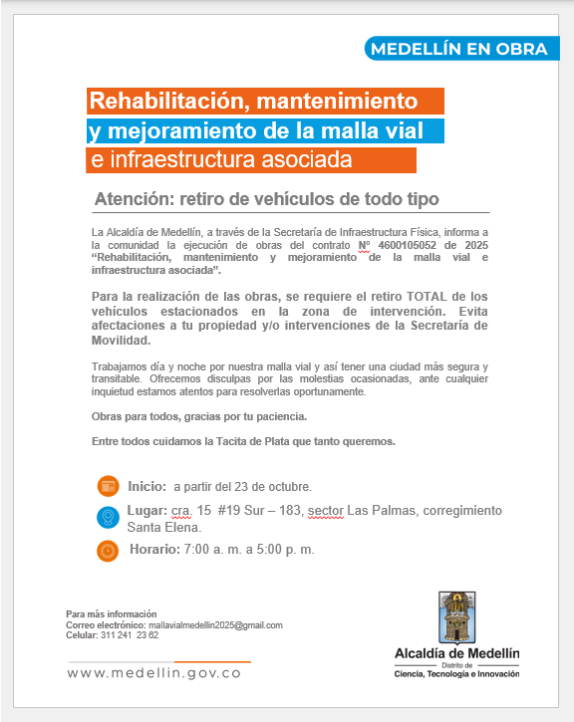
5	San Cristóbal Carrera 129A entre calles 63 y 64 + vehículos	Entrega 07 octubre	 

6	Av. El Poblado Cra. 43 A entre calles 44 Sur y 7 Sur sector Oviedo	Entregada 08 octubre	
7	Santo Domingo Carrera 28 entre calles 107 y 107FD + vehículos	Entrega 09 octubre	

8	Moscú # 1 carrera 47 x calle 99, Moscú #1 + vehículos	Entrega 10 octubre Frente #13	 

9	El Poblado Av. El Poblado cra. 43A entre calles 7 y 10 y calle 10 y 9.	Entrega 10 octubre Frente #15	
10	Guayabal Avenida Guayabal Cra. 52 calle 10 entre inicio del puente y la glorieta	Entrega 10 octubre	

11	Santa Mónica calle 37 x cra. 93 y calle 38 x cra. 94	Entrega 17 octubre Frente #21	 

12	La Ladera Calle 59A x 31A	Entrega 17 octubre Frente #13	
13	Santa Elena cra. 15 #19 Sur – 183 Sector Las Palmas	Entrega 22 octubre Frente #17	

14	La Mansión cra. 43 x calles 63A y 65	Entrega 22 octubre Frente #21	 
15	Robledo Diamante Calle 80 x86A-88	Entrega Octubre 27 Frente #21	

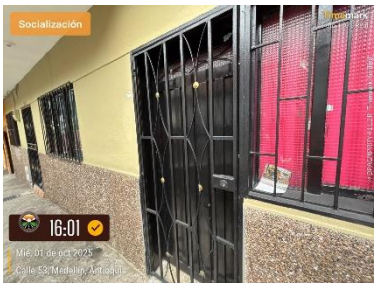
16	Tranvía Ayacucho Carrera 40 entre 48 y 49A	Entrega 28 octubre	 
17	La Riviere Ciudad del Río	Entregada 28 octubre	



18	Los Balsos I Carrera 16 x calle 12 Sur	Entregada 29 octubre	
19	Villa Sofía carrera 92 x calles 90 y 92	Entregada 30 octubre	 

20	El Poblado Calle 9 entre 43A y 43B	Entrega 31 octubre	


Ver anexo 3.1.1 Programa comunicación e información a la comunidad Circulares.


Tabla 62. Relación de volantes:

1	Villatina Carrera 13 x calle 52	Entrega 01 octubre 50 volantes	 

2	Moscú	Entrega 10 octubre 70 volantes	 
3	Palmas + Los Balsos Santa Elena	Entrega 22 octubre 11 afiches 40 volantes	 

4	La Mansión	Entrega 22 octubre 50 volantes	
5	Robledo Diamante Calle 80 entre 86A y 88	Entrega 27 octubre 200	

6	Ayacucho Tranvía	Entrega 28 octubre 150	  
7	Provenza En articulación con la agencia APP de la Alcaldía	Entrega 29 octubre 80 volantes	

8	Villa Sofía Carrera 92 x calles 90-92	Entrega 30 octubre 50 volantes	  

Observación: Durante este periodo la pieza volante de obra se entregó en la mayor parte de acciones de socialización conjuntamente con la circular ya que el mensaje del mismo es promocional del proyecto en su totalidad. En determinados lugares como supermercados, farmacias, puntos de venta de la marca Gana, se solicita el permiso para dejar una cantidad de 20 volantes (en ocasiones un poco más) para que los ciudadanos los tomen espontáneamente. Durante octubre se entregaron un total de 590 volantes. Para el periodo siguiente se propone unir el volante en cada circular para facilitar a los profesionales la entrega a los ciudadanos.

Ver anexo 3.1.2 Programa comunicación e información a la comunidad/Volantes.

Valla Tijera de obra:

Pieza de comunicación externa de 1x1mt doble cara que contiene los elementos básicos del contrato: descripción y correo electrónico. El contratista garantiza que la pieza permanezca instalada en los frentes de trabajo que están activos.

Durante el periodo de octubre se realizó la reposición de las tijeras de obra que se deterioraron durante los primeros meses de obras. Para el cierre de este mes el balance es de 42 tijeras de obra implementadas así. En frentes: 21. En Bodega nuevas: 05. En Bodega dañadas 14. En frentes cesantes: 2. (Informe en carpeta anexos).

A Continuación, se registra las vallas tijeras en cada uno de los frentes de obra.

Tabla 63. Relación de valla tijeras:

Frente#1	Reposición	
Frente #3	Reposición	

Frente #7	Reposición	 
Frente #9	Reposición	 

Ver anexo: 3.1.3 Programa comunicación e información a la comunidad/Valla Tijeras.

E-Card:

Durante el periodo de **octubre del 2025** se compartió la E-Card como complemento a las acciones presenciales, con énfasis en Juntas Administradoras Locales -JAL, Juntas de Acción Comunal – JAC y empresas de transporte público: directores operativos, jefes de ruta y/o gerencias. En esta estrategia, realizamos un total de 16 grupos socializaciones digitales.


Hablamos de grupos porque en casos especiales como la intervención en el barrio Enciso, hemos debido usar la E-Card en varias ocasiones por la necesidad de advertir de cierres viales totales en el momento de los vaciados de concreto que así lo han exigido.

Cabe anotar que en esta estrategia digital se incluyen tanto los envíos por WhatsApp como por correo electrónico.

La totalidad de los destinatarios y las evidencias se consignan en las carpetas (anexos).

Tabla 64. Relación de e-card:

1	Villatina	Entrega 1 octubre	
2	San Cristóbal El Llano carrera 129A entre calles 63 y 64	Entrega 07 octubre	
3	San Cristóbal El Llano carrera 129A entre calles 63 y 64 Suspensión obra	Entrega 08 octubre	

4	El Poblado Av. El Poblado entre calles 6 Sur y 9 Sur Sector Oviedo	Entrega 08 octubre	
5	Av. Guayabal Cra 52 x calle 10 cerca al puente	Entrega 08 octubre	
6	Santo Domingo	Entrega 09 octubre	

7	Enciso Los Mangos Vaciados de concreto 2 y 3	Entrega 14 octubre	
8	Juan XXIII Cale 48 DD x 99B		
9	San José de la Cima II Calle 92C x 32	Entrega 17 octubre	

10	Enciso Los Mangos Vaciado #4 (luego fue cancelado)	Entrega 17 octubre	

11	Santa Mónica Carrera 94 x 37 y 38	Entrega 20 octubre	
12	La Honda Entre la Terminal de Buses y la UVA Los Sueños	Entrega 21 octubre	

13	Enciso Los Mangos	Entrega 21 octubre	
14	Enciso Los Mangos	Entrega Octubre 27	
15	La Ladera	Entrega Octubre 27	

16	El Pacífico	Entrega	
17	Ayacucho – Tranvía Carrera 40 entre 48 y 49A	Entrega 28 octubre	
18	Palmas – Santa Elena Edificio Bellagio Unidad Nueva Zelanda	Entrega 29 octubre	

19	Enciso Los Mangos	Entregas 30 octubre	
20	Ayacucho Tranvía Retraso	Entrega 30 octubre	
21	Santa María de Los Ángeles Calle 17 Sur x 43A Av. El Poblado	Entrega 30 octubre	

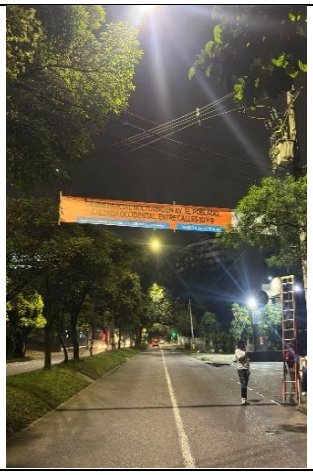
22	Villa Sofía Carrera 92 entre calles 90 y 92	Entregada 31 octubre	

Ver anexo 3.1.4 Programa comunicación e información a la comunidad/E Card

Pasacalles:

Durante este periodo se realizó la instalación de 3 pasacalles para informar sobre las actividades de obra.

Tabla 65. Relación de pasacalles:

		
Pasacalle Avenida El Poblado entre calles 7D y 10, calzada oriental.	Pasacalle Avenida El Poblado, calzada occidental entre calles 10 y 9.	Pasacalle Avenida El Poblado calzada occidental entre calles 6 sur y 9 sur.


Ver anexo 3.1.5 Programa comunicación e información a la comunidad/Pasacalles.

Afiche: Durante el periodo de **octubre de 2025** se instaló el afiche en el mayor número de lugares posible. En el total, se implementaron 110 afiches adicionales a los que se pegaron en septiembre (60) para un total de 170 hasta el cierre de este periodo.

Adicionalmente se realizó gestión con la ventanilla virtual del Metro de Medellín para intentar la instalación de afiches en las carteleras de las estaciones de la jurisdicción de Medellín. Al cierre del informe se espera la respuesta de la entidad.

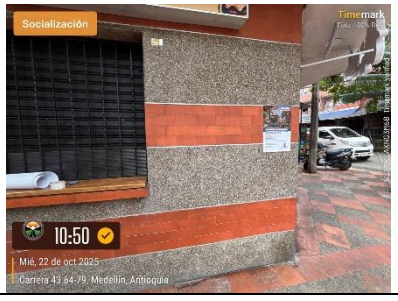
Tabla 66. Relación de afiches:

1	Villatina Carrera 53 entre calles 15 y 13	Entrega 02 octubre 8 afiches	 

2	Moscú #1 Calle 99 entre 46B y 47B + vehículos	Entrega 07 octubre 7 afiches	 
3	El Poblado Sector Oviedo	Entrega 08 octubre En C.C. Oviedo se entregan a Dirección Operativa, un total de 15 afiches para disposición en carteleras	

4	Santo Domingo Calle 107	Entrega 09 octubre 10 afiches	 
5	Moscú #1 99x48A	Entrega 10 octubre 7 afiches	 

6	San José de la Cima II Calle 92C x 32	Entrega 17 octubre 9 afiches	 
7	La Ladera No se realiza, pero se entregan los afiches para divulgación del proyecto La semana del 27 de octubre se reinicia la intervención.	Entrega 17 octubre 8 afiches	 
8	Santa Mónica 94 x 37	Entrega 17 octubre Se entregan 3 afiches para carteleras	

9	Palmas + Los Balsos Santa Elena	Entrega 22 octubre 11 afiches Dos unidades 7 y 5 afiches para pegar en carteleras	 
10	La Mansión	Entrega 22 de octubre 5 afiches	 

11	Robledo Diamante Calle 80 entre 86A y 88	Entrega 27 octubre 11 afiches	 
12	Ayacucho - Tranvía	Entrega 28 octubre 9 afiches	 

13	Provenza	Entrega 29 octubre 7 afiches	 

Ver anexo 3.1.6 Programa comunicación e información a la comunidad/Afiches

Carteleras y Buzón: De acuerdo a la dinámica del proyecto se acordó en comité social, que estas dos piezas se instalaran en los frentes de obra de rango 3 en adelante que tengan una duración de más de dos semanas.

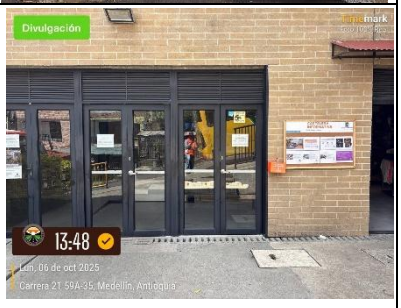
Durante el presente periodo de **octubre 2025**, se instalaron carteleras informativas y buzón en los respectivos frentes que, por su duración en el tiempo se acordó con interventoría su gestión. Se reporta la pérdida de la cartelera de Unicentro (pompeyanos) y la destrucción del buzón.

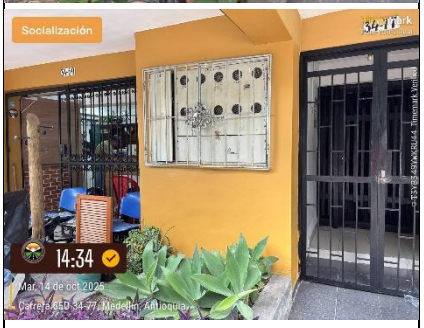
Al cierre de este informe están activas las carteleras de Enciso-Llanaditas, Avenida El Poblado y Ayacucho.

En cuanto a los buzones, hasta el momento no se recibió ninguna PQRSD en los buzones retirados en el periodo o los activos.

La interventoría continua con el seguimiento a la instalación de estas piezas en los frentes de obras que se requiera. A continuación, registro de la instalación de las carteleras y buzón de sugerencias en los frentes de obras mencionados anteriormente.

Tabla 67. Relación de Carteleras y Buzón:

1	Bello Oriente	Instalación Cartelera + buzón 03 octubre Retiro Lunes 20 de octubre Buzón Buen estado Cartelera deteriorada por intemperie	 
2	Enciso Los Mangos	Reinstalación 06 octubre	

3	Unicentro Pompeyanos	Retiro 14 octubre Cartelera hurtada Buzón destruido	 
4	Santa Lucía – Floresta Calle 47D x 82	Retiro 27 octubre	 

5	Ayacucho – Tranvía Carrera 40 x calles 48 y 49A	Instalación Cartelera + buzón 24 octubre	

Ver anexo 3.1.7 Programa comunicación e información a la comunidad/cartelera informativa y buzón

Subprograma de resolución de conflictos:

PQRS:

Esta estrategia es un subprograma enmarcado en el programa de comunicación e información, se relaciona con la instalación del buzón de sugerencias y la oficina de atención a la comunidad. Además, el contratista dispuso una línea telefónica (3112412362) y un correo electrónico mallavialmedellin2025@gmail.com, a través de los cuales se canalizarán las peticiones, quejas, reclamos o sugerencias (PQRS) y demás situaciones con la comunidad que requieran atención directa por parte del proyecto.

Para la recepción de PQRS, el contratista dispone de los formatos establecidos por la entidad contratante y se contemplan los plazos establecidos para cada una de las situaciones que se presenten.

En el mes de **octubre 2025** se realizó atención de seis (6) quejas a través de la línea telefónica y correo Electrónico, la cual se relaciona a continuación:

La interventoría continúa con el seguimiento a las PQRS reportadas por el contratista, para este mes de octubre del 2025, el contratista realizó la atención y el cierre de 1 PQRS, las cuales se relaciona a continuación:

Luz Marina Naranjo- Cierre: El 01 de octubre 2025 se recibe llamada de la señora en mención la cual manifiesta que por trabajos en la vía. se ha visto afectada por las lluvias (inundaciones), debido que se subió el nivel de la vía, se realiza visita por parte del componente social y se le informa a señora Marina que se realizara bordillo para darle solución a su solicitud, se cierra PQRS a satisfacción.

Marleny Roldan-Atención: El día jueves 9 de octubre 2025 se recibe llamada de la señora en mención la cual solicita la reposición de la puerta vidriera la cual fue afectada por un cuesco de la materia retirada de la vía, el día 21 de octubre se realizó contacto telefónico con la usuaria a quien se le informa que ya de le abordonó $400.000 mil pesos a proveedor quien será el encargado de reponerle el vidrio.

Sebastián Villegas Atención: El jueves 16 de octubre 2025, el señor en mención se contacta telefónicamente al número asignado a la comunidad del área social para hacer una reclamación, el manifiesta que tenía su vehículo parqueado donde se realizan trabajos constructivos en la vía. Cuando uno de los colaboradores paso muy cerca del vehículo con un coche lleno de escombro y raya dicho vehículo, por parte de componente social se le solicita realizar tres cotizaciones y hacerlas llega al consorcio, el usuario en mención realiza las tres cotizaciones las cuales son pasadas a la gerencia para el respectivo estudio.

Piedad Castro-Atención: 21 de octubre 2025, se recibe un derecho de petición a través del correo electrónico enviado por la interventoría donde la señora Piedad castros ex colaboradora del consorcio solicita revisar su liquidación, debido que no está de acuerdo con la pagado, desde el componente social se remite al área de talento humano para gestionar respuesta.

.

Antonio Blanco-Atención: 22 de octubre 2025 se recibe un correo electrónico por parte del señor en mención, el cual realiza reclamo por daño de vehículo, el señor Antonio manifiesta que en San Antonio de Prado estaban realizado trabajos de mejoramiento en la vía y que no detuvieron el tráfico vehicular, por tal motivo, el pasa con su vehículo es cual se es golpeado con el rodillo manual, desde el componente social se realiza comunicación telefónica con dicho usuario y se le solicita para cotización por el daño causado el cual es remitido a la gerencia para su respectivo estudio.

Claudia Collazo-Atención: el 27 de octubre 2025 se recibe un derecho de petición a través de la interventoría, por porte de la señora en mención el cual solicita sea pagada su liquidación lo más pronto posible debido que hace más de un mes que renuncio al consorcio Vialmed 2025 y a la fecha no ha recibido su liquidación.

Tabla 68. Relación de PQRS:

N.º	Ciudadano	Teléfono	Fecha de recibido	Asunto	tipo de atención	estado
1	Marina Naranjo	3125471987	01/10/2025	Ingreso de aguas lluvias a su vivienda	Solicitud	Cerrada
2	Marleny Roldan	3210574881	09/10/2025	Daño vidriera	Reclamo	En Proceso
3	Sebastián Villegas	3502819593	16/10/2025	Daño de vehículo	Reclamo	En Proceso
4	Piedad Castro	3004099218	21/10/2025	Solicitud revisión de liquidación	Derecho de Petición	En Proceso
5	Antonio Blanco	3507633128	22/10/2025	Daño de vehículo con el rodillo	Reclamo	En Proceso
6	Claudia Collazos	3225901232	27/10/2025	Solicitud de pago de liquidación	Solicitud	En proceso

Tabla 69. Indicador de PQRS

Indicador	
Estado	Atención de PQRSD
En proceso	Nro. Total de Atenciones Brindadas 14 = 43 % Nro. Total de Atenciones Recibidas 6

Ver anexo 3.1.8 Programa comunicación e información a la comunidad/PQRS

Programa participación comunitaria: Este programa tiene el objetivo de garantizar que la comunidad tenga posibilidades de participación, mediante acciones de información, consulta, concertación y cogestión permanentes durante el desarrollo de la obra. (Tomado de: Guía Socio Ambiental).

Reunión de Inicio de Obra: Debido a la dinámica del proyecto, se concertó al inicio del contrato, en comité social, que no se realizarían reuniones de inicio, teniendo en cuenta que cada frente de obra tendría una duración máxima de un mes. Sin embargo, se definió implementar la estrategia de socialización puerta a puerta en los frentes de rango 3 den adelante o según la necesidad particular de cada frente de obra. Dicha actividad se acompaña de la entrega de una circular informativa de inicio de obra, con la cual se suplen las reuniones de inicio, garantizando así la socialización y divulgación oportuna de la información aledaña.

Socializaciones: El contratista para este mes ha realizado 18 socializaciones puertas a puertas, 2 socializaciones de PMT y diferentes visitas y acompañamiento a los frentes de obra. A continuación, se reporta las acciones realizadas por el contratista con la comunidad y en compañía de la interventoría.

A continuación, se reporta las acciones realizadas por el contratista con la comunidad y en compañía de la interventoría.

Tabla 70. Consolidado de socializaciones durante el mes:

No.	Ubicación	Actividad	Fecha	No. Asistentes	Desarrollo
1	Villatina	Socialización Inicio de Obra	02/10/2025	31	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
2	Santa Lucia	Socialización Inicio de Obra	03/10/2025	40	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
3	Moscú	Socialización Inicio de Obra	06/10/2025	30	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
4	San Cristóbal	Socialización Inicio de Obra	07/10/2025	30	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
5	Poblado	Socialización Inicio de Obra: 4 Sur	08/10/2025	30	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
6	San Domingo	Socialización Inicio de Obra	09/10/2025	42	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
7	Guayabal	Socialización Inicio de obra	10/10/2025	15	Entrega de Circular -Puerta a Puerta
8	Juan XXIII	Socialización Inicio de Obra	15/10/2025	35	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
9	San Jose La cima	Socialización Inicio de Obra	17/10/2025	30	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
10	Santa Mónica	Socialización Inicio de Obra	17/102025	15	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
11	Los balsos	Socialización Inicio de Obra	22/10/2025	10	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
12	La Mansión	Socialización Inicio de Obra	22/10/2025	30	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
13	Robledo el Diamante	Socialización Inicio de Obra	27/10/2025	47	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
14	Ayacucho Tranvía	Socialización Inicio de Obra	28/10/2025	30	Entrega de Circular-Puerta a Puerta
15	Los balsos	Socialización inicio de obra	29/10/2025	10	Entrega de Circular
16	Villa Sofía	Socialización inicio de obra	30/10/2025	40	Entrega de Circular- Puerta a Puerta

No.	Ubicación	Actividad	Fecha	No. Asistentes	Desarrollo
17	13 de noviembre	Socialización inicio de obra	20/10/2025	2	Entrega de Circular
18	Poblado-parque	Socialización inicio de obra	31/10/2025	10	Entrega de Circular- Puerta a Puerta

Ver anexo 3.1.9 Participación comunitaria: socializaciones.

Reuniones con líderes: Durante el periodo correspondiente a este informa se realizaron algunas reuniones con líderes de diferentes sectores a intervenir, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 71. Consolidado de reuniones durante el mes.

No.	Ubicación	Asunto	Fecha	No. Asistentes	Compromisos
1	Enciso	Socialización a los lideres el reinicio de actividades constructivas en el sector	06/10/2025	20	Instalar pare siga el día 7 de octubre. Mantener constante comunicación con líderes y trasportadoras.
2	Santo Domingo	Socialización transportadoras inicio de obras	10/10/2025	6	Realizar mesa de trabajo con Movilidad en invitar transportadores
3	La Honda	Socialización transportadoras intervención en Versalles, La Honda y la Cruz	20/10/2025	6	Iniciar trabajos en la Honda y avisar al coordinador de transporte con tiempo.
4	Administrador centro comercial tranvía	Socialización Inicio de Obra y acceso al parqueadero	29/10/2025	8	Trabajar a un solo carril Tener constante comunicación la administración del centro comercial. Remitir el acta de reunión.
5	Centro comercial Villanueva	Socializar sobre el inicio de las actividades de obra en el barrio Santo Domingo Savio y revisar actividades de PMT para afectar lo menos posible a la comunidad	31/10/2025	9	Realizar mesa de trabajo con movilidad. Después que se tenga el MPT realizar una buena divulgación con líderes y comunidad El horario de trabajo 9:00 am a 4:00 pm

Ver anexo 3.1.1.10. Participación comunitaria: Reuniones

Comité Ciudadano de Obra: Para el presente proyecto no se realizarán comités ciudadanos de obra (CCO), debido a que los frentes de obra tienen una duración máxima de un mes. Por lo anterior y de común acuerdo entre el quipo social del contratista, la interventoría y la SIF, se decidió no implementar esta actividad.

No obstante, se mantendrá una comunicación permanente con la comunidad aledaña, mediante la implementación de diferentes piezas comunicacionales, tales como circulares, volante y afiches, con el fin de informar oportunamente sobre las actividades que se desarrollan en el marco proyecto.

Tabla 72. Relación de CCO

Comuna	Fecha	Hora	Lugar	Tema	Asistentes
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Programa de la Contratación de Mano de Obra Local

El programa busca la inserción de mano de obra de la zona de influencia directa del proyecto en las obras con el objetivo de promover el desarrollo local y la apropiación del proyecto.

Generación de empleo: Para la fecha el contratista ha contrato 475 personas, de las cuales 527 siguen activas en el proyecto. Distribuido de la siguiente manera, 252 son personal operativo,229 conductores (operadores) y 44 son personal administrativo. Para la fecha se tiene una contratación de 42 mujeres, además se cuenta con una contratación de 478 personas de la zona de influencia del proyecto.

A continuación, la evidencia del reporte de la contratación del personal hasta la fecha.

Tabla 73. Consolidado Personal Vinculado Mano de Obra:

Total, de personal vinculado por Mano de Obra Calificada y No Calificada Activa.		Total, de personal vinculado por género	
Mano de Obra Calificada	275	Mujeres	42
Mano de Obra No Calificada	252	Hombres	485
Empleos generados en el área de influencia	478	TOTAL	527
Total, Personal Vinculado Activo	527		

Ver anexo 3.1.11 Programa de la Contratación de Mano de Obra: Consolidado Empleabilidad.

Programa de Formación y Capacitación:

En este programa se garantiza que el personal de obra y la comunidad reciban capacitaciones en temas sociales, ambientales, y SST.

El contratista de acuerdo a la necesidad de cada frente de obra, capacita al personal en los siguientes temas sociales:

- Relaciones con la comunidad
- Riesgo público
- Manejo de hallazgos arqueológicos
- Manejo de conflictos
- Recepción de quejas y reclamos
- Protocolo para atención de emergencias
- Mecanismos de participación ciudadana.
- Relaciones Interpersonales

Durante este mes se realizaron 7 capacitaciones al personal de obra en diferentes cuadrillas, las cuales se relacionan a continuación.

Tabla 74. Consolidado de inducciones y capacitaciones al personal:

Capacitaciones e Inducciones				
Fecha	**Frente de Obra**	**Tema**	**No. Asistentes**	**Observaciones**
20/10/2025	No. 2	Comunicación asertiva	5	Capacitación
29/10/2025	No.5	Comunicación asertiva	9	Capacitación
29/10/2025	No. 9	Comunicación asertiva	21	Capacitación
29/10/2025	No. 11	Comunicación asertiva	21	Capacitación
21/10/2025	No. 14	Comunicación asertiva	9	Capacitación
07/10/2025	No. 19	Comunicación asertiva	9	Capacitación
08/10/2025	No. 20	Comunicación asertiva	5	Capacitación
09/10/2025	No. 21	Comunicación asertiva	19	Capacitación
08/10/2025	No. 15	Comunicación asertiva	14	Capacitación
08/10/2025	No.16	Comunicación asertiva	20	Capacitación

Tabla 75. Indicador de cumplimiento capacitaciones:

Cumplimiento capacitaciones
Nro. Capacitaciones Programadas 7 = 100%
Nro. Capacitaciones Realizadas 7

Ver Anexo 3.1.12 Programa de Formación y Capacitación: consolidado empleabilidad.

Programa de Sostenibilidad y Calidad de la Obra:

Con el objetivo de fomentar la apropiación de las obras, de establecer canales comunicacionales, permitir el acercamiento a los grupos de interés y la creación de conciencia ciudadana respecto al cuidado y conservación de la infraestructura del espacio público, el contratista desarrollará capacitaciones a grupos poblacionales que participen activa y voluntariamente de los diferentes espacios de encuentro que se generen desde el área social del proyecto y se apersonen de las obras ejecutadas.

Durante el periodo correspondiente a este informe se realizaron dos actividades del programa de sostenibilidad en alianza con la empresa Emvarias en el barrio Belén las Violetas.

Tabla 76. Relación actividades de sostenibilidad de las obras:

No	Ubicación	Asunto	Fecha	No. Asistentes	Observaciones
1	Belén las violetas	Capacitación sobre Manejo de residuos sólidos. Dirigida a los habitantes del área de influencia del proyecto, donde se mejora una vía y se construyó un muro de contención.	23/10/2025	12	En la capacitación se presentó el tema de los residuos sólidos: Que son los residuos, cómo se clasifican y cómo deben separarse. El tema estuvo dirigido por dos gestoras ambientales de la empresa EMVARIAS de Medellín. Los asistentes se mostraron participativos e interesados en el tema.
2	Belén las violetas	Actividad de mejoramiento del paisajismo, a través de la siembre de un muro vivo.	25/10/2025	60	En esta actividad participó comunidad de la zona de influencia del proyecto: líderes del barrio, jóvenes, niños y adultos. La comunidad se mostró agradecida por recuperación del espacio, de la jardinera y se comprometieron a cuidar las especies sembradas.

Registro fotográfico de las actividades de Sostenibilidad:

	
Capacitación en Residuos Sólidos comunidad barrio Belén Las Violetas.	**Huellas de las manos en el muro de contención construido por el contratista.**

Ver anexo 3.1.1.13. Programa de Sostenibilidad y Calidad de las obras: Actividades de sostenibilidad.

Tabla 77. Cumplimiento de actividades del Programa de Sostenibilidad

Cumplimiento capacitaciones
Nro. Actividades Programadas 2 = 100% Nro. Actividades Realizadas 2

Actividades de la interventoría relacionadas con la ejecución del componente social, al interior del contrato.

Recorridos de seguimiento a la gestión social en la obra

En este periodo, la interventoría realizó recorridos con la profesional social por parte de la Alcaldía de Medellín, Margarita Mejía y recorridos propios por los diferentes frentes de obra, para revisar las actividades del componente social: como piezas comunicacionales, atención a la comunidad, socializaciones puerta a puerta, entre otras, como se describe a continuación:

Tabla 78. Recorridos Sociales realizados:

Asunto	Fechas	Cuadrilla	Receptores o Participantes	Registro fotográfico
Recorrido socioambiental	02/10/2025	2, 6 y 9	Profesional social y ambiental y profesional ambiental SIF	
Acompañamiento en campo.	7/10/2025	19 y 21	Profesional social interventoría.	
Recorrido frentes de obra	15/10/2025	5, 6 y 9	Profesionales sociales SIF e interventoría.	

Recorrido y verificación de piezas comunicacionales	16/10/2025	2, 8 y 21	Profesional interventoría.	
Recorrido frentes de obra	17/10/2025	6, 9 y 11	Profesional interventoría.	
Acompañamiento en obra	20/10/2025	14	Profesional interventoría.	
Recorrido frentes de obra				

	22/10/2025	3,7 y 13	Profesionales sociales SIF e interventoría.	
Recorrido frentes de obra	23/10/2025	6,14 y18	Profesional interventoría.	
Recorrido frentes de obra	30/10/2024	6,10 y 17	Profesional interventoría	

Reuniones con el contratista / supervisión.

En el periodo reportado, se realizó una reunión con el equipo social del contratista de obra y la profesional social de la SIF, Margarita Mejía. Reunión realizada el día 09 de octubre del 2025, reunión equipo social del contratista, interventoría y SIF.

Tabla 79. Consolidado de reuniones.

Fecha	Lugar	Tema	Participantes	Registro fotográfico
09/10/2025	Piso 9 Alcaldía de Medellín	Revisión de actividades ejecutadas y actividades por realizar.	Profesional social, Alcaldía de Medellín: Margarita Mejía- Interventoría: Luisa Restrepo Contratista: Víctor Vargas Rodríguez, Doriela Ospina Marulanda. Asney García.	

Anexos 3.1.14. Interventoria: Actas de reunión.

3.1.2. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL, AL INTERIOR DE SU CONTRATO

A continuación, se describen las actividades de la interventoría desde el componente social, para dar cumplimiento con lo estimado por la Guía de Manejo Socioambiental y demás normas vigentes.

Tabla 80. Actividades de la interventoría.

Programa	Descripción de la actividad	Relación del anexo
Información y comunicación a la comunidad.	En este mes se revisó y se envió a aprobación final de comunicaciones de la alcaldía la siguiente pieza comunicacional. Pasacalle. Circulares informativas.	Anexo 1. Programa de Información y comunicación a la comunidad/3 pasacalles
Subprograma de resolución de conflictos	La interventoría realizó el seguimiento a las PQRS recibidas en el contrato por las actividades de obra, se realizó alertas al contratista para realizar su respectivo cierre de acuerdo con los tiempos estipulados, establecidos en guía socioambiental.	Anexo 1. Programa de Información y comunicación a la comunidad/8 PQRS

	En el mes de septiembre se recibieron 6 PQRS y se realizó el cierre de 1 y se tienen dos en procesos de cierre, las cuales están sujetas a respuesta de EMP.	
Participación comunitaria	Se realizó el acompañamiento a las socializaciones puerta a puerta realizadas por el contratista. En total fueron 18 socializaciones puerta a puerta, con la entrega de circular informativa en diferentes frentes de obra. Igualmente se realizaron 5 reuniones con líderes de Juntas de Acción Comunal de las zonas de influencia del proyecto.	Anexo 2. Programa de Participación Comunitaria
Contratación de mano de obra local	Para este periodo se reportaron 478 personas de mano de obra local, representando el 84% del total del personal contratado. La interventoría realiza el seguimiento a este personal, garantizando que se cumpla con porcentaje solicitado por la Alcaldía de Medellín.	Anexo 3. Programa de la Contratación Mano de obra: Consolidado de Empleabilidad. Listado de personal contratado.
Capacitación y formación	Durante este periodo se realizó por parte del contratista 9 capacitaciones al personal de obra. La interventoría acompaño algunas de las capacitaciones, evidenciando su cumplimiento.	Anexo 4. Programa Formación Comunitaria
Sostenibilidad y calidad de la obra	Para la fecha el contratista realizó dos actividades de sostenibilidad: Capacitación en Residuos Sólidos y Sensibilización en el cuidado del paisajismo, en el barrio Belén Las Violetas.	Anexo 5. Programa de Sostenibilidad de las obras.

3.1.3. CONSOLIDADO DE LA GESTIÓN SOCIAL:

GESTION SOCIAL EN OBRA - APLICACIÓN GMSA																					
PERIODO DEL INFORME	CARTELERAS	BUZÓN	PIEZAS COMUNICACIONALES	REUNIÓN INICIO		REUNIÓN AVANCE		REUNIÓN FINAL		COMITÉ CIUDADANO DE OBRA – CCO		RECORRIDOS CON COMUNIDAD		PQRS ATENDIDAS	PQRS X ATENDER	CONTRATACIÓN DE M.O.	CONTRATACIÓN DE M.O. LOCAL	CAPACITACIONES		ACTIVIDADES DE SOSTENIBILIDAD		INFORMES
				# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# Reuniones	# Asistentes	# CCO	# Asistentes	# Recorridos	# Asistentes					# Recorridos	# Asistentes	# Actividades	# Asistentes	
Mes 1	0	0	27	NA	NAN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	102	87	1	21	NA	NA	1
Mes 2	0	0	34	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	2	118	163	7	81	NA	NA	2
Mes 3	7	7	162	1	4	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	0	444	400	16	178	NA	NA	3
Mes 4	5	5	46	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	527	478	10	111	1	30	1

3.1.4. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA, CON RELACIÓN A LAS LABORES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE SOCIAL DE SU CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

- El equipo social del contratista ha dado cumplimiento con cada uno de los programas y subprogramas establecidos en el PASAO.

- Se realiza estricto seguimiento al contratista, en cuanto a los compromisos adquiridos diarios y semanalmente e instaurados en el Plan de gestión Social.

- Para el presente informe el contratista cuenta con una contratación de mano de obra no calificada de la zona con un porcentaje 84%.

- Durante este mes se realizaron varias socializaciones con los líderes de las zonas de influencia del proyecto. En el frente de obra de Enciso Los Mangos, lugar donde se intervino la vía con pavimento rígido, se suspendieron las actividades por intimidaciones al personal de obra, por personas desconocidas de la comunidad. Algunos líderes de Juntas de Acción Comunal aledañas a la obra debieron colaborar para investigar la situación y garantizar la seguridad y tranquilidad del personal de obra para retomar actividades. Mediante una reunión en la Junta de Acción Comunal del barrio con varios de los líderes se informó la situación y se informó que gracias al acompañamiento de la comunidad el contratista de obra retomaría las actividades, sin volverse a presentar riesgos para el personal y la actividad se llevó a cabo con toda normalidad.

- Se continua con una comunicación veraz y eficaz con la profesional social y con el área de comunicaciones de la Alcaldía, con el propósito de mantener un buen desarrollo de la obra.

3.2. INFORME AMBIENTAL:

A continuación relacionamos las actividades ejecutadas por la Empresa Contratista Consorcio VIALMED 2025 en el periodo del mes de **octubre del 2025**, de igual manera es de anotar que la interventoría supervisó todo lo concerniente al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en el país, el cumplimiento del PASAO aprobado por la interventoría, la guía de manejo socio ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública de la alcaldía del distrito de Medellín; de igual manera se pudo verificar que no se han ocasionado impactos ambientales de mayor relevancia sobre el medio ambiente, los recursos naturales, las redes de servicios públicos, y la comunidad del área de influencia del proyecto. Esto en concordancia con el tipo de proyecto, de acuerdo con la clasificación de este proyecto según la guía mencionada previamente.

3.2.1. PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA:

Durante el periodo reportado se contó con las siguientes cuadrillas:

Tabla 81. Localización de las cuadrillas en el mes **octubre de 2025.**

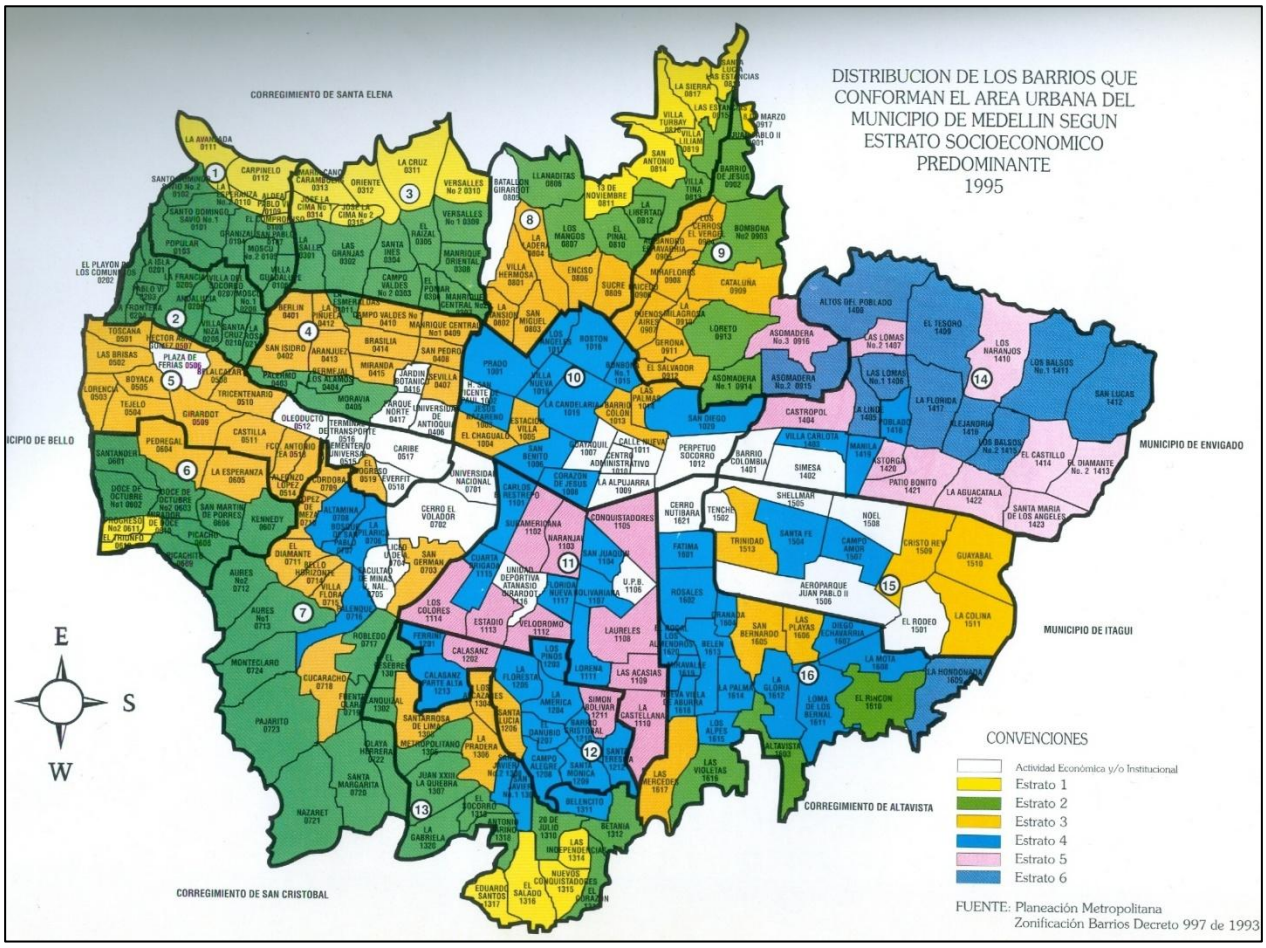
CUADRILLA	BARRIO - COMUNA
1	LAS VIOLETAS - 16
2	TRECE DE NOVIEMBRE - 8 ROBLEDO – 7 LA GLORIA – 16 LA FLORESTA – 12 SAN BERNARDO – 16 LAS PLAYAS – 16 VILLA CARLOTA – 14 EL DIAMANTE - 7 VILLA CARLOTA – 14 SANTA MARIA DE LOS ANGELES – 14
3	LA CRUZ - 3 VILLA DEL SOCORRO – 2 SANTO DOMINGO S – 1 POPULAR – 1 MOSCU – 2 GRANIZAL - 3
4	ALPUJARRA - 10 CAICEDO– 9 TRECE DE N OVIEMBRE - 8 CAMPOAMOR – 15 LA COLINA – 15 EL POBLADO - 14
5	PERPETUO SOCORRO – 7 BOLIVARIANA – 11 LA CANDELARIA – 10 ESTACION VILLA – 10 VILLA NUEVA – 10 GUAYAQUIL – 10 CALLE NUEVA - 10
6	CAMPO AMOR - 16 LA PALMA – 16 GRANADA – 16 ROSALES – 16 SAN BERNARDO – 16 LAS PLAYAS - 16
7	LA ESPERANZA - 6 DIAMANTE - 7 AURES – 7 CAMPO VALDES – 4 BELLO HORIZONTE – 7 PALENQUE – 7
8	ARANJUEZ - 4 LAS GRANJAS- 3 SANTA INES – 3 CAMPO VALDES – 4 BERMEJAL – 4 LA SALLE - 3
9	VERALLES - 3 ALTAVISTA – 16 SAN LUCAS - 14 LAS VIOLETAS - 16

CUADRILLA	BARRIO - COMUNA
10	OLAYA HERRERA - 7 POBLADO – 14 LOS MANGOS – 8 ENCISO – 8 PINAL - 8 CUCARACHO - 7
11	JUAN XXIII – 13 VERSALLLES - 3 LA CASTELLANA – 11 BOLIVARIANA – 11 LA AMERICA - 12 CALAZANS – 12 FUENTE CLARA - 7
12	GUAYABAL – 15 LA COLINA – 15 SAN ANTONIO DE PRADO - 80
13	MOSCU – 2 ENCISO - 8
14	BELLO HORIENTE - 3 CRISTO REY – 15 GRANIZAL – 1 LA ESPERANZA - 1
15	SANTA MARIA DE LOS ANGELES - 14 ASTORGA-14
16	GUAYAQUIL - 10 ALPUJARRA - 10
17	VILLATINA - 8
18	ROSALES – 16 CONQUISTADORES – 11 ANDALUCIA - 2
19	LOS MANGOS – 8 ROSALES - 16 MANILA - 14
20	MANILA– 14 PEDREGAL – 7 LA CANDELARIA – 10
21	SANTA LUCIA – 12 LA FLORESTA - 12

ACTIVIDADES DE OBRA DEL PERIODO.

- Demolición de pavimento con martillo neumático y compresor, generación y disposición de rcd.
- Aplicación de emulsión para pavimento.
- Instalación de mezcla asfáltica - actividades de pavimentación.
- Retiro de pavimento en mal estado, por medio mecánico operación de fresadora.
- Aplicación de pavimento por medio mecánico finisher.
- Instalación de señalización para manejo de tránsito y control de movilidad.
- Aplicación de pintura para señalización horizontal.
- Operación de equipos y maquinaria en general.
- Preparación e instalación de concretos.
- Retiro de adoquines.
- Instalación de aceros de refuerzo.

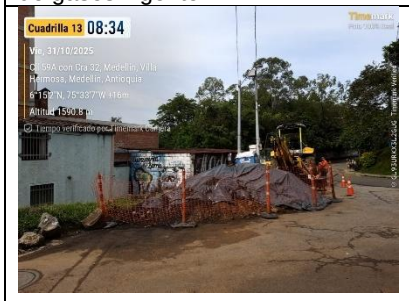
- Actividades de manejo Ambiental para aplicación del PASAO y la Guía de Manejo socio Ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública de la Alcaldía del distrito de Medellín.



Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
1. Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)	En el mes de octubre de 2025, la interventoría realizó el respectivo seguimiento y verificación a las actividades de manejo comprendidas para el programa de manejo de residuos, es de indicar que el contratista implemento las medidas como el uso de los puntos ecológicos con disposición en los frentes de trabajo de 4 canecas de 5 galones que cumplieron con el respectivo código de colores según la norma vigente. El contratista realizó reposición de las bolsas en los casos que fue solicitado por esta interventoría, adicionalmente la disposición final se realizó de la siguiente manera: ● Los residuos sólidos no aprovechables son almacenados temporalmente en las instalaciones de las oficinas de CONSORCIO VIAL MED y entregadas a la EMPRESA VARIAS DE MEDELLIN. Se reportan en el Informe del contratista 101 kg residuos no aprovechables (ordinarios). Los residuos reciclables son almacenados por el contratista mientras se acumula un volumen considerable para ser entregados a proveedores que realicen actividad de recuperación y reciclaje, o en su	     	**Anexo.** **3.2.1.** Planilla de Residuos Sólidos. Planilla de manejo de escombros se encuentra en el informe ambiental contratista impresa y digital. Se entregan copia de las remisiones digital. Se hizo entrega de la certificación de disposición de rcd para el mes de septiembre de 2025 de PROCOPAL Y PAVIMENTAR.

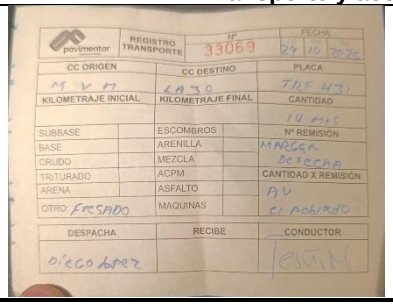
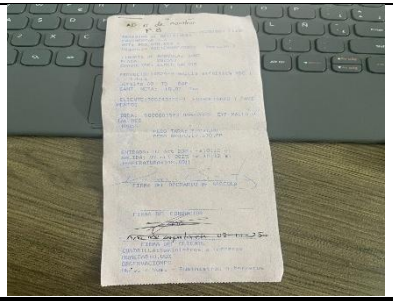
Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	defecto a recuperadores de lo cual el contratista deberá hacer la respectiva acta soporte de entrega. Durante los recorridos de obra fue frecuente en algunas cuadrillas encontrar una incorrecta disposición de las bolsas correspondientes a la hidratación del personal de obra, para lo cual el contratista llevó a cabo refuerzo del tema en las respectivas charlas en los diferentes frentes de obra. Se solicitó el uso de punto ecológico para la disposición de este tipo de residuos. Se reportaron 50,5 kg de reciclable o aprovechable, 101 kg de residuos ordinarios y un total de 522,82 kg generadores en el mes, reportados en el formato de planilla de generación de residuos sólidos para este periodo. Adicionalmente reporta un acumulado de 371.32 kg de residuos peligrosos, entregados a ASCRUDOS, se entrega soporte de recolección, para disposición en celda de seguridad. El contratista reporta disposición de residuos líquidos el mes de octubre por 16,16 m^3 en PTAR San Fernando, ubicada en el distrito de Medellín. Según soporte de recolección suministrado por el contratista, se adjunta además soporte de entrega de vertimiento	**Puntos ecológicos instalados en las cuadrillas**  **Generación y cargue de escombros.**	

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	en planta de tratamiento de aguas residuales. Esta información se encuentra en detalle en el programa prevención de la contaminación de cuerpos de aguas y redes de servicios públicos. En lo que respecta al manejo de RCD se manejaron de la siguiente manera: **Escombro:** en el mes de octubre de 2025, se dispuso en Procopal S.A.S., con un volumen aproximado de 1750 m³, y en Pavimentar S.A.S., con 1637 m³, para un total gestionado de 3386,5 m³ de RCD. El material resultante del fresado corresponde a 720.11 m³. Con respecto a los acopios de RCD, es de indicar que estos materiales no permanecieron en los frentes de obra por periodos superiores a 24 horas, durante su permanencia en obra una vez culminadas las actividades de demolición, fueron cubiertos por plástico, la interventoría solicitó mayor atención a la protección de los mismos teniendo presente el incremento en la frecuencia de lluvias en los diferentes sectores de la ciudad. El contratista tiene pendiente la entrega de Certificación de	      Actividades de generación de rcd por demolición, extracción y fresado.	

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	disposición final de RCD ya que no se entregó la de agosto 2025, ni la de septiembre de 2025. Se recuerda que se entrega mes vencido la de Octubre 2025, sería entregada el próximo mes.		
2. Programa para el control de emisiones atmosféricas	Se realizó seguimiento por parte de la interventoría al carpado de volquetas, adicionalmente en algunos casos el contratista realizó reemplazo de las lonas utilizadas para la protección de escombros y mezcla dispuestos en los frentes de trabajo. Se continuó realizando por parte de la interventoría el respectivo control, verificación y actualización de los vehículos, equipos y maquinaria presentes en obra, garantizando la vigencia de documentos como SOAT, técnico mecánica y matrícula que fueron aportados por el contratista previo a su ingreso, hasta el momento no se ha reportado incumplimientos con este requerimiento sobre los vehículos. Esta información es reportada en el programa de manejo de vehículos y maquinaria. Se realizó seguimiento a la oportuna disposición de RCD generado en los diferentes puntos intervenidos, los cuales se retiraron al finalizar la atención de los frentes de trabajo, es de indicar que durante su permanencia en obra	  Cubrimiento de carga de volquetas Las volquetas cumplen con la revisión técnico mecánica y de emisiones de gases vigente.  	**Anexo. 3.2.2**. **No aplica.** **No se entrega información. La evidencia de este programa es soportada con registros fotográficos.**

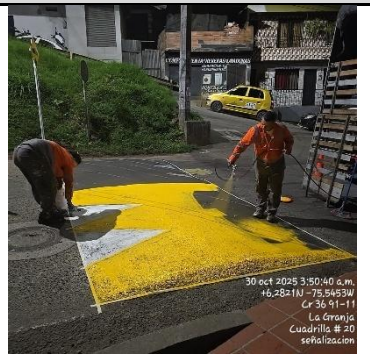
Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	este material es debidamente protegido con plástico negro o, para evitar su dispersión. En algunos casos, se solicitó el cubrimiento de estos acopios con lona o plástico. En las emisiones de equipos y maquinaria por combustible no se encontró opacidad en dichas emisiones.	    **Protección de escombros y mezcla, verificación de información y Carpado de volquetas.**  	

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		  Actividades de generación de ruido. Entrega de protección auditiva a la comunidad.	
3. Programa para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción.	La interventoría verificó que los diferentes materiales que ingresaron a obra durante el periodo, provenían de canteras previamente autorizadas en el PASAO aprobado para la ejecución de la obra, lo cual cuenta con los permisos ambientales vigentes relacionados con la extracción de materiales de cantera. Para el periodo de octubre, ingresaron a obra 11287,93 toneladas de mezcla asfáltica, distribuidas en 3094,97 toneladas por Procopal y 8192,96 toneladas por Pavimentar. No se generaron acopios temporales de materiales de obra ya que el material se consume en la misma jornada de trabajo programada, generalmente el	**Transporte de materiales.**  	**Anexo 3.2.3. Remisiones de materiales ingresados en cada cuadrilla.** **Se entrega planilla de materiales del mes de octubre de 2025.** **Se entrega certificación de cantera del proveedor PROCOPAL, del mes de septiembre de 2025.**

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	material requerido para los frentes de obra, permanece dentro de las volquetas autorizadas para ingreso con el respectivo distintivo del Distrito de Medellín, hasta que sea descargado para su uso, esto permite conservar la calidad y temperatura del material, hasta su uso. Es importante destacar que, en cada frente de trabajo, se contó con la respectiva señalización y aislamiento del sitio puntual de intervención, en algunos casos puntuales, la interventoría solicitó el retiro de elementos acopiados por los colaboradores en andenes, zonas verdes y bases de árboles, para lo cual el contratista reforzó el tema en los frentes de trabajo. Por medio de charlas y capacitaciones.	    **Transporte y acopio de materiales.**  	

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		Remisiones de materiales. **Remisiones de materiales.**	
4. Programa para la protección del suelo	Por la naturaleza misma del presente contrato de obra, relacionado con sus actividades no se contempla alteraciones o cambios de uso del suelo, ya que se realizan actividades de mantenimiento sobre vías urbanas existentes. La interventoría realizó el respectivo seguimiento a la protección del suelo en las diferentes actividades de obra, para lo cual se destaca que no se realizaron afectaciones directas al mismo ya que el contratista cubrió con plastilona las áreas para descargue de mezcla asfáltica, en cada frente de obra. Con esto se evita la alteración del pavimento en buen estado. Se realizó verificación de la provisión de los frentes de trabajo con bandeja para manejo de químicos, para evitar posibles derrames directos al suelo, o áreas de pavimento en buen estado. Se observó que los recipientes de químicos se encontraban dentro del área de la bandeja. Adicionalmente los derrames accidentales ocurridos fueron atendidos oportunamente. Los residuos derivados de los	    **Protección del suelo**	**Anexo 3.2.4. No aplica. No se incluye información. La evidencia del cumplimiento de este programa se basa en registro fotográfico.**

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	derrames, son dispuestos como residuos peligrosos. El contratista realizó el retiro de elementos acopiados en algunos frentes de trabajo en las zonas verdes en cumplimiento de la solicitud de esta interventoría ambiental. La interventoría ambiental se apoya en los Tecnólogos de obra civil, para tramitar requerimientos o solicitudes en cada una de las cuadrillas.		
5. Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra	Las sustancias químicas se acopiaron en bandejas provistas para evitar derrames directos al suelo, como se mencionó previamente en el programa para la protección del suelo. Se realizó seguimiento a la rotulación de productos químicos de las cuadrillas visitadas, garantizando el cambio por deterioro, además la publicación del protocolo de atención de derrame, por medio de un código QR, que cuenta con enlace que permite visualizar las hojas de seguridad de los productos químicos. En los frentes de obra normalmente se encuentran sustancias químicas como combustibles y emulsión	   	**Anexo 3.2.5**. Formato de Planilla de control de sustancias químicas.

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	(reportadas en el formato de utilización de sustancias químicas). Se realiza seguimiento al estado de los recipientes, rotulación, cierre y provisión de kit de derrame, además, se verifican las áreas en las cuales se hizo uso de dichas sustancias. La interventoría solicita tener especial cuidado en el trasvase de productos químicos para evitar posibles derrames. Los residuos contaminados con este tipo de productos, fueron acopiados por el contratista en su bodega principal ubicada en la Carrera 55B #72a-154, Edificio Catleya y se tiene previsto realizar su disposición por la empresa ASEI y ASCRUDOS, las certificaciones y soportes de disposición final de residuos peligrosos serán aportadas por el contratista una vez se lleve a cabo esta actividad.	    **Evidencia del manejo de sustancias peligrosas**	
6. Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra.	Haciendo seguimiento a lo planteado en el programa dentro del PASAO de obra, la interventoría realizó lo siguiente: • Se verificó la documentación de la maquinaria, vehículos y equipos que se están utilizando, en el **ANEXO 3.2.6.** Se encuentra la documentación presentada. Se presenta formato con el registro de los vehículos y	 	**Anexo 3.2.6**. En este periodo se hizo entrega de la información relacionada con el cumplimiento de este programa, adicionalmente en el periodo se hizo entrega

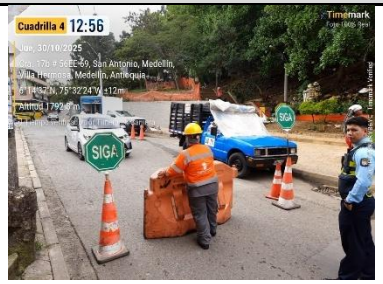
Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	maquinaria aprobados por interventoría. • Se solicitó al contratista realizar entrega de las respectivas fichas técnicas y hoja de vida de los diferentes equipos empleados en obra. Se ha entregado información de manera parcializada. Teniendo en cuenta la presentación del contratista del Plan de calidad, la interventoría realiza seguimiento a las medidas que respaldan la buenas ejecución de las obras, en cuanto a materiales de calidad garantizada, equipos en buen estado y óptimas condiciones de funcionamiento y personal capacitado y entrenado que pueda realizar las actividades conforme su requerimiento técnico y acabados, para ello se realizó el control a que los vehículos, equipos y maquinaria empleados no fueran equipos mayores a 20 años, en caso de ser repotenciados se tomó la fecha de dicho proceso. Hasta el momento no se han reportado equipos o vehículos superior a los 20 años de antigüedad, sin que se haya subsanado el requerimiento de repotenciación.	      **Manejo de maquinaria y equipos**	previa de documentación relacionada con el ingreso de vehículos y maquinaria para la autorización de la interventoría.


Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	Se hizo entrega de la información relacionada con la maquinaria y vehículos. Se entrega listado y documentación de maquinaria acorde a lo reportado por la interventoría en el periodo.		
7. Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos	Durante el mes de octubre, la interventoría verificó que las unidades móviles usadas por el contratista pertenecían al proveedor **Comercializadora SYE y CIA S.A.S.;** la cual cuenta con los permisos pertinentes para llevar a cabo este tipo de actividad, adicionalmente se revisó la información correspondiente a lo siguiente: ● Recibo control de descargue de Aguas Residuales en la PTAR San Fernando. ● Resolución YG5969 donde se lleva a cabo la descarga de las aguas Residuales, en la planta de aguas residuales san Fernando. En campo, se realizó seguimiento al mantenimiento de las 20 USM, el cual se debe realizar 2 veces por semana. El contratista informa que en 4 unidades sanitarias se realiza 3 mantenimientos de limpieza y recolección de aguas residuales.	   	**Anexo 3.2.7.:** Certificado de recolección de aguas residuales. Certificado de vertimiento en planta de tratamiento de aguas residuales del proveedor del servicio.

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	Se verificó la respectiva protección de los sumideros aledaños a los frentes de trabajo, se realiza seguimiento a instrucción de que en rangos 0 a 3, solo se realiza protección y limpieza de lo generado por la obra, en caso de estar colmatados serán reportados a EPM; en rangos superiores el contratista deberá realizar el respectivo mantenimiento del sumidero, independiente si el mismo se encontraba colmatado previo a las intervenciones. En la cuadrilla 19 se cuenta con campamento que tiene baños conectada a la red hidrosanitaria de la ciudad.	    **Actividades de mantenimiento en las unidades sanitarias portátiles en la obra.**  

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		    Baño de la cuadrilla 19.	
8. Programa para la gestión de la fauna y flora	A la fecha para el desarrollo del contrato, no se cuenta con permisos para intervenciones forestales. El contratista realiza por medio de inducciones a su personal, en el manejo de fauna que se pudiese llegar a encontrar en los diferentes frentes de trabajo. La interventoría indica tanto a su equipo de trabajo como al del contratista que está prohibida la intervención de raíces que se puedan llegar a encontrar, de	 **Actividad de sostenibilidad. Retiro de elementos de la zona verde y cercanías de los árboles**  **Las intervenciones no contemplan las zonas verdes. Se realiza mantenimiento de vías y estructuras complementarias. Se**	**Anexo 3.2.8. No Aplica. No se generan anexos, soportes o registros de este programa. Las evidencias de este programa corresponden a registro fotográfico.**

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
	llegarse a presentar estas situaciones, deberán ser reportadas a la supervisión ambiental de la SIF. De igual manera la interventoría verificó en campo que no hubiese afectaciones a las especies arbóreas que se encontraban en el área de influencia del proyecto.	**verifica que no hay afectación de áreas aledañas.**	
9. Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía	Se solicitó al contratista los permisos tramitados en EPM para uso de hidrantes de acuerdo con la cuadrilla que laboró en cada sector; además se solicitó medidor de caudal que se conecta al hidrante para verificar el caudal captado y utilizado, en el periodo de referencia el contratista realiza actualización de permisos por temas de facturación. Se recomienda a la empresa contratista incentivar el uso eficiente del agua, en todas las cuadrillas y de agua y energía en su oficina y bodega principal. En el anexo 3.2.9. se encuentra la información relacionada con permisos y facturación de servicios públicos.	    **Verificación de la instalación de medidor de caudal Recipientes para agua. Carrotanque.**	**Anexo 3.2.9.** **Formato de consumo de agua y energía.** Documentación presentada por el contratista referente a la utilización de hidrantes, renovación. Facturas del pago de consumo energía.
10. Programa para el manejo de	De acuerdo con la dinámica de trabajo, el contratista cuenta con camiones que hacen las veces de		**Anexo 3.2.10**. Se entrega listado de

Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
campamentos e instalaciones temporales	campamento móvil dado que en ellos se almacenan los diferentes elementos y equipos a implementar en el desarrollo de actividades de la jornada laboral, además, cuentan con su bodega principal en Carrera 55B #72a-154, Edificio Catleya, Itagüí, Antioquia. Desde la Interventoría se solicitó al contratista realizar actividades de orden y aseo a los camiones, con el fin de brindar buenas condiciones de almacenamiento y de esta manera también evitar que se presenten accidentes laborales y conservar condiciones de higiene. Para la cuadrilla 19, se cuenta con un campamento fijo, en el barrio Enciso Los Mangos. Este espacio cuenta con baño y disponibilidad para las pertenencias de los trabajadores. Dirección cra 19 #59-30. Interior 101.	     	asistencia de capacitaciones. Se incluye el informe ambiental de actividades realizado por el contratista.

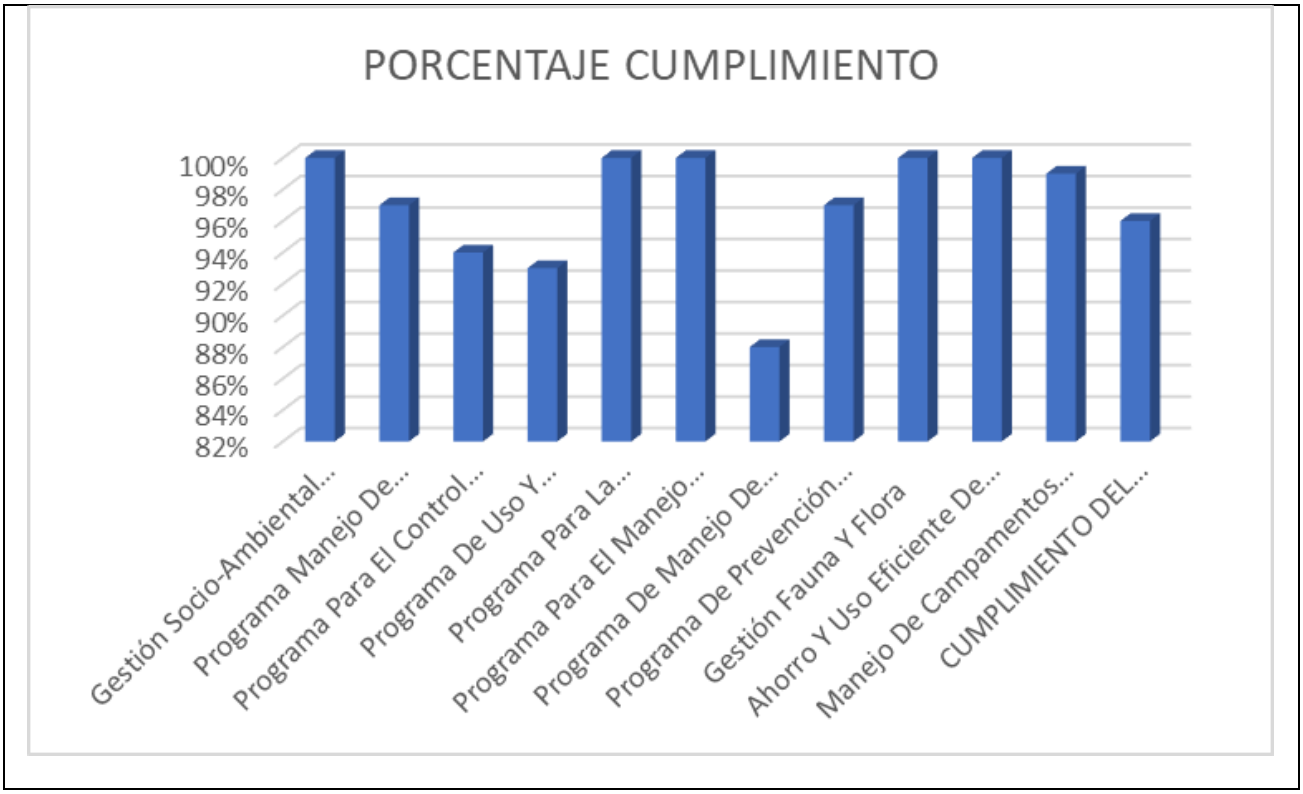
Programa	Gestión de la Interventoría	Soporte	Anexo O Formatos
		  **Campamento cuadrilla 19 y Campamentos móviles**   **Identificación de vehículos y volquetas.**	

Formatos del contratista entregados a la interventoría		
Nombre del Anexo	**Cumplimiento**	
	Si	**No**
Informe Mensual del Contratista	X	
Automotores utilizados en obra	X	
Consumo de agua y energía	X	
Control de sustancias químicas	X	
Maquinaria y equipo	X	
Planillas de escombro	X	
Planilla de residuos sólidos	X	
Registro de Capacitaciones	X	
Registro de tala y trasplante	No aplica	
Suministro de material de construcción	X	

Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista
En términos generales la empresa contratista viene dando cumplimiento a lo estipulado en el Documento PASAO; sin embargo, en el periodo de referencia, se realizaron observaciones en referencia al manejo de sustancias químicas y protección de sumideros
Calificaciones Mensual de la Gestión y Desempeño del Contratista
A continuación, se relaciona el promedio de Evaluación Ambiental por semanas. Semana 1:96% Semana 2:97% Semana 3: 96% Semana 4: 96% El promedio de Evaluación Ambiental acumulado para el mes de **octubre** -2025 fue del 96% **Ver el Anexo 3.2.10-3**
Evaluación Del Desempeño Ambiental

Componente	**Porcentaje De Cumplimiento**
Gestión Socio-Ambiental Contractual	**100%**
Programa Manejo De Residuos Sólidos	**97%**
Programa Para El Control De Emisiones Atmosféricas	**94%**
Programa De Uso Y Almacenamiento De Materiales De Construcción	**93%**
Programa Para La Protección Del Suelo	**100%**
Programa Para El Manejo De Sustancias Química Peligrosas	**100**
Programa De Manejo De Maquinaria, Equipos Y Vehículos	**88%**
Programa De Prevención De La Contaminación De Cuerpo De Agua Y Redes	97%
Gestión Fauna Y Flora	100%
Ahorro Y Uso Eficiente De Agua Y Energía	100%
Manejo De Campamentos E Instalaciones Temporales	99%
CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL	**96%**

En términos generales la empresa contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el PASAO; sin embargo, es pertinente que se mejoren aspectos relevantes específicamente en relación a la protección de sumideros, protección de suelo y manejo de maquinaria y equipos.



3.2.1 PROGRAMA DE CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES REALIZADAS.

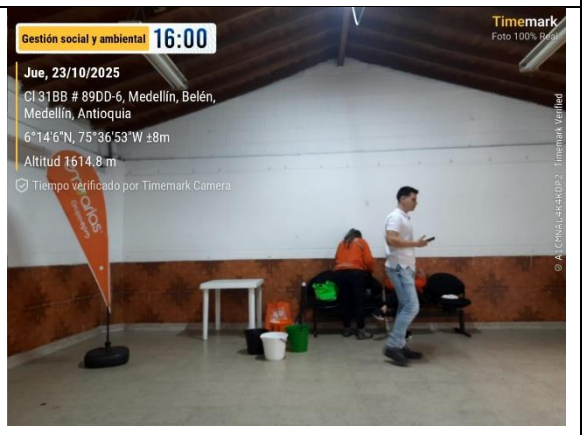
Capacitar al personal en temas ambientales es de suma importancia ya que ellos son los que ejecutan las actividades en obra que de no realizarse de manera adecuada pueda dar a lugar a que se presenten impactos ambientales de carácter permanente; se superviso que el contratista realizara en un lenguaje de sencillo entendimiento y de manera participativa con el fin de lograr que los trabajadores identificaran la importancia del cumplimiento de la Normatividad Ambiental.

Tabla 82. Capacitaciones gestión ambiental.

FECHA	TEMA	CANT.PERSONAS	CUADRILLA
20-10-2025	MANEJO DE RCD – CONTROL DE DERRAMES.	5	2
21-10-2025	MANEJO DE RESIDUOS RCD Y CONTROL DE DERRAMES.	8	3
29-10-2025	CONTROL DE DERRAMES – MANEJO DE RESIDUOS RCD	10	5
14-10-2025	MANEJO RESIDUOS RCD – CONTROL DERRAMES.	15	6
31-10-2025	CONTROL DERRAMES . MANEJO DE RESIDUOS RCD.	8	7
31-10-2025	MANEJO RCD – CONTROL DE DERRAMES.	9	8
21-10-2025	MANEJO DE RESIDUOS RCD – CONTROL DERRAMES.	10	9
23-10-2025	MANEJO DE RESIDUOS RCD – CONTROL DERRAMES.	21	11
21-10-2025	MANEJO RCD – CONTROL DE DERRAMES.	20	15
16-10-2025	MANEJO RESIDUOS RCD – CONTROL DERRAMES.	19	16
17-10-2025	MANEJO DE RESIDUOS RCD – CONTROL DE DERRAMES.	6	18
27-10-2025	MANEJO RCD – CONTROL DE DERRAMES.	11	18
17-10-2025	MANEJO DE RESIDUOS RCD . CONTROL DERRAMES.	9	19

21-10-2025	**MANEJO RCD – CONTROL DE DERRAMES.**	**5**	**20**
9-10-2025	**MANEJO RESIDUOS RCD – CONTROL DERRAMES**	**19**	**21**
	TOTAL OCTUBRE 2025.	**174**	

Anexo 3.2.10. Programa de manejo de campamentos, se encuentran los Listados de asistencia capacitación e inducciones.

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capacitaciones dirigidas al personal en las diferentes cuadrillas</td></tr>
</table>

3.2.2 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (FORMATO INDICADORES)

Los Formatos de Interventoría se encuentra el formato de indicadores de Gestión Ambiental, se encuentran relacionados a continuación:

ANEXO	TÍTULO.
3.2.1.	Programa para el manejo de los residuos sólidos (comunes, especiales y peligrosos)

3.2.2.	Programa para el almacenamiento adecuado de materiales de construcción.
3.2.3.	Programa para el control de emisiones atmosféricas.
3.2.4.	Programa para la protección del suelo.
3.2.5.	Programa para el manejo de sustancias químicas peligrosas en obra
3.2.6.	Programa para el manejo de maquinaria, vehículos y equipos en la obra
3.2.7.	Programa de prevención de la Contaminación de Cuerpos de Agua y Redes de Servicios Públicos.
3.2.8.	Programa para la gestión de la fauna y flora
3.2.9.	Programa para el ahorro y uso eficiente de agua y energía
3.2.10.	Programa para el manejo de campamentos e instalaciones temporales
3.2.11.	Formatos ambientales de la interventoría. Incluye Informe de visita, actas de reunión, informes semanales.

3.2.3 Seguimiento Al Presupuesto Ambiental (Formato Vigente).

En la ejecución del presupuesto de gestión ambiental fue necesario realizar un ajuste (balance) en el cual se hizo modificación de cantidades, con base en las necesidades de ejecución del presupuesto ambiental, acorde a las necesidades para la prevención y control de impactos ambientales a continuación se presenta el ajuste realizado.

Este archivo en su versión hoja de cálculo (Excel) se encuentra en los anexos correspondientes, del informe en la carpeta 3.2.11. FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORÍA AMNBIENTAL.

Para el presente periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025, el acta de cobro corresponde a la No 4 no se presentó ejecución de la inversión ambiental, por lo que el valor para el periodo queda en 0:

Valor Presupuesto $ 572.064.162,00
Valor acta 1: 0.
Valor Acta 2: $ 63.106.160,37
Valor Acta 3: $ 93.244.430.
Valor acta 4: $0

En el informe, correspondiente a gestión social y pmt, se incluye el presupuesto ejecutado en esos componentes.

3.2.4 OBSERVACIONES COMPONENTE AMBIENTAL.

De acuerdo con las actividades llevadas a cabo en el mes de **octubre de 2025** se realizaron las siguientes recomendaciones al contratista.

- ✓ Protección de sumideros de todos los frentes de obra, en algunos casos se debe realizar limpieza de sumideros.

- ✓ Rotulación e identificación de sustancias químicas utilizadas en las actividades constructivas.
- ✓ Manejo general de residuos en el frente de obra, utilizar adecuadamente los puntos ecológicos, los cuales fueron evidenciados en los frentes de obra. Hacer la reposición correspondiente.
- ✓ Mantenimiento periódico de los baños móviles, evitando la generación de olores ofensivos en los sitios donde se ubica
- ✓ Entrega de soportes de mantenimiento de maquinaria.
- ✓ Cubrimiento de acopios y protección del pavimento con plastilona.
- ✓ Identificación de volquetas y camiones con la lona banner del contrato.

Adicionalmente, la interventoría teniendo presente los recorridos realizados en campo, tanto por la interventoría como por la supervisión ambiental de la SIF, reforzar lo siguiente:

- Mantener una correcta señalización en los frentes de trabajo, con la información adecuada a la comunidad y usuario sobre desvíos, así como senderos peatonales (tanto como los andenes existentes como los habilitados) y la realización de actividades.
- Instalación de puntos ecológicos, y aseo general de camiones y frentes de obra. Retiro de rcd, limpieza de polvo, empaques y botellas y otros elementos de obra.
- Aseo y mantenimiento continuo de unidades móviles sanitarias, evitando la generación de olores ofensivos.
- Prevenir correctamente los derrames y ser atendidos oportunamente, contar con insumos para la atención de derrames. Disponer adecuadamente de los residuos.
- Cada cuadrilla debe contar con protección auditiva para distribuir a la comunidad afectada.
- Protección de sumideros y la limpieza de los afectados por actividades.
- Señalización y hojas de seguridad de los productos químicos utilizados en los frentes y cuadrillas.
- Capacitaciones ambientales e inducciones al personal operativo y administrativo con énfasis en el manejo ambiental en el frente de obra.
- Cubrimiento de acopios de materiales y escombros.
- Reporte oportuno de maquinaria, equipos y vehículos a la interventoría para su debida aprobación.
- Identificación de volquetas, y vehículos con el pendón del contrato.
- Velar el cumplimiento del pmt en los frentes y cuadrillas.
- Evitar el desperdicio de materiales.
- Seguimiento al consumo de agua, energía y combustibles.
- Evitar el uso de zonas verdes para acopios y la limpieza de las mismas cuando ello ocurra.
- Protección de zonas verdes con mamparas o lonas.
- Control de emisiones de emulsión por aspersión para evitar impactos en fachadas, inmuebles, personas y otros vehículos.
- Entre otros impactos que se han identificado en las actividades realizadas en las visitas de interventoría.

3.2.6. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL, AL INTERIOR DE SU CONTRATO.

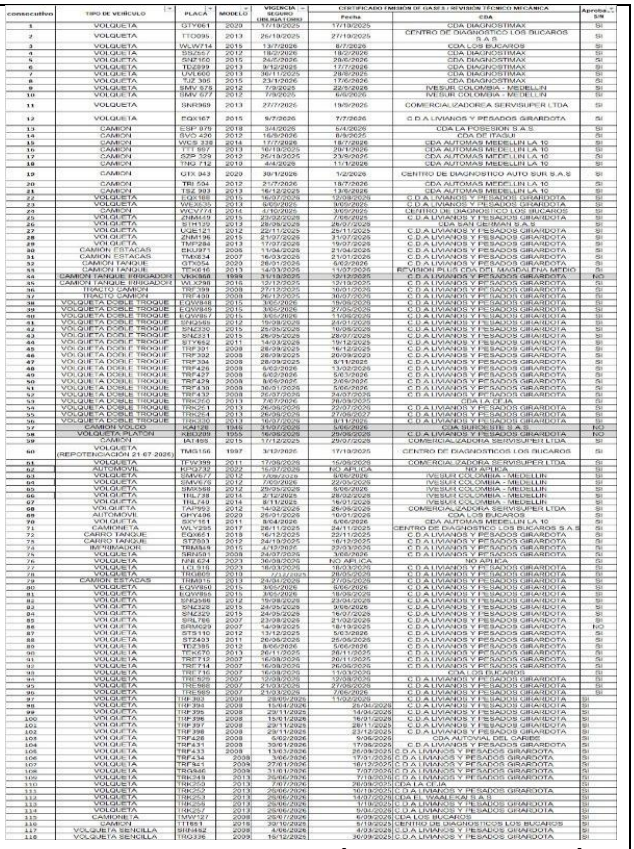
Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales que tiene la Interventoría en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que debe cumplir la empresa contratista en la ejecución de las medidas de manejo contenidas en el PASAO, a continuación, relacionamos las actividades realizadas los profesionales ambientales, adscritos al presente contrato.

- Se realiza recorrido de obra nocturna en compañía de la supervisión ambiental de la SIF el día 09 de octubre; se envía informe de visita emitido por la supervisión ambiental de la SIF.
- Se realizo revisión de acta y memorias de cálculo.
- Se envió correo electrónico el 07 de octubre, con observaciones al contratista con respecto al informe de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2025.
- Se envía por correo electrónico 22 de octubre de 2025, informe correspondiente al mes de septiembre a la supervisión ambiental, no se recibieron observaciones al mismo
- Reunión en compañía de supervisión ambiental SIF, contratista e interventoría para revisión y validación de cantidades del componente correspondientes al Acta No 3, esta se llevó a cabo el 06 de octubre de 2025. La interventoría levanto el acta de reunión y realizo envió a las partes.
- Se envió oficio No.040 4600105322 de 2025, con referencia al incumplimiento en uso de pendones de identificación de vehículos en obra.
- Recorridos de verificación aspectos ambientales en obra; se envían al contratista las observaciones de los hallazgos encontrados en los frentes visitados.
- Articulación con el contratista actividades de gestión ambiental para la correcta implementación del PASAO y el cumplimiento de la Guía Socio Ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública del municipio de Medellín.
- Seguimiento a los compromisos adquiridos en reuniones con Supervisión técnica y ambiental de la SIF.
- Velar por la correcta aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental.
- Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista de construcción y que impliquen un cambio a lo establecido en el PASAO.
- Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto.
- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación del PASAO.
- Elaboración de informes mensuales, evaluaciones semanales, informes semanales y demás formatos establecidos por la supervisión del contrato.

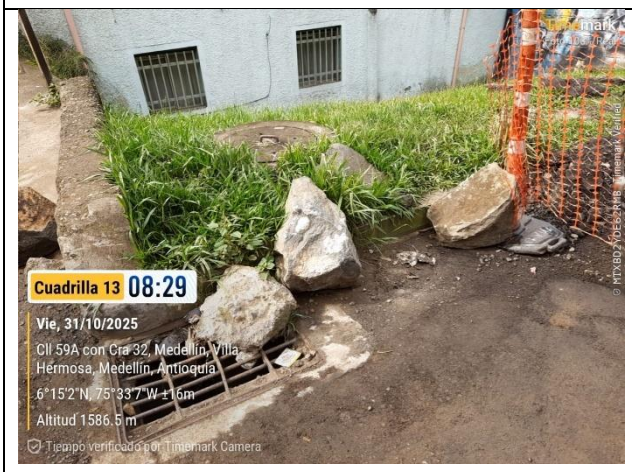
A continuación, algunas actividades desarrolladas por la interventoría ambiental en campo.



Verificación uso de pendones en vehículos



Seguimiento verificación de interventoría de los vehículos reportados por el contratista.



Solicitud protección de sumideros



Solicitud de la interventoría retiro de RCD de zona verde

Recorridos realizados en las diferentes cuadrillas	
	
Recorrido de seguimiento a la cuadrilla 4 en la comuna 8.	Visita de seguimiento a la cuadrilla 19
	
Seguimiento a acopios RCD, cuadrilla 9, comuna 3.	Seguimiento mantenimiento USM Cuadrilla 13, comuna 8.

Anexos 3.2.11. Formatos de seguimiento de la Interventoría Ambiental. Entre estos se encuentran los siguientes: Evaluación socio ambiental octubre 2025, manejo de sumideros en el frente de obra, orden y limpieza de la obra, lista de verificación de campamentos, entre otros.

3.3. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST:

El presente informe mensual del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se elaboró en cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas vigentes. Este numeral tiene como objetivo proporcionar una visión detallada e integra del estado actual de las actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, así como los avances y retos encontrados durante el período de **octubre del 2025**.

El componente de SST en el proyecto "Rehabilitación, Mantenimiento y mejoramiento de la Malla Vial e infraestructura asociada de la Ciudad de Medellín" tiene la misión de asegurar la calidad integral de las actividades desarrolladas, buscando establecer mecanismos de control efectivos que garanticen el cumplimiento de los objetivos establecidos por el ente contratante. La labor del interventor es proactiva y preventiva, abarcando desde la verificación del cumplimiento normativo hasta la implementación de mejoras continúas en los procedimientos y protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

De acuerdo con el objeto del contrato y las obligaciones específicas de la interventoría, este informe incluye una revisión detallada de la aplicación de la seguridad y salud dentro del Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PASAO), el control, seguimiento y la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Además, se presentan las acciones correctivas y preventivas adoptadas, los hallazgos relevantes y las recomendaciones para mejorar la gestión de SST en el proyecto.

Este informe es una herramienta clave para la toma de decisiones informadas y la mejora continua de las condiciones de trabajo, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de todos los trabajadores involucrados en el proyecto. El alcance del informe abarca todas las actividades de Rehabilitación, Mantenimiento y mejoramiento de la Malla Vial e infraestructura asociada ejecutadas durante este periodo, incluyendo la identificación y gestión de riesgos laborales, la implementación de capacitaciones y la supervisión del cumplimiento de los estándares del SG-SST establecidos.

3.3.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST (CONTRATISTA DE OBRA)

La interventoría realizará una descripción de las actividades de monitoreo y seguimiento realizadas para verificar el desarrollo, cumplimiento normativo y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo por parte del contratista de Obra Pública de acuerdo con la guía de manejo socio ambiental para la obra pública.

Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista, requeridos en el Documento Específico DE-GETH Lineamientos de Contratación Referente al Cumplimiento de Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA				
Nombre del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo del Contratista:	**Francy Milena Escobar Morales**	**No Licencia en SST:**	**2017060667104**	
Nombre de la empresa:	**Consorcio Vialmed 2025**	**NIT:**	**901949183-1**	
Nombre del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa de interventoría:	**Luis Norberto León Álvarez**	**No Licencia en SST:**	**2025060179372**	**Fecha de realización del informe: 31/10/2025**
Seleccione el número correspondiente al valor de cada ítem valorado, como se explica a continuación: **C (cumple) - 5 puntos:** Si se cuenta con la evidencia que soporte la acción del ítem requerido **NC (no cumple) - 0 puntos:** Si no cuenta con la evidencia o cuenta con la evidencia parcial o incompleta sobre el ítem requerido **NA (no aplica) - 5 puntos:** Si lo solicitado en el ítem requerido no hace parte del objeto contractual				
Nota 1: Cada uno de los ítems a verificar están justificados en las normas nacionales que rigen el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo vigentes a la fecha y estas pueden ser susceptibles a modificaciones o variaciones de acuerdo con lo que establezca el Gobierno Nacional.				

ETAPA CONTRACTUAL											
No.	**Requisito Normativo**	**Periodicidad**	**Ítem a verificar**	**Evidencia**	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**	**PLAN DE ACCIÓN**		
					5	**0**	**5**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Resolución 0312/2019	Al iniciar el contrato, teniendo en cuenta la fecha de emisión por parte de la ARL.	Se cuenta con la certificación de ARL y Ministerio de Trabajo para el cumplimiento de estándares mínimos, con vigencia inferior a un año.	Certificado de Estándares mínimos emitido por ARL. Certificado de Estándares mínimos emitido por Min Trabajo.	5			Se enviaron los soportes de certificados de ARL y Min trabajo. Se adjuntan los soportes del SG-SST son los aportados de la empresa consorciada IngeAlquipos, Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
2	Resolución 0312/2019 Resolución 4927/2016	Al iniciar el contrato (tener en cuenta si se cambia de responsable de SG-SST volver a solicitar los documentos)	La empresa cuenta con un responsable del SG-SST, con licencia para prestar servicios de SST y curso de 50 horas o el curso de 20 horas de actualización.	Licencia de SST y certificado del curso de las 50 horas vigente o su actualización: Profesional, especialista o magister en SST con Licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo. Curso de 50 horas en SST y/o 20 horas.	5			Se envió hv de profesional SST del Consorcio. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
3	Decreto 1072/ 2015, 2.2.4.6.15 - 2.2.4.6.16- 2.2.4.6.23 - 2.2.4.6.24.	Al iniciar y durante el contrato	Se tienen identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos laborales, por medio de una matriz, con las medidas de intervención y soportes que demuestren la implementación de los mismos, en el personal que se encuentra ejecutando el contrato.	Documento de la IPEVR y evidencias de los controles implementados. Nota: Deberá ser específico del proyecto que se viene a ejecutar al Distrito de Medellín.	5			Se adjunto matriz IPEVR de acuerdo a la naturaleza del contrato. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			

4	Decreto 1072/2012.2.4.6.8 N°6, 7 y 8. 2.2.4.6.16.	Al iniciar el contrato	Se tiene un plan de trabajo y un plan de formación del SG-SST firmado por el representante legal y el responsable de SST para las actividades de ejecución del contrato.	Documento de plan de trabajo y plan de formación con sus respectivas firmas. Con firma del Representante Legal y el responsable del SG-SST. Soporte y evidencias de las actividades, formaciones y capacitaciones del personal que ejecuta el proyecto. Resultado de la auditoría del SG-SST y de la rendición de cuentas. Vigencia inferior a un año.	5			Se adjunto plan de trabajo 2025 y resultado de auditorías y rendición de cuentas. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
5	C.S. del T. Art. 104-125 Ley 1010/2006 Ley 962/ 2005	Al iniciar el contrato	Se cuenta con: Las políticas del SG-SST Reglamento Interno de Trabajo. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Actualizados, con sus respectivos soportes de publicación y divulgación.	Documentos actualizados de las políticas, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, soporte de socialización con el personal que ejecuta el proyecto y evidencia de publicación en los centros de trabajo donde se ejecuta el proyecto con el Distrito de Medellín.	5			Se adjuntaron políticas reglamento y las socializaciones se encuentran en los formatos de inducción de ingreso. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
6	Resolución 1401/2007 Resolución 0312/2019 Decreto 1072/2015	Mensual, si se presentan eventos.	Se reportan y se investigan todos los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ocurridos dentro de la ejecución del contrato de obra.	Documento soporte del reporte del incidente o accidente de trabajo, enfermedad laboral y la respectiva investigación.	5			Se cuenta con las investigaciones de los accidentes reportados para el periodo relacionado			
7	Resolución 1401/2007	Mensual, si se presentan eventos.	Se cuenta con las evidencias del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en las investigaciones de accidentes de trabajo.	Evidencias de cumplimiento de los planes de acción de los incidentes y accidentes de trabajo, ocurridos durante la ejecución del contrato.	5			Se adjuntan las lecciones aprendidas en el archivo correspondiente al accidente para el periodo relacionado			

8	Ley 1295/1994 Art 21 lit.g, Resolución 2400/1979, Resolución 1401/2007, Decreto 1072/2015 Art 2.2.4. 6..11, Parágrafo 1 y 2, Art 2.2.4.6.12 Numeral 6, Art 2.2.4.6.13 Núm. 4	Al iniciar el contrato y si se presentan ingreso de personal nuevo durante la ejecución del contrato.	Se tiene los registros de inducción y reinducción en SST (peligros de acuerdo con la actividad a desarrollar y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral)	Registros de inducción y reinducción del personal que ejecuta el proyecto durante la ejecución del contrato.	5			Se adjunta carpeta de registro de inducción para el periodo relacionado			
9	Resolución 2013/1986 Art. 1,3, 11 y 14 lit. K, Decreto 1295/1994 Art. 35 y 63 y Parágrafo, Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.8 y 2.2.4.6.12 Núm. 10.	Al iniciar el contrato	La empresa cuenta con la conformación y operatividad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST y actas de reunión.	Registros de conformación y operación del COPASST, registros de las inspecciones, actas de reunión de los últimos tres (3) meses y socialización de los resultados de las mediciones ambientales	5			Se relacionan las acatas de reuniones al Copasst para el periodo relacionado			
10	Resolución 652/2012 Resolución 1356/2012.	Al iniciar el contrato	La empresa cuenta con la conformación y operatividad del Comité de Convivencia Laboral CCL y actas de reunión.	Registro y/o acta de conformación del CCL, listados de asistencia de las reuniones e informe de rendición de cuentas del CCL.	5			Se relacionan las acatas de reuniones al Cocola para el periodo relacionado			

11	Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.25. Núm. 1 al 13 Parágrafo 1 y 2.	Durante el contrato	Se cuenta con plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres, conformación de una brigada de emergencias capacitada para atender cualquiera situación de emergencia y se cuenta con inventario de recursos, PON divulgados a todo el personal y registros de simulacros de evacuación.	Evidencias de actividades del plan de emergencias del proyecto en ejecución con el Distrito de Medellín durante la ejecución del contrato, recursos de emergencia, registros de simulacros de evacuación y evidencias de capacitación.	5			Se envió el plan de emergencias, los elementos de emergencia en los vehículos de todos los frentes de trabajo: extintor, botiquín, camilla y silbatos. Para el simulacro de evacuación se tiene programada capacitación de la brigada para participación en simulacro. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio Las inspecciones de emergencias se adjuntan y conformación de brigada,anexos para el periodo relacionado			
12	Ley 9/1979 Art. 15, 80 y 84, Ley 1562/2012 Art 21 lit c y d, Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12 Núm. 14.	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se tienen evidencias de los resultados de las inspecciones a los sitios y puestos de trabajo, equipos de protección personal y herramientas de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivas evidencias.	Registros de inspecciones periódicas realizadas durante la ejecución del contrato y seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Plan de mantenimiento.	5			Se adjuntas registro de inspecciones del presente mes de todos los integrantes del Consorcio Vialmed para el periodo relacionado			
13	Decreto 1295/1994 Art. 21 lit c y d, Decreto 1072/ 2015 Art 2.2.4.2.2.20	Al iniciar el contrato	Se cuenta con el análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal adscrito al contrato de obra y constancia de las medidas adoptadas para disminuir la tasa de	Informe de los análisis de accidentalidad, indicadores epidemiológicos del mes anterior a la fecha del informe y registro de las intervenciones realizadas.	5			Se adjunta formato de indicadores para el periodo relacionado			

			accidentalidad o enfermedades profesionales.								
14	Resolución 1843/2025 Art. 8 Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.2.2.18	Al iniciar el contrato (solo una vez).	Se realiza a los trabajadores que ejecutan el contrato las respectivas evaluaciones médicas ocupacionales obligatorias, incluyendo la evaluación de preingreso, evaluaciones periódicas, la de egreso, la de retorno laboral, la de seguimiento o control, y la evaluación por cambio de ocupación. Cuando aplique cada una de estas.	Resultado de las evaluaciones médicas ocupacionales obligatorias, incluyendo: La evaluación de preingreso Evaluaciones periódicas Evaluación de egreso Evaluación de retorno laboral Evaluación de seguimiento o control Evaluación por cambio de ocupación.	5			Se adjuntan los resultados de evaluaciones médicas para el periodo relacionado			
15	Decreto 1072 de 2015, articulo 2.2.4.6.28, numeral 4	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Comunicar a todos los trabajadores los contenidos de los peligros a los cuales se exponen realizando las tareas asignadas dentro de las instalaciones del proyecto de obra.	Registros de asistencias.	5			Se adjunta formato de asistencia a inducción para el periodo relacionado			
16	Ley 9/1979 Art. 122; Resolución 2400/1979 Art. 176 a 201, Decreto 1072/2015 Art. 2.2.4.6.12 Núm. 8 y 2.2.4.6.24 Núm. 5.	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se cuenta con los registros de entrega de elementos de protección personal, utilizados en la ejecución del contrato, con sus respectivas fichas técnicas y registros de capacitación.	Registros de entrega de elementos de protección personal firmados por cada trabajador, evidencias de capacitación y seguimiento para su uso (listas de chequeo, inspecciones, registros fotográficos, otros) durante la ejecución del contrato.	5			Se adjunta soporte de entrega de EPP para el periodo relacionado			

17	Ley 1295/1994 Art 21 lit. g, Resolución 2400/1979, Resolución 1401/2007, Decreto 1072/2015 Art 2.2.4. 6..11, Parágrafo 1 y 2, Art 2.2.4.6.12 Núm. 6, Art 2.2.4.6.13 Núm. 4	Al iniciar el contrato y si se presentan ingreso de personal nuevo durante la ejecución del contrato.	Se cuenta con los registros de entrenamiento específico según el cargo u oficio, para la actividad que va a desarrollar el trabajador.	Registros de entrenamiento antes y durante la ejecución del contrato (cargo y/o oficio)	5			Se adjuntaron los certificados de los controladores viales. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
18	Código Sustantivo del Trabajo (CST). Ley 2101 de 2021 Resolución 3031 DE 2023	Cada vez que se actualice el permiso ante Min. Trabajo	Se cuenta con permiso para trabajo suplementario (horas extras) actualizado.	Autorización vigente del Ministerio del Trabajo y lista de los cargos autorizados	5			Se adjunto soporte de permiso para trabajo suplementario. Se adjuntaron en el informe No. 1de julio			
19	Resolución 5492 de 2024 Decreto 1347 de 2021	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se tiene documentado y en operación el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores – SGSPAM.	Acciones implementadas en la ejecución del contrato para el Sistema de Gestión de Seguridad para la Prevención de Accidentes Mayores - SGSPAM.			5	No se realizan trabajos con sustancias que generen accidentes de gran impacto o tareas de alto riesgo			
20	Ley 1523 de 2012 Decreto 2157 De 2017	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se tiene documentado y en operación el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas (PGRDEPP)	Documento y evidencias de las actividades desarrolladas en el plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas (PGRDEPP)	5			Los soportes se adjuntan en el ítem 12 para el periodo relacionado			

21	Decreto 1072 del 2015	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	La empresa cuenta con los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de los diferentes factores de riesgo.	Documento de los sistemas de vigilancia epidemiológica, evidencias de implementación y seguimiento a indicadores.	5			Se adjunto el programa de SVE conservación auditiva. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL LEY 2050 DE 2020 EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 20223040040595 DE 2022											
No.	**Requisito Normativo**	**Periodicidad**	**Ítem a verificar**	**Evidencia**	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**	**PLAN DE ACCIÓN**		
					5	**0**	**5**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Resolución 40595 de 2022 Min Transporte, Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito) Ley 2251 de 2022 Decreto 1430 de 2022 Ley 2050 /2020 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Se cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	Documentos que soporten el diseño e implementación del PESV.	5			Se adjunto el documento del PESV. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			



2	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato y según cronograma	Competencia y plan anual de formación	Certificado y/o registros de capacitación.	5			Se adjunta charlas de seguridad del correspondiente mes para el periodo relacionado			
3	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	Documento y socialización del Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	5			Se adjunto documento solicitado de acuerdo con el contratista mayoritario dado que este tiene la mayor experiencia en la ejecución de estas actividades. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
4	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Mensual	Mantenimiento y control de vehículos y equipos	Certificado de mantenimientos preventivos, correctivos y de mejora. Cronograma.	5			Se adjuntan formatos de hojas de vida y mantenimiento de equipos para el periodo relacionado			
5	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Mensual (se entrega la totalidad de las listas de chequeo preoperacionales)	Inspecciones preoperacionales de vehículos y equipos	Registro de resultados de inspecciones preoperacionales, en caso de incumplimiento, el respectivo soporte de mantenimiento y/o reparación.	5			Se adjunta soporte de preoperacionales de equipos para el periodo relacionado			
6	Resolución 40595 de 2022 Decreto 1072 de 2015	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Se cuenta con el reporte del PESV a la entidad competente	Radicado o soporte de respectivo reporte.			5	N.A.			
7	Resolución 40595 de 2022	Al inicio del contrato	Auditoria Anual	Informe de auditoría y plan de mejoramiento.			5	N.A.			

	Decreto 1072 de 2015										

PROGRAMA DE RIESGO QUÍMICO											
No.	**Requisito Normativo**	**Periodicidad**	**Ítem a verificar**	**Evidencia**	**C**	**NC**	**NA**	**Observaciones**	**PLAN DE ACCIÓN**		
					5	**0**	**5**		**DESCRIPCION**	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato (solo una vez)	Se tiene elaborado un protocolo o guía que garantice la compra de productos químicos o agrícolas con el cumplimiento de fichas de datos de seguridad (16 ítem) y etiquetado del SGA	Documento, guía, protocolo o procedimiento	5			Se adjunto documento Matriz de riesgo químico. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
2	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	Se cuenta en la obra con los registros de implementación del Sistema globalmente armonizado SGA	Documento, Programa y registros o evidencias de implementación.	5			Se adjunta registro fotográfico en campo de SGA y kit de derrames Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
3	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Mensual y según cronograma	Los recipientes de las sustancias químicas usabas en la obra están etiquetados según el SGA	Informe de evidencia fotográfica o inspección de seguridad	5			Se adjunta registro fotográfico en campo de SGA y kit de derrames para el periodo relacionado			

4	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato (solo una vez)	La empresa realiza el transporte de mercancías peligrosas, según lo estipulado en el Decreto 1609 de 2002	Certificado o permiso para el transporte de mercancías peligrosas.			5	Se transportan en vehículos de trabajo cantidades mínimas del producto a utilizar y los vehículos cuentan con la señalización de la NFPA y kit de antiderrames			
5	Decreto 1609 de 2002	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	El personal que realiza el transporte de sustancias químicas cuenta con curso de transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (60 horas) y/o Actualización transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (20 horas)	Certificados de transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (60 horas) y/o Actualización transporte y manejo de Mercancías Peligrosas (20 horas)			5	Se transportan en vehículos de trabajo cantidades mínimas del producto a utilizar y los vehículos cuentan con la señalización de la NFPA y kit de antiderrames			
6	Decreto 1609 de 2002	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	El vehículo donde se transportan sustancias químicas peligrosas se encuentra señalizado con la clasificación de mercancías peligrosas, número de Naciones Unidas y número CAS.	Evidencia fotográfica de los vehículos			5	No se utilizan vehículos específicos para el transporte de sustancias químicas. Cuando la empresa requiere realizar intervenciones grandes, cuentan con un vehículo interno para el traslado y aplicación (emulsión asfáltica)			

7	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Trimestral	La empresa da cumplimiento a las obligaciones como destinatario de los químicos	Certificado de disposición de residuos	5			Se adjunto certificado ya que a empresa cuenta con un proveedor certificado por parte de la interventoría el cual realiza la recolección de los Respel y presenta su respectivo certificado de disposición final de residuos. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
8	Ley 55/1993, Ley 320/1996, Decreto 1496/2018 Art 33, Resolución 773 2021	Al iniciar el contrato y mensual según cronograma	Se cuenta con planes operativos normalizados para el control de derrames químicos	Documento, Procedimiento y registro de socialización	5			Se adjunto documento de PON y se socializa con el personal en las charlas de seguridad diarias en campo. Se adjuntaron en el informe No. 1 de julio			
9	Resolución 2467 de 2022 del Ministerio de Trabajo	Al iniciar el contrato y durante la ejecución del contrato	Se cuenta con el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Prevención y el Control del Riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable.	Controles implementados para el riesgo por Exposición a Sílice Cristalina Respirable según las mediciones ambientales.			5	N.A.			

PUNTAJE TOTAL	C	NC	NA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	**100%**		
CONVENCIONES: ≥ 90% - OPTIMO < 90% NO CUMPLE - SE GENERA INTERVENCIÓN INMEDIATA Y PLAN DE MEJORAMIENTO			
Nombre del Profesional -SST de la interventoría: **LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ**	**Nombre del Profesional SST del Contratista:** **FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES**		
C.C. 70.902.445	**C.C. 43.100.537**		
FIRMA 	**FIRMA** 		

GESTION SST INTERVENTORIA			
Programa	**Gestión de la Interventoría**	**Soporte**	**Anexo o Formatos**
Reglamento de higiene y seguridad industrial	Se observa en campo el cumplimiento del contratista en la divulgación y capacitación del reglamento de higiene y seguridad industrial de todo el personal que ingresa a obra a través de la inducción. El contratista presenta los certificados del cumplimiento del sistema de gestión en SST de las empresas que conforman el Consorcio Vialmed emitidos por las respectivas ARL. Se evidencia que en este periodo se realizan reunión del comité con los grupos conformados por las empresas del consocio se realiza la reunión del (COPASST Y COCOLA). Se realizo la elección de los trabajadores que conformaran la brigada de emergencia con la participación de la mayoría de personal vinculado al contrato.	 	Anexo 3.3.1
Medicina preventiva y del trabajo	A través de la revisión realizada por la interventoría a la documentación del contratista, se verifica el cumplimiento de la realización de los exámenes médicos de ingreso para el todo el personal nuevo y periódicos para el personal antiguo de la empresa. Se realiza revisión de las hojas de seguridad de los productos químicos manejados por el contratista. (ACPM, Asfalto, Emulsión, Propano, Gasolina, pinturas y solventes). Adicional se observa que las dichas fichas se encuentran publicadas en los camiones y son socializadas a los trabajadores.	 	Anexo 3.3.2

Entrega de dotación y elementos de protección personal	En los recorridos realizados por los diferentes frentes de obra en el periodo y mediante la revisión de documentación la interventoría ha evidenciado que el contratista realiza la respectiva entrega de dotación y elementos de protección personal a los trabajadores por frente de trabajo y se realizan cambios y reposiciones periódicamente de acuerdo a la necesidad.(algunas veces se ha presentado inconvenientes en la entrega de dotación al personal que ingresa por primera vez por el tallaje, lo cual retrasa entrega de la misma.	 	Anexo 3.3.3
Plan de Inducciones y Capacitaciones	Se evidencia que la gestión SST del contratista realiza la inducción en SST, donde se socializan los peligros y riesgos de las actividades desarrolladas, normas de seguridad, entre otros temas. Se evidencia por parte del contratista la capacitación mensual programada; así como también la charla de seguridad por frente del trabajo. En temas como: Socialización de accidentes, Pausas activas, Ausentismo e incapacidades, Señalización y demarcación, Prevención de caídas al mismo nivel, Orden y aseo, Uso de extintor, Riesgo locativo, Riesgo público, Primeros auxilios, Comportamiento seguro, Lesiones osteomusculares, PMT entre otros temas.	 	Anexo 3.3.4
Programa de Inspecciones	Durante los recorridos realizados por los diferentes frentes de obra y el acompañamiento por parte de la interventoría en las actividades de SST en obra, se verifica que el personal SST del contratista realizó el diligenciamiento de los formatos de inspección de áreas locativas, orden y aseo y preoperacionales establecidos para verificar el estado de los equipos, maquinas, herramientas y recursos de emergencia por frente.	 	Anexo 3.3.5
Orden y aseo frentes de trabajo	La interventoría evidencia un buen comportamiento por partes del contratista en orden y aseo en los frentes de trabajo		Anexo 3.3.6

Accidentes de trabajo – Ausentismo laboral	Durante el mes octubre se presentaron un total de 5 accidentes; el Consorcio Vialmed reporto 2 accidentes con 12 días de incapacidad, la empresa Estructuras y Pavimentos reporto 2 accidentes de trabajo con 40 días de incapacidad. Para las empresas IngeAlquipos se tuvo reporte de 1 accidente, con 7 días de incapacidad. Pavimentar no reporto accidentes de trabajo, sin embargo; adjunta la investigación de accidentes del mes de septiembre, dado que por las fechas de ocurrencia aún se está en el tiempo normativo para la misma y Procopal no se reportaron accidentes, se realiza el reporte a la ARL y realizan sus respetivas investigaciones y se socializan las lesiones aprendidas. Para un total de 59 días de ausentismo por accidentalidad laboral en el periodo.		Anexo 3.3.7
Afiliaciones sistema Seguridad Social	Desde la interventoría se realiza la revisión de las afiliaciones y planillas de seguridad social del personal de obra que ingresa y se encuentra activo; así como también la documentación de egreso periodo reportado.		Anexo 3.3.8

Anexo 3.3.9 Seguridad Social Consorcio Vial Med 2025

3.3.1.1. SEGUIMIENTO A LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PARA LA GESTIÓN, EN EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATISTA

La interventoría formula el plan de acción correspondiente a los ítems identificados con un NO CUMPLE (NC), y desarrollará a continuación el seguimiento para el cumplimiento de este.

NUMERAL	SUBCOMPONENTE	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO
11	Decreto 1072/2015 Art 2.2.4.6.25. Núm. 1 al 13 Parágrafo 1 y 2	Se realiza convocatoria para conformar la brigada, queda pendiente la conformación de la misma.	Se realiza la conformación de la brigada de emergencias

4. INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

4.1 CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

A continuación, se relaciona el personal del contratista asociado al proyecto, adicional se hace verificación del estado de afiliación de cada colaborador, los soportes de afiliación del personal nuevo y los documentos de paz y salvos de personal retirado están consignados en los anexos del numeral 3.3 de la gestión SST.

Tabla 83. Relación de personal vinculado al proyecto activo durante el mes de **octubre 2025.**

CONSORCIO VIALMED OCTUBRE 2025					
#	**NOMBRE**	**IDENTIFICACIÓN**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	NATALIA ANDREA CALDERÓN V.	1.017.209.286	DIRECTORA DE OBRA	4/07/2025	ACTIVO
2	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	1.053.842.729	RESIDENTE DE OBRA	21/07/2025	ACTIVO
3	CARLOS ARTURO TORO GÓMEZ	1.039.446.342	RESIDENTE DE OBRA	21/07/2025	ACTIVO
4	JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ GÓMEZ	71.584.643	RESIDENTE DE OBRA	14/07/2025	ACTIVO
5	VICTOR HUGO VARGAS RODRIGUEZ	70.694.470	LIDER COMUNICACIONES	21/07/2025	ACTIVO
6	WILLIAM HUMBERTO TOBÓN R.	98.507.113	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	21/07/2025	ACTIVO
7	WILSON ALBERTO SERNA CARO	15.264.416	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	21/07/2025	ACTIVO
8	SANTIAGO HENAO MEJÍA	1.007.253.881	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	7/07/2025	ACTIVO
9	SEBASTIÁN POSADA GARCÍA	1.036.633.297	PROFESIONAL PMT	21/07/2025	ACTIVO
10	ASNEY DEL CARMEN GARCÍA A.	50.909.309	PROFESIONAL SOCIAL	21/07/2025	ACTIVO
11	DORIELA AMPARO OSPINA M.	43.169.267	PROFESIONAL SOCIAL	21/07/2025	ACTIVO
12	ELSA MARÍA POLO CUELLO	1.082.862.061	PROFESIONAL AMBIENTAL	8/07/2025	ACTIVO
13	ANDRÉS FELIPE REYES MARÍN	1.059.703.439	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
14	JUAN PABLO OCHOA BENJUMEA	1.036.687.717	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
15	MANUEL FERNANDO DELGADO V.	1.036.669.125	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	23/07/2025	ACTIVO
16	DANIELA RESTREPO GONZÁLEZ	1.036.938.945	PROFESIONAL AMBIENTAL	21/07/2025	ACTIVO
17	ANGELA MARIA ARISTIZABAL G.	32.140.755	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	18/07/2025	ACTIVO
18	ALEJANDRO MANUEL RIQUEME G.	1.067.096.996	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
19	ARLEY SANTIAGO SUÁREZ M.	1.040.745.565	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	ACTIVO
20	MARIA ISABEL PÉREZ MONTES	1.128.271.702	TECNÓLOGA ADMINISTRATIVA	28/07/2025	ACTIVO
21	SAMUEL OROZCO NORIEGA	1.037.664.653	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	29/07/2025	ACTIVO
22	JAIME ALONSO VERA RODRIGUEZ	98.627.697	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
23	LUIS DANIEL DE LA ROSA VISBAL	1.082.942.983	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	10/08/2025	ACTIVO

24	ANDY ANAYA NIETO	1.073.972.876	RESIDENTE DE OBRA	4/08/2025	ACTIVO
25	FEDERICO AGUDELO MONCADA	1.004.519.462	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	10/08/2025	ACTIVO
26	EMI TATIANA ARBELAEZ ORTIZ	1.152.691.705	TÉCNICA ADMINISTRATIVA	10/08/2025	ACTIVO
27	ELKIN HERNANDO MORA PUERTA	98.495.085	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	11/08/2025	ACTIVO
28	LUISA MARIA BERMUDEZ CANO	1.000.538.542	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	15/08/2025	ACTIVO
29	LIZETH JULIANA ALZATE ARBOLEDA	1.037.073.873	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	14/08/2025	ACTIVO
30	DANIEL ACUÑA GOMEZ	1.065.009.003	RESIDENTE DE OBRA	16/08/2025	ACTIVO
31	KATERINE HERNANDEZ CHAURRA	4.554.382	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	19/08/2025	ACTIVO
32	SANTIAGO HIGUITA VALENCIA	1.037.776.106	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	ACTIVO
33	JOSE HILDEBRANDO MENA PEREZ	1.045.138.638	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	8/09/2025	ACTIVO
34	ANA MARIA ZAPATA CHAVERRA	1.152.224.687	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	18/09/2025	ACTIVO
35	ERIKA TATIANA MAZO ARREDONDO	1.020.434.105	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	11/09/2025	ACTIVO
36	CESAR AUGUSTO RIVAS	12.201.058	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	11/09/2025	ACTIVO
37	YESI KAROLINA CASTRO MARTINEZ	1.152.689.127	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	25/09/2025	ACTIVO
38	JHON JAMINTON BEDOYA GONZALEZ	1.216.713.015	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	30/09/2025	ACTIVO
39	KELLY DAYANA FORERO RODRIGUEZ	1.017.237.774	TECNÓLOGA SST	1/09/2025	ACTIVO
40	SANTIAGO GARCIA SALAZAR	1.001.477.477	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	30/07/2025
41	JUAN PABLO CASTAÑO GARCÍA	1.017.244.168	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	31/07/2025
42	LINA MARIA OCAMPO GÓMEZ	1.152.215.568	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	11/08/2025	25/08/2025
43	PIEDAD MARÍA CASTRO CELIS	43.108.123	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	24/07/2025	8/09/2025
44	DIANA MARCELA JARAMILLO R.	43.904.939	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	28/07/2025	11/09/2025
45	CLAUDIA MILENA COLLAZOS VILLA	43.145.348	TECNÓLOGA SST	28/07/2025	8/09/2025
46	MANUEL ALEJANDRO PANQUEBA R.	1.152.214.957	TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES	11/09/2025	1/10/2025
47	GISELA MARIA ATENCIA NAVARRO	1.066.513.588	TECNÓLOGA SST	29/07/2025	27/10/2025
48	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	43.100.537	PROFESIONAL SST	21/07/2025	31/10/2025

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS

#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	SIMON URAN JARAMILLO	1.025.885.254	AYUDANTE	18/07/2025	ACTIVO
2	YADIRL JENRY PEREA IBARGUEN	1.023.628.277	AYUDANTE	18/07/2025	ACTIVO
3	DIEGO CANO MANCO	1.000.885.407	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
4	JOSÉ MANUEL LOZANO HERNANDEZ	78.698.878	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
5	SERGIO EUSTAQUIO PEREA BENITEZ	10.199.838	LIGADOR	18/07/2025	ACTIVO

6	JAVIER MANUEL SOTO AVILEZ	10.998.746	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
7	JULIAN ALONSO GALEANO RIOS	1.001.226.018	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
8	FABER DUVAN QUIROZ CHAVARRIA	71.218.539	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
9	SEBASTIAN VELASQUEZ CUADRADO	1.216.720.990	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
10	JOSE NILSEN SALDARRIAGA	70.326.052	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
11	ALBEIRO ANTONIO MORA GONZALES	1.128.388.502	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
12	JHONIER ESTHITH CACERES C.	1.003.931.398	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
13	JOSE ARBEY DUQUE DUARTE	1.017.208.758	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
14	LEIMAR PEREZ AREIZA	1.044.150.803	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
15	JUAN DAVID VANEGAS	1.001.545.570	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
16	MARLON MARTINEZ SUAREZ	1.066.572.966	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
17	MIGUEL ANGEL GUERRA USUGA	1.037.628.049	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
18	VICTOR ALFONSO CORDOBA E.	1.027.954.723	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
19	ALBEIRO ANTONIO SUAREZ M.	8.438.422	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
20	JUAN DAVID PALACIOS QUINTO	1.193.232.928	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
21	JHONNY ALEXANDER LONDOÑO M.	98.698.748	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
22	LEIVER PADILLA OSORIO	11.166.305	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
23	JORGE ANDRES MOSQUERA GOMEZ	1.076.818.653	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
24	JUAN DAVID SANMARTIN CARDONA	1.017.191.272	OPERARIO DE EQUIPO	21/07/2025	ACTIVO
25	YOVANNY CUESTA ORTIZ	1.078.117.258	RASTRILLERO	21/07/2025	ACTIVO
26	FRANCISCO TOBON TOBON	1.026.147.320	LIGADOR	21/07/2025	ACTIVO
27	JHON JAIRO VALENCIA MORENO	1.077.436.701	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
28	EDUARDO ENRIQUE MESA R.	3.840.411	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
29	DEIVI PINO RAMIREZ	100.090.533	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
30	LAURA NARANJO RENDÓN	1.039.454.020	AUXILIAR SST	23/07/2025	ACTIVO
31	NELSON DE JESÚS SERNA	98.462.729	OPERARIO DE EQUIPO	14/11/2025	ACTIVO
32	ROBERTO CARLOS VASQUEZ LOPEZ	1.040.743.189	AYUDANTE	6/03/2025	ACTIVO
33	BREYMER SMITH ZAPATA	1.214.720.397	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
34	JAIME ALEXIS SERNA RIVERA	98.711.003	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
35	SEBASTIAN SANCHEZ	1.128.457.928	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
36	JOHAN STIVEN RENTERIA OSPINA	1.010.170.674	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
37	ALVARO AUGUSTO OSORIO GARCES	8.012.790	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
38	YAIR ANTONIO ASPRILLA VALENCIA	11.803.214	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
39	DIEGO ANDRES VILLA RIOS	98.713.744	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
40	BRAYAN DE JESUS QUINTO P.	1.216.729.783	LIGADOR	28/07/2025	ACTIVO
41	ALAIN DE JESUS JULIO GARCIA	1.074.712.086	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
42	JOSE BERNARDO CORREA CUAVAS	1.074.717.158	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
43	OSCAR DARIO ZAPATA ORREGO	98.653.743	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

44	LUIS CARLOS MONSALVE	1.129.532.636	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
45	JOHNA ESTIBEN QUINTERO FONNEGRA	98.703.083	RASTRILLERO	28/07/2025	ACTIVO
46	JAIME ALBERTO CHICA PULGARIN	1.128.415.899	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
47	ADELIS MONTERO MEDINA	1.712.248	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
48	PEDRO LUIS ROBLES CHARRIS	1.082.405.869	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
49	LUIS EMIRO MOSQUERA OREJUELA	82.360.601	RASTRILLERO	28/07/2025	ACTIVO
50	SANTIAGO MUÑOZ RODRIGUEZ	1.020.492.897	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
51	ALEXANDER MOSQUERA MORENO	1.146.443.436	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
52	JHON JAIME HERRERA TABORDA	15.511.716	ENCARGADO DE CUADRILLA	29/07/2025	ACTIVO
53	JOSE ALE VILLALOBOS HERNANDEZ	1.063.149.719	AYUDANTE	29/07/2025	ACTIVO
54	DAVID ESNEIDER ZAPATA ARBOLEDA	1.001.249.839	AYUDANTE	29/07/2025	ACTIVO
55	VICTOR ALFONSO MEJIA MARIN	1.096.188.968	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
56	CRISTIAN ALEJANDRO JIMENEZ CASTAÑO	1.099.552.574	AYUDANTE	21/07/2025	ACTIVO
57	JUAN CARLOS ORTEGA	1.115.747.149	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
58	ELKIN DAVID CASIANNI OZUNA	1.101.497.577	LIGADOR	1/08/2025	ACTIVO
59	JAIDER DAVID PEREZ LEÓN	1.063.289.035	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
60	OMAR ALEJANDRO MONROY	1.121.921.526	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
61	JOSE DAVISD QUEJADA BOHORQUEZ	1.033.989.402	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
62	JHOSUA MIRA RENDÓN	1.000.554.344	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
63	CARLOS ANDRES CARMONA	1.037.674.225	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
64	EDISON DE JESUS SANCHEZ HINCAPIE	15.512.265	AYUDANTE	1/08/2025	ACTIVO
65	JOSE ORLANDO MENDOZA	1.150.177	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
66	ESNEIDER CERQUERA ESCUDERO	1.023.624.189	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
67	JOSE ANGEL JULIO SILGADO	1.003.654.788	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
68	JHOAN ALBERTO HIGUITA HERNANDEZ	1.039.701.632	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
69	JORLETH CONTRERAS ARRIETA	1.044.911.952	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
70	HUGO DE JESUS RIOS FRANCO	71.630.405	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
71	WILMAR ALEXANDER SANCHEZ O.	1.017.122.975	AYUDANTE	4/08/2025	ACTIVO
72	JOSE RUFINO MOSQUERA M.	71.740.265	RASTRILLERO	20/08/2025	ACTIVO
73	LUIS FELIPE ARBOLEDA JARAMILLO	1.037.647.785	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
74	DEILER SANCHEZ ALDANA	1.028.009.980	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
75	YEFERSON CORREA SALAZAR	1.214.733.258	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
76	JAIR MIGUEL MARTINEZ	1.046.532.090	AYUDANTE	25/08/2025	ACTIVO
77	MARICELLY RINCON USUGA	1.001.610.190	AYUDANTE VIAL	25/08/2025	ACTIVO
78	ANA YARLENY AGUIRRE GALEANO	21.590.352	AUXILIAR VIAL	26/08/2025	ACTIVO
79	JAIME ERNEY CARMONA ZAPATA	1.045.422.465	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
80	HECTOR DUVAN VELEZ DURAN	1.152.468.090	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
81	JAVIER ENRIQUE MEJIA HERNANDEZ	98.615.271	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO
82	YOHANDRIZ JOSE ACOSTA MONTERO	6.105.357	AYUDANTE	26/08/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

83	JUAN FERNADO CUESTA CORDOBA	4.809.323	RASTRILLERO	28/08/2025	ACTIVO
84	JAIME ALEXIS SERNA RIVERA	98.711.003	RASTRLLERO	11/008/2025	ACTIVO
85	ALVEIRO DE JESUS GALLEGO V.	98.662.317	LIGUERO	11/008/2025	ACTIVO
86	EDGAR ELIECER JIMENEZ	98.713.483	AYUDANTE	11/008/2025	ACTIVO
87	YONATAN ORLANDO PADILLA C.	1.133.839.901	AYUDANTE	11/008/2025	ACTIVO
88	WILSON KEVIN CORDOBA CAICEDO	1.077.424.059	AYUDANTE	14/08/2025	ACTIVO
89	RUBEN DARIO DURANGO ESPINAL	1.020.467.610	AYUDANTE	14/08/2025	ACTIVO
90	TONY ENRIQUE URUETA POLO	1.045.720.703	AYUDANTE	14/08/2025	ACTIVO
91	KANER FRANCISCO AGUALIMPIA R.	1.017.176.467	AYUDANTE	14/08/2025	ACTIVO
92	JULIAN GOMEZ MAZO	8.161.526	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
93	JOSE DANIEL MEJIA PALENCIA	1.100.550.956	AYUDANTE	14/08/2025	RETIRADO
94	YILDERMAN ALEXANDER BERRIO C.	1.214.716.772	AYUDANTE	15/09/2025	ACTIVO
95	JOSE ULVER BETANCOURT B.	71.734.095	RASTRILLERO	15/09/2025	ACTIVO
96	CARLOS ALBERTO AGUIRRE PEREZ	1.020.410.888	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
97	DANIEL CADAVID GALLEGO	1.020.484.822	INGENIERO AUXILIAR	19/09/2025	ACTIVO
98	NICOLAS DE JESÚS CATAÑO	70.320.792	TORNILLLERO	19/09/2025	ACTIVO
99	DIEGO ALBERTO CEBALLOS	15.512.745	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
100	DINO JOSE CUADRADO GONZALES	71.938.894	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
101	YERSON FERNEY GUTIERRES J.	1.006.903.799	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
102	LEIDY YULIANA HERRERA SALAZAR	1.152.689.377	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
103	EDINSON DAVID JIMENEZ MARQUEZ	71.194.796	LIGUERO	19/09/2025	ACTIVO
104	JOSE FABIAN MORENO ROBLEDO	82.384.073	ENCARGADO DE OBRA	19/09/2025	ACTIVO
105	JOSE RUFINO MOSQUERA M.	71.740.265	RASTRILLERO	19/09/2025	ACTIVO
106	MIGUEL ANGEL PEREA HURTADO	1.037.628.969	RASTRILLERO	19/09/2025	ACTIVO
107	FREDY ALEXANDER RUIZ POLO	1.039.696.122	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
108	ERISON DAVID VELASQUEZ C.	8.177.915	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
109	ISAIAS TOBÓN TOBÓN	15.383.379	OPERADOR COMPRESOR	26/09/2025	ACTIVO
110	EDWIN ANDRES BARRERA TIRADO	70.856.453	OPERADOR	19/09/2025	ACTIVO
111	OMAR CASTAÑO GONZALEZ	8.415.304	OPERADOR FINISHER	19/09/2025	ACTIVO
112	JOSE FAUSTINO CATAÑO CATAÑO	1.035.222.314	OPERADOR	19/09/2025	ACTIVO
113	JOSE DE LA CRUZ CORDOBA H.	11.710.424	OPERADOR FRESADORA	19/09/2025	ACTIVO
114	LUIS EDUARDO LOPEZ ZAPATA	1.035.302.720	OPERADOR MINICARGADOR	19/09/2025	ACTIVO
115	ELSON EMIRO MOSQUERA M.	8.236.097	TORNILLERO	19/09/2025	ACTIVO
116	RAFAEL ANGEL RENDÓN SANCHÉZ	15.325.482	OPERADOR VIBRO	19/09/2025	ACTIVO
117	JULIAN ANDRES AGUDELO RUIZ	1.039.692.949	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
118	FERNANDO JOSE ARTEAGA A.	1.072.522.718	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
119	BAYRON JOHAN BERRIO MARQUE	1.017.135.917	RASTRILLERO	19/09/2025	ACTIVO
120	NOLASCO ANTONIO LOPEZ GALEANO	3.419.768	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
121	JOHAN JAVIER ROBLES CONTRERAS	1.127.665.064	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
122	CARLOS ARTURO SANCHEZ H.	1.128.084.645	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
123	BRAHIAM STIVEN SINITAVE JIMENEZ	1.234.992.524	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
124	ALEJANDRO CEBALLOS GOEZ	1.152.444.446	AYUDANTE	19/09/2025	ACTIVO
125	RONAL DANIEL ECHAVARRIA ARIAS	1.020.495.402	AYUDANTE	25/09/2025	ACTIVO
126	JOHAN SEBASTIAN TORO RUIZ	1.020.460.916	OFICIAL	23/09/2025	ACTIVO

127	ANDRES FELIPE GONZALES OSPINA	1.020.445.010	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
128	ANGELA MARIA MOSQUERA M.	71.768.060	ENCARGADA DE OBRA	26/09/2025	ACTIVO
129	ARLEY ALBERTO AGUDELO C.	1.000.406.333	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
130	BERNANDO ANTONIO CADAVID S.	71.678.485	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
131	CARLOS ALEXIS PEREZ ANGEL	1.040.745.850	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
132	CARLOS ANDRES MOSQUERA M.	1.128.471.904	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
133	CRUZ EMILIO BENITEZ PEREA	1.128.084.419	RASTRILLERO	26/09/2025	ACTIVO
134	EVANGELINA MORENO RENTERIA	32.258.247	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
135	JAIME ALBERTO GRISALES R.	1.128.400.129	LIGUERO	26/09/2025	ACTIVO
136	JHONIER SAMIR BONILLA BERRIO	1.193.030.204	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
137	JULIO MORENO MURILLO	11.545.067	AYUDANTE	26/09/2025	ACTIVO
138	LUIS MIGUEL SUAREZ HERNANDEZ	1.113.371.694	RASTRILLERO	26/09/2025	ACTIVO
139	MANUELA GUERRA SANCHEZ	1.037.662.364	INGENIERA AUXILIAR	26/09/2025	ACTIVO
140	KELLYS VANESA PERNET PACHECO	1.071.348.328	TÉCNOLOGA SST	29/09/2025	ACTIVO
141	GABRIEL JAIME AGUIRRE MORENO	1.038.336.265	AYUDANTE	1/10/2025	ACTIVO
142	DAIRO DE JESUS DUQUE VELASQUEZ	98.458.767	AYUDANTE	6/10/2025	ACTIVO
143	GERMIN ANTONIO MOSQUERA M.	71.364.045	LIGUERO	6/10/2025	ACTIVO
144	JOHNAR ALEXANDER LEAL FLOREZ	1.018.228.704	AYUDANTE	6/10/2025	ACTIVO
145	JUAN HUMBERTO LONDOÑO URREGO	98.607.191	AYUDANTE	7/10/2025	ACTIVO
146	BRAYAN ALEXIS SUAREZ OBANDO	1,020,485,970	AYUDANTE	7/10/2025	ACTIVO
147	JUAN DAVID MESA BEDOYA	1,020,487,196	AYUDANTE	7/10/2025	ACTIVO
148	LEIDER CAMILO MOSQUERA M.	1,027,800,068	AYUDANTE	7/10/2025	ACTIVO
149	JHON FREDY SAENZ RUIZ	1,040,754,381	AYUDANTE	7/10/2025	ACTIVO
150	JHOAN SEBASTIAN VALOYES	1,020,223,926	AYUDANTE	7/10/2025	ACTIVO
151	RICHARD ALEXANDER PATIÑO A.	1.152.706.052	COMPRESORISTA	9/10/2025	ACTIVO
152	EDUARDO DE JESUS URIBE CASTAÑEDA	71.704.434	AYUDANTE	20/10/2025	ACTIVO
153	JHON DEIVYS CARO SALCEDO	1.002.318.088	AYUDANTE	21/07/2025	31/07/2025
154	WILMER DURANGO OQUENDO	1.001.669.589	AYUDANTE	28/07/2025	31/07/2025
155	FRANCISCO HINESTROZA M.	101.718.080	AYUDANTE	28/07/2025	30/07/2025
156	JAVIER ESTIVEN SOSA PEREZ	1.018.228.217	AYUDANTE	11/008/2025	15/09/2025
157	JHORMAN ANDRES VELASQUEZ O.	1.146.440.589	AYUDANTE	11/008/2025	30/08/2025
158	WILDER ANDRES PIEDRAHITA R.	1.007.054.147	AYUDANTE	11/008/2025	
159	ALFONSO RAMIREZ ISAZA	70.137.414	AYUDANTE	11/008/2025	12/08/2025
160	GALEANO RIOS DANIEL SANTIAGO	1.001.226.017	RASTRLLERO	14/08/2025	24/09/2025
161	CALLE CASTILLO JOSE ALDAIR	1.066.749.749	LIGERO	28/07/2025	11/08/2025
162	VELASQUEZ RESTREPO SERGIO A.	1.036.678.702	AYUDANTE	14/08/2025	
163	JOHAN FABIAN ROMERO HERRERA	1.006.700.443	AYUDANTE	21/07/2025	31/07/2025
164	ARNOL ARLEY ARANGO PARRA	1.035.234.678	AYUDANTE	21/07/2025	1/08/2025

165	STIVEN CHAVERRA MAZO	1.000.654.446	AYUDANTE	21/07/2025	1/08/2025
166	SEBASTIAN MURILLO RIVAS	1.007.053.871	AYUDANTE	21/07/2025	25/08/2025
167	REINALDO LOPERA	3.663.335	AYUDANTE	21/07/2025	1/08/2025
168	LUIS CARLOS CASTILLO QUEJADA	1.017.207.858	AYUDANTE	28/07/2025	31/07/2025
169	JOSE LUIS ZUÑIGA BEDOYA	1.001.901.166	AYUDANTE	4/08/2025	21/08/2025
170	CRISTIAN JOB PADILLA CALLE	1.193.127.048	AYUDANTE	4/08/2025	6/08/2025
171	BRAYAN USUGA GUISAO	1.001.133.444	AYUDANTE	4/08/2025	6/08/2025
172	JHON ALEXANDER SEPULVEDA A.	1.148.698.123	AYUDANTE	26/08/2025	26/08/2025
173	LUIS ALBERTO PANIAGUA SERNA	1.128.403.289	AYUDANTE	26/08/2025	19/09/2025
174	JOSE DE LOS SANTOS ISAZA ISAZA	1.017.122.511	AYUDANTE	26/08/2025	24/09/2025
175	MAURICIO ROMAÑA CORDOBA	1.038.807.107	AYUDANTE	25/08/2025	26/08/2025
176	JHON MARIO CONTRERAS	1.003.308.840	AYUDANTE	4/08/2025	6/08/2025
177	DILAN YESID LEMUS PADILLA	1.007.210.881	LIGADOR	21/07/2025	20/09/2025
178	JUAN ESTEBAN MURILLO ALVAREZ	1.045.497.637	AYUDANTE	21/07/2025	11/09/2025
179	ALDAIR JOSE CALLE CASTILLO	1.066.749.749	LIGADOR	28/07/2025	11/08/2025
180	JEIMAR QUICENO HERNANDEZ	1.216.717.092	AYUDANTE	25/08/2025	11/09/2025
181	MATEO MOSQUERA MOSQUERA	1.025.648.141	AYUDANTE	28/07/2025	ACTIVO
182	NEIVER CAMILO MUÑOZ OBANDO	1.006.843.648	AYUDANTE	7/10/2025	ACTIVO

PAVIMENTAR

#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	ALONSO DE JESÚS PANIAGUA Z.	71.709.895	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
2	CARLOS MARIO RIVERA VILLA	71.696.781	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
3	DIEGO LUIS LÓPEZ PÉREZ	1.068.807.795	RASTRILLERO	23/07/2025	ACTIVO
4	GILBERTO DE JESÚS COLORADO T.	98.534.353	ENCARGADO DE CUADRILLA	23/07/2025	ACTIVO
5	JESÚS ALBERTO FLORES CASTILLO	PPT 3.489.433	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
6	LUIS ENOBER PARRA SOSA	70.631.869	RASTRILLERO	23/07/2025	ACTIVO
7	SANDRO ALBERTO URIBE LONDOÑO	8.014.121	LIGADOR	23/07/2025	ACTIVO
8	VICTOR MANUEL GALLO GUTIERREZ	98.504.348	AYUDANTE DE OBRA	23/07/2025	ACTIVO
9	OSCAR DE JESÚS GÚZMAN	70.851.766	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
10	JHON MARIO VELASQUEZ	98.572.408	RASTRILLERO	19/08/2025	ACTIVO
11	WILMAN GUISAO	1.020.445.841	TORNILLERO	19/08/2025	ACTIVO
12	DANIEL DANILO PAYA RES	1.066.741.466	LIGUERO	19/08/2025	ACTIVO
13	DARY NEL ORTEGA	1.069.463.280	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
14	GUSTAVO QUINTANA	98.700.124	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
15	JONATAN ALEICES MAYA	1.037.594.243	RASTRILLERO	19/08/2025	ACTIVO
16	NAISIR PADILLA	1.102.874.885	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
17	JHAN CARLO ZAPATA	1.036.134.685	AYUDANTE DE OBRA	19/08/2025	ACTIVO
18	ALEJANDRO MORALES GALLEGO	1.152.687.179	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO

19	JORGE ELIECER ALVAREZ MORENO	1.128.480.832	AYUDANTE DE OBRA	8/08/2025	ACTIVO
20	LEÓN DARÍO QUICENO MARIN	1.148.144.870	AYUDANTE DE OBRA	13/08/2025	ACTIVO
21	DEIMER MANUEL OVIEDO SIMANCA	1193044969	OPERADOR TERMINADORA	19/08/2025	ACTIVO
22	ALEXANDER CHARRY MENDEZ	98504477	OPERADOR FRESADORA	19/08/2025	ACTIVO
23	WILLIAM DE JESUS QUINTERO R.	15428462	OPERADOR COMPACTADOR	19/08/2025	ACTIVO
24	JOHN FREDY RAMIREZ ZAPATA	15537255	OPERADOR COMPRESOR	19/08/2025	ACTIVO
25	FABIAN MENDOZA GONZALES	1.148.194.201	AYUDANTE DE OBRA	26/08/2025	ACTIVO
26	LEONARDO CONTRERAS VALBUENA	10.187.064	OPERADOR VIBRO	11/09/2025	ACTIVO
27	ANDRES GEOVANNY RODAS GOMÉZ	1.038.767.337	OPERADOR MINICARGADOR	11/09/2025	ACTIVO
28	SANDRA MILENA FORERO G.	21.849.842	CONTROLADOR VIAL	12/09/2025	ACTIVO
29	DANIELA BONILLA CIFUENTES	1.001.443.208	CONTROLADOR VIAL	13/09/2025	ACTIVO
30	YOSER FARID CARVAJAL ARROYO	1.028.280.313	AYUDANTE DE OBRA	23/09/2025	ACTIVO
31	ALEXANDER DE JESUS ZAPATA G.	8.103.894	CONDUCTOR IMPRIMADOR	3/10/2025	ACTIVO
32	ELIAS VALDERRAMA	84.082.977	OPERADOR MAQUINARIA	3/10/2025	ACTIVO
33	FREDY ALBERTO ZAPATA RIVERA	15.514.835	OPERADOR COMPACTADOR	3/10/2025	ACTIVO
34	JHON EDWIN ENCIZO GONZALEZ	3.132.182	CONDUCTOR DE VEHICULO	3/10/2025	ACTIVO
35	JOHN EDISON HENAO	1.020.418.695	CONDUCTOR	3/10/2025	ACTIVO
36	JOHN FREDY VILLA SEPULVEDA	71.379.552	OPERADOR MAQUINARIA	3/10/2025	ACTIVO
37	JORGE HUGO ARIAS GOMEZ	71.780.247	OPERADOR MAQUINARIA	3/10/2025	ACTIVO
38	NELSON DE JESUS ZAPATA C.	98.503.312	AYUDANTE	3/10/2025	ACTIVO
39	ROLANDO MESA YEPES	10.172.859	OPERADOR VIBRO	3/10/2025	ACTIVO
40	WILLY EISNER SANCHEZ ZAPATA	1.017.143.394	CONDUCTOR DE VEHICULO	3/10/2025	ACTIVO
41	YEISON FERNEY CADAVID RIVERA	1.035.422.342	AYUDANTE	3/10/2025	ACTIVO
42	ALVARO RONALDO SALAS	1.098.643.884	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	29/10/2025	ACTIVO
43	ELIECER SERVANDO ARIAS CORDOBA	1.017.165.610	AYUDANTE	29/10/2025	ACTIVO
44	EDISON DARIO ISAZA CHAVEZ	75.075.687	RESIDENTE AMBIENTAL	29/10/2025	ACTIVO
45	JOSE EMILIO HENAO PATIÑO	71.690.571	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	29/10/2025	ACTIVO
46	OMAR ALEJANDRO MONROY HUMOA	1.121.921.526	AYUDANTE	29/10/2025	ACTIVO
47	MATEO MOSQUERA MOSQUERA	1.025.648.141	AYUDANTE	29/10/2025	ACTIVO

INGEALQUIPOS

#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	ENESTEBANA BELLO VELASQUEZ	1.045.420.278	CONTROL. DE TRANSITO	19/08/2025	ACTIVO
2	YANETH ORTIZ MANJARRREZ	1.002.488.066	CONTROL, DE TRANSITO	23/08/2025	ACTIVO
3	LEIDIANA PONCE	42.783.825	CONTROL. DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
4	LEIDY VIVIANA ZAPATA VELEZ	1.128.443.316	CONTROL. DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
5	LEIDY JOHANA USUGA USUGA	1.017.208.034	CONTROLA, DE TRANSITO	22/08/2025	ACTIVO
6	SIGIFREDO ALONSO CORREA C.	15.508.295	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
7	CARLOS JULIAN ENRIQUE MAYA	1.123.318.880	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO

8	DANIEL STIVEN LONDOÑO J.	1.017.259.833	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
9	JHON JAIRO LONDOÑO LONDOÑO	15.295.849	RASTRILLERO	21/08/2025	ACTIVO
10	SERGIO ARLEY LONDOÑO ROLDAN	71.318.418	RASTRILLERO	21/08/2025	ACTIVO
11	JHON FREDY CRUZ HERNANDEZ	1.006.846.636	AYUDANTE	21/08/2025	ACTIVO
12	DIANA JIMENA GALVIS CAICEDO	1.020.402.479	CONTROL. DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
13	PAOLA NOHEMI AGUIRRE LOPÉZ	43.553.681	CONTROLADOR DE TRANSITO	27/08/2025	ACTIVO
14	OSCAR ELIAS MORALES CORDOBA	98.637.028	CONDUCTOR VEHICULO	28/08/2025	ACTIVO
15	ALBEIRO CAMACHO PEÑA	6.833.941	AYUDANTE	1/09/2025	ACTIVO
16	WIKLLERMAN YHOSNEIDER GALINDO	1.067.974.486	AYUDANTE	1/09/2025	ACTIVO
17	ALEX MARTINEZ HOYOS	6.030.581	AYUDANTE	1/09/2025	ACTIVO
18	CARLOS ARTURO MAZO VERA	70.578.852	OFICIAL	1/09/2025	ACTIVO
19	JORGE IVAN DE JESUS MONSALVE E.	98.516.120	MAESTRO DE OBRA	1/09/2025	ACTIVO
20	SIGIFREDO SOTO SERNA	1.146.442.473	AYUDANTE	1/09/2025	ACTIVO
21	FABIO NELSON VALENCIA CUARTAS	94.063.912	CONDUCTOR	1/09/2025	ACTIVO
22	REINEL SNEIDER ZAPATA MARTINEZ	1.088.293.810	OPERADOR	3/09/2025	ACTIVO
23	JUAN CARLOS BARANOA CABRERA	1.102.582.482	OFICIAL	8/09/2025	ACTIVO
24	JUAN CAMILO CASTILLO ROJAS	1.193.524.589	AYUDANTE	8/09/2025	ACTIVO
25	LUZ ANDREA VILLAMIL JARAMILLO	43.588.827	CONTROLA. DE TRANSITO	8/09/2025	ACTIVO
26	DOUGLAS BERNARDO BRISEÑO G.	956.732	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
27	EYVER CUESTA OVIEDO	1.064.188.782	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
28	ROBERT ALEX JIMENEZ ALAMO	6.600.073	ALMACENISTA	10/09/2025	ACTIVO
29	JESUS DAVID LASSO GONZALES	1.066.724.102	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
30	JHON JAIRO MENDOZA HOYOS	1.063.300.621	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
31	GERMAN OSORIO MAQUILON	1.045.495.924	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
32	JUAN ANDRES PALACIOS E.	1.062.428.666	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
33	ALBERT RINCON BRAVO	4.583.251	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
34	YAIR ANDRES TORRES SALGADO	1.193.130.351	AYUDANTE	10/09/2025	ACTIVO
35	NANCY ESTHER DIAZ BOLAÑOS	50.927.318	RESIDENTE SST	10/09/2025	ACTIVO
36	ANGELA BEATRIZ GONZALES R.	1.077.439.947	CONTROLA.DE TRANSITO	10/09/2025	ACTIVO
37	JULIANA ANDREA DIAZ ASPRILLA	1.013.460.771	CONTROLA.DE TRANSITO	10/09/2025	ACTIVO
38	ANLLELY JINETH CONTRERAS ARCILA	1.000.085.608	CONTROLA. DE TRANSITO	11/09/2025	ACTIVO
39	SEBASTIAN GALLEGO ECHAVARRIA	1.020.471.584	AYUDANTE	12/09/2025	ACTIVO
40	MARIA JOHANA SARABIA	1.035.869.424	CONTROLA. DE TRANSITO	17/09/2025	ACTIVO
41	VALERIA CALDERON QUICENO	1.023.625.267	CONTROLA. DE TRANSITO	19/09/2025	ACTIVO
42	LAURA MELISSA HERNANDEZ H.	1.001.738.349	CONTROLA. DE TRANSITO	18/09/2025	ACTIVO
43	YEIDI ESTEFANI VELEZ GAVIRIA	1.000.884.469	CONTROLA.DE TRANSITO	18/09/2025	ACTIVO
44	BRAYAN STIVEN ANZOLA NAVARRO	1.193.075.336	AYUDANTE	20/09/2025	ACTIVO
45	LUIS MANUEL GUERRERO TEJADA	8.166.079	AYUDANTE	20/09/2025	ACTIVO

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

46	JUAN CAMILO ARBOLEDA GUERRA	1.011.392.291	AYUDANTE	23/09/2025	ACTIVO
47	JHON JADER CARDENAS OLIVEROS	1.001.417.611	AYUDANTE	23/09/2025	ACTIVO
48	YOVANI ANTONIO GUAPACHA SERNA	98.622.835	AYUDANTE	23/09/2025	ACTIVO
49	MAIRA ALEJANDRA MESA ACEVEDO	1.036.685.284	AYUDANTE	24/09/2025	ACTIVO
50	JORGE ERNESTO SUAREZ B.	1.036.640.080	ECARGADO DE OBRA	24/09/2025	ACTIVO
51	JUAN SEBASTIAN TAPASCO GUISAO	1.035.440.838	AYUDANTE	24/09/2025	ACTIVO
52	JONATAN ESTIBEN HERNANDEZ GIL	1.035.392.468	CONTROLA. DE TRANSITO	6/10/2025	ACTIVO
53	JORGE LEÓN MAZO ZULETA	71.623.097	OPERADOR RETRO	9/10/2025	ACTIVO
54	DUVAN ANDRES VASQUEZ AGUDELO	1.040.738.161	OPE. MINICARGADOR	9/10/2025	ACTIVO
55	JUAN CARLOS BRICEÑO HERNANDEZ	5.070.644	OFI, DE CONSTRUCCIÓN	23/10/2025	ACTIVO
56	RUBÉN DARÍO OJEDA MEJÍA	78.752.054	AYUDANTE	23/10/2025	ACTIVO
57	JHORMAN JOSÉ RODRIGUEZ LOBO	1.002.493.204	AYUDANTE	23/10/2025	ACTIVO
58	ANDRES MAURICIO CATAÑO RICO	71.267.874	OFI.DE CONSTRUCCIÓN	24/10/2025	ACTIVO
59	FREDY ENRIQUE VERA GONZALES	6.164.971	OFI.DE CONSTRUCCIÓN	24/10/2025	ACTIVO
60	ANDREA ESTEFANIA HERNANDEZ O.	1.017.206.875	CONDUCTORA	23/10/2025	ACTIVO
61	BRAYAN STIVEN ANZOLA NAVARRO	1.193.075.336	AYUDANTE	30/10/2025	ACTIVO
62	JULIAN PARRA AGUDELO	1.047.996.529	AYUDANTE	30/10/2025	ACTIVO
63	WANDER DAVID LAMBRANO RAMIREZ	1.002.013.218	AYUDANTE	31/10/2025	ACTIVO
64	DUBAN ADRES VELASQUEZ GRISALES	1.216.716.352	AYUDANTE	31/10/2025	ACTIVO
65	NATALIA ANDREA JIMENEZ GUERRA	1.020.439.288	CONTROL. DE TRANSITO	27/08/2025	28/08/2025
66	NEIVER CAMILO MUÑOZ OBANDO	1.006.843.648	AYUDANTE	21/08/2025	29/09/2025
67	JAIME ALBERTO RESTREPO C.	98.711.536	AYUDANTE	21/08/2025	16/09/2025
68	HÉCTOR DE JESÚS ARRIETA R.	79.681.977	CONTROLA.DE TRANSITO	19/08/2025	7/10/2025
69	GERALDO CHIRINOS	4.925.682	CONTROLA. DE TRANSITO	19/08/2025	7/10/2025
70	DEISI YURANI ACEVEDO BENITEZ	1.042.092.241	CONTROLA. DE TRANSITO	12/09/2025	17/10/2025
71	CARLOS MARIO MONTOYA OSSA	8126125	CONDUCTOR VEHICULO	26/08/2025	15/10/2025
72	JOHAN ANDRÉS SANCHÉZ RAMÍREZ	1.020.466.736	CONTROL.DE TRANSITO	6/10/2025	24/10/2025
73	RUTH MERY AGUIRRE LOPEZ	43.553.135	CONTROL. DE TRANSITO	26/08/2025	29/10/2025

PROCOPAL

#	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	LUIS FERNANDO TEJADA GOMÉZ	98.765.349	CONDUCTOR	8/09/2025	ACTIVO
2	JOSE LIBARDO HINCAPIE ISAZA	70301388	AYUDANTE	8/09/2025	ACTIVO
3	CARLOS MARIO CARDONA	98654257	OPERADOR	8/09/2025	ACTIVO
4	CARLOS ALBERTO LOPERA	15505019	ENCARGADO	8/09/2025	ACTIVO
5	ALEXANDER ALVARADO RAMIREZ	85443499	SUPERNUMERARIO	8/09/2025	ACTIVO
6	EVELIO CESAR AYALA PEREZ	98467315	LIGADOR	8/09/2025	ACTIVO
7	JAVIER NICOLAS LOPEZ BARRERA	17973409	ENCARGADO	8/09/2025	ACTIVO
8	LUIS MIGUEL YEPES RAMIREZ	1035916722	AYUDANTE	8/09/2025	ACTIVO
9	JHON ESTEBAN AVENDAÑO GUERRA	1193298224	AYUDANTE	8/09/2025	ACTIVO
10	ROBINSON VANEGAS OSORIO	1035422151	CONDUCTOR	8/09/2025	ACTIVO
11	MARIO ENRIQUE GUERRERO NAVAS	73102718	RASTRILLERO	8/09/2025	ACTIVO

12	FERNEY FERNANDO OVIEDO A.	1104420553	RASTRILLERO	8/09/2025	ACTIVO
13	JULIO ENRIQUE SOTO ARIAS	8046640	OPERADOR HYSTER	8/09/2025	ACTIVO
14	OSCAR ALBERTO PEREZ ROMAN	15530323	OPERADOR VIBRO	8/09/2025	ACTIVO
15	GUSTAVO ADOLFO RAMOS BERRIOS	1072525314	AYUDANTE	8/09/2025	ACTIVO
16	JUAN ENRIQUE LONDOÑO GEORGE	3.483.416	OPERADOR FINISHER	8/09/2025	ACTIVO
17	JOSE WALTER PINZON CALDERON	70.324.759	COND. CARRO IMPRIMADOR	8/09/2025	ACTIVO
18	JUAN CARLOS VALENCIA	75.075.422	CONDUCTOR FRESADORA	8/09/2025	ACTIVO
19	SEBASTIAN DE LA CRUZ OSPINA G.	1.039.400.261	OPERADOR RETROEXCA.	16/09/2025	ACTIVO
20	ANDRÉS LUJAN HENAO	71.388.046	AYUDANTE	17/09/2025	ACTIVO
21	HÉCTOR AUGUSTO GONZALES VELEZ	98.488.507	OPERADOR IMPRIMADOR	17/09/2025	ACTIVO
22	PEDRO LUIS RUA GUTIERREZ	70.541.121	AYUDANTE	22/09/2025	ACTIVO
23	WILSON ADOLFO SANCHEZ PALACIO	98.577.310	OPERADOR	22/09/2025	ACTIVO
24	CRISTIAN ARANGO VELEZ	1.007.242.278	CONDUCTOR CAMIÓN	29/09/2025	ACTIVO
25	JAIME HUMBERTO GOMÉZ HERRERA	15.513.087	CONDUCTOR	29/09/2025	ACTIVO
26	JHON MARIO ARANGO HERRERA	3.481.863	OPERADOR FRESADORA	29/09/2025	ACTIVO
27	ALBEIRO DE JESUS AGUDELO LOPÉZ	71.141.264	LIGADOR	29/09/2025	ACTIVO
28	ANDRÉS FELIPE ECHEVERRI R.	1.128.478.406	OPERADOR	29/09/2025	ACTIVO
29	CESÁR FERNEY FRANCO GOMÉZ	71.221.980	ENCARGADO DE OBRA	29/09/2025	ACTIVO
30	CRISTIAN DAVID HOYOS CASTAÑEDA	1.032.098.333	AYUDANTE	29/09/2025	ACTIVO
31	EZEQUIEL DE JESÚS QUIROZ OSORIO	1.007.578.868	COMPRESORISTA	29/09/2025	ACTIVO
32	HERNANDO DE JESÚS AGUIRRE R.	71.053.330	RASTRILLERO	29/09/2025	ACTIVO
33	JESÚS ARLEN DAVID CANO	15.286.180	COMPRESORISTA	29/09/2025	ACTIVO
34	JHONATANN JARAMILLO VASQUEZ	98.714.304	AYUDANTE	29/09/2025	ACTIVO
35	JUAN DAVID JIMENEZ CANO	1.017.168.947	RASTRILERO	29/09/2025	ACTIVO
36	KEYLA MARGARITA MEZA CASTRO	1.082.249.538	RESIDENTE SST	29/09/2025	ACTIVO
37	LUIS HERNANDO ROLDÁN VERGARA	98.493.223	CONDUCTOR DE VOLQUETA	29/09/2025	ACTIVO
38	RAÚL DARÍO RESTREPO MAZO	71.391.918	AYUDANTE	29/09/2025	ACTIVO
39	SILFREDO ANTONIO LUCAS BELTRÁN	15.443.732	AYUDANTE	29/09/2025	ACTIVO
40	WILSON DE JSÚS AMAYA RESTREPO	71.330.851	AYUDANTE	29/09/2025	ACTIVO
41	EDWIN LEÓN GIRALDO CARMONA	15.513.485	OPERADOR VIBRO	30/09/2025	ACTIVO
42	ONOFRE SUAREZ	8.049.017	OPERADOR FINISHER	30/09/2025	ACTIVO

Tabla 84. Relación de planillas de seguridad social presentadas **octubre 2025**.

Razón social	Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Consorcio Vial Med	JULIO	79594227	$ 137.400	$ 549.400	$ 239.000	$ 1.057.200
Consorcio Vial Med	AGOSTO	80541329	$ 5.607.700	$ 21.715.600	$ 9.742.500	$ 42.657.400
IngeAlquipos S.A.S	AGOSTO	80371185	$ 644.200	$ 2.585.300	$ 1.120.700	$ 4.994.400
Prisma 54 S.A.S	AGOSTO	80381463	$ 193.600	$ 744.300	$ 336.900	$ 1.498 400
IngeAlquipos S.A.S	SEPTIEMBRE	81108590	$3.205.700	$ 13.068.800	$ 5.554.000	$ 24.995.600
Prisma 54 S.A.S	SEPTIEMBRE	81110273	$ 193.600	$ 774.300	$ 336.900	$ 1.498.400
Consorcio Vial Med	SEPTIEMBRE	80958520	$ 6.5888.800	$ 25.775.900	$ 11.289.500	$ 50.180.700
Consorcio Vial Med	OCTUBRE	9494425222	$ 6.907.500	$ 26.905.300	$ 11.909.200	$ 52.592.000
IngeAlquipos S.A.S	OCTUBRE	9494540756	$3.274.900	$ 13.423.300	$ 5.610.400	$ 26.601.300
Prisma 54 S.A.S	OCTUBRE	9494567795	$ 193.600	$ 744.300	$ 336.900	$ 1.498.400

Tabla 85. Certificado de revisor fiscal actualizado del contratista:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
31/10/2025	Últimos seis meses (6) meses	Catherine Rua Correa Contadora Pública T.P N.° 285453 Consorcio VialMed 2025
31/10/2025	Últimos seis meses (6) meses	Karina Paola Mármol Noriega Revisora Fiscal T.P N.° 95553 -T Prisma 54 S.A.S
31/10/2025	Últimos seis meses (6) meses	Karina Paola Mármol Noriega Revisora Fiscal T.P N.° 95553 -T IngeAlquipos S.A.S

Anexo 4.4.1 Certificación parafiscales Consorcio Vial Med 2025 y consorciados.

4.2 CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN:

En relación a la subcontratación, el Consorcio VialMed 2025 a través de comunicado de fecha 21 de julio de 2025, solicitó al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, aprobación para subcontratar varias actividades del contrato de obra N° 4600105252 de 2025 a la empresa constructora Estructuras y Pavimentos S.A.S, actividades relacionadas a continuación:

- ✓ Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada Horario diurno.
- ✓ Rango 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada Horario diurno.
- ✓ Rango 1: De 9,1 a 12,5 Ton/Jornada Horario nocturno.
- ✓ Rango 2: De 12,51 a 16 Ton/Jornada.
- ✓ Rango 3: De 8 a 19,99 m3/Jornada.
- ✓ Rango 4: De 20 a 50m3/Jornada Horario diurno.
- ✓ Rango 4: De 20 a 50m3/Jornada Horario nocturno.

El contratista Consorcio VialMed 2025 describe en el comunicado la pertinencia de subcontratar las actividades antes mencionadas, toda vez que considera que la empresa Estructuras y Pavimentos S.A.S cuenta con los recursos técnicos suficientes de personal idóneo y la maquinaria necesaria para la ejecución de las actividades. Así mismo, cuenta con la capacidad financiera para asumir los gastos de ejecución del mismo mientras se ejecuta el acta de obra, como lo demuestra los índices de liquides y capacidad de endeudamiento reportados, y a la experiencia y trayectoria que tiene en el mercado para cumplir a cabalidad las exigencias del presente contrato.
Mediante comunicado número 001 de fecha 21 de julio de 2025, en atención a la solicitud del contratista Consorcio VialMed 2025 para la subcontratación de actividades específicas relacionadas con la instalación de mezcla asfáltica, la Interventoría de acuerdo a la cláusula 20 del contrato de obra N° 4600105252 de 2025 que cita “la subcontratación requiere autorización expresa de la entidad contratante o su interventoría delegada, sin que ello implique la liberación de responsabilidad del contratista frente al cumplimiento integral de las obligaciones contractuales”; y según decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.2.9 y habiendo revisado la documentación requerida anexa al comunicado del contratista del 9 de julio de 2025, considera viable la subcontratación con la empresa Estructuras y Pavimentos S.A.S exclusivamente para la ejecución de las actividades relacionadas con el suministro e instalación de mezcla asfáltica en los rangos antes descritos; sin embargo, esta aprobación está condicionada a la presentación de otros documentos:

- ✓ Contrato de subcontratación firmado.
- ✓ Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual que incluyan al subcontratista o póliza propia con los mismos amparos.
- ✓ Plan detallado de ejecución de actividades, articulado con el cronograma general del contrato principal.
- ✓ Certificación de no inhabilidades del subcontratista.

Finalmente, la supervisión designada para el contrato de Interventoría N° 4600105322 de 2025, basándose en los motivos expuestos por la interventoría Consorcio Medurbano 20005377 mediante comunicado N° 001 de fecha 21 de julio de 2025, consideró viable que el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín apruebe que el contratista Consorcio VialMed 2025 subcontrate a la empresa Estructuras y Pavimentos S.A.S para las actividades de mezcla asfáltica; como lo expone en su oficio dirigido al Secretario de Infraestructura.

Cabe anotar que, al **30 de octubre de 2025**, el contratista hizo entrega de la documentación. En caso de presentarse incumplimientos, deficiencias en la ejecución o riesgos asociados, la Interventoría podrá solicitar la modificación o terminación del subcontrato, según lo estipulado en la cláusula 20 del contrato principal.

4.3 INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE OBRA Y SU MITIGACIÓN:

A la fecha no ha sido necesario realizar implementación de la matriz de riesgos establecida para el proyecto.

4.4 CONTROL A LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LOS COMITÉS DE OBRA:

Tabla 86. Relación de actas de reunión y comités realizados en **octubre de 2025**

Fecha	N° de Acta	Tipo de Acta	Componente	Lugar	Participantes	Temas Tratados	Compromisos Adquiridos
07-10-2025	10	Acta de comité	Técnico	Campamento contratista	Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín Contratista Consorcio Vialmed 2025 Interventoría Consorcio Med Urbano 20005376	Revisión compromisos acta de comité anterior, avances de actividades técnicas, sociales, ambientales y SST.	✓ Presentar diseños de mezclas de los concretos relacionados en la propuesta económica. ✓ Presentar acta de reajustes N° 1 de los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, en formato Excel. ✓ Entrega de programación de las actividades mantenimiento sobre la vía localizada en la carrera 40 entre calles 48 y 49 (Tranvía Plaza). ✓ Presentar actas de modificación de cantidades para los subcontratos con Procopal S.A, Pavimentar S.A y Estructuras y Pavimentos para extensión de mezcla asfáltica.
15-10-2025	11	Acta de comité	Técnico	Municipio de Medellín	Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín Contratista Consorcio Vialmed 2025 Interventoría Consorcio Med Urbano 20005376	Revisión compromisos acta de comité anterior, avances de actividades técnicas, sociales, ambientales y SST.	✓ Realizar reunión con el Ingeniero Mario de la SIF a fin de revisar observaciones presentadas a los APUs de obra extra. ✓ Presentar programación especifica de actividades para la calle 10 A que incluya la extensión de mezcla tipo SMA en el deprimido y las obras complementarias como realce cárcamos, cámaras de inspección y válvulas, andenes y cordones.
22-10-2025	12	Acta de comité	Técnico	Campamento contratista	Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín Contratista Consorcio Vialmed 2025 Interventoría Consorcio Med Urbano 20005376	Revisión compromisos acta de comité anterior, avances de actividades técnicas, sociales, ambientales y SST.	✓ Proponer recomendaciones de intervención para la atención de la vía en la carrera 70 entre calles 9 y 30 (Costado oriental), a través de un diseñador o especialista. ✓ Actualizar cronograma de obras complementarias para la calle 10 A incluyendo la actividad de reposición de andenes.
28-10-2025	13	Acta de comité	Técnico	Virtual	Distrito Especial de Ciencia y Tecnología de Medellín Contratista Consorcio Vialmed 2025 Interventoría Consorcio Med Urbano 20005376	Revisión compromisos acta de comité anterior, avances de actividades técnicas, sociales, ambientales y SST.	✓ Realizar una socialización con los lideres sociales y administradores de rutas de buses del sector Santo Domingo, para intervención con rango 3. ✓ Enviar los soportes de la administración del acta de obra N° 2 en medio físicos,

Fecha	N° de Acta	Tipo de Acta	Componente	Lugar	Participantes	Temas Tratados	Compromisos Adquiridos
							para enviar al archivo del Municipio, aún se encuentran pendientes.

Anexo 4.4.1 Actas de comité técnico

4.5 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

Tabla 87. Relación de correspondencia enviada **octubre 2025**

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
1/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Ingreso de personal	no aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
1/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Revisión APUS OBRA EXTRA 01 - 06	Relacion de OE_N1 REV INTERV.xlsx Cotizacion_Hito_señalizacion vial.pdf Cotizacion_Tacha_señalizacionvial.pdf Cotizacion_Señal_Vertical_señalizacionvial.pdf COTIZACION- 2025-09-0219 SEÃ_ALES DEFINITIVAS-TACHAS- SEPTIEMBRE 25.pdf Cotizacion_ISEIN.pdf Sika 2025.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/10/2025	EMAIL	LILIA MARGARITA BERMUDEZ RAMIREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Solicitud facturación acta No.2 agosto 1 al 31 del 2025	AttachedDocument_FV-2-9.xml RUT ACTUAL CEI 1-10-2025 14892461025.pdf FE9 ACTA N°2 CONSORCIO MED URBANO 200005377.pdf RUT ACTUAL CATALINA OCHOA 1-10-2025 141136266774.pdf RUT ACTUAL CONSORCIO MED URBANO 1-10-2025 141192589868.pdf NC6 FE8 ACTA N°2	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
								CONSORCIO MED URBANO 200005377.pdf Pago impuesto de TIMBRE julio 17 del 2025.pdf	
1/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Núcleos semana 10 (22 al 27 de septiembre)	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Re: Documentos de Camión Estacas Fo 20_pintura (JYY 370)	VEHICULOS APROBADOS 1-10-2025.pdf	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
1/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Información para el control de calidad del proyecto	Oficio No.032 Octubre 01 - Calidad.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/10/2025	OFICIO	CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Requerimientos para el control de calidad del proyecto	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: Q. El Ahorcado. Calle 67 No.36A-9. Visita conjunta.	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
2/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Valor acta 03 interventoriía - Consorcio Med Urbano 20005377	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
3/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Re: Documentos Volqueta (STY 105) Fo21	VEHICULOS APROBADOS 3-10-2025.pdf	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
3/10/2025	EMAIL	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ A.	consorciomedurbano@gmail.com	Juan Camilo Patino Amortegui	juanc.patino@medellin.gov.co	Técnico	Entrega de archivo – Revisión de baches pendientes de eliminación	EJECUTADOS EN OTRO CONTRATO.xlsx OTRO RANGO R3,R4.xlsx REPETIDOS.xlsx	Diego Alejandro Ramírez
3/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Ingreso de personal	no aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
4/10/2025	EMAIL	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMIREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: profesionalsst.vialmed2025 te ha enviado ACTA No. 3 SEPTIEMBRE CONSORCIO VIALMED 2025.rar con WeTransfer	no aplica	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ
4/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: SOLICITUD DE ATENCIÓN BACHE BARRIO LA PRADERA CL 49A #97A-16	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
				LONDOÑO					
6/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	ELSA MARÍA POLO CUELLO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	REPORTE DE MAQUINARIA	control de interventoría de equipos y maquinaria reportado..xlsx	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
6/10/2025	EMAIL	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMIREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Acta No.3 y sus anexos para revisión y aprobación	ACTA No. 3 SEPTIEMBRE CONSORCIO VIALMED 2025.rar 1. Copia de Acta No.3 Spbre 1 al 30 del 2025.xlsx Soportes acta No.3.rar	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ
6/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Ingreso de personal	no aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
6/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	lucia hincapié	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Gestión Ambiental	Acta de reunión revisión de ejecución de presupuesto ambiental acta 2.	FO-GINF-055ActadeReunin-V4_5 Ambi #5 (SIF) Malla Vial Revisión acta ambiental.docx	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
6/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Ingreso de personal	no aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
6/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Acta de comité de obra N° 9	9 - Comité de obra N° 9 30-09-2025 OK.docx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Acumulación de baches ejecutados en campo, pero sin ejecutar en SIRO	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Administrativo	Balance bolsa socioambiental Versión 1	Balance Bolsa Socioambiental PMT y SST REV INTERV.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
3/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	ELSA MARÍA POLO CUELLO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Revisión inicial de ejecución de presupuesto ambiental acta 3.	Copia de Balance_26092025_(1)(1).xlsx	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
6/10/2025	EMAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	Margarita Mejia	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Informe semanal y cronograma social	Informe Semanal Social N°11_del 29 de septiembre al 4 de octubre del 2025_R.Int.docx Cronograma semanal_ del 06 Octubre al 11 de Octubre_R.Int.docx	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
6-10-2025	EMAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión Social	Envío de informe semanal de empleabilidad: Malla Vial del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2025	CONSOLIDADO SEMANAL EMPLEABILIDAD MALLA VIAL.xlsx	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
7/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Balance bolsa socioambiental Versión 1	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
7/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	RV: Reporte baches San Antonio de Prado	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	Luisa Fernanda Restrepo María Catalina Martínez Romero Profesionales Sociales	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión Social	Atención PQRS	no aplica	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
6/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Inventario obras complementarias	Inventario obras complementarias oct 06 2025.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal	no aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
7/10/2025	EMAIL	RAQUEL VANESSA VARGAS BUILES JORGE	consorciomedurbano@gmail.com	ELSA MARÍA POLO CUELLO Cuello	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL CONTRATISTA SEPTIEMBRE 2025.	no aplica	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
		LUIS MONSALVE MONTIEL		DANIELA RESTREPO					
8/10/2025	EMAIL	MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Núcleos semana 11 (29 de septiembre al 4 de octubre)	SOLICITUD EXTRACCION NÚCLEOS (29 de Septiembre al 4 de octubre) Ajustado.xlsx 2456K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Ingreso de personal	no aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
8/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	ELSA MARÍA POLO CUELLO Cuello DANIELA RESTREPO	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Fwd: Informe de visita 4. Malla vial	INFORME VISITA 4. 02-10-2025.pdf	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
8/10/2025	EMAIL	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Oficio de Interventoría 035. Socavación Castilla	Oficio No.035 Octubre 8 de 2025 - CR 69 entre CL 95 y CL 96.pdf	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
8/10/2025	OFICIO No.03546001053322 de 2025	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Informe intervención por socavación en la CR 69 entre CL 95 Y CL 96.	no aplica	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO
8/10/2025	EMAIL	Luisa Fernanda Restrepo GONZALEZ María Catalina Martínez Romero	consorciomedurbano@gmail.com	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA.	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Presupuesto social	Balance Bolsa Socioambiental PMT y SST REV INTERV.xlsx	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
8/10/2025	EMAIL	MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Núcleos semana 11 (29 de septiembre al 4 de octubre)	SOLICITUD EXTRACCION NÚCLEOS (29 de Septiembre al 4 de octubre) Ajustado.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
8/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA.	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Fwd: TRASLADO TRES PQRS	no aplica	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
8/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión Social	TRASLADO TRES PQRS	no aplica	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
8/10/2025	EMAIL	LILIA MARGARITA BERMUDEZ RAMIREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Cálculo del A para su revisión y ajuste meses julio y agosto.	COMPROBANTE DE PAGO FE2 P1.pdf 19K ENTARDA MERCANCIAS-DESCUENTO IMP TIMBRE.PDF 447K	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
8/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Oficio CVM-068-2025 Informe mensual SST	no aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
10/08/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	RE: Oficio CVM-069-2025 Informe mensual calidad de septiembre	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Áreas por segmento capa de MAM-25 Avenida las Vegas	no aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
9/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Ingreso de personal	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
9/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA	consorciomedurbano@gmail.com	Vanessa Tobon	publicistasif@gmail.com	Gestión Social	PASACALLES (3) INTERVENCIONES AVENIDA EL POBLADO SECTORES PARQUE Y OVIEDO	V_1 Pasacalles_Baja Av. El Poblado calzada occidental entre calles 10 y 9.pdf 169K V_1 Pasacalles_Baja Av. El Poblado calzada oriental entre calles 7D y 10.pdf 169K	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
		CATALINA MARTINEZ ROMERO						V_1 Pasacalles_Baja Av. El Poblado calzada occidental entre calles 4 Sur y 9 Sur.pdf 170K	
9/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	MARGARITA MEJÍA	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión SST	Envío editable del informe social mensual del mes de agosto del 2025	ANEXOS CONTRATISTA.rar ANEXOS INTERVENTORÍA.rar FO-GECO-033InformeSocial Interventoría #2 Agosto.docx	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
10/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: Informe análisis árboles UdeA / intervención malla vial	NO aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
10/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	SOLICITUD RECIBOS ORIGINALES DE PAVIMENTO	NO aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
10/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: profesionalsst.vialmed2025 te ha enviado INFORME No. 3 SEPTIEMBRE CONSORCIO VIALMED 2025.rar con WeTransfer	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
10/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA.	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	PQR de luz marina naranjo	NO aplica	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
10/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión Social	Re: PQR de luz marina naranjo	WhatsApp Image 2025-10-06 at 10.37.43 AM (1).jpeg 174K WhatsApp Image 2025-10-10 at 10.48.05 AM (1).jpeg 197K WhatsApp Image 2025-10-10 at 10.48.05 AM.jpeg 203K CamScanner 06-10-2025 12.05.pdf 1008K	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
10/10/2025	EMAIL	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ A.	consorciomedurbano@gmail.com	Juan Camilo Patino Amorte gui	juanc.patino@medellin.gov.co	Técnico	Entrega de archivos – Revisión de baches pendientes de eliminación	EJECUTADOS EN OTRO CONTRATO.xlsx 15K REPETIDOS.xlsx 14K OTRO RANGO R3,R4.xlsx 12K	DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ A.
10/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Vias para ser consultadas con epm	VIAS NUEVAS DEL LSIUTADO PARA RANGO 4 Y CONSULTAR CON EPM.docx 14K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
10/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	listado para tener en cuenta en futuros presupuestos	oficio solicitando consultar con epm para futuras intervenciones.docx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
13/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Observaciones informe social N°3_Septiembre	Informe Septiembre 2025_R.Int.docx 22338K	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
14/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Revisión de seguridad social	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
14/10/2025	EMAIL	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMIREZ	consorciomedurbano@gmail.com	CESAR RIVAS	ingealquipos.vialmed2025@gmail.com	Administrativo	Consorcio VialMed2025 - Rpta email interventoría Oct 8, 2025 at 3:47 PM, Ajuste Cálculo del A para agosto.	NO aplica	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ
14/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Acta de comité de obra N° 10	10 - Comité de obra N° 10 07-10-2025 V2.docx 1607K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	PMT	Re: Oficio CVM-072-2025 PMT Especifico para cierre parcial Avenida Poblado	NO aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	RE INGRESO DE PERSONAL	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
14/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	MARGARITA MEJÍA	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Informe semanal y cronograma.	Informe Semanal Social N°12_del 6 al 11 de octubre del 2025.docx 1899K Cronograma semanal_ del 13 Octubre al 18 de Octubre_R.Int.docx 988K	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
15/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Acta 01 ajuste cantidades para corregir	FO-GECO-112ActadeAjusteCantidades_v8 Revisada interv.docx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
15/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Gestión SST	Envío de informe semanal de empleabilidad: Malla Vial del 6 de octubre al 11 de octubre del 2025	**CONSOLIDADO SEMANAL EMPLEABILIDAD MALLA VIAL.xlsx**	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
15/10/2025	EMAIL	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMIREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Solicitud aprobación hoja de vida ing Carlos Mario Gallego- NOVEDAD PERSONAL	HV ING CIVIL MARIO GALLEGO_2025_V3.1 (1).pdf 1639K Diploma ingenierio civil Carlos Mario.pdf 185K Matrícula Carlos Mario.pdf 275K Copnia Carlos Mario.pdf	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ
15/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Ingreso de personal Ingealquipos	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
15/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: profesionalsst.vialmed2025 te ha enviado INFORME No. 3 CONSORCIO VIALMED 2025 SEPTIEMBRE.rar con WeTransfer	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
15/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Re: Respuesta firmada	NO aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
15/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Re: Soportes balance bolsa socioambiental	NO aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
16/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Re: Soportes balance bolsa socioambiental	Balance Bolsa Socioambiental PMT y SST REV INTERV aprob.pdf 814K Balance Bolsa Socioambiental PMT y SST REV INTERV aprob.xlsx 15654K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
16/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Adjunto envío las observaciones del A del mes de spbre para sus respectivos ajustes.	Adjunto envío las observaciones del A del mes de spbre para sus respectivos ajustes.	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
16/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Se envía acta de modificación firmada por representante Legal Interventoría.	Se envía acta de modificación firmada por representante Legal Interventoría.	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
16/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	ELSA MARÍA POLO CUELLO Cuello DANIELA RESTREPO	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	observaciones ambientales del cobro de la bolsa ambiental	Listado de bosla socioambiental	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
16/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA.	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Aprobación informe social No3	Informe Septiembre 2025	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
16/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Tabla de Escombros Septiembre	Matriz de cantidades de obra	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
17/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	Núcleos semana 12 (6 al 11 de octubre)	Núcleos semana 12 (6 al 11 de octubre)	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
17/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	INFORME BACHES MEDIATICOS ITM	INFORME BACHES MEDIATICOS ITM	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
17/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	ELSA MARÍA POLO CUELLO Cuello DANIELA RESTREPO	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	VOLQUETAS Obra aprobadas	VOLQUETAS Obra aprobadas	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
17/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Oficio de Respuesta a la solicitud de ampliación de plazo y adición Contrato de Obra No. 4600105052 de 2025.	OFICIO No.036 4600105322 de 2025Respuesta a la solicitud de ampliación de plazo y adición Contrato de Obra No. 4600105052 de 2025.	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
16/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA.	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	INFORME OCTUBRE VALLAS TIJERA: EN FRENTES, CESANTES, DAÑADAS Y NUEVAS	INFORME OCTUBRE VALLAS TIJERA: EN FRENTES, CESANTES, DAÑADAS Y NUEVAS	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
17/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	ELSA MARÍA POLO CUELLO Cuello DANIELA	ambientalvialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	VOLQUETAS Obra aprobadas	VOLQUETAS Obra aprobadas	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
				RESTREPO					
17/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Proyeccion interventoría actualizada	Proyeccion interventoría actualizada	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
17/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	RE INGRESO DE PERSONAL	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
17/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Bolsa Socioambiental acta 03 firmada	Bolsa Socioambiental acta 03 firmada	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
18/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Técnico	ACTA 03 DE OBRA REVISADA Y APROBADA	ACTA 03 DE OBRA REVISADA Y APROBADA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
20/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	RE INGRESO DE PERSONAL	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
20/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Milena Escobar	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Apruebo el ingreso a laborar en el contrato:	Apruebo el ingreso a laborar en el contrato:EDUARDO DE JESUS URIBE CASTAÑEDA	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
20/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	MARGARITA MEJÍA	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Informe Semanal Social N°13_ del 13 al 18 de octubre del 2025	Informe Semanal Social N°13_ del 13 al 18 de octubre del 2025	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
21/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	MARGARITA MEJÍA	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	Informe mensual social N°13	Informe mensual social N°13	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
16/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA.	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Solicitud de respuesta a derecho de petición por la señora Piedad María Castro Celis.	Solicitud de respuesta a derecho de petición por la señora Piedad María Castro Celis.	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
21/10/2025	EMAIL	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTINEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	MARGARITA MEJÍA	margarita.mejia@medellin.gov.co	Gestión Social	RV: Metodología -programa de sostenibilidad ambiental	RV: Metodología -programa de sostenibilidad ambiental	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
21/10/2025	EMAIL	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	INFORME AVANCE POMPEYANOS	INFORME AVANCE POMPEYANOS	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO
22/10/2025	EMAIL	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ A.	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Informe comparativo de baches Octubre 20 de 2025	Informe comparativo de baches Octubre 20 de 2025	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO
22/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal E y P	Ingreso de personal E y P, ANDRES FELIPE PEREZ BENJUMEA	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
22/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Camion Fo4_UFZ690	Camion Fo4_UFZ690	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
22/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Informe Ambiental septiembre 2025.	Informe Ambiental septiembre 2025.	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
22/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Acta de reunión: ejecución presupuesto ambiental acta 3.	Acta de reunión: ejecución presupuesto ambiental acta 3.	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
22/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	lucia.hincapie@medellin.gov.co	lucia hincapié	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Informe ambiental septiembre 2025	Informe ambiental septiembre 2025	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
22/10/2025	EMAIL	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Lucia hincapié	directora.vialmed2025@gmail.com	Gestión Ambiental	Acta de reunión: ejecución presupuesto ambiental acta 3.	Acta de reunión: ejecución presupuesto ambiental acta 3.	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
23/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Apruebo el ingreso a laborar en el contrato: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada, en el siguiente cuadro: JUAN CARLOS BRICEÑO HERNANDEZ, RUBÉN DARÍO OJEDA MEJÍA	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
23/10/2025	EMAIL	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Informe avance masivos, R4 y R3	Informe avance masivos, R4 y R3	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
23/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	pendientes los resultados de los núcleos del mes de septiembre de los siguientes consecutivos: 217 a 240 251 a 255 261 a 284 290 304 310 A 321	NO aplica	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
23/10/2025	EMAIL	DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ A.	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Informe Baches reportados teniendo en cuenta los aceptado que han sido depurados	Informe Baches reportados teniendo en cuenta los aceptado que han sido depurados	DIEGO ALEJANDRO RAMÍREZ A.
24/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Apruebo el ingreso a laborar en el contrato: Rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada, ingresa. de la empresa ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS. FREDY BURITICA MARTINEZ 1.152.451.859 CONDUCTOR 5	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
24/10/2025	EMAIL	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	Gestión SST	Apruebo el ingreso a laborar en el contrato: NDRÉS MAURICIO CATAÑO RICO, 71.267.874 OFICIAL FIDEL ANTONIO ARGUELLO JULIO, 8.168.864,CADENERO	NO aplica	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
							MILTON DE JESUS CASTILLO CASTRO, 1.084.742.366.TOPOGRAFOINGEALQUIPOS FREDY ENRIQUE VERA GONZALES,6.164.971, OFICIAL, INGEALQUIPOS.JHON WILLIAM ESTRADA RESTREPO. 1.036.627.560 CONDUCTOR 5 EYP (INGEONIX)		
24/10/2025	EMAIL	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO	consorciomedurbano@gmail.com	Juan Camilo Patino Amortegui	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	INFORME GENERAL EJECUCIÓN R3 MOSCÚ	INFORME GENERAL EJECUCIÓN R3 MOSCÚ	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO
24/10/2025	EMAIL	dIEGO ALEJANDRO RAMIREZA.	consorciomedurbano@gmail.com	Juan Camilo Patino Amortegui	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Entrega de archivo – Revisión de baches pendientes de eliminación	Entrega de archivo – Revisión de baches pendientes de eliminación	CRISTIÁN DAVID CORREA ALVARADO
24/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	Técnico	Acta de comité de obra N° 12	Acta de comité de obra N° 12	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

REGISTRO CORRESPONDENCIA		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**CONSECUTIVO**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**Elabora**
27/10/2025	EMAIL	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Asney Garcia Agamez	mallavialmedellin2025@gmail.com	Gestión Social	Informe semanal y cronograma: N°14	Informe semanal y cronograma: N°14	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
27/10/2025	EMAIL	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO	consorciomedurbano@gmail.com	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	PMT	Aprobación PMT para la Cr40 entre calles 48 y49	Aprobación PMT para la Cr40 entre calles 48 y49. Planos PMT. Planos desvíos de rutas.	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO

Anexo 4.5.1 Correspondencia enviada **octubre de 2025**

Tabla 88. Relación correspondencia recibida **octubre 2025**

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
1/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR RAMIREZ	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal	GABRIEL JAIME AGUIRRE MORENO.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
1/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Topografía Calle 10a	ACAD-AREAS FRESADO LAS VEGAS-Model2 (1).pdf ACAD-AREAS FRESADO LAS VEGAS-Model.pdf VOL_CL10A.zip	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	LILIA M BERMUDEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Solicitud facturación acta No.2 agosto 1 al 31 del 2025	NO APLICA	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ
1/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	LILIA M BERMUDEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: APROBACIÓN Oficio CVM-062-2025 Hojas de vida Tecnólogos de obra. Parte 8	1216713015.pdf	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ
1/10/2025	EMAIL	ALCALDIA DE MEDELLIN	reportesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
1/10/2025	EMAIL	ALCALDIA DE MEDELLIN	reportesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
1/10/2025	EMAIL	ALCALDIA DE MEDELLIN	reportesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
1/10/2025	EMAIL	ALCALDIA DE MEDELLIN	reportesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
1/10/2025	EMAIL	ALCALDIA DE MEDELLIN	reportesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
1/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Informe técnico huecos vía Carambolas y Bello Oriente, Comuna 3 - Reporte Mesa interinstitucional	20250801 IT HUECOS BELLO ORIENTE.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Organigrama de obra V1	Organigrama versión final 2.pdf Organigrama versión final 2.docx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
1/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 02-10-2025	MAPA JORNADA 02-10-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 02-10-2025.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
2/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Oficio N°04531529	202530479403.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
2/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: FRENTES LISTOS PARA PAVIMENTAR	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Q. El Ahorcado. Calle 67 No.36A-9. Visita conjunta.	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
2/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Q. El Ahorcado. Calle 67 No.36A-9. Visita conjunta.	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
2/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Alternativas intervención rígido Calle 10a	Informe CO-AP-9539-162-2025 Cll 10A deprimido.pdf ANEXO - LEVANTAMIENTO CALLE10A.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
2/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	reportesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
2/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 03-10-2025	MAPA JORNADA 03-10-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 03-10-2025.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
2/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
3/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: EJECUTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
3/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Valor acta 03 interventoriía - Consorcio Med Urbano 20005377	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
2/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Jorge Monsalve	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos Volqueta (STY 105) Fo21	CONDUCTOR JOHNY GIRALDO PLACA STX 105 (1)_removed.pdf TÉCNICO MECANICO STX 105.pdf	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
3/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
3/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal	INGRESOS PAVIMENTAR.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
3/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: ACEPTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
3/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Areas por segmentos Calle 10a	segementos cl10a-11.xlsx AREAS SEGMENTOS.dwg	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
3/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 04-10-2025	MAPA JORNADA 04-10-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 04-10-2025.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
3/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	profesionalsst.vialmed2025 te ha enviado ACTA No. 3 SEPTIEMBRE CONSORCIO VIALMED 2025.rar con WeTransfer	ACTA No. 3 SEPTIEMBRE CONSORCIO VIALMED 2025.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
3/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: SOLICITUD DE ATENCIÓN BACHE BARRIO LA PRADERA CL 49A #97A-16	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
4/10/2025	EMAIL	ASNEY GARCÍA AGÁMEZ DORIELA	mallavialmedellin2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Informe Mensual-Septiembre	3-Inf Septiembre 2025.zip	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
		OSPINA M..		GONZÁLEZ					ROMERO
4/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 04-10-2025	MAPA JORNADA 06-10-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 06-10-2025.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
5/10/2025	EMAIL	JULIAN ALEXANDER JARAMILLO RUA Yolanda de Jesús Rúa Jaramillo	julianrua11@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Respuesta del documento - 202510302505	NO APLICA	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
6/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Jorge Monsalve	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos compactador vibratorio de doble rodillo.	compactador vibratorio doble rodillo.zip	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
6/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
3/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Oficio CVM-065-2025 Informe de Gestión Social- Barrio Enciso, Sector Los Mangos	Oficio CVM-065-2025 Informe de Gestión Social- Barrio Enciso, Sector Los Mangos.pdf	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
3/10/2025	OFICIO CVM-065-2025	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	CAMILO ANDRÉS ÁNGEL	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Informe de Gestión Social- Barrio Enciso, Sector Los Mangos	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Oficio CVM-065-2025 Informe de Gestión Social- Barrio Enciso, Sector Los Mangos	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
6/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Oficio CVM-065-2025 Informe de Gestión Social- Barrio Enciso, Sector Los Mangos	Oficio CVM-065-2025 Informe de Gestión Social- Barrio Enciso, Sector Los Mangos.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Oficio CVM-066-2025 Informe mensual social Septiembre	SOCIAL.rar Oficio CVM-066-2025 Informe mensual social Septiembre.pdf	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
6/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Camilo Andrés Ángel	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Informe mensual social Septiembre	NO APLICA	Camilo Andres Angel Saldarriaga
6/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
6/10/2025	EMAIL	ASNEY GARCÍA AGÁMEZ DORIELA OSPINA M.. Profesion	mallavialmedellin2025@gmail.com	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Social. Informe Semanal y Cronograma de actividades	Informe Semanal Social N°11.docx 11-Cronograma semanal_ del 06 Octubre al 11 de Octubre.docx	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
		ales Sociales							
6/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Programación de obra semanal	PROGRAMACIÓN SEMANAL CUADRILLAS SEMANA 12.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Programación de obra semanal	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Programación de obra semanal	PROGRAMACIÓN SEMANAL CUADRILLAS SEMANA 12 (1).xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal	INGRESOS.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
6/10/2025	EMAIL	ASNEY GARCÍA AGÁMEZ DORIELA OSPINA M.. Profesionales Sociales	mallavialmedellin2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Social- Cuadro de Empleabilidad	Registro de Empleabilidad.xlsx	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
3/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	intervención rígido Calle 10a	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: intervención rígido Calle 10a	Cantidades losas 10a.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de Personal	INGRESOS OCTUBRE.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
6/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Administrativo	Re: Balance bolsa socioambiental Versión 1	Balance socioambiental.rar	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
6/10/2025	EMAIL	ELSA MARÍA POLO CUELLO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Jorge Monsalve	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Revisión inicial de ejecución de presupuesto ambiental acta 3.	Version 2_ ACTA 03.xlsx	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
6/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: Cálculo del A para su revisión y ajuste meses julio y agosto.	06102025_Cálculo del AU_ AGOSTO V2.xlsx 06102025 Cálculo del AU_ JULIO V2.xlsx Anexos Calculo A_Julio.rar Anexos Calculo A_Agosto.rar	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 07-10-2025	MAPA JORNADA 07-10-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 07-10-2025.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 07-10-2025	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
6/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	CONSorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Ejecutado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
6/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	CONSorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Ejecutado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
7/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: OBSERVACIONES RELACIÓN ENTRE SHAREPOINT Y SIRO - MALLA VIAL 2025	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	OBRA EXTRA REVISADO POR LA SIF TEMA DEL COMITE DE HOY	OBRA EXTRA VERSION 3 REVISADO SIF 06102025.xlsx 5612K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Reporte baches San Antonio de Prado	Reporte Baches_San Antonio Prado.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Atención PQRS	NO APLICA	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
7/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Inventario obras complementarias	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
7/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Relación días de la comisión de topografía	2330- ESTACION TOTAL RUBEN ARLEISON SEPULVEDA TANGARIFE (1).pdf Topografia.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	PROfesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal	INGRESOS.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
7/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
7/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
7/10/2025	EMAIL	ELSA MARÍA POLO CUELLO DANIELA RESTREPO	ambientalvialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Informe mensual Septiembre 2025	Informe Septiembre.zip	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
7/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Núcleos semana 11 (29 de septiembre al 4 de octubre)	SOLICITUD EXTRACCION NÚCLEOS (29 de Septiembre al 4 de octubre).xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	LUCÍA HINCAPIÉ MARTÍNEZ	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Acta de reunión revisión de ejecución de presupuesto ambiental acta 2.	FO-GINF-055ActadeReunin-V4_5 Ambi #5 (SIF) Malla Vial Revisioìn acta ambiental.pdf 441K	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
7/10/2025	EMAIL	LUCÍA HINCAPIÉ MARTÍNEZ	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Informe de visita 4. Malla vial	INFORME VISITA 4. 02-10-2025.pdf	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
7/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 08-10-2025	MAPA JORNADA 08-10-2025.txt PROGRAMACIÓN DIARIA 08-10-2025.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
7/10/2025	EMAIL	ÁNGELA ARISTIZÁBAL	mallavial2025@gmail.com	MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Re: OBSERVACIONES RELACIÓN ENTRE SHAREPOINT Y SIRO - MALLA VIAL 2025	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	documentos fisicos del acta 1 que faltan	ilovepdf_merged.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	comprobante de pago de acta de obra	COMPROBANTE DE PAGO FE2 P1.pdf COMPROBANTE DE PAGO.pdf ENTARDA MERCANCIAS-DESCUENTO IMP TIMBRE.pdf	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Relación días de la comisión de topografía	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Envío de informe semanal de empleabilidad: Malla Vial del 29 de septiembre al 2 de octubre del 2025	NO APLICA	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
8/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acta No.3 y sus anexos para revisión y aprobación.	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Q. El Ahorcado. Calle 67 No.36A-9. Visita conjunta.	PHOTO-2025-09-30-11-19-42_1.jpg 235K PHOTO-2025-09-30-11-19-42_2_1.jpg 613K PHOTO-2025-09-30-11-19-42_3.jpg 326K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Q. El Ahorcado. Calle 67 No.36A-9. Visita conjunta.	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Envío de Informe Semanal Ambiental_11_ semana 5. del 29 de septiembre al 3 de octubre 2025	10_INF_AMB_SEMANA_5_SEP-OCT_2025..docx 10_INF_AMB_SEMANA_5_SEP-OCT_2025..pdf	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
8/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acumulación de baches ejecutados en campo, pero sin ejecutar en SIRO	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
8/10/2025	EMAIL	DORIELA OSPINA ASNEY GARCÍA AGAMEZ	mallavialmedellin2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: Presupuesto social	NO APLICA	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	TRASLADO TRES PQRS	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Consulta LAZO AV GUAYABAL X CL 10 ORIENTE	Empalmes Av. guayabal (14, 15 y 16).kml 4K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Oficio CVM-068-2025 Informe mensual SST Septiembre	INFORME #3 CONSORCIO VIALMED 2025 SEPTIEMBRE.pdf 1218K Oficio CVM-068-2025 Informe	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
								mensual SST Septiembre.pdf 118K	ROMERO
8/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	JOSE CAMILO CASTAÑEDA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Oficio CVM-069-2025 Informe mensual calidad de septiembre	Oficio CVM-069-2025 Informe mensual calidad de septiembre.pdf 118K 1. INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE.pdf Anexos.rar	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
8/10/2025	CVM-068-2025	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	CAMILO ANDRÉS ANGEL SALDARRIAGA	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Informe mensual SST Septiembre	NO APLICA	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
8/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Ejecutado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
8/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 09-10-2025	MAPA JORNADA 09-10-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 09-10-2025.xlsx 15K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
9/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Mto_equipos utilizados vialmed	Equipos_vialmed.zip	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
9/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Documentos maquinaria de los Fo_18 y 19	MINICARGADOR CAT 236D - MODELO 2015-20251009T011239Z-1-001.zip 7090K RETROEXCAVADORA CAT416E-20251009T011209Z-1-001.zip 4985K	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
8/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Áreas por segmento capa de MAM-25 Avenida las Vegas	Volumenes-aguacatala.dwg 1077K Topografía_segmentos las vegas_Frente_15.xlsx 10K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
9/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARÍA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Áreas por segmento capa de MAM-25 Avenida las Vegas	Topografia_Avenida las vegas_Septiembre_Vialmed_Masivos.xlsx 11K corte 30 sept.dwg 1126K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
9/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Oficio CVM-070-2025 Informe mensual ambiental de septiembre	Oficio CVM-070-2025 Informe mensual ambiental de septiembre.pdf OBS_INF_AMB_3_SEP_081025.pdf	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
9/10/2025	CVM-070-2025	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	CAMILO ANDRÉS ANGEL SALDARRIAGA	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Informe mensual ambiental de septiembre	NO APLICA	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
9/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
9/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Solicitud de evaluación de árbol en riesgo – Intervención vial Cl. 47D con Cr. 86 y Cr. 87B, sector La Floresta – Medellín	Solicitud_Riesgoarb_9102025_VIALMED.pdf 312K	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
9/10/2025	EMAIL	LUCÍA HINCAPIÉ MARTÍNEZ	lucia.hincapie@medellin.gov.co	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	RE: Solicitud de evaluación de árbol en riesgo – Intervención vial Cl. 47D con Cr. 86 y Cr. 87B, sector La Floresta – Medellín	NO APLICA	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
9/10/2025	EMAIL	ELSA MARÍA POLO CUELLO	ambientalvialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	documentos Fo Sellado de grietas	Ruteadora.zip 927K Selladora.zip 8266K	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
9/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Fwd: Informe mensual ambiental Septiembre subsanado	Inf_amb_sep.zip	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
9/10/2025	EMAIL	ELSA MARÍA POLO CUELLO	ambientalvialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	RE Fwd: Informe mensual ambiental Septiembre subsanado	OBS_INF_AMB_3_SEP_091025.docx 4615K OBS_INF_AMB_3_SEP_091025.pdf 4948K	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
9/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Solicitud de información	FRENTES COMUNAS 1,3, 60,70,80 y 90.pdf 12746K RE: Frentes priorizados con PP 2025.eml 17639K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
9/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal	INGRESOS.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
8/10/2025	EMAIL	VÍCTOR VARGAS RODRÍGUEZ	mallavialmedellin2025@gmail.com	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	PASACALLES (3) INTERVENCIONES AVENIDA EL POBLADO SECTORES PARQUE Y OVIEDO	V_1 Pasacalles_Baja Av. El Poblado calzada occidental entre calles 10 y 9.pdf 169K V_1 Pasacalles_Baja Av. El Poblado calzada oriental entre calles 7D y 10.pdf 169K V_1 Pasacalles_Baja Av. El	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
								Poblado calzada occidental entre calles 4 Sur y 9 Sur.pdf 170K	
09-10-2025	EMAIL	ALCALDIA DE MEDELLIN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
9/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	INTERVENCION MASIVA EN AV. FERROCARRIL U DE A	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
9/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 10-10-2025	MAPA JORNADA 10-10-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 10-10-2025.xlsx 15K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
10/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Informe análisis árboles UdeA / intervención malla vial	LeeDoc Ficus UdeA.pdf 2582K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
10/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	drisños de vias que psoblemente se tengan en cuenta para masivos	CL-0813-25-623-01-11-Diseño Calle 30 entre carrera 53 y carrera 70.zip 12316K CL-0810-25-623-01-08-Diseño Av Regional entre Puente Guayaquil y Av 33 (1).zip 10849K CL-483-416-06-480- Av. Pintuco.pdf 6118K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
10/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Entrega informe de Actualización Diseño pavimento vía San Cristóbal - túnel de Occidente	CL-0039-25-151-18-22-Rediseño-Vía-San_Cristobal.pdf 6876K Anexos-I-151-18-22-San Cristobal.zip 11484K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
10/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Intervenciones PRIORITARIAS	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
10/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	profesionalsst.vialmed2025 te ha enviado INFORME No. 3 SEPTIEMBRE CONSORCIO VIALMED 2025.rar con WeTransfer	INFORME No. 3 SEPTIEMBRE CONSORCIO VIALMED 2025.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
10/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	PQR de luz marina naranjo	NO APLICA	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
10/10/2025	EMAIL	DORIELA OSPINA ASNEY GARCÍA AGAMEZ	MALLAVIAL2025@gmail.com	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: PQR de luz marina naranjo	Cierre PQRS No. 09-Luz Marina Naranjo.zip	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
10/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	sellado en el poblado	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
10/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
10/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	Residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 11-10-2025	MAPA JORNADA 11-10-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 11-10-2025.xlsx 11K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
10/10/2025	EMAIL	Erika Vanessa Tobon Norena	erika.tobon@medellin.gov.co	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Fwd: Fw: Pasacalles cierres parciales por mantenimiento (Av. El Poblado)	PASACALLES CIERRES PARCIALES AV EL POBLADO_Rev_ MCCJ.pdf 1103K	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
11/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	Residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 14-10-2025	MAPA JORNADA 14-10-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 14-10-2025.xlsx 15K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
11/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
13/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
13/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Duplicado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
14/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	notificacion.gedo@medellin.gov.co	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Respuesta del documento - 202510322332	202530497336.pdf 3K	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
14/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Revisión de seguridad social	BASE DE DATOS INFORME.xlsx 69K	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
14/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Revisión de seguridad social	PAGO SEPTIEMBRE 30 2025_80958520_CONSORCIO VIALMED.pdf 96K PAGO SEPTIEMBRE 30 2025_80958984_CUADRILLA DE SEÑALIZACION.pdf 26K PAGO SEPTIEMBRE 30 2025_80958802_CUADRILLAS Y PAVIMENTOS.pdf	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
								41K SS Huargo.pdf 22K SS Consorcio Vial Med SS EYP Septiembre.pdf 8637K	
14/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acta de modificación septiembre	Acta de modificación 1_GJCL. Final.xlsx 12230K FO-GECO-112ActadeAjusteCantidades_v8.docx 969K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acta de modificación septiembre	FO-GECO-112ActadeAjusteCantidades_v8 Revisada.docx 970K Acta de modificación 1_GJCL. (Modificada ajustada).xlsx 12208K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
14/10/2025	EMAIL	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA M..	mallavialmedellin2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Social-Cuadro de Empleabilidad	Registro de Empleabilidad.xlsx	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
14/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: VÍAS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO - MALLA VIAL 2025	Proyeccion_Rango_3_-_Rango_4_y_Masivo_CO vr2 (1).xlsx	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	DANIELA RESTREPO	ambiental2.vialmed2025@gmail.com	Raquel Vanessa Vargas Builes JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Ambiental	Envío de Informe Semanal Ambiental_12_ semana 1. del 6 al 10 de octubre 2025	12_INF_AMB_SEMANA_1_OCT_2025..pdf 2100K 12_INF_AMB_SEMANA_1_OCT_2025..docx 4864K	JORGE LUIS MONSALVE MONTIEL
14/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Programación de obra semanal	PROGRAMACIÓN SEMANAL CUADRILLAS SEMANA 13.xlsx	MARIA CATALINA OCHOA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
									ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA M..	mallavialmedellin2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Social. Informe semanal y cronograma de actividades	Informe Semanal Social N°12.docx 1900K 12-Cronograma semanal_ del 13 Octubre al 18 de Octubre.docx 988K	MARÍA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO
14/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑOS	consorciomedurbano@gmail.com	PMT	Oficio CVM-072-2025 PMT Especifico para cierre parcial Avenida Poblado	Anexo A. Plano de señalización 1 de 6.pdf 979K Anexo B. Plano de señalización 2 de 6.pdf 940K Anexo C. Plano de señalización 3 de 6.pdf 1146K Anexo E. Plano de señalización 5 de 6.pdf 1122K PMT Av. El Poblado.pdf 4917K Anexo D. Plano de señalización 4 de 6.pdf 1159K Oficio CVM-072-2025 PMT Especifico para cierre parcial Avenida Poblado.pdf 117K Anexo F. Plano de	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
								señalización 6 de 6.pdf 1100K	
14/10/2025	CVM-072-2025	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	CAMILO ANDRÉS ANGEL SALDARRIAGA	consorciomedurbano@gmail.com	PMT	PMT Especifico para cierre parcial Avenida Poblado	NO APLICA	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO
14/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑOS	consorciomedurbano@gmail.com	PMT	Oficio CVM-073-2025 Informe mensual PMT de septiembre	Oficio CVM-073-2025 Informe mensual PMT de septiembre.pdf 117K 1-INF.MENSUAL_PMT-SEPTIEMBRE 2025.pdf 3111K Anexo. Bolsa PMT_Septiembre.xlsx 17562K	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO
14/10/2025	CVM-073-2025	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	CAMILO ANDRÉS ANGEL SALDARRIAGA	consorciomedurbano@gmail.com	PMT	Informe mensual PMT de septiembre	NO APLICA	YULANIS MARIET SIERRA BOLAÑO

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
14/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	profesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal	INGRESOS.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
14/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Acta de modificación septiembre	Acta de modificación 1_GJCL. Final.xlsx 12230K FO-GECO-112ActadeAjusteCantidades_v8.docx 969K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: Acta de modificación septiembre	FO-GECO-112ActadeAjusteCantidades_v8 Revisada.docx 970K Acta de modificación 1_GJCL. (Modificada ajustada).xlsx 12208K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	CESAR RIVAS	ingealquipos.vialmed2025@gmail.com	LILIA MARGARITA BERMUDEZ RAMIREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Administrativo	Consorcio VialMed2025 - Rpta email interventoría Oct 14, 2025 at 8:58 AM, Ajuste Cálculo del A para agosto.	14102025_Cálculo del AU_ AGOSTO VF (RevDA).xlsx	LILIA MARGARITA BERMÚDEZ RAMÍREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
14/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acta N°3 Septiembre	Acta 3.xlsx Anexos.rar	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
14/10/2025	EMAIL	ASNEY GARCÍA AGAMEZ DORIELA OSPINA M..	MALLAVIAL2025@gmail.com	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZALEZ MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO.	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión Social	Re: Observaciones informe social N°3_Septiembre	3-Inf Septiembre 2025.zip	LUISA FERNANDA RESTREPO GONZÁLEZ
14/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	Residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 15-10-2025	MAPA JORNADA 15-10-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 15-10-2025.xlsx 15K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
15/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RE: Acta 01 ajuste cantidades para corregir	NO APLICA	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
15/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
15/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDÍA DE MEDELLÍN - BACHES Y HUECOS. ESTADO: REPORTADO	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
15/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Ejecutado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
15/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	PROfesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	Ingreso de personal Ingealquipos	CASTILLO ROJAS JUAN CAMILO.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
15/10/2025	EMAIL	FRANCY MILENA ESCOBAR MORALES	PROfesionalsst.vialmed2025@gmail.com	LUIS NORBERTO LEON ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Gestión SST	profesionalsst.vialmed2025 te ha enviado INFORME No. 3 CONSORCIO VIALMED 2025 SEPTIEMBRE.rar con WeTransfer	INFORME No. 3 CONSORCIO VIALMED 2025 SEPTIEMBRE.rar	LUIS NORBERTO LEÓN ÁLVAREZ
15/10/2025	EMAIL	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO	gabriel.cardona@medellin.gov.co	MARIA CATALINA MARTÍNEZ ROMERO	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	RV: Respuesta firmada	202530500381.pdf 264K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
15/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Ejecutado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
15/10/2025	EMAIL	ALCALDÍA DE MEDELLÍN	REPortesmed@medellin.gov.co	MARIA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	ALCALDIA DE MEDELLIN - REPORTE DE HUECOS. ESTADO: Aceptado	NO APLICA	MARÍA ALEJANDRA ARANGO DÁVILA
15/10/2025	EMAIL	LUIS ALEJANDRO CASTRO ROQUE	Residente2.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	PROGRAMACIÓN DE OBRA VIALMED 16-10-2025	MAPA JORNADA 16-10-2025.txt 1K PROGRAMACIÓN DIARIA 16-10-2025.xlsx 15K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
15/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Soportes balance bolsa socioambiental	Anexos.rar 4741K Balance Bolsa Socioambiental PMT y SST REV INTERV.xlsx 15659K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
15/10/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	re Soportes balance bolsa socioambiental	Balance Bolsa Socioambiental PMT y SST REV INTERV.xlsx 15657K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

EMAIL		REMITENTE		DESTINATARIO		CONTENIDO			
Fecha	**eMAIL**	**Nombre**	**Correo**	**Nombre**	**Correo**	**Tema**	**Asunto**	**documentos adjuntos**	**RECIBE**
16/10/2015	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	re Soportes balance bolsa socioambiental	Balance Bolsa Socioambiental PMT y SST REV INTERV aprob.pdf 890K	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ
1/11/2025	EMAIL	NATALIA CALDERÓN VÁSQUEZ	directora.vialmed2025@gmail.com	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ	consorciomedurbano@gmail.com	Técnico	Acta de modificación cantidades subcontratista Pavimentar	CVM25-02 de 2025 PAVIMENTAR SA_ACTA DE AJUSTE DE CANTIDADES	MARIA CATALINA OCHOA ALVAREZ

Anexo 4.5.2 Correspondencia recibida **octubre de 2025.**

4.6 COPIA DE LA BITÁCORA:

Durante este periodo se diligenciaron las bitácoras de obra en las cuales se hace la descripción de las actividades llevadas a cabo en los frentes de obra priorizados, y se detallan las observaciones realizadas al contratista o los cometarios y/o cambios propuestos por la supervisión en los recorridos de obra, en las bitácoras se detallan los esquemas de las intervenciones realizadas. Se anexa copia de las bitácoras del mes de **octubre de 2025.**

Anexo 4.6.1 Copia digital de las bitácoras de obra.

5 INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

5.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

Imputación presupuestal

El contrato de obra N° 4600105052 de 2025, cuenta con los recursos disponibles para su ejecución por parte del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, mediante la siguiente información presupuestal: CDP N° 4000120693 por valor de $42.428.847.850.

Tabla 89. Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
11000025 Recursos del Crédito 2025	74100000	23201010010302	240092	4000120693	5100008576	5100008576

A la fecha de corte del presente informe, correspondiente al tercer mes del contrato de obra, el Contratista ha presentado el acta de obra No. 1, 2 y 3 correspondiente a las actividades ejecutadas durante el mes de julio, agosto y septiembre de 2025 respectivamente, lo que representa una inversión acumulada de $ 13.613.585.391,27, equivalente al 34,55% del total de los recursos del contrato.

5.2 RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE OBRA:

Al **30 de octubre de 2025**, se ha realizado pagos por parte del Distrito al Contratista Consorcio Vial Med 2025 así:

Tabla 90. Relación pagos realizados

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Acumulado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
	$ 39.403.924.837	FC-1	22/07/2025	$ 394.039.248	$ 394.039.248	$ 39.009.885.589	1,00%
		FC-2	20/08/2025	$ 713.363.421	$ 1.107.402.669	$ 38.296.522.168	2,81%
		FC-4	19/09/2025	$ 3.284.047.067	$ 4.391.449.736	$ 35.012.475.101	11,14%

Durante el mes de **octubre 2025** se presenta el Acta Parcial de Obra No 4, con las siguientes cantidades de obra conciliadas previamente entre el contratista e interventoría:

			ACTA N°4 (1 al 31 de octubre)		ACUMULADO	
ÍTEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1.1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL con equipo de precisión, comisión de topografía se hará con la frecuencia que indique la interventoría durante la ejecución del proyecto. Incluye libretas y planos.	día	18,00	$ 17.308.800,00	36,00	$ 34.617.600,00
1.2.1.1	Rango 0: De 0,5 a 5 Ton/Jornada. Horario diurno	TON	105,89	$ 134.386.058,00	424,22	$ 538.381.844,00
1.2.1.2	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario diurno.	TON	1966,63	$1.830.403.507,00	5733,41	$ 5.336.262.424,00
1.2.1.3	Rango 1: De 9.1 a 12.5 Ton/Jornada. Horario nocturno.	TON	211,72	$ 206.152.611,00	1091,80	$ 1.063.090.027,00
1.2.1.4	Rango 2: De 12.51 a 16 Ton/Jornada.	TON		$ -	0,00	$ -
1.2.2.1	Rango 3: De 8 a 19.99 m3/Jornada.	m3	499,95	$ 925.924.898,00	897,41	$ 1.662.042.848,00
1.2.2.2	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario diurno.	m3	1075,33	$1.940.956.287,00	2508,04	$ 4.526.974.354,00
1.2.2.3	Rango 4: De 20 a 50 m3/Jornada. Horario nocturno.	m3	345,64	$ 638.667.726,00	1256,16	$ 2.321.082.937,00

1.3.2	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica discontinua tibia SMA (Stone Mastic Asphalt), las cuales se pueden obtener bajo el resultado de la combinación de material bituminoso, agregados de granulometría discontinua con gran cantidad de gruesos, poco tamaño medio y gran cantidad de finos, con fibras de celulosa y eventualmente aditivos, bajo las normas SMA internacionales y en concordancia con lo estipulado en la norma INVIAS 2022 para estos casos especiales y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificados. Incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su medida de pago será metro cúbico compacto medido por topografía.	m3	272,69	$ 609.467.393,00	272,69	$ 609.467.393,00
1.3.4	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia de alto módulo MAM-19 y/o MAM-25, que cumpla con el capítulo 450-22 de la norma INVIAS 2022 y utilizar asfalto modificado con polímeros debidamente certificado, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher) y compactación. Incluye reconocimiento para el transporte de cuadrilla y herramientas. Su pago será por metro cúbico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	m3	809,88	$ 1.493.979.860,00	1929,83	$ 3.559.941.545,00
1.3.6	Suministro y aplicación de mezcla asfáltica tibia adicionada con Fibra sintéticas de aramida y poliolefina tipo Semidensa MSC-25 Y/O MSC-19, que cumpla con el capitulo 450-22 y 418-22 de la norma INVIAS 2022 y con asfalto normalizado y certificado por el proveedor que cumpla con lo estipulado en el artículo 450-22 (Asfalto de penetración 60-70) de dicha norma, incluye: suministro, transporte, imprimación, colocación con terminadora de asfalto (finisher), y compactación. Su medida de pago será metro cubico compacto medido por topografia. HORARIO NOCTURNO	m3	757,04	$ 1.353.846.428,00	1245,05	$ 2.226.579.882,00

1.3.7	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MDC-19 para construcion de resaltos. Compactada con medios mecánicos. Incluye riego de liga y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según detalle SIF	m3	7,14	$ 15.801.616,00	25,06	$ 55.431.396,00
1.4.2	Fresado de vías con maquina fresadora que posea equipo de cargue del material fresado a la volqueta (conveyor), incluye: fresado de la superficie, cargue y transporte del material al sitio designado por la interventoría, retiro del pavimento en proximidades a sardineles y otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, barrido y soplado de la superficie. Toda la actividad deberá cumplir con el artículo 460-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras INVIAS 2022. HORARIO NOCTURNO	m3	1313,19	$ 274.716.211,00	2469,12	$ 516.532.706,00
1.4.3	Sellado de grietas, comprende suministro, aplicación de sello SIN ruteado de grieta, de 16 mm de espesor por 19 mm de profundidad con banda de sobre-ancho de 3 pulgadas.	m	1977,00	$ 20.206.917,00	1977,00	$ 20.206.917,00
1.4.5	Demolición de carpeta asfáltica cualquier espesor. Incluye picada en tamaños máximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de reciclaje de la SIF y botada del material que no se pueda recuperar.	m2	73,66	$ 2.430.706,00	111,35	$ 3.674.471,00
1.4.6	Corte de carpeta asfáltica con máquina de disco diamantado.	m	195,08	$ 1.882.717,00	210,72	$ 2.033.659,00
1.4.7	Transporte, aplicación y compactación de llenos con material reciclado de fresado de pavimento; compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor Modificado. Incluye transporte desde la planta del Municipio de Medellín. Medido en sitio.	m3		$ -	43,40	$ 3.557.151,00
1.4.8	Transporte de material fresado desde el punto de acopio indicado por la interventoria hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP	m3/km		$ -	13452,08	$ 23.204.838,00
1.4.9	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	1912,85	$ 15.744.668,00	5236,99	$ 43.105.628,00

1.5	**REALCES**					
1.5.1	Realce de caja válvula de compuerta incluye tapa polimérica.	un	3,00	$ 1.558.743,00	3,00	$ 1.558.743,00
1.5.3	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	12,00	$ 20.418.840,00	12,00	$ 20.418.840,00
1.5.6	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	5,00	$ 7.509.120,00	5,00	$ 7.509.120,00
1.6	**ENSAYOS Y DISEÑOS**					
1.6.1	Diseño estructural de pavimentos, incluye: Exploración de campo, ejecución de apiques, ensayos de laboratorio, exploración con georradar y evaluación de deflexiones con FWD, análisis estructural y diseños necesarios.	km/calzada		$ -		$ 29.825.251,00
2.1.6	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO de cualquier resistencia, reforzado, ciclópeo y en cualquier clase y forma de estructura: Estructuras de contención, fundaciones, columnas, vigas, losas, escaleras, muros, coberturas, cámaras de inspección, entre otros; incluye transporte interno hasta el sitio de almacenamiento, recuperación de los materiales aprovechables, retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado e instalaciones embebidas; se contempla el equipo necesario para su correcta ejecución.	m3	53,98	$ 12.867.451,00	77,59	$ 18.496.174,00
2.1.7	Desmonte de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría.	m2	15,33	$ 286.664,00	165,41	$ 3.093.516,00
2.1.8	Desmonte y reinstalación de piso en adoquín. Incluye recuperación de los materiales, su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, arena de pega, arena de revoque y mano de obra y todo lo necesario para su correcto desmonte y reinstalación.	m2	390,76	$ 44.409.874,00	514,90	$ 58.518.226,00
2.2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIONES Y LLENOS**					

2.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³. Incluye transporte interno del material proveniente de las excavaciones al sitio donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado ni botada del material.	m3	73,35	$ 4.777.799,00	114,90	$ 7.484.242,00
2.2.3	Suministro, transporte, colocación y compactación de Subbase granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 95% del ensayo Proctor modificado. Que cumpla con el artículo 320-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3		$ -	14,72	$ 3.398.689,00
2.2.4	Suministro, transporte, colocación y compactación de Base granular Clase A, reacomodada con MEDIOS MECÁNICOS y compactada al 98% del ensayo Proctor modificado, que cumpla con el artículo 330-22 de la norma INVIAS 2022. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	40,67	$10.203.455,00	75,41	$18.918.912,00
2.2.5	Suministro, transporte y colocación de ARENILLA compactado mecánicamente hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado. Su medida será en sitio.	m3		$ -	1,21	$177.684,00
2.2.6	Recuperación y perfilación de subrasante, incluye sellado y compactación mecánica.	m3	42,58	$1.661.131,00	42,63	$1.663.094,00
2.2.7	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3	98,53	$ 810.976,00	98,53	$ 810.976,00
2.2.8	Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km	25,67	$ 68.205,00	25,67	$ 68.205,00
2.3	**ACERO DE REFUERZO**					

2.3.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	1508,00	$ 11.138.105,00	3540,04	$ 26.146.746,00
2.4	**CONCRETOS Y ADOQUINES**					
2.4.1	Suministro, transporte y colocación de Concreto premezclado en planta MR40 para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido (Se deben seguir las recomendaciones y precauciones del productor) formaleta, vibrado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción. Curado con Antisol.	m3	59,79	$ 73.951.627,00	94,81	$ 117.272.689,00
2.4.2	Suministro, transporte y colocación de Concreto vaciado de 28 Mpa para construcción pavimento rígido. Incluye juntas con cortadora de disco a la distancia que lo determine la interventoría, soporte fondo de junta cordón de espuma polietileno y apoyo de masillas sellantes para la aplicación del sellante de juntas elastomérico de poliuretano de alto desempeño y tiempo de secado rápido, se debe seguir las recomendaciones y precauciones del productor; formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	2,93	$ 3.680.900,00	15,29	$ 19.211.536,00
2.4.3	Suministro, transporte y aplicación de aditivo tipo acelerante de fraguado y resistencia para concretos. Aplica para concretos premezclados o realizados en obra. Se debe tener en cuenta las recomendaciones de aplicación, de manejo, de almacenamiento dadas por el productor. Se pagará por m3 de concreto con aditivo colocado en obra.	m3	62,59	$ 5.071.468,00	112,29	$ 9.098.421,00

2.4.4	Suministro, transporte y colocación de Concreto 21 Mpa Ciclópeo 50% de piedra, para recinte, espesor 20-30 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	2,10	$ 436.361,00	23,41	$ 4.863.556,00
2.5	**REALCES**					
2.5.3	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1. Incluye anillo y tapa en polipropileno, demoliciones, botada de escombros, mezcla asfáltica, liga y todo lo necesario para su correcta construcción.	un	2,00	$ 3.403.140,00	2,00	$ 3.403.140,00
2.5.4	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11. TIPO 1 Incluye anillo , mezcla asfáltica, liga, demoliciones, botada de escombros y todo lo necesario para su correcta construcción. Incluye transporte e instalación de la tapa que será suministrada por la entidad en el lugar indicado por la interventoría.	un		$ -	4,00	$ 4.884.776,00
2.5.5	REALCE Y REEMPLAZO DE ANILLOS EN CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES – MH – Según norma NC-AS-IL02-11 TIPO 2. Incluye anillo y tapa prefabricados, demoliciones, botada de escombros, formaletas, concreto de 28 Mpa, y todo lo necesario para su correcta construcción.	un		$ -	1,00	$ 1.501.824,00
2.5.7	Suministro, transporte e instalación de reja metálica para sumidero tipo B - Según norma vigente de EPM.	un	5,00	$ 4.327.430,00	5,00	$ 4.327.430,0000
	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
3.1.3	Desobstrucción y limpieza de sumideros, incluye limpieza de tuberías hasta el MH más cercano, retiro y botada de material sobrante.	un	8,00	$ 1.726.080,00	50,00	$ 10.788.000,0000
3.2	**ACTIVIDADES EN CONCRETO Y PREFABRICADOS**					
3.2.5	Suministro, transporte y colocación de bordillo prefabricado de 15 x 45 x 80 cm (BOBAR) en concreto de 21 MPa, tres caras. Incluye conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento y pega y todo lo necesaria para su correcta instalación.	m	44,51	$ 5.066.796,00	44,51	$ 5.066.796,0000

3.2.6	Construcción de cordon - bordillo recto, vaciado en concreto de 21 Mpa. De acuerdo a diseño y necesidades del proyecto. Incluye formaleta y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	m3	0,76	$ 1.049.643,00	0,76	$ 1.049.643,0000
3.2.13	Suministro transporte y construcción de concreto de 21 Mpa para la construcción de llaves de confinamiento, según diseño. Vaciado monolitico con andenes, pisos duros, rampas, curado. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m3	0,80	$ 1.022.826,00	0,80	$ 1.022.826,0000
3.3	**ACEROS Y MALLAS**					
3.3.1	Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada Tipo D84. Incluye el suministro y transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	5,73	$ 88.498,00	5,73	$ 88.498,0000
3.4	**REDES HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS**					
3.4.2	Suministro, transporte e instalación de GEOTEXTIL NT 2500 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño del filtro.	m2		$ -	18,00	$ 266.958,0000
3.7	**CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA**					
3.7.1	Cargue MECÁNICO, transporte y disposición final de material proveniente de demolición, excavación y voladura de roca a sitio autorizado. Su medida será de acuerdo a las demoliciones, excavaciones y/o voladuras. El ítem incluye el factor de expansión. En caso de requerir el pago de derecho de botadero, se pagará en su ítem respectivo.	m3-km		$ -	8,36	$ 22.202,0000
3.7.2	Pago de derechos para disposición final de residuos de construcción, demolición y/o tierra, en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental.	m3		$ -	8,36	$ 68.779,0000
4.1	**SEÑALIZACIÓN**					
4.1.1	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	m2	98,16	$ 12.346.270,00	160,82	$ 20.227.872,0000

4.1.2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para marcas viales (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona escolar entre otros). TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO.	m2	293,46	$ 11.110.899,00	668,72	$ 25.319.076,0000
4.1.3	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. HORARIO NOCTURNO.	m	244,63	$ 5.256.854,00	326,80	$ 7.022.605,0000
4.1.4	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA de 0.12M para canalización continua o segmentada, berma, agujas, celdas de estacionamiento entre otras. HORARIO NOCTURNO.	m	3800,18	$ 31.974.715,00	4679,07	$ 39.369.695,0000
4.1.5	Suministro y aplicación de pintura plástico en frío con resistencia al deslizamiento para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. Incluye microesferas de vidrio y alúmina antideslizante. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	m	177,94	$ 7.578.465,00	225,21	$ 9.591.694,0000
4.1.6	Suministro y aplicación de pintura acrílica para demarcación de LÍNEA DE 0.40M para pasos peatonales, líneas de resalto, líneas de pare, entre otras. TRABAJOS EN HORARIO NOCTURNO	m	1352,14	$ 27.424.103,00	2209,78	$ 44.818.757,0000
4.3	**RETIRO, REPARACIÓN Y PINTURA DE PASAMANOS Y OTROS**					
4.3.4	Retiro mecánico de pintura de barandas tipo pingüino y/o defensas metálicas, para la correcta aplicación e instalación de pintura nueva.	m	15,00	$ 267.990,00	15,00	$ 267.990,0000

SUBTOTAL OBRAS	**COSTO CON AIU**	**$**	**9.793.370.831,00**	**COSTO CON AIU**	**$**	**23.073.830.801,00**
	COSTO DIRECTO	**$**	**7.709.494.474,53**	**COSTO DIRECTO**	**$**	**18.164.079.982,00**
	DESCUENTO IMPREVISTOS	**-$**	**77.094.944,75**		**-$**	**181.640.800,00**
		$	**2.083.876.356,47**	**AIU**	**$**	**4.909.750.819,00**

SUBTOTAL OBRAS				
Destinación pago de Reajustes y Factor prestacional del AIU no exonerados				$ -
Inversión Socio-Ambiental e Implementación PMT-bioseguridad - Gasto Reembolsable -				$ 328.533.103,27
Pólizas - Gasto Reembolsable-				$ 109.138.173,00
VALOR TOTAL ACTA 4		$ 9.716.275.886,25		$ 23.329.861.277,27

Para la ejecución del contrato de obra N° 4600105252 DE 2025, con objeto “REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA”, no se otorgó anticipo por parte del Distrito. Sin embargo, se otorgó al contratista a título de pago anticipado un valor equivalente al uno [1%] por ciento del valor básico del contrato. El pago anticipado se regirá por las condiciones señaladas en la CLAUSULA 6 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO de Minuta del Contrato.

Este pago, se entregó bajo las siguientes condiciones:

- ✓ La entidad, otorgará un pago anticipado correspondiente al 1 % del valor total del contrato, con la finalidad de garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.

- ✓ El contratista al facturar el segundo pago descontará del total a pagar por parte de la Entidad Contratante la suma correspondiente al pago anticipado y en caso de que el valor facturado no sea suficiente, dicho descuento se realizará en las subsiguientes facturas hasta abarcar la totalidad del valor del pago anticipado entregado por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín al contratista.

- ✓ La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado.

- ✓ La finalidad del pago anticipado correspondiente al uno (1%) por ciento del valor total del contrato, es garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.

Considerando lo anterior, se realizó un pago anticipado al contratista Consorcio VialMed 2025 por valor de $ 394.039.248.

Tabla 91. Relación pagos realizados por pago anticipado

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	Valor Facturado	Acumulado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
	$ 39.403.924.837	FE-1	22/07/2025	$ 394.039.248	$ 394.039.248	$ 39.009.885.589	1%.

5.3 CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA:

Para la ejecución del contrato de obra N° 4600105052 DE 2025, con objeto “REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA”, no se otorgó anticipo por parte del Distrito.

5.4 RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

En la CLAUSULA 5 VALOR DEL CONTRATO, están relacionados claramente los valores de las retenciones, impuestos, tasas y contribuciones aplicables al contrato 4600105052 de 2025, así:

- ✓ Contribución especial para la seguridad: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato antes de IVA, de conformidad con la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014.
- ✓ Retención en la Fuente: Corresponde al pago anticipado del Impuesto de Renta.
- ✓ Gravamen a los movimientos financieros: Equivalente al cuatro por mil (4#) del valor total del contrato. Se debe considerar la deducción del 50% de que trata el Artículo 115 del Estatuto Tributario.
- ✓ Impuesto de Industria y Comercio: Recae sobre las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realicen en la jurisdicción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, su tarifa corresponde al millaje establecido, según su actividad, en el artículo 71 del Acuerdo 93 de 2023.
- ✓ Estampilla Universidad de Antioquia: Correspondiente al 1% de los valores efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en los artículos 288 y 289 del Acuerdo 93 de 2023.
- ✓ Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor: Equivalente al 2% de los valores efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 273 y 274 del Acuerdo 93 de 2023.
- ✓ Estampilla Pro-Cultura: Equivalente al 0,5% de los valores efectivamente pagados por concepto del contrato antes de IVA, de conformidad con los artículos 254 y 255 del Acuerdo 93 de 2023.
- ✓ Tasa Pro-Deporte y Recreación: Equivalente al 1,3% del valor total del contrato de conformidad con el artículo 206 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Estampilla para la Justicia Familiar: Equivalente al 2% de cada cuenta que se pague al contratista, antes de IVA, de conformidad con el artículo 313 del Acuerdo 93 de 2023.

- ✓ Impuesto de Timbre Nacional: Correspondiente al 0,5% del valor del contrato antes de IVA, de conformidad con el Decreto legislativo 0175 de 2025 que modifica temporalmente el parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario.

La relación de retenciones causadas asociadas al cobro del acta de obra N° 1 se relacionará en el informe mensual de interventoría N° 4.

5.5 RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

A la fecha no se han presentado imprevistos que requieran ser reconocidos por la entidad contratante al Consorcio VialMed 2025.

6 INFORME JURÍDICO:

6.1 RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

A la fecha no se ha reportado ninguna reclamación, controversia o acuerdo.

6.2 RELACION DE SANCIONES:

A la fecha no se ha adelantado ningún proceso de multa, sanción, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

6.3 CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

A continuación, se presenta el cuadro acumulativo con los datos identificativos del estado de todas y cada una de las coberturas que amparan a la entidad relacionada con la ejecución del contrato de obra.

Tabla 92. Relación de Pólizas Contrato de Obra

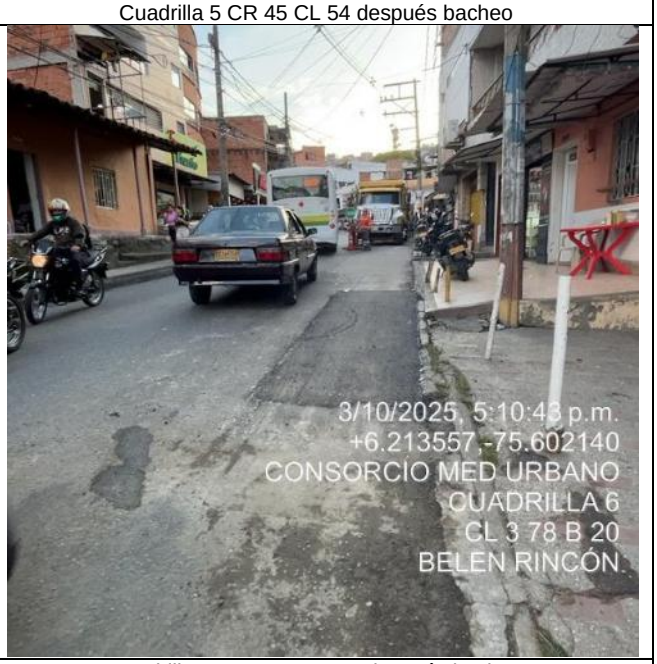
Nombre Asegurador	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha aprobación Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Garantías Actualizadas al inicio del contrato de obra - 21/07/2025						
Seguros Mundial	M-100266709 Anexo 4 del	Cumplimiento	21/07/2025	21/05/2026		$3.940.392.483,70
		Pago salarios, prestaciones sociales e	21/07/2025	21/11/2028		$1.970.196.241,85

Nombre Asegurador	No. Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha aprobación Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		indemnizaciones laborales				
		Pago anticipado	21/07/2025	21/05/2026		$394.039.248,37
		Estabilidad de la obra	21/11/2025	21/11/2030		$3.940.392.483,70
	M-100066947 Anexo 4 del 22/07/2025	Responsabilidad Civil Extracontractual	10/06/2025	21/11/2025		$1.970.196.241,85

7 REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:

	
Cuadrilla 1 CL 30 CR 89 DB	Cuadrilla 1 CL 30 CR 89 DB
	
Cuadrilla 2 CL 56 H # 17A-20 antes bacheo	Cuadrilla 2 CL 56 H # 17A-20 después bacheo

	
Cuadrilla 3 CR 50B CL124-02 antes bacheo	Cuadrilla 3 CR 50B CL 124-02 después bacheo
	
Cuadrilla 4 CR 17B CL 56 antes bacheo	Cuadrilla 4 CR 17B CL 56 después bacheo

	
Cuadrilla 5 CR 45 CL 54 antes bacheo	Cuadrilla 5 CR 45 CL 54 después bacheo
	
Cuadrilla 6 CL 3 # 78 B 20 antes bacheo	Cuadrilla 6 CL 3 # 78 B 20 después bacheo



Cuadrilla 7 CL 97 # 73 B 32 antes bacheo



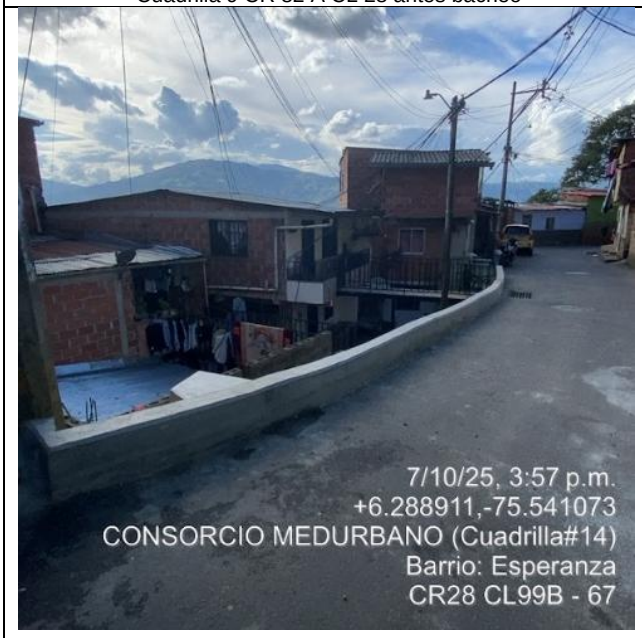
Cuadrilla 7 CL 97 # 73 B 32 después bacheo



Cuadrilla 8 CR 49 CL 76 - 42 antes bacheo



Cuadrilla 8 CR 49 CL 76 - 42 después bacheo

	
Cuadrilla 9 CR 82 A CL 28 antes bacheo	Cuadrilla 9 CR 82 A CL 28 después bacheo
	
Cuadrilla 10 CR 28 CL 99 B 67	Cuadrilla 10 CR 28 CL 99 B 67



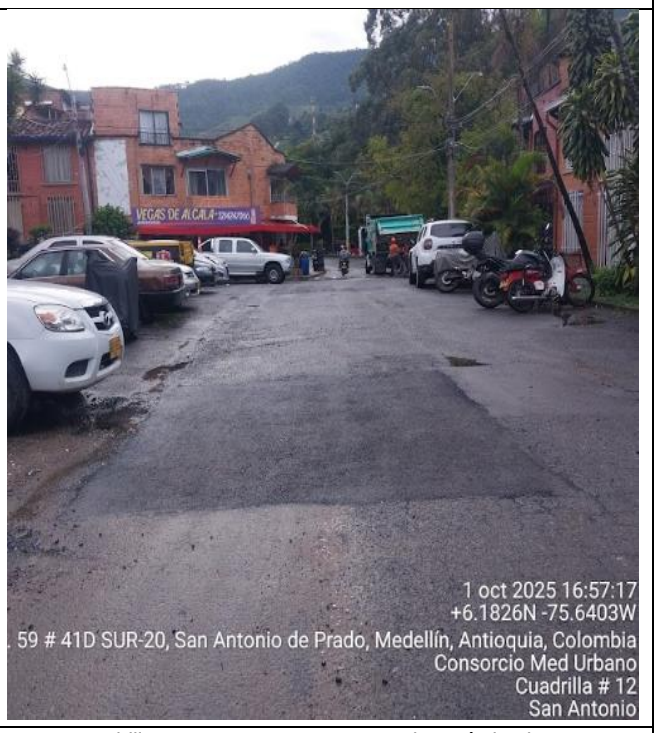
Cuadrilla 11 CL 49 CR 99 y 99AA antes bacheo



Cuadrilla 11 CL 49 CR 99 y 99AA después bacheo



Cuadrilla 12 CR 59 # 41 D SUR 20 antes bacheo



Cuadrilla 12 CR 59 # 41 D SUR 20 después bacheo

	
Cuadrilla 13 CL 59 A entre CR 35 y CR 31antes bacheo	Cuadrilla 13 CL 59 A entre CR 35 y CR 31 después bacheo
	
Cuadrilla 14 CR 23 B entre CL84 B y CL87 antes	Cuadrilla 14 CR 23 B entre CL 84B y CL87 después

	
Cuadrilla 15 CR 48 CL 12 SUR antes	Cuadrilla 15 CR 48 CL 12 SUR después
	
Cuadrilla 16 CL 44 CR 55 antes	Cuadrilla 16 CL 44 CR 55 después

	
Cuadrilla 17 CR 13 entre CL 52 y 53 antes	Cuadrilla 17 CR 13 entre CL 52 y 53 después
	
Cuadrilla 18 CL 32 F # 74 B 35 antes	Cuadrilla 18 CL 32 F # 74 B 35 después

	
Cuadrilla 19 CR 21 entre CL 59 y 59A antes	Cuadrilla 19 CR 21 entre CL 59 y 59A después
	
Cuadrilla 20 CL 49 A entre CR 87 y 87A antes	Cuadrilla 20 CL 49 entre CR 87 y 87A después



Cuadrilla 21 CR 87 entre CL 47 y 47D antes



Cuadrilla 21 CR 87 B entre CL 47 y 47D durante



Cuadrilla 21 CR 87 B entre CL 47 y 47D durante



Cuadrilla 21 CR 87 B entre CL 47 y 47D después

8 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Durante el mes de **octubre de 2025**, el Contratista de Obra dispuso 21 cuadrillas de trabajo para la ejecución de actividades programadas, principalmente en atención de baches con rango 0, rango 1, rango 3, rango 4, mantenimiento masivo, obras complementarias y señalización (demarcación con plástico en frío).

Las intervenciones se continúan priorizado de acuerdo con las solicitudes mediáticas emitidas por la Supervisión, complementadas con los reportes generados a través de la plataforma SIRO. No obstante, la Interventoría ha instado al Contratista a acelerar el ingreso de nuevas cuadrillas, en cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta y cobertura del proyecto.

En el periodo evaluado, mes de **octubre de 2025**, se evidencia que los materiales y procesos usados en las actividades de bacheo, están bajo la normativa y estándares de calidad que los rige.

Entre el **1 y el 31 de octubre de 2025**, se realizaron labores de mantenimiento puntual en un total de **1064 baches**, para un acumulado a la fecha de **3517 baches** utilizando mezcla asfáltica densa tibia tipo MDC-19 con incorporación de material reciclado (RAP).

Durante este período de trabajo, la inversión financiera es de **$9.716.275.886**, lo que representa el 24,66% del valor total del contrato, y una inversión financiera acumulada de **$23.329.861.277**, o sea el 59,21% del valor total del contrato.

Estas actividades evidencian un avance importante en la atención de puntos críticos de la malla vial, permitiendo mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en los segmentos intervenidos, pero no se está cumpliendo con el plan de inversión presentado al iniciar el contrato, el cual, al **31 de octubre de 2025** debería encontrarse en el 79,38%, lo que evidencia un atraso del 17,68% frente a la programación inicial.

La Interventoría y la supervisión del contrato han estado al pendiente. Haciendo seguimiento de la programación y rendimientos del contratista de tal forma que se garanticen los avances adecuados para este periodo.

El equipo social del contratista ha dado cumplimiento con cada uno de los programas y subprogramas establecidos en el PASAO.

Se ha realizado un estricto seguimiento al contratista, en cuanto a los compromisos adquiridos diaria y semanalmente, e instaurados en el Plan de Gestión Social.

Los diferentes frentes de obra cuentan con sus respectivas vallas tijera en buenas condiciones, los vehículos del Contratista tienen su lona informativa, dando cumplimiento al Manual de imagen del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

En el periodo reportado todo el personal se mantuvo afiliado al sistema general de seguridad social; así como estuvo recibiendo capacitación, elementos de protección personal y dotación.

Desde el componente SST, se ha recomendado al Contratista ejecutar los planes de acción derivados de la investigación de los accidentes de trabajo presentados en este periodo. Igualmente, continuar con la realización de los pre operacionales e inspecciones de los frentes de trabajo para identificar posibles riesgos y corregir cualquier situación inadecuada que se presente.

Atentamente,

CAMILO ANDRÉS ÁNGEL SALDARRIAGA
Director de Interventoría
CONSORCIO MEDURBANO 2025
Matricula profesional: 05202-50289
Fecha de elaboración: septiembre 15 de 2025

Elaboro **María Alejandra Arango Dávila** Residente Administrativa Interventoría	**Elaboro** **Cristian David Correa Alvarado** Residente Civil de Interventoría	**Elaboro** **María Catalina Ochoa A.** Residente Civil de Interventoría
Elaboro **María Catalina Martínez R.** Profesional Social de Interventoría	**Elaboro** **Jorge Luis Monsalve Montiel** Residente Ambiental de Interventoría	**Elaboro** **Luis Norberto Alvarez León** Residente SST de Interventoría
Elaboro **Yulanis Mariet Sierra Bolaño.** Especialista PMT de Interventoría		
