CONTRATO ■ **CONVENIO** □

Proyecto (S): RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

LOCALIZACIÓN: Municipio: CERETE Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 24 DE OCTUBRE – 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	**063 - 2025**
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	**CONTRATO DE OBRA**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BUGRE 2025
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
OBJETO:	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($558.145.182)
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($223.258.073)
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	24 DE DICIEMBRE DE 2025

Scanned with CamScanner

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	**N/A**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**N/A**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

Póliza inicial para firma

ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	N/A			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**53-44-101041371**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento de contrato	SI	23/10/2025	30/06/2026	$111.629,036.40
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	SI	23/10/2025	30/06/2026	$223.258.072,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	23/10/2025	30/06/2028	$55.814.518.20
Estabilidad y calidad de la obra	SI	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		$111.629.036,40
POLIZA RCE No	**CBC - 100013742**			
Predios laborales y operacionales	SI	23/10/2025	30/12/2025	$ 711.750.000,00
Contratistas y subcontratistas	SI	23/10/2025	30/12/2025	$ 711.750.000,00
Vehículos propios y no propios	SI	23/10/2025	30/12/2025	$ 711.750.000,00

Scanned with CamScanner

Póliza actualizada al acta de inicio

SEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO			
IT ASEGURADORA	860.009.578-6			
-MAIL ASEGURADORA	N/A			
OLIZA CUMPLIMIENTO No	**53-44-101041371**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
umplimiento de contrato	SI	24/10/2025	01/07/2026	$111.629,036.40
uen manejo y correcta versión de anticipo	SI	24/10/2025	01/07/2026	$223.258.072,80
ago de salarios, prestaciones ociales legales e demnizaciones laborales	SI	24/10/2025	31/12/2028	$55.814.518.20
stabilidad y calidad de la obra	SI	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		$111.629.036,40
OLIZA RCE No	**CBC - 100013742**			
redios laborales y peracionales	SI	24/10/2025	31/12/2025	$ 711.750.000,00
ontratistas y subcontratistas	SI	24/10/2025	31/12/2025	$ 711.750.000,00
ehículos propios y no propios	SI	24/10/2025	31/12/2025	$ 711.750.000,00


REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO :

MEDIO DE TRAMITE	RADICADO	FECHA	ASUNTO
SIDCAR	20252117489	04/11/2025	Recordatorio de obligaciones contractuales, requisitos para anticipo y citación a comité inicial – Contrato de Interventoría No. 062 de 2025
SIDCAR	20252117968	13/11/2025	Recordatorio de cumplimiento de las obligaciones contractuales – Contrato No. 062-2025
SIDCAR	20252118108		Recordatorio de obligaciones relacionadas con la programación y desarrollo de actividades comunitarias – Contrato 062-2025

Scanned with CamScanner

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	**Realizar actividades preliminares**	-	-	-	-	-
1.1	Trazado, localización y replanteo	M	606	363,6	363,6	60%
2	**Movimiento de tierra**	-	-	-	-	-
2.1	Optimización de la sección hidráulica de cauce en la tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes	M3	19450	11670	11670	60%
2.2	Optimización de la sección hidráulica de cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes	M3	24313	14587,8	14587,8	60%

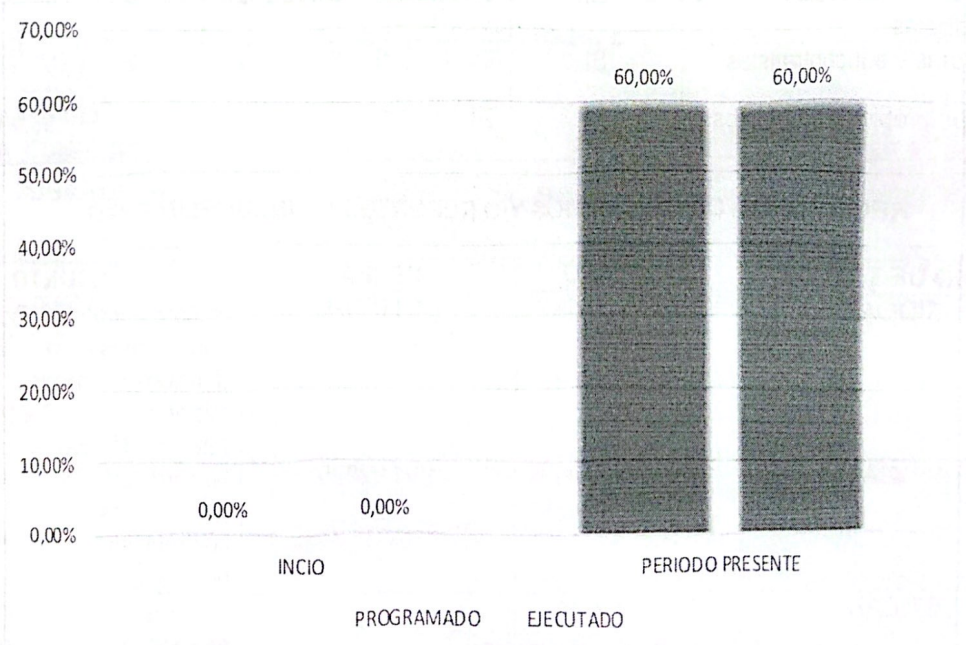

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

La gráfica evidencia el avance físico acumulado del proyecto comparando lo programado y lo ejecutado entre el inicio y el periodo presente; adicionalmente se observa que el avance programado alcanza el 60% y el avance ejecutado también se sitúa en 60%, lo que indica que las actividades desarrolladas se ajustan exactamente a lo planificado. Esto significa que el

Scanned with CamScanner

proyecto se está ejecutando conforme al cronograma establecido, reflejando un cumplimiento adecuado de las metas previstas para el periodo evaluado.

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $ 558.145.182
VALOR ANTICIPO $ 223.258.073
% AVANCE FINANCIERO 40%

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO		$ 558.141.182,32	-	$ 558.141.182,32	-		-	
ACTA 01	No se ha tramitado	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

Eje de calidad

Requisitos de calidad contratados	Cumple / No cumple	Observaciones
Asegurar que el personal requerido para la ejecución del contrato cuente con la educación, formación y experiencia para garantizar el óptimo desarrollo del objeto contractual.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Socializar con el equipo que realizará las actividades definidas en el contrato/convenio, la documentación básica del Sistema de Gestión Integral de la CVS.	NO CUMPLE EN SU TOTALIDAD	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Realizar un (1) ejercicio muestral para evaluar la percepción de satisfacción de los beneficiarios con respecto a la prestación del servicio y entregar a la CVS los resultados obtenidos.	NO SE EVIDENCIA EN SU TOTALIDAD	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución de objeto contractual e informar a la CVS de la radicación de estas.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Asegurar que los equipos de medición utilizados para el cumplimiento del objeto contractual cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus verificaciones intermedias y entregar copia de estas certificaciones a la CVS.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo

Scanned with CamScanner

Eje de Seguridad y salud en el trabajo

Requisitos de Seguridad y salud en el trabajo contratados	Cumple / No cumple	Observaciones
Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que garantice el cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco de su ejecución y la normatividad vigente.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
El contratista (persona Jurídica o Natural) deberá entregar al inicio del contrato la autoevaluación vigente (1 vez por año), la cual deberá estar por encima del 80%, este documento deberá estar aprobado por la ARL o Carta de certificación por la ARL del estado de avance del SG- SST, si el porcentaje de avance de este se encuentra entre el 0% y 60%, se deberá adjuntar además el plan de mejoramiento debidamente aprobado por la ARL.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Presentar a la CVS la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	NO CUMPLE EN SU TOTALIDAD	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de éstos.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Garantizar que todo el personal vinculado para la ejecución del contrato o convenio se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social y que disponga del concepto médico ocupacional favorable.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Contar con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Presentar el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y el programa estratégico de seguridad vial en los contratos o convenios en los cuales se haga uso de sistemas de transporte.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo

Eje Ambiental

Requisitos ambientales contratados	Cumple / No cumple	Observaciones
Identificar los aspectos e impactos ambientales de cada una de las actividades a ejecutar y establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato o convenio; de acuerdo con la normatividad vigente.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	NO PRESENTA TODA LA INFORMACION NECESARIA	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas

Scanned with CamScanner

CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Tramo a intervenir- sedimentación de los cauces




Fotografía 2. Tramo a intervenir- sedimentación de los cauces


21

Scanned with CamScanner




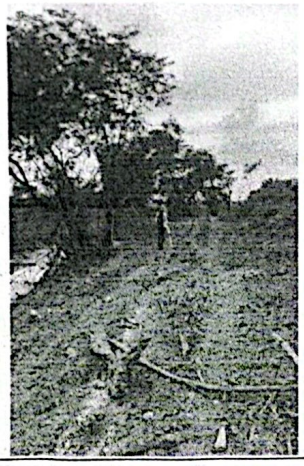

Fotografía 5. Localización, trazado y replanteo.

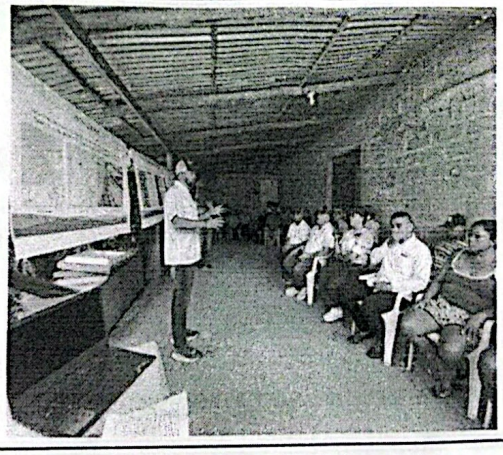

Fotografía 8. Socialización del proyecto.

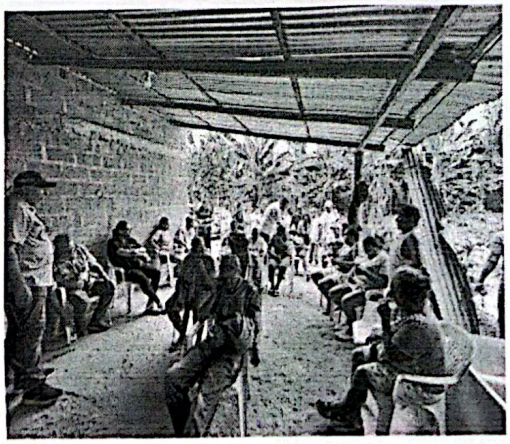

Fotografía 9. Socialización del proyecto.

Scanned with CamScanner

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la información contenida en el informe de avance técnico mensual correspondiente al período del 24 de Octubre al 24 de Noviembre de 2025, se revisaron los datos proporcionados, realizando el seguimiento correspondiente a cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato 052-2025. Como resultado, se constató un cumplimiento satisfactorio en la mayoría de las obligaciones todas revisadas en función de cronograma de actividades presentado al inicio de la ejecucion de proyecto. Se realizaron algunas sugerencias respecto a la presentación del informe técnico y del informe PGIO de este periodo ya que este no fue presentado bajo los lineamientos establecidos y socializados al inicio de la ejecucion de mismo; a la fecha se presentaron los resultados evidenciados de la obra e interventoría según la información allegada por el contratista e interventoría en los informes de presente periodo, los cuales deben ser ajustados según las sugerencias realizadas.

Se sugiere al contratista cumplir con los tiempos estipulados para la entrega de los informes y toda la información requerida por la supervisión CVS, con el fin de asegurar un seguimiento adecuado y verificar que todas las actividades del cronograma se cumplan dentro de los plazos contractuales establecidos.

Para constancia se firma a los 24 días del mes de noviembre del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Supervisor CVS

Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe 24/11/2025

72

Scanned with CamScanner

CONTRATO ■ **CONVENIO** ☐

Proyecto (S): RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

LOCALIZACIÓN: Municipio: CERETE Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 24 DE NOVIEMBRE – 24 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	**063 - 2025**
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	**CONTRATO DE OBRA**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO BUGRE 2025
REPRESENTANTE LEGAL:	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
OBJETO:	RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($558.145.182)
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($223.258.073)
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	24 DE DICIEMBRE DE 2025

23

Scanned with CamScanner

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Documento	Desde	Hasta
	Suspensión No.1	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	N/A		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	N/A	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

Póliza inicial para firma

ASEGURADORA	SEGUROS DE ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	N/A			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**53-44-101041371**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento de contrato	SI	23/10/2025	30/06/2026	$111.629,036.40
Buen manejo y correcta inversión de anticipo	SI	23/10/2025	30/06/2026	$223.258.072,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	SI	23/10/2025	30/06/2028	$55.814.518.20
Estabilidad y calidad de la obra	SI	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		$111.629.036,40
POLIZA RCE No	**CBC - 100013742**			
Predios laborales y operacionales	SI	23/10/2025	30/12/2025	$ 711.750.000,00
Contratistas y subcontratistas	SI	23/10/2025	30/12/2025	$ 711.750.000,00
Vehículos propios y no propios	SI	23/10/2025	30/12/2025	$ 711.750.000,00

Scanned with CamScanner

Póliza actualizada al acta de inicio

EGURADORA	SEGUROS DE ESTADO			
ASEGURADORA	860.009.578-6			
AIL ASEGURADORA	N/A			
LIZA CUMPLIMIENTO No	53-44-101041371			ANEXO No
CUBRIMIENTO	APLICA (Si/No)	INICIAL	FINAL	SUMA ASEG/ACTUAL
nplimiento de contrato	SI	24/10/2025	01/07/2026	$111.629,036.40
n manejo y correcta rsión de anticipo	SI	24/10/2025	01/07/2026	$223.258.072,80
o de salarios, prestaciones iales legales e mnizaciones laborales	SI	24/10/2025	31/12/2028	$55.814.518.20
abilidad y calidad de la obra	SI	Si ampara 1 años, 0 meses y 0 días		$111.629.036,40
LIZA RCE No	CBC - 100013742			
dios laborales y racionales	SI	24/10/2025	31/12/2025	$ 711.750.000,00
ntratistas y subcontratistas	SI	24/10/2025	31/12/2025	$ 711.750.000,00
ículos propios y no propios	SI	24/10/2025	31/12/2025	$ 711.750.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO :


MEDIO DE TRAMITE	RADICADO	FECHA	ASUNTO
SIDCAR	20252117489	04/11/2025	Recordatorio de obligaciones contractuales, requisitos para anticipo y citación a comité inicial – Contrato de Interventoría No. 062 de 2025
SIDCAR	20252117968	13/11/2025	Recordatorio de cumplimiento de las obligaciones contractuales – Contrato No. 062-2025
SIDCAR	20252118108		Recordatorio de obligaciones relacionadas con la programación y desarrollo de actividades comunitarias – Contrato 062-2025

Scanned with CamScanner

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUC ACTIVID
1	**Realizar actividades preliminares**	-	-	-	-	-
1.1	Trazado, localización y replanteo	M	606	363,6	606	100%
2	**Movimiento de tierra**	-	-	-	-	-
2.1	Optimización de la sección hidráulica de cauce en la tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes	M3	19450	7780	19450	100%
2.2	Optimización de la sección hidráulica de cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes	M3	24313	9.725,20	24313	100%

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

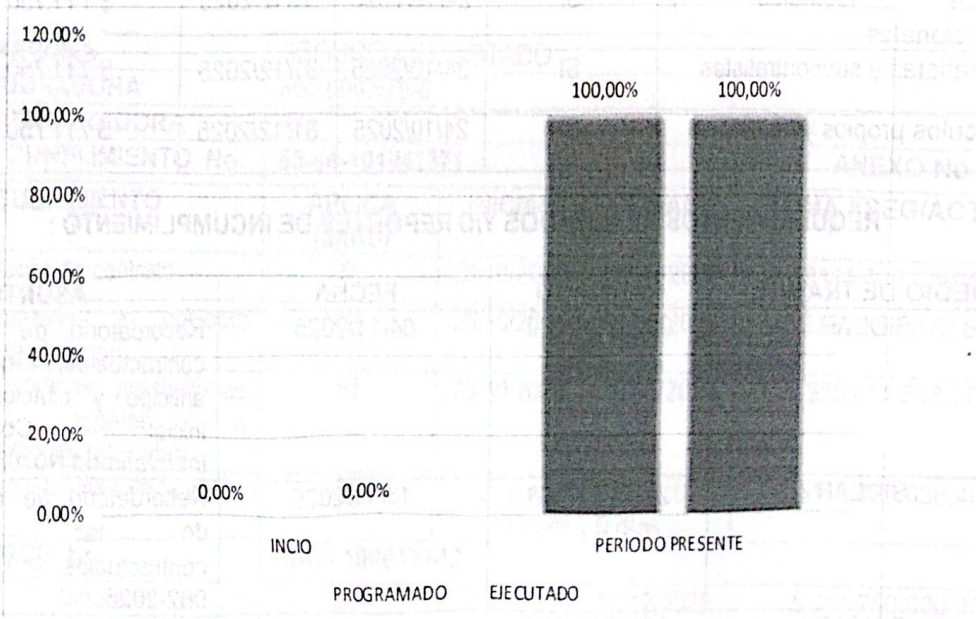

La gráfica muestra el avance físico acumulado del proyecto al comparar el estado inicial con el periodo presente. Para el periodo presente, se observa que el avance programado alcanza el 100% y el avance ejecutado también llega al 100%, lo que indica que la totalidad de las actividades previstas fueron desarrolladas conforme a lo establecido en el cronograma. Esto refleja un cumplimiento total de las actividades del proyecto dentro de los tiempos contractuales establecidos. El avance del mismo se estima según las actividades presentadas dentro de cronograma de actividades avalado por la interventoría al inicio de ejecucion de presente proyecto y el informe técnico presentado por el contratista de obra para el presente periodo.

Scanned with CamScanner

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $ 558.145.182
VALOR ANTICIPO $ 223.258.073
% AVANCE FINANCIERO 40%

DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
IPO	-	$ 558.141.182,32	-	$ 558.141.182,32	-		-	
01	No se ha tramitado	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

Eje de calidad

Requisitos de calidad contratados	Cumple / No cumple	Observaciones
egurar que el personal requerido para la ejecución contrato cuente con la educación, formación y periencia para garantizar el óptimo desarrollo del eto contractual.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
cializar con el equipo que realizará las actividades finidas en el contrato/convenio, la documentación sica del Sistema de Gestión Integral de la CVS.	NO CUMPLE EN SU TOTALIDAD	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
alizar un (1) ejercicio muestral para evaluar la rcepción de satisfacción de los beneficiarios con specto a la prestación del servicio y entregar a la CVS s resultados obtenidos.	NO SE EVIDENCIA EN SU TOTALIDAD	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
ontar con información documentada para la cepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, uejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco e la ejecución de objeto contractual e informar a la VS de la radicación de estas.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
segurar que los equipos de medición utilizados para l cumplimiento del objeto contractual cuentan con ertificaciones iniciales de calibración y sus erificaciones intermedias y entregar copia de estas ertificaciones a la CVS.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo

Scanned with CamScanner

Eje de Seguridad y salud en el trabajo


Requisitos de Seguridad y salud en el trabajo contratados	Cumple / No cumple	Observaciones
Designar por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable del tema durante toda la vigencia del contrato, para que garantice el cumplimiento de obligaciones establecidas en el marco de su ejecución y la normatividad vigente.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de requisitos contractuales pertinentes para la presentación informe PGIO para el presente periodo
El contratista (persona Jurídica o Natural) deberá entregar al inicio del contrato la autoevaluación vigente (1 vez por año), la cual deberá estar por encima del 80%, este documento deberá estar aprobado por la ARL o Carta de certificación por la ARL del estado de avance del SG- SST, si el porcentaje de avance de este se encuentra entre el 0% y 60%, se deberá adjuntar además el plan de mejoramiento debidamente aprobado por la ARL.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de requisitos contractuales pertinentes para la presentación informe PGIO para el presente periodo
Presentar a la CVS la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	NO CUMPLE EN SU TOTALIDAD	No cumple en su totalidad con la informa requerida necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de éstos.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Garantizar que todo el personal vinculado para la ejecución del contrato o convenio se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social y que disponga del concepto médico ocupacional favorable.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Contar con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Presentar el certificado de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes y el programa estratégico de seguridad vial en los contratos o convenios en los cuales se haga uso de sistemas de transporte.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo


Eje Ambiental

Requisitos ambientales contratados	Cumple / No cumple	Observaciones
Identificar los aspectos e impactos ambientales de cada una de las actividades a ejecutar y establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	CUMPLE EN ALGUNOS ASPECTOS	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas
Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato o convenio; de acuerdo con la normatividad vigente.	CUMPLE	Cumple con todos los lineamientos solicitados dentro de los requisitos contractuales pertinentes para la presentación de informe PGIO para el presente periodo
Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente.	NO PRESENTA TODA LA INFORMACION NECESARIA	No cumple en su totalidad con la informa requerida y necesaria para el adecuado seguimiento de los requisitos contractuales de informe PGIO; por lo cual se sugiere acatar con las correcciones sugeridas


Scanned with CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

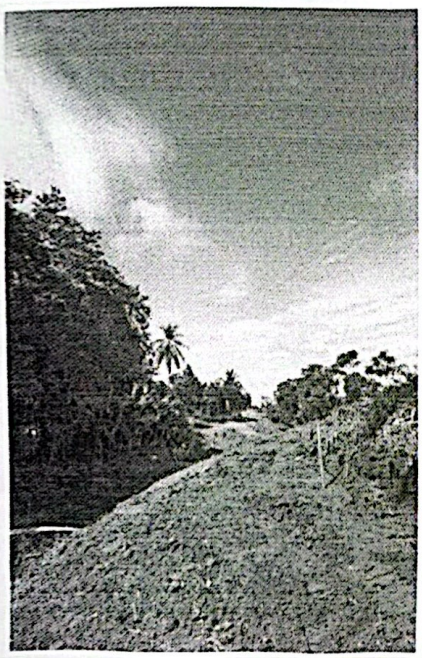

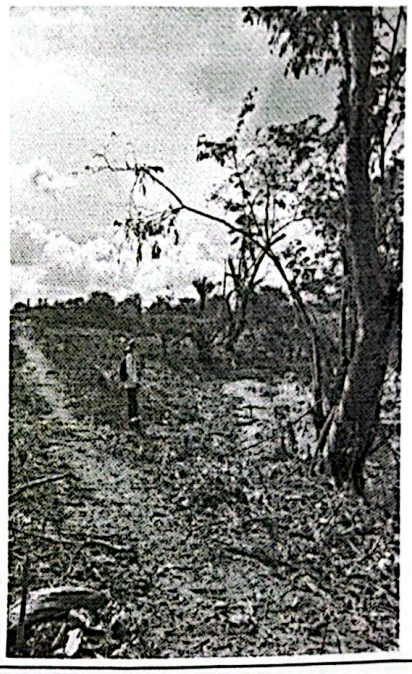


Fotografía 1. Recorrido de reconocimiento inicial.

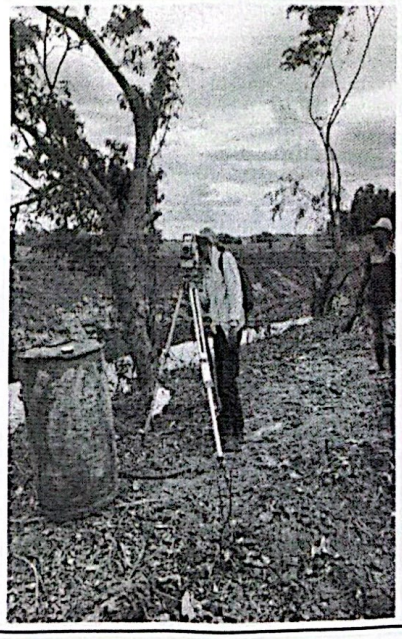

Scanned with CamScanner



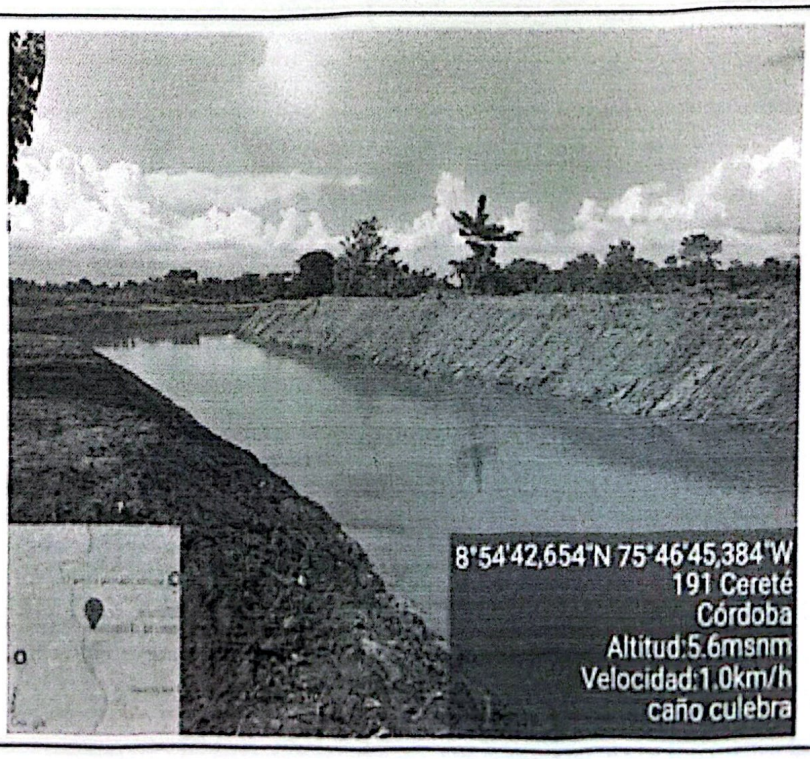

Scanned with CamScanner

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con la información contenida en el informe de avance técnico mensual correspondiente al período del 24 de noviembre al 24 de diciembre de 2025, se revisaron los datos proporcionados, realizando el seguimiento correspondiente a cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato 052-2025. Como resultado, se constató un cumplimiento satisfactorio en la mayoría de las obligaciones todas revisadas en función de cronograma de actividades presentado al inicio de la ejecucion de proyecto. Se realizaron algunas sugerencias respecto a la presentación del informe técnico y del informe PGIO de este periodo ya que este no fue presentado bajo los lineamientos establecidos y socializados al inicio de la ejecucion de mismo; a la fecha se presentan los resultados evidenciados de la obra según la información allegada hasta la fecha por el contratista de obra y/o interventoría el cual debe ajustar la información según los ajustes sugeridos.

Se sugiere al contratista cumplir con los tiempos estipulados para la entrega de los informes y toda la información requerida por la supervisión CVS, con el fin de asegurar un seguimiento adecuado y verificar que todas las actividades del cronograma se cumplan dentro de los plazos contractuales establecidos.

Para constancia se firma a los 24 días del mes de diciembre del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.

Supervisor CVS

Maria Kamila Leon.
Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe 24/12/2025

Scanned with CamScanner

CONTRATO ■ **CONVENIO** ☐

Proyecto (S): INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DE CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

LOCALIZACIÓN: Municipio: CERETE Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 24 DE NOVIEMBRE – 24 DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	**063 - 2025**
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	**CONTRATO DE OBRA**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA:	VELASQUEZ CABEZA E INGENIERIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNÁN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DE CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($39.793.600) IVA INCLUIDO
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($15.917.440)
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	24 DE DICIEMBRE DE 2025

Scanned with CamScanner
