ACTA PARCIAL

PERIODO / FECHA: Del 08 de octubre al 18 de diciembre de 2025.

AREA O DEPENDENCIA: Oficina de Planeación e Infraestructura Municipal

RESPONSABLE: Héctor Horacio Gaitán Guerrero

OBJETIVO DEL INFORME:

REALIZAR EL INFORME PARA EL PAGO DEL ACTA PARCIAL No. 1, DEL CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027", SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL- HUILA Y PROCON C&P.

CONTENIDO DEL INFORME:

INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL No. 1

CONTRATO	OBRA	**No.:**	208	**AÑO:**	2025
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PITAL- HUILA Y PROCON C&P S.A.S.					

CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	PROCON C&P S.A.S.		
	NIT O CC:	900.808.308-7		
	R.L.:	ARDENSON CELORIO ZUÑIGA		
	CC:	7.700.082 de Neiva Huila		
	DIRECCIÓN:	CALLE 9 # 3-50 C.C. MEGACENTRO OF- 412- CENTRO	TEL:	3102881869
	CIUDAD:	Neiva – Huila		
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027".			

VALOR INICIAL DE CONTRATO:	**En cifras:** $ 136.934.868,59 M/CTE		
	En Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE.		
VALOR ADICIONAL:	**En cifras:** $ 4.511.039,78 M/CTE		
	En Letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.		
VALOR TOTAL DE CONTRATO:	**En cifras:** $141.445.908,37 M/CTE		
	En Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, EL PLAZO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ EXCEDER DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025; DE TAL FORMA QUE, SI LLEGADO ESE DÍA EL CONTRATO NO SE HUBIERE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, TANTO EL CONTRATISTA COMO EL CONTRATANTE, ACEPTAN LIQUIDAR EL CONTRATO LIBERANDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE EL PITAL – HUILA LA SUMA NO EJECUTADA. ESTA OBLIGACIÓN DEBE QUEDAR CONSIGNADA EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	DIECINUEVE (19) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 1:	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
OTROSÍ MODIFIATORIO No. 1:	SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)		
FECHA TERMINACION:	**No. 1**	**TERMINACION INICIAL**	30/12/2025
PRESENTES HOY:	NOMBRE:		**HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO**
	EN CALIDAD DE:		Supervisor
	NOMBRE:		**KAREN TATIANA GUTIÉRREZ VILLAQUIRA**
	EN CALIDAD DE:		Apoyo técnico Supervisión

1. CONTRATO OBRA

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
Acta parcial No. 1	19-12-2025	$ 67.173.467,24
Acta parcial No. 2	-	$ 0,00
Acta parcial No. 3	-	$ 0,00
Acta Final	-	$ 0,00
TOTAL		**$ 67.173.467,24**

1.1 BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCIÒN	VALOR	SALDO
1. Valor del contrato		$ 141.445.908,37
2. Valor acta parcial No. 1	$67.173.467,24	$ 0,00
3. Saldo por ejecutar	$74.272.441,13	$ 0,00
TOTAL	**$ 141.445.908,37**	**$ 141.445.908,37**

1.1 BALANCE ANTICIPO

ANTICIPO (0%)		$ 00,00
VALOR A AMORTIZAR ACTA No 1	$ 00,00	$ 00,00
VALOR AMORTIZADO ACTA No 2	$ 00,00	$ 00,00
VALOR AMORTIZADO ACTA FINAL	$ 00,00	$ 00,00
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR	$ 00,00	$ 00,00
TOTAL	**$ 00,00**	**$ 00,00**

1.2 CONTROL DE GARANTÍAS

1.2.1 CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **CHU-100057174**
No. CERTIFICADO. **533107597**

COBERTURAS	ANEXO 0 **FECHA DE EXPEDICIÓN:** 19 de Septiembre de 2025	
	Valor Asegurado	**VIGENCIA**
Cumplimiento	$ 27.386.973,60	19/09/2025 al 18/04/2026
Prestaciones sociales	$ 13.693.486,80	19/09/2025 al 18/12/2028
Estabilidad de la obra	$ 27.389.973,60	18/12/2025 al 18/12/2030

1.2.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. **CHU-100010826**
No. CERTIFICADO. **533107599**

COBERTURAS	ANEXO 0 FECHA DE EXPEDICIÓN: 19 de Septiembre de 2025	
	Valor Asegurado	VIGENCIA
Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Patronal	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025

1.2.3 CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **CHU-100057174**
No. CERTIFICADO. **533111718**

COBERTURAS	ANEXO 1 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Octubre de 2025	
	Valor Asegurado	VIGENCIA
Cumplimiento	$ 27.386.973,60	19/09/2025 al 18/04/2026
Prestaciones sociales	$ 13.693.486,80	19/09/2025 al 18/12/2028
Estabilidad de la obra	$ 27.389.973,60	18/12/2025 al 18/12/2030

1.2.4 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. **CHU-100010826**
No. CERTIFICADO. **533111723**

COBERTURAS	ANEXO 1 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de Octubre de 2025	
	Valor Asegurado	VIGENCIA
Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Patronal	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	19/09/2025 al 18/12/2025

1.2.5 CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No. **CHU-100057174**
No. CERTIFICADO. **533111719**

COBERTURAS	ANEXO 2 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de octubre de 2025	
	Valor Asegurado	VIGENCIA
Cumplimiento	$ 27.386.973,60	08/10/2025 al 07/05/2026
Prestaciones sociales	$ 13.693.486,80	08/10/2025 al 06/01/2029
Estabilidad de la obra	$ 27.389.973,60	06/01/2026 al 06/01/2031

1.2.6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PÓLIZA No. **CHU-100010826**
No. CERTIFICADO. **533111724**

COBERTURAS	ANEXO 2 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10 de octubre de 2025	
	Valor Asegurado	VIGENCIA
Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Patronal	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026

1.2.7 CUMPLIMIENTO
PÓLIZA No. **CHU-100057174**
No. CERTIFICADO. **533122872**

COBERTURAS	ANEXO 3 FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 de diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	VIGENCIA
Cumplimiento	$ 28.289.181,67	06/12/2025 al 07/05/2026
Prestaciones sociales	$ 14.144.590,84	06/12/2025 al 06/01/2029
Estabilidad de la obra	$ 28.289.181,67	06/12/2026 al 06/01/2031

1.2.8 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
PÓLIZA No. **CHU-100010826**
No. CERTIFICADO. **533122933**

COBERTURAS	ANEXO 3 FECHA DE EXPEDICIÓN: 09 de diciembre de 2025	
	Valor Asegurado	VIGENCIA

Amparo básico- Predios, labores y operaciones	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Patronal	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Contratistas y subcontratistas	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026
Vínculos propios u no propios	$284.700.000,00	08/10/2025 al 06/01/2026

De acuerdo al Informe Parcial No. 1 presentado por el Contratista de PROCON C&P S.A.S., mediante oficio, radicado en la Secretaria de Planeacion e Infraestructura de fecha diecinueve (19) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), el cual fue verificado por la supervisión, se certifica que el contratista viene cumpliendo a entera satisfacción con el Contrato de Obra No. 208 de 2025, el cual tiene por objeto "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027".".

Es viable recibir a satisfacción las actividades ejecutadas en el marco del CONTRATO DE OBRA No. 208 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 003 DE 2023, el cual tiene por objeto "CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO "UNIDOS SÍ PODEMOS 2024-2027".", dado que el Contratista viene cumpliendo a entera satisfacción el contrato.

Durante la ejecución del Contrato se resaltan los siguientes aspectos:

1. El día diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), el Contratista suscribió contrato de Obra No. 208 de 2025.

2. El día ocho (08) de octubre de dos mil veinticinco (2025), el Contratista suscribió acta de inicio.

3. Que el día seis (06) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), se suscribió el acta de justificación No. 1 y el otrosí modificatorio No. 1.

4. El día diecinueve (19) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), se suscribe el Acta Parcial No. 1.

5. El Informe del contratista de obra, establece que el porcentaje ejecutado conforme al Acta Parcial No. 1 es del 47,49 %, que corresponde a $ 67.173.467,24 del total del valor del contrato de obra.

6. Que según Informe y Acta Parcial No. 1, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

ACTA PARCIAL

ALCALDÍA EL PITAL HUILA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

OBJETO: CONTRATO DE OBRA A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO Y NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO UNIDOS SI PODEMOS 2024-2027

Proyectos y Construcciones PROCON C&P SAS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1

DEPARTAMENTO DEL HUILA	CONTRATISTA:	PROCON C&P SAS	FECHA CONTRATO DE OBRA:	19 de septiembre de 2025	Parcial	X
	SUPERVISOR	ING. HÉCTOR HORACIO GAITAN G.	PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días sin superar el 30/12/2025	Modifica	
MUNICIPIO DE EL PITAL	VALOR INICIAL :	$ 136.934.868,59	FECHA INICIO	8 de octubre de 2025	Final	
	VALOR ADICIONAL 1:	$ 4.511.039,78	FECHA OTROSÍ No. 1	6 de diciembre de 2025	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	VALOR FINAL:	$ 141.445.908,37	VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 67.173.467,24	19 de diciembre de 2025	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES - OTROSI No. 1		OBRA EJECUTADA			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A	**CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO**										
A1	**PRELIMINARES**				**$ 697.621,68**		**$ 639.486,54**		**$ 639.486,54**		**$ 639.486,54**
A1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	73,08	$ 4.521,00	$ 330.394,68	66,99	$ 302.861,79	66,99	$ 302.861,79	66,99	$ 302.861,79
A1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	73,08	$ 5.025,00	$ 367.227,00	66,99	$ 336.624,75	66,99	$ 336.624,75	66,99	$ 336.624,75
A2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 1.020.610,90**		**$ 3.023.856,89**		**$ 3.023.856,89**		**$ 3.023.856,89**
A2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	13,09	$ 43.211,00	$ 565.631,99	10,68	$ 461.493,48	10,68	$ 461.493,48	10,68	$ 461.493,48
A2,2	Relleno en recebo compactado mecánicamente.	M3	4,21	$ 108.071,00	$ 454.978,91	23,71	$ 2.562.363,41	23,71	$ 2.562.363,41	23,71	$ 2.562.363,41
A3	**CIMIENTOS**				**$ 8.561.947,31**		**$ 8.561.947,31**		**$ 8.561.947,31**		**$ 8.561.947,31**
A3,1	Concreto Ciclópeo (40% en piedra media zonga y 60% concreto 2500 PSI de 0,30*0,40 m).	M3	3,07	$ 581.189,00	$ 1.784.250,23	3,07	$ 1.784.250,23	3,07	$ 1.784.250,23	3,07	$ 1.784.250,23
A3,2	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (0,70*0,70*0,30mts).	M3	0,74	$ 684.414,00	$ 506.466,36	0,74	$ 506.466,36	0,74	$ 506.466,36	0,74	$ 506.466,36
A3,3	Cimentación tipo zapatas en concreto de 3000 P.S.I (1,00*1,00*0,30mts).	M3	0,30	$ 684.414,00	$ 205.324,20	0,30	$ 205.324,20	0,30	$ 205.324,20	0,30	$ 205.324,20
A3,4	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	39,15	$ 134.357,00	$ 5.260.076,55	39,15	$ 5.260.076,55	39,15	$ 5.260.076,55	39,15	$ 5.260.076,55

A3,5	Cimentación tipo solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05 m.	M2	3,45	$ 35.505,00	$ 122.492,25	3,45	$ 122.492,25	3,45	$ 122.492,25	3,45	$ 122.492,25
A3,6	Acero de refuerzo 600000 PSI, para zapata (incluye amarre y figurado).	KG	86,74	$ 7.878,00	$ 683.337,72	86,74	$ 683.337,72	86,74	$ 683.337,72	86,74	$ 683.337,72
A4	**MAMPOSTERIA**				**$ 6.430.843,95**		**$ 6.430.843,95**		**$ 2.950.083,20**		**$ 2.950.083,20**
A4,1	Construcción de Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	76,30	$ 50.158,00	$ 3.827.055,40	76,30	$ 3.827.055,40	57,20	$ 2.869.037,60	57,20	$ 2.869.037,60
A4,2	Construcción de Mesón en concreto 3000 psi, a=0,60, e=0.10 enchapado, inc. Acero (1Ø1/2"c.015 ambos sentidos).	ML	7,85	$ 240.495,00	$ 1.887.885,75	7,85	$ 1.887.885,75	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A4,3	Construcción de Alfajía en Concreto 3000 PSI, E= 0.15X0.25 MTS – Incluye: Acero de refuerzo de 60000 PSI (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c. 0,35 m).	ML	10,60	$ 67.538,00	$ 715.902,80	10,60	$ 715.902,80	1,20	$ 81.045,60	1,20	$ 81.045,60
A5	**ESTRUCTURA**				**$ 12.421.614,96**		**$ 13.099.563,66**		**$ 12.679.183,02**		**$ 12.679.183,02**
A5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI. (0,30*0,30mts). Incluye acero de refuerzo fy= 60000 PSI. (4Ø5/8" refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts).	ML	35,80	$ 160.215,00	$ 5.735.697,00	35,80	$ 5.735.697,00	35,80	$ 5.735.697,00	35,80	$ 5.735.697,00
A5,2	Columna en concreto de 3000 PSI (0.30x0.30mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI (6Ø5/8", refuerzo y E=Ø3/8" c./d. 0,10 mts Y 0,15 mts).	ML	21,90	$ 173.833,00	$ 3.806.942,70	25,80	$ 4.484.891,40	25,80	$ 4.484.891,40	25,80	$ 4.484.891,40
A5,3	Columna de confinamiento (0,20x0,15mts) en concreto de 3000 PSI. Incluye refuerzo de 6000 PSI (4Ø 1/2" refuerzo y E=Ø 1/4" c./d. 0,10 mts).	ML	10,20	$ 73.074,00	$ 745.354,80	10,20	$ 745.354,80	10,20	$ 745.354,80	10,20	$ 745.354,80
A5,4	Viga cinta en concreto 3000 PSI (0.10x0.20mts). Incluye acero (2Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10mts).	ML	34,26	$ 50.007,00	$ 1.713.239,82	34,26	$ 1.713.239,82	34,26	$ 1.713.239,82	34,26	$ 1.713.239,82
A5,5	Construcción de Placa aérea en concreto armado de 3000 psi e = 15 cm.	M2	1,44	$ 291.931,00	$ 420.380,64	1,44	$ 420.380,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 2.507.244,06**		**$ 2.507.244,06**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A6,1	Suministro e instalación de Tablero monofásico 4 circuitos.	UND	1,00	$ 148.174,00	$ 148.174,00	1,00	$ 148.174,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6,2	Suministro e instalación de Salida toma corriente doble 110 v.	UND	3,00	$ 56.713,00	$ 170.139,00	3,00	$ 170.139,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6,3	Suministro e instalación de Salida Interruptor Sencillo 110 v.	UND	1,00	$ 28.883,00	$ 28.883,00	1,00	$ 28.883,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6,4	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	1,00	$ 29.621,00	$ 29.621,00	1,00	$ 29.621,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6,5	Suministro e instalación de Salida lampara fluorescente electrónica 2 X 48 w, incluye lampara.	UND	3,00	$ 227.385,00	$ 682.155,00	3,00	$ 682.155,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

A6,6	Suministro e instalación de Puesta a tierra de tablero de distribución, polo a tierra, varilla C. W. 2,40 ml.	UND	1,00	$ 328.671,00	$ 328.671,00	1,00	$ 328.671,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6,7	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 línea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Línea No 14 para toma corrientes.	ML	12,65	$ 30.982,00	$ 391.922,30	12,65	$ 391.922,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6,8	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	18,31	$ 25.196,00	$ 461.338,76	18,31	$ 461.338,76	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A6,9	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofásico.	ML	12,00	$ 22.195,00	$ 266.340,00	12,00	$ 266.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**				**$ 1.606.035,00**		**$ 1.606.035,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A7,1	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 2", incluye tubería.	UND	1,00	$ 61.802,00	$ 61.802,00	1,00	$ 61.802,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,2	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 3", incluye tubería.	UND	2,00	$ 60.642,00	$ 121.284,00	2,00	$ 121.284,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,3	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 4", incluye tubería.	UND	1,00	$ 86.078,00	$ 86.078,00	1,00	$ 86.078,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,00	$ 385.268,00	$ 385.268,00	1,00	$ 385.268,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,5	Suministro e instalación de Punto agua fría de ½" PVC, incluye tubería.	UND	1,00	$ 63.158,00	$ 63.158,00	1,00	$ 63.158,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,6	Suministro e instalación de Registro de paso directo ½" (bola).	UND	2,00	$ 44.368,00	$ 88.736,00	2,00	$ 88.736,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,7	Suministro e instalación de Acometida general de ½".	UND	1,00	$ 186.649,00	$ 186.649,00	1,00	$ 186.649,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,8	Suministro e instalación de salida llave terminal de ½".	UND	1,00	$ 54.758,00	$ 54.758,00	1,00	$ 54.758,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,9	Suministro e instalación de lavaplatos.	UND	1,00	$ 142.298,00	$ 142.298,00	1,00	$ 142.298,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A7,10	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,00	$ 416.004,00	$ 416.004,00	1,00	$ 416.004,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A8	**PAÑETES**				**$ 5.703.064,52**		**$ 5.703.064,52**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A8,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	213,47	$ 26.716,00	$ 5.703.064,52	213,47	$ 5.703.064,52	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A9	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				**$ 6.143.219,83**		**$ 6.143.219,83**		**$ 5.944.055,68**		**$ 5.944.055,68**
A9,1	Suministro e instalación de cubierta en teja master 1000 color, CAL 30. Incluye tornillos autoperforantes.	M2	71,36	$ 52.313,00	$ 3.733.055,68	71,36	$ 3.733.055,68	71,36	$ 3.733.055,68	71,36	$ 3.733.055,68
A9,2	Suministro e instalación de Correa en perfil metálico de 3"X1 1/2", cal.18. Incluye pintura.	ML	50,25	$ 44.000,00	$ 2.211.000,00	50,25	$ 2.211.000,00	50,25	$ 2.211.000,00	50,25	$ 2.211.000,00
A9,3	Suministro e instalación de Bajante ALL PVC 4". Incluye accesorios y mano de obra.	ML	4,65	$ 42.831,00	$ 199.164,15	4,65	$ 199.164,15	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

A10	**PISOS Y ENCHAPES**				**$ 9.995.925,97**		**$ 7.121.235,97**		**$ 1.840.789,57**		**$ 1.840.789,57**
A10, 1	Alistado de piso en mortero e= 0,05m.	M2	53,09	$ 34.673,00	$ 1.840.789,57	53,09	$ 1.840.789,57	53,09	$ 1.840.789,57	53,09	$ 1.840.789,57
A10, 2	Construcción de Placa en concreto de 2500 PSI e=0,08 m.	M2	45,63	$ 63.000,00	$ 2.874.690,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A10, 3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	53,09	$ 90.800,00	$ 4.820.572,00	53,09	$ 4.820.572,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A10, 4	Suministro e instalación de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	41,20	$ 11.162,00	$ 459.874,40	41,20	$ 459.874,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A11	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 5.380.568,89**		**$ 5.380.568,89**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A11, 1	Suministro e instalación ventana en lámina C.20 con vidrio 4mm Inc. anticorrosivo + pintura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	17,32	$ 243.027,00	$ 4.209.227,64	17,32	$ 4.209.227,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A11, 2	Suministro e instalación de Marco y puerta metálicos lamina C. R. cal. 20, de 1,00x2.00 m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	1,00	$ 528.694,00	$ 528.694,00	1,00	$ 528.694,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A11, 3	Suministro e instalación de Canal en lámina Galvanizada C. 20. Incluye refuerzos en ángulo 1" x 1/8"+ pintura.	ML	10,05	$ 63.945,00	$ 642.647,25	10,05	$ 642.647,25	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A12	**PINTURA GENERAL Y ACABADOS**				**$ 6.776.675,07**		**$ 6.776.675,07**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A12, 1	Suministro y aplicación de Estuco y pintura vinilo tipo1 tres manos sobre muros.	M2	120,03	$ 27.669,00	$ 3.321.110,07	120,03	$ 3.321.110,07	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A12, 2	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	86,12	$ 40.125,00	$ 3.455.565,00	86,12	$ 3.455.565,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A13	**EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 2.054.803,45**		**$ 544.236,84**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A13, 1	Sardinel en concreto 2500 psi.	ML	9,65	$ 54.250,00	$ 523.512,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A13, 2	Cuneta A.LL. en concreto de 3.000 PSI Tipo U.	ML	9,65	$ 64.687,00	$ 624.229,55	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A13, 3	Anden en concreto 2500 PSI. e=0.10mts.	M2	9,65	$ 93.996,00	$ 907.061,40	5,79	$ 544.236,84	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A14	**LIMPIEZA GENERAL**				**$ 194.256,00**		**$ 194.256,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
A14, 1	Aseo final de obra.	M2	85,20	$ 2.280,00	$ 194.256,00	85,20	$ 194.256,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A15	**ITEM ADICIONALES NO PREVISTOS**				**$ 0,00**		**$ 10.360.187,08**		**$ 9.495.885,44**		**$ 9.495.885,44**
A15, 1	Construcción de Muro de contención tolete No. 3 (9x19x28cm). Incluye mortero de pega y bloque.	M2	0,00	$ 169.736,00	$ 0,00	13,27	$ 2.252.396,72	13,27	$ 2.252.396,72	13,27	$ 2.252.396,72
A15, 2	Suministro y aplicación de Pañete impermeabilizado muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	0,00	$ 32.566,00	$ 0,00	26,54	$ 864.301,64	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
A15, 3	Construccion de Placa PISO en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm.	M2	0,00	$ 158.744,00	$ 0,00	45,63	$ 7.243.488,72	45,63	$ 7.243.488,72	45,63	$ 7.243.488,72

B	CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO										
B1	PRELIMINARES				$ 231.490,50		$ 206.193,60		$ 206.193,60		$ 206.193,60
B1,1	Localización y Replanteo manual.	M2	24,25	$ 4.521,00	$ 109.634,25	21,60	$ 97.653,60	21,60	$ 97.653,60	21,60	$ 97.653,60
B1,2	Descapote manual e=20cm incluye retiro.	M2	24,25	$ 5.025,00	$ 121.856,25	21,60	$ 108.540,00	21,60	$ 108.540,00	21,60	$ 108.540,00
B2	MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 16.852,29		$ 17.716,51		$ 17.716,51		$ 17.716,51
B2,1	Excavación manual. Incluye retiro del material.	M3	0,39	$ 43.211,00	$ 16.852,29	0,41	$ 17.716,51	0,41	$ 17.716,51	0,41	$ 17.716,51
B3	CIMIENTOS				$ 724.187,28		$ 754.084,92		$ 754.084,92		$ 754.084,92
B3,1	Viga de cimentación en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,08	$ 55.366,00	$ 724.187,28	13,62	$ 754.084,92	13,62	$ 754.084,92	13,62	$ 754.084,92
B4	MAMPOSTERIA				$ 855.695,48		$ 782.464,80		$ 782.464,80		$ 782.464,80
B4,1	Muro en Bloque de arcilla #5 (12x20x30cm) Incluye mortero de pega y bloque.	M2	17,06	$ 50.158,00	$ 855.695,48	15,60	$ 782.464,80	15,60	$ 782.464,80	15,60	$ 782.464,80
B5	ESTRUCTURA				$ 14.656.838,42		$ 2.988.817,42		$ 1.347.280,00		$ 1.347.280,00
B5,1	Viga aérea en concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	13,08	$ 67.115,00	$ 877.864,20	13,62	$ 914.106,30	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B5,2	Columnas concreto de 3000 PSI (0,12 x 0,20 mts). Incluye acero de refuerzo de 60000 PSI. (4Ø3/8" refuerzo y E=Ø1/4" c/d. 0,10 m).	ML	22,00	$ 61.240,00	$ 1.347.280,00	22,00	$ 1.347.280,00	22,00	$ 1.347.280,00	22,00	$ 1.347.280,00
B5,3	Lavamanos en concreto pulido.	ML	3,30	$ 263.562,00	$ 869.754,60	2,76	$ 727.431,12	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B5,4	Placa aerea en concreto 3000 PSI e = 15 cm.	M2	16,94	$ 682.523,00	$ 11.561.939,62	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B6	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 697.541,00		$ 697.541,00		$ 0,00		$ 0,00
B6,1	Suministro e instalación de Salida lampara incandescente, incluye bombillo.	UND	4,00	$ 54.113,00	$ 216.452,00	4,00	$ 216.452,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B6,2	Suministro e instalación de Salida Interruptor Doble 110 v.	UND	2,00	$ 29.621,00	$ 59.242,00	2,00	$ 59.242,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B6,3	Suministro e instalación de tablero monofase 2 circuitos.	UND	1,00	$ 134.500,00	$ 134.500,00	1,00	$ 134.500,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B6,4	Suministro e instalación de Red eléctrica en tubería pvc de 1/2", incluye 1 N° 12 + neutro N° 12 para luminarias.	ML	7,00	$ 25.196,00	$ 176.372,00	7,00	$ 176.372,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B6,5	Suministro e instalación de Cable concéntrico monofásico.	ML	5,00	$ 22.195,00	$ 110.975,00	5,00	$ 110.975,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				$ 2.528.533,00		$ 2.528.533,00		$ 0,00		$ 0,00
B7,1	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 2", incluye tubería.	UND	5,00	$ 61.802,00	$ 309.010,00	5,00	$ 309.010,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

B7,2	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 3", incluye tubería.	UND	1,00	$ 60.642,00	$ 60.642,00	1,00	$ 60.642,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,3	Suministro e instalación de Punto de desagüe en pvc 4", incluye tubería.	UND	4,00	$ 86.078,00	$ 344.312,00	4,00	$ 344.312,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,4	Caja de inspección de 60x60 cm, ladrillo.	UND	1,00	$ 385.268,00	$ 385.268,00	1,00	$ 385.268,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,5	Suministro e instalación de Punto agua fría de ½" PVC, incluye tubería.	UND	9,00	$ 63.158,00	$ 568.422,00	9,00	$ 568.422,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,6	Suministro e instalación de Registro de paso directo ½" (bola).	UND	1,00	$ 44.368,00	$ 44.368,00	1,00	$ 44.368,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,7	Suministro e instalación de Acometida general de ½".	UND	1,00	$ 186.649,00	$ 186.649,00	1,00	$ 186.649,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,8	Suministro e instalación de salida llave terminal de ½".	UND	1,00	$ 54.758,00	$ 54.758,00	1,00	$ 54.758,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,9	Suministro e instalación de tanque 500 litros, incluye grifería y accesorios.	UND	1,00	$ 416.004,00	$ 416.004,00	1,00	$ 416.004,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B7,11	Suministro e instalación de grifería lavamanos cromada.	UND	4,00	$ 39.775,00	$ 159.100,00	4,00	$ 159.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B8	**APARATOS SANITARIOS**				**$ 2.185.284,00**		**$ 2.185.284,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
B8,1	Suministro e instalación de sanitario color blanco.	UND	3,00	$ 479.537,00	$ 1.438.611,00	3,00	$ 1.438.611,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B8,2	Suministro e instalación de Orinal color blanco.	UND	1,00	$ 746.673,00	$ 746.673,00	1,00	$ 746.673,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B9	**PAÑETES**				**$ 1.159.207,24**		**$ 1.159.207,24**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
B9,1	Suministro y aplicación de Pañete muros 1:4 Incluye Filos, carteras y Dilataciones.	M2	43,39	$ 26.716,00	$ 1.159.207,24	43,39	$ 1.159.207,24	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B10	**ENCHAPES**				**$ 7.204.723,42**		**$ 5.537.184,92**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
B10,1	Suministro e instalación de Enchape de pares 0,20 x 0,25.	M2	36,08	$ 79.474,00	$ 2.867.421,92	36,08	$ 2.867.421,92	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B10,2	Construcción de Placa en concreto de 2500 PSI e=0,08 m.	M2	24,25	$ 58.842,00	$ 1.426.918,50	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B10,3	Suministrar e instalar Piso en cerámica T-5.	M2	24,25	$ 90.800,00	$ 2.201.900,00	21,60	$ 1.961.280,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B10,4	Suministro e instalación de Guardaescoba en cerámica T-5.	ML	3,00	$ 11.162,00	$ 33.486,00	3,00	$ 33.486,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B10,5	Suministro e instalación de Espejo flotado 4mm.	M2	3,00	$ 224.999,00	$ 674.997,00	3,00	$ 674.997,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B11	**CARPINTERIA**				**$ 2.688.017,88**		**$ 2.688.017,88**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
B11,1	Suministro e instalación de Marco y Puerta en lámina Galvanizada C.18 de 0,70 x 1,60m. Incluye anticorrosivo y pintura.	UND	3,00	$ 542.869,00	$ 1.628.607,00	3,00	$ 1.628.607,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B11,2	Suministro e instalación divisiones para sanitario en lámina galvanizada cal. 18.	M2	4,32	$ 245.234,00	$ 1.059.410,88	4,32	$ 1.059.410,88	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B12	**Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.**				$ 237.019,20		$ 237.019,20		$ 0,00		$ 0,00

B12, 1	Suministrar y aplicar Esgrafiado en Graniplast.	M2	6,60	$ 35.912,00	$ 237.019,20	6,60	$ 237.019,20	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B13	POZO SÉPTICO				$ 2.599.403,00		$ 2.599.403,00		$ 0,00		$ 0,00
B13, 1	Construir a todo costo Pozo séptico y filtro anaeróbico de 3,30 x 1,30 x 1,00 mts.	UND	1,00	$ 2.599.403,00	$ 2.599.403,00	1,00	$ 2.599.403,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B14	Aseo final de obra.				$ 55.290,00		$ 49.248,00		$ 0,00		$ 0,00
B14, 1	Aseo final de obra.	M2	24,25	$ 2.280,00	$ 55.290,00	21,60	$ 49.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
B.15	ITEM ADICIONALES NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 3.428.870,40		$ 3.428.870,40		$ 3.428.870,40
B15, 1	Construccion de Placa PISO en concreto armado de 3000 psi e = 10 cm.	M2	0,00	$ 158.744,00	$ 0,00	21,60	$ 3.428.870,40	21,60	$ 3.428.870,40	21,60	$ 3.428.870,40
B15, 2	Placa aerea en concreto 3000 PSI e = 10 cm.	M2	0,00	$ 299.170,00	$ 0,00	16,22	$ 4.852.537,40	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 105.334.514,30		$ 103.952.007,50		$ 51.671.897,88		$ 51.671.897,88
	ADMINISTRACION			23,00%	$ 24.226.938,29		$ 23.908.961,73		$ 11.884.536,51		$ 11.884.536,51
	IMPREVISTOS			2,00%	$ 2.106.690,29		$ 2.079.040,15		$ 1.033.437,96		$ 1.033.437,96
	UTILIDAD			5,00%	$ 5.266.725,72		$ 5.197.600,38		$ 2.583.594,89		$ 2.583.594,89
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 31.600.354,29		$ 31.185.602,25		$ 15.501.569,36		$ 15.501.569,36
	VALOR TOTAL DE OBRA				$ 136.934.868,59		$ 135.137.609,75		$ 67.173.467,24		$ 67.173.467,24

7. El contratista en su informe relaciona el cuadro de personal, el cual corresponde así:

Relación personal profesional:

NOMBE	CARGO	C.C.
HÉCTOR JULIO RIOS JOVEL	DIRECTOR DE OBRA	12.125.383 de Neiva – Huila
CESAR ANTONIO GÓMEZ MACHADO	RESIDENTE DE OBRA	1.075.227.021 de Neiva - Huila

1. El día diecinueve (19) de diciembre del dos mil veinticinco (2025), el Contratista radica cuenta de cobro e informe parcial de obra con los soportes requeridos por la entidad contratante, entre los cuales se encuentra: (Oficio OFI-001-2025, Radicado en la Secreatria de Planeacion e Infraestructura, cámara de comercio, RUT, paz y salvo de tesorería, certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), Contrato, registro presupuestal (RP), certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) otrosí modificatorio, acta de justificación No. 01, otrosí modificatorio No. 01, registro presupuestal (RP) otrosí modificatorio, Legalización del contrato, póliza anexo 0, 1, 2 y 3, aprobación de póliza anexo 0,1, 2 y 3 Acta de inicio, Seguridad social - afiliación, Factura electrónica FEP 133, Acta de recibo parcial de obra No. 1 , Informe de obra No. 1, Bitácora, Certificado de la supervisión, Certificado de la cuenta bancaria y Autorización para consignar.

Por lo anteriormente expuesto, la supervisión considera viable proceder a recibir y cancelar parcialmente las actividades ejecutadas.


Para constancia, se firma en el municipio de El Pital - Huila, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), por quienes intervinieron.


HÉCTOR HORACIO GAITÁN GUERRERO
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA
ALCALDÍA DE EL PITAL– HUILA

KAREN TATIANA GUTIÉRREZ V.
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ALCALDÍA DE EL PITAL – HUILA

Anexo: 38 Registro Fotográfico


CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR - COCINA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SEDE EL AMPARO

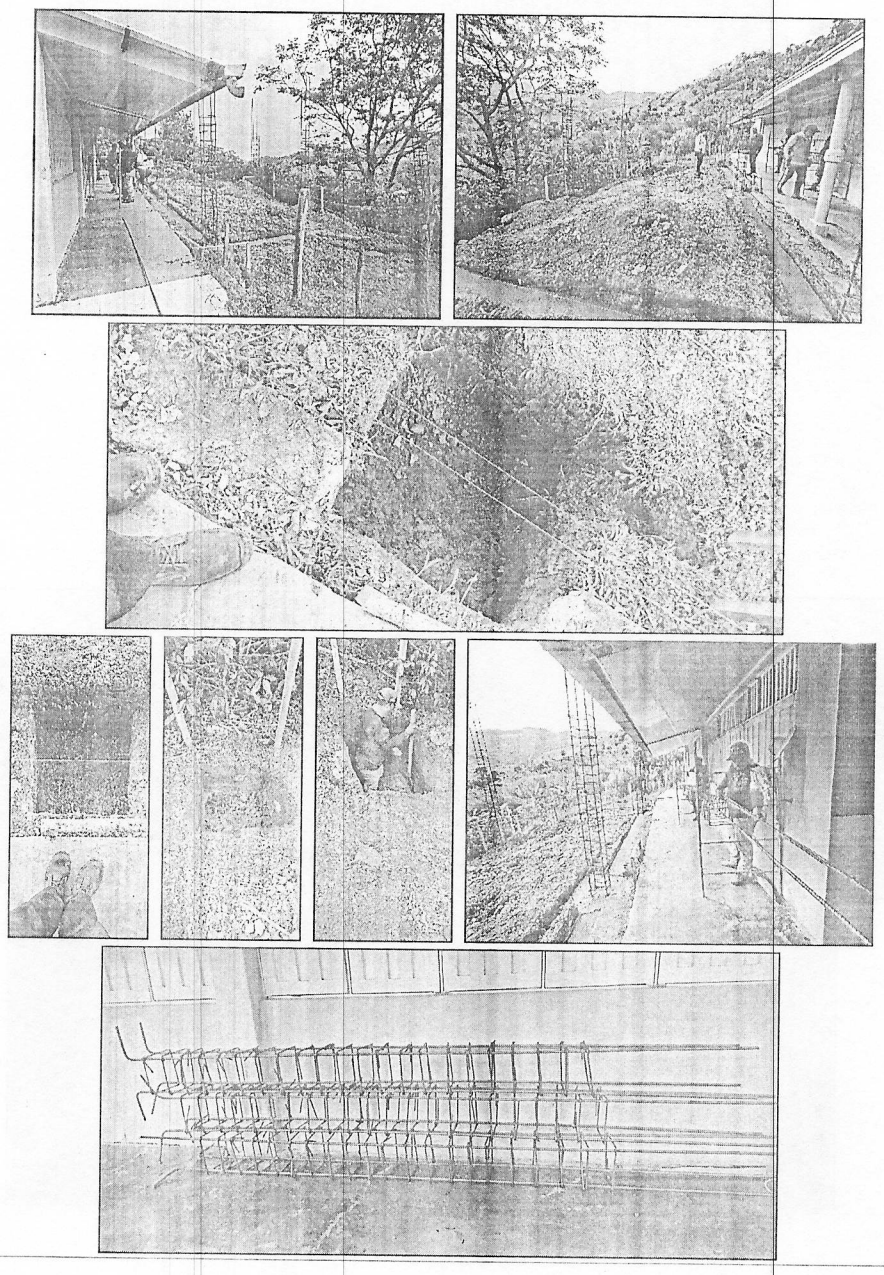


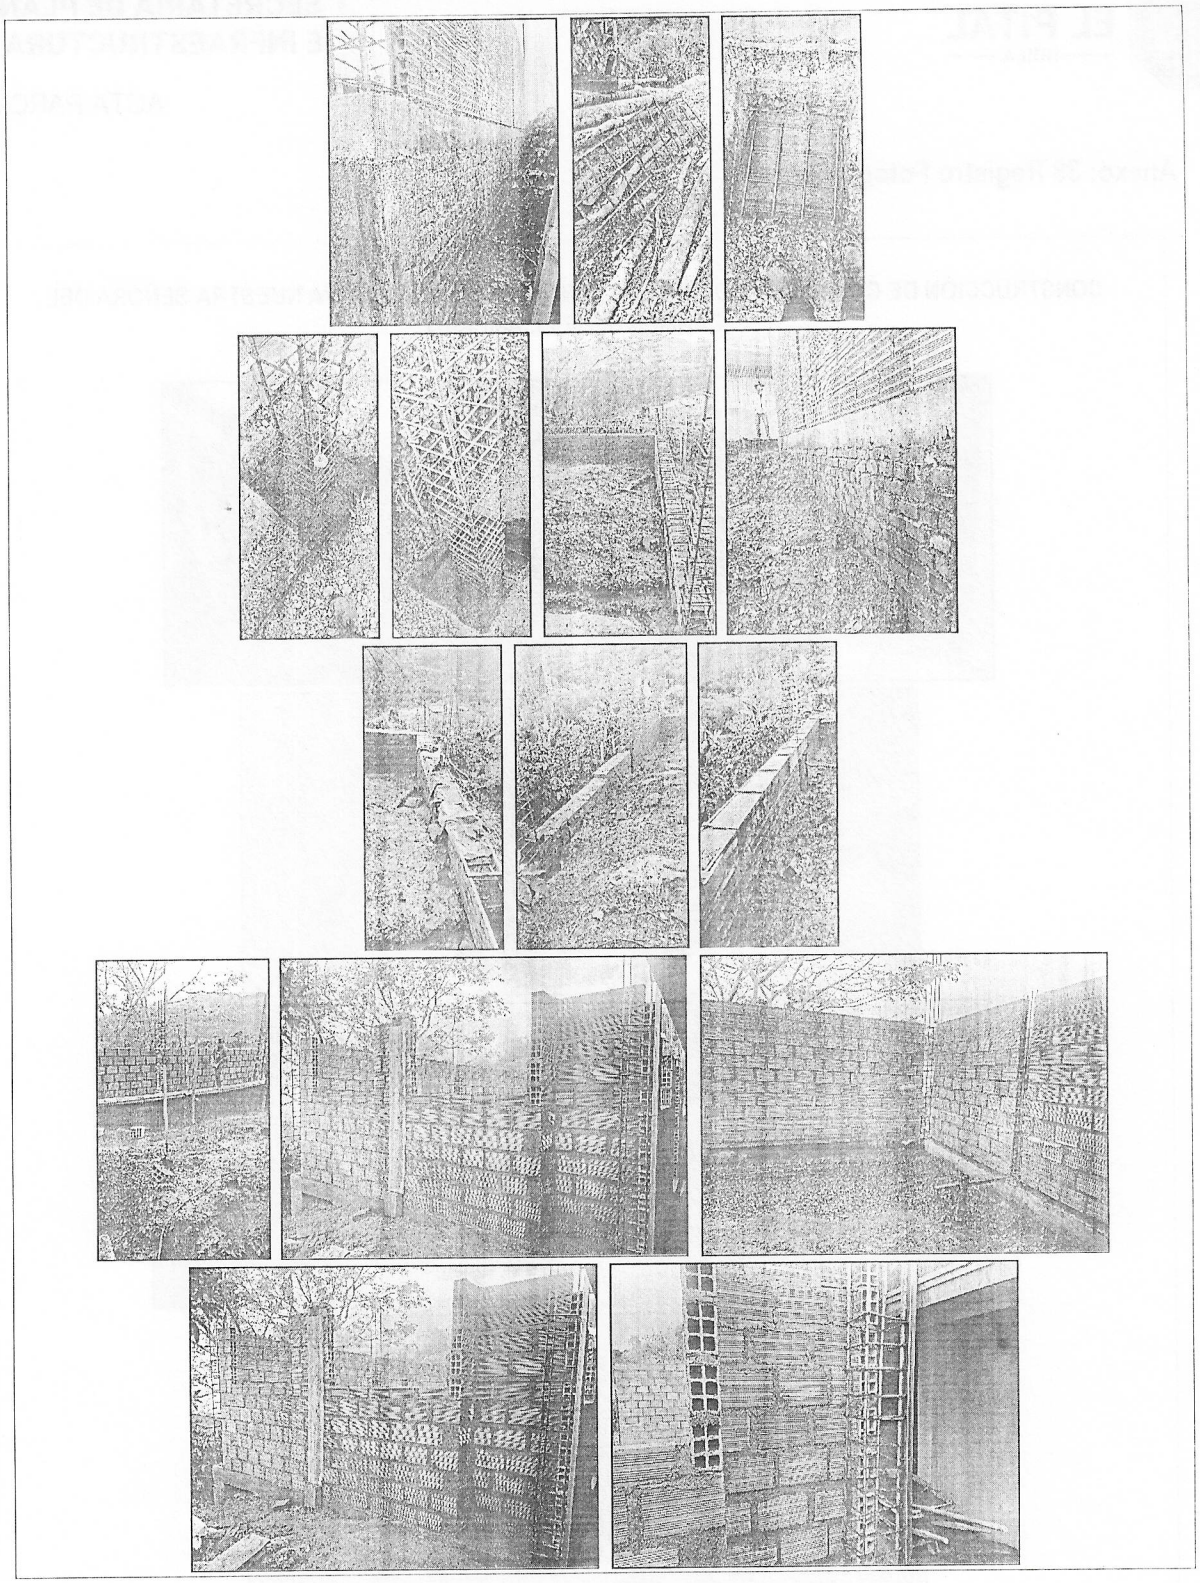

Alcaldía Municipal, NIT: 891.180.199-0.
Calle 6 No. 10 – 15, Pital Huila - Colombia.
alcaldia@elpital-huila.gov.co

CONSTRUCCION DE APARATO SANITARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO SEDE ALTO SAN ISIDRO

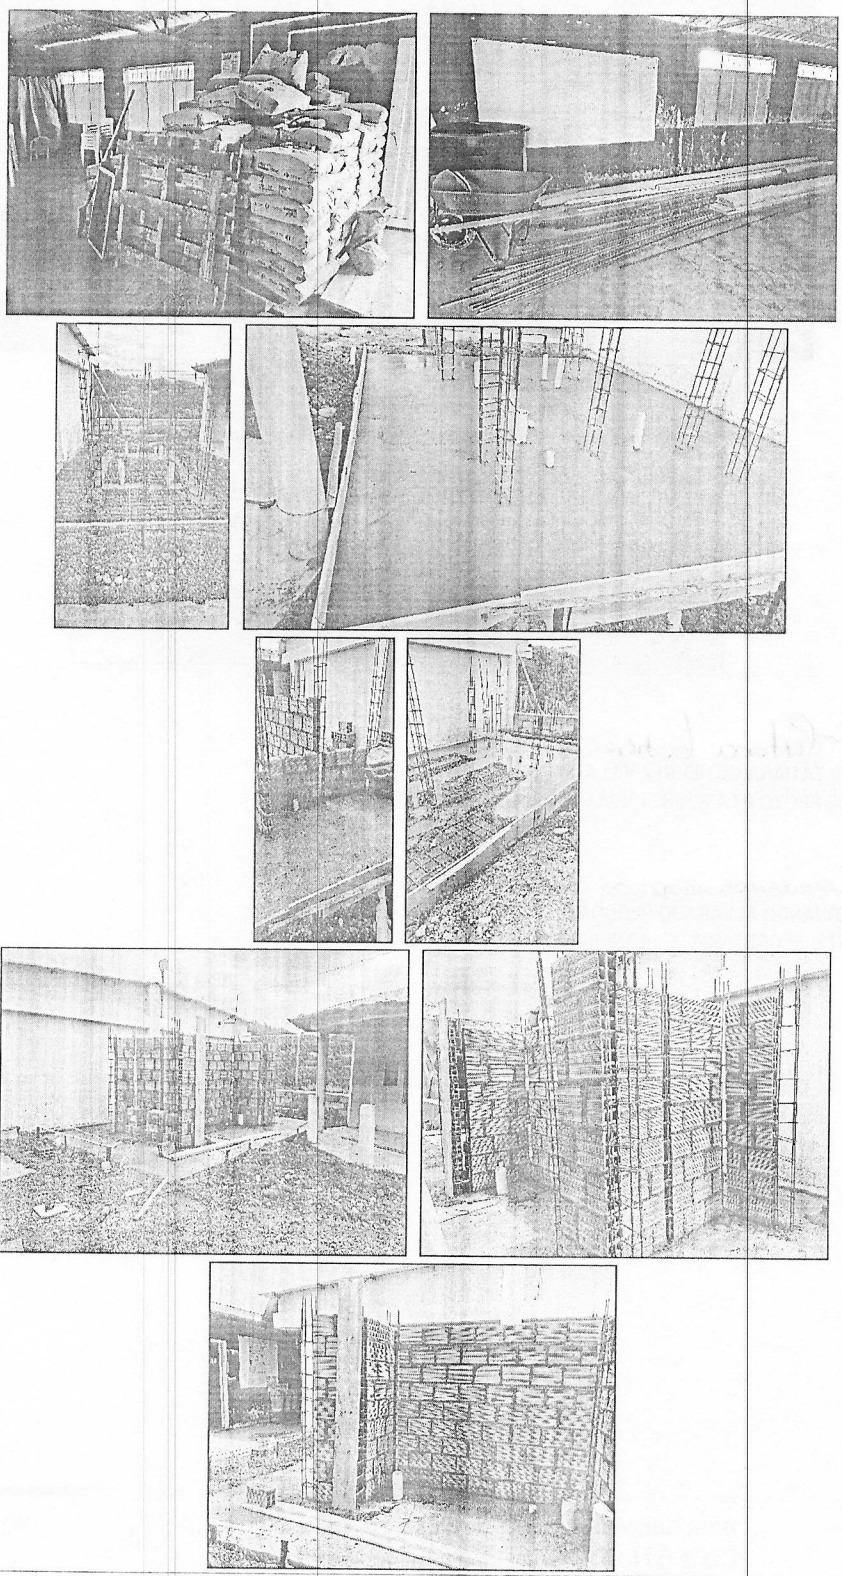

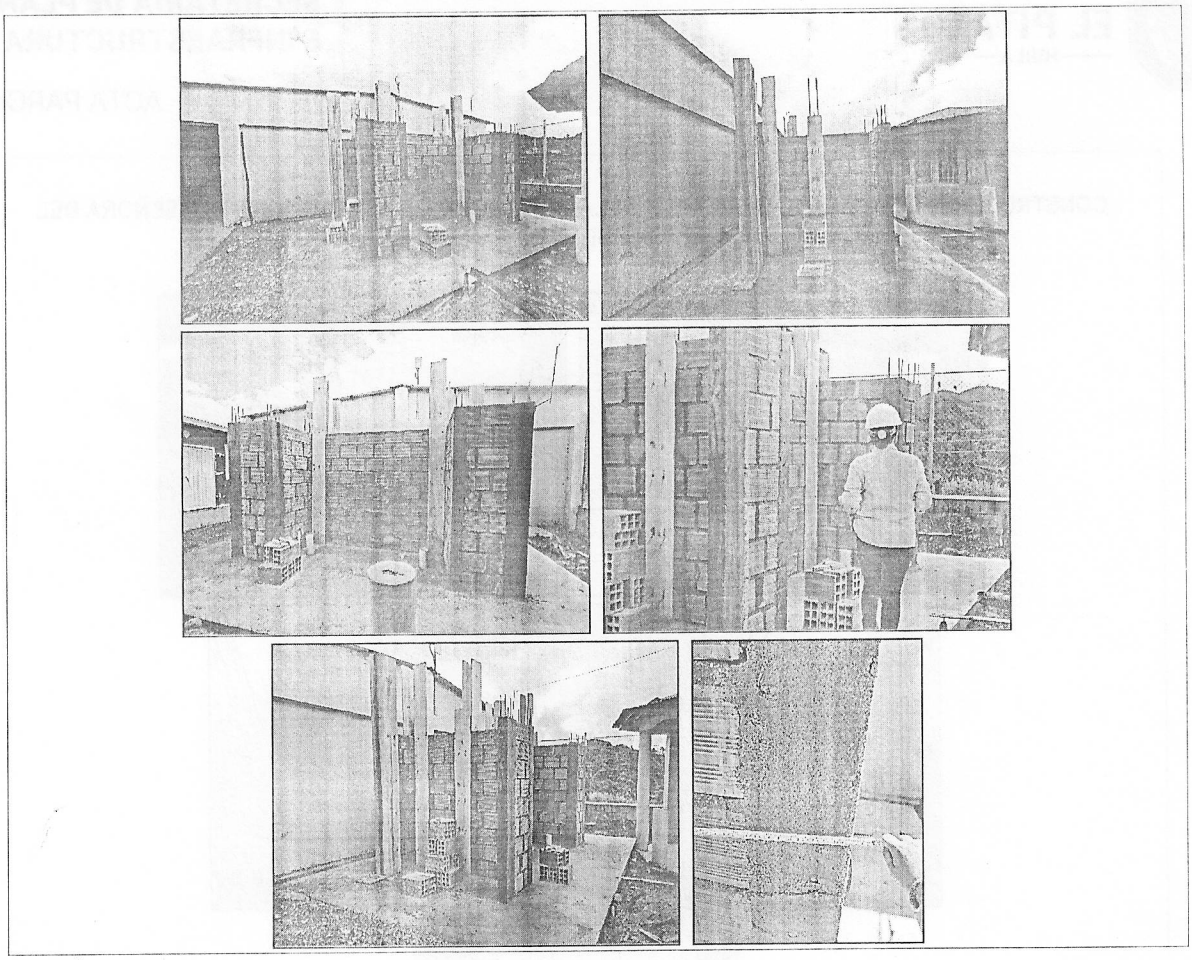

PROYECTÓ: KAREN TATIANA GUTIÉRREZ VILLAQUIRA
INGENIERA CIVIL DE APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

BORIS FERNANDO ALVARADO
REVISÓ: BORIS FERNANDO ALVARADO PERDOMO
ASESOR JURÍDICO DE SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
