Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1
PERIODO: DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 10 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	-		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	333.243.408,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		28 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:		N.A.	
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:		N.A.	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:		29 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:		28 DE FEBRERO DE 2025	
VALOR EJECUTADO:	$	309.911.971,00	93,00%	VALOR EJECUTADO:	$	5.388.412.398,99	74,96%
VALOR POR EJECUTAR:	$	23.331.437,00	7,00%	VALOR POR EJECUTAR:	$	1.799.688.301,40	25,04%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	73,21%	40,53%	-32,69%
Durante el periodo	21,62%	34,44%	12,81%
Acumulado Actual	94,83%	74,96%	-19,87%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	-25

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

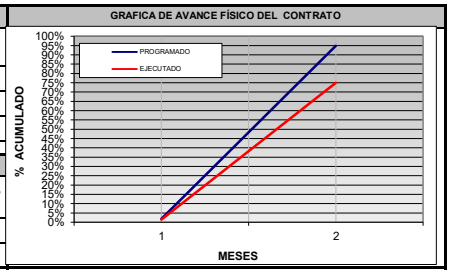

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 87.808,00	
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 2.859.904,70	
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 10.411.944,32	
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	$ 363.702,72	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 11.155.461,24	
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 2.284.236,24	
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 869.275,96	
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	$ 791.703,36	
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en	M2	$ 25.780.460,64	
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	$ 19.531.957,44	
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	$ 35.204.530,80	
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	$ 846.790,00	
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 35.202.933,08	
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 18.636.900,00	
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML	$ 485.110,08	
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	$ 7.171.416,00	
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	$ 7.149.008,00	
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	$ 12.032.278,20	
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	$ 2.972.680,00	
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 4.805.838,00	
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 3.470.880,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 10 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 15.925.718,50	
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 6.634.558,06	
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 3.555.552,00	
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 7.274.370,00	
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	$ 13.207.194,00	
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	$ 23.532.224,00	
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	$ 4.346.272,00	
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 7.339.304,00	
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 660.720,00	
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	$ 6.668.280,00	
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 76.272,00	
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	$ 38.899.449,00	
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.413.060,00	
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.094.108,00	
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	$ 1.662.336,00	
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 1.017.912,00	
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 2.049.498,00	
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 6.787.382,80	
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 152.272,00	
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 125.476,00	
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 175.158,00	
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 172.340,00	
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 221.572,00	
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 5.998.720,00	
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 6.067.880,00	
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	$ 779.114,00	
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	$ 36.028.350,00	
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato	UN	$ 4.242.598,00	
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.348.816,00	
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.958.928,00	
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 12.606.953,00	
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 19.882.246,00	
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.429.748,00	
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	$ 51.373.416,00	
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	$ 4.449.632,00	
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.123.688,00	
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 727.168,00	
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 718.200,00	
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	$ 16.509.848,74	
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI	$ 78.992.576,00	
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML	$ 18.488.435,00	
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	$ 122.857.549,08	
NP - 17	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e intalacion de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminacion existente)	UNI	$ 4.641.000,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 10 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

NP - 26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML	$ 7.110.135,60	
NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	UN	$ 55.575.270,00	
NP - 35	Ajuste a los diseños redes de iluminación.	M2	$ 4.864.400,00	
NP - 36	Ajuste a los diseños redes cableado estructurado, eléctricas de orden normal y regulado	M2	$ 5.846.400,00	
NP - 37	Mesón en acero inoxidable, ancho 60 cm, con salpicaderos y lavaplatos incorporado. (Suministro e instalación, incluye grifería, canastilla, desagüe y demás elementos de	ML	$ 6.889.270,19	
NP - 39	Señalética de 15x15 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 2.177.360,00	
NP - 40	Señalética de 30x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 10.857.968,00	
NP - 41	Señalética de 100x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 1.295.604,00	
NP - 42	Certificación de puntos de anclajes existentes, según normatividad.	UNI	$ 5.423.000,00	
NP - 43	Kit válvula de pedal manos libres de alto tráfico, con dos acoples flexo metálicos. (Suministro e instalación, incluye acoples y accesorios)	UN	$ 243.000,00	
NP - 44	Estructura metálica tipo pérgola (Suministro e instalación, incluye estudios y ajustes de diseños)	M2	$ 105.764.120,00	
NP - 48	Enchape para pared o piso en mármol. (Suministro e instalación)	M2	$ 7.632.371,00	
NP - 50	Reparación nariz paso escaleras. (Incluye refuerzo, pirlan similar al existente)	ML	$ 1.680.900,00	
NP - 51	Lavado de fachadas o similar con hidro lavadora (Suministro e instalación)	M2	$ 465.520,00	
NP - 52	Cinta antideslizante 25mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)	ML	$ 244.308,45	
NP - 53	Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	$ 650.568,41	
NP - 54	Backer Rod de 3/8" y sikaflex 1A para dilataciones entre porcelanato (suministro e instalación)	ML	$ 4.073.986,32	
NP - 55	Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2	$ 42.917.400,00	
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalacion)	UN	$ 4.314.000,00	
NP - 62	Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalacion)	M2	$ 5.634.397,13	
NP-63	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 134.181.936,18	
		TOTAL	$ 204.776.371,62	

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: DEL 11 DE MAYO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	333.243.408,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	319.911.971,00	96,00%	VALOR EJECUTADO:	$	5.593.188.770,61	77,81%
VALOR POR EJECUTAR:	$	13.331.437,00	4,00%	VALOR POR EJECUTAR:	$	1.594.911.929,79	22,19%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	73,21%	40,53%	-32,69%
Durante el periodo	21,62%	37,29%	15,66%
Acumulado Actual	94,83%	77,81%	-17,02%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	-21

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

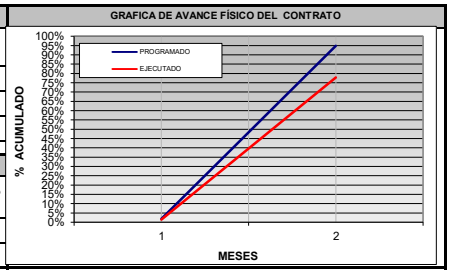

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 87.808,00	
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 2.859.904,70	
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 10.411.944,32	
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	$ 363.702,72	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 11.155.461,24	
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 2.284.236,24	
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 869.275,96	
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	$ 791.703,36	
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en	M2	$ 25.780.460,64	
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	$ 19.531.957,44	
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	$ 35.204.530,80	
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	$ 846.790,00	
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 35.202.933,08	
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 18.636.900,00	
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML	$ 485.110,08	
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	$ 7.171.416,00	
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	$ 7.149.008,00	
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	$ 12.032.278,20	
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	$ 2.972.680,00	
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 4.805.838,00	
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 3.470.880,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: **DEL 11 DE MAYO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 15.925.718,50	
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 6.634.558,06	
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 3.555.552,00	
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 7.274.370,00	
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	$ 13.207.194,00	
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	$ 23.532.224,00	
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	$ 4.346.272,00	
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 7.339.304,00	
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 660.720,00	
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	$ 6.668.280,00	
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 76.272,00	
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	$ 38.899.449,00	
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.413.060,00	
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.094.108,00	
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	$ 1.662.336,00	
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 1.017.912,00	
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 2.049.498,00	
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 6.787.382,80	
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 152.272,00	
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 125.476,00	
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 175.158,00	
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 172.340,00	
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 221.572,00	
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 5.998.720,00	
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 6.067.880,00	
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	$ 779.114,00	
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	$ 36.028.350,00	
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato	UN	$ 4.242.598,00	
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.348.816,00	
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.958.928,00	
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 12.606.953,00	
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 19.882.246,00	
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.429.748,00	
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	$ 51.373.416,00	
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	$ 4.449.632,00	
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.123.688,00	
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 727.168,00	
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 718.200,00	
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	$ 16.509.848,74	
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI	$ 78.992.576,00	
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML	$ 18.488.435,00	
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	$ 122.857.549,08	
NP - 17	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e intalacion de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminacion existente)	UNI	$ 4.641.000,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: **DEL 11 DE MAYO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

NP - 26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML	$ 7.110.135,60	
NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	UN	$ 55.575.270,00	
NP - 35	Ajuste a los diseños redes de iluminación.	M2	$ 4.864.400,00	
NP - 36	Ajuste a los diseños redes cableado estructurado, eléctricas de orden normal y regulado	M2	$ 5.846.400,00	
NP - 37	Mesón en acero inoxidable, ancho 60 cm, con salpicaderos y lavaplatos incorporado. (Suministro e instalación, incluye grifería, canastilla, desagüe y demás elementos de	ML	$ 6.889.270,19	
NP - 39	Señalética de 15x15 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 2.177.360,00	
NP - 40	Señalética de 30x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 10.857.968,00	
NP - 41	Señalética de 100x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 1.295.604,00	
NP - 42	Certificación de puntos de anclajes existentes, según normatividad.	UNI	$ 5.423.000,00	
NP - 43	Kit válvula de pedal manos libres de alto tráfico, con dos acoples flexo metálicos. (Suministro e instalación, incluye acoples y accesorios)	UN	$ 243.000,00	
NP - 44	Estructura metálica tipo pérgola (Suministro e instalación, incluye estudios y ajustes de diseños)	M2	$ 105.764.120,00	
NP - 48	Enchape para pared o piso en mármol. (Suministro e instalación)	M2	$ 7.632.371,00	
NP - 50	Reparación nariz paso escaleras. (Incluye refuerzo, pirlan similar al existente)	ML	$ 1.680.900,00	
NP - 51	Lavado de fachadas o similar con hidro lavadora (Suministro e instalación)	M2	$ 465.520,00	
NP - 52	Cinta antideslizante 25mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)	ML	$ 244.308,45	
NP - 53	Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	$ 650.568,41	
NP - 54	Backer Rod de 3/8" y sikaflex 1A para dilataciones entre porcelanato (suministro e instalación)	ML	$ 4.073.986,32	
NP - 55	Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2	$ 42.917.400,00	
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalacion)	UN	$ 4.314.000,00	
NP - 62	Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalacion)	M2	$ 5.634.397,13	
NP-63	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 134.181.936,18	
		TOTAL	$ 204.776.371,62	

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: DEL 18 DE MAYO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	321.111.971,00	72,27%	VALOR EJECUTADO:	$	5.797.965.142,22	80,66%
VALOR POR EJECUTAR:	$	123.212.573,00	27,73%	VALOR POR EJECUTAR:	$	1.390.135.558,17	19,34%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	73,21%	40,53%	-32,69%
Durante el periodo	21,62%	40,13%	18,51%
Acumulado Actual	94,83%	80,66%	-14,17%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	-18

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

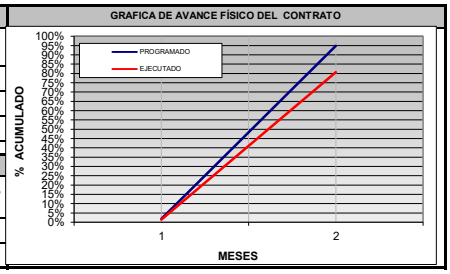

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 87.808,00	
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 2.859.904,70	
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 10.411.944,32	
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	$ 363.702,72	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 11.155.461,24	
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 2.284.236,24	
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 869.275,96	
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	$ 791.703,36	
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en	M2	$ 25.780.460,64	
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	$ 19.531.957,44	
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	$ 35.204.530,80	
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	$ 846.790,00	
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 35.202.933,08	
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 18.636.900,00	
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML	$ 485.110,08	
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	$ 7.171.416,00	
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	$ 7.149.008,00	
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	$ 12.032.278,20	
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	$ 2.972.680,00	
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 4.805.838,00	
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 3.470.880,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: **DEL 18 DE MAYO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 15.925.718,50	
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 6.634.558,06	
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 3.555.552,00	
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 7.274.370,00	
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	$ 13.207.194,00	
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	$ 23.532.224,00	
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	$ 4.346.272,00	
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 7.339.304,00	
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 660.720,00	
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	$ 6.668.280,00	
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 76.272,00	
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	$ 38.899.449,00	
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.413.060,00	
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.094.108,00	
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	$ 1.662.336,00	
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 1.017.912,00	
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 2.049.498,00	
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 6.787.382,80	
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 152.272,00	
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 125.476,00	
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 175.158,00	
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 172.340,00	
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 221.572,00	
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 5.998.720,00	
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 6.067.880,00	
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	$ 779.114,00	
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	$ 36.028.350,00	
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato	UN	$ 4.242.598,00	
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.348.816,00	
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.958.928,00	
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 12.606.953,00	
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 19.882.246,00	
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.429.748,00	
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	$ 51.373.416,00	
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	$ 4.449.632,00	
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.123.688,00	
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 727.168,00	
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 718.200,00	
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	$ 16.509.848,74	
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI	$ 78.992.576,00	
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML	$ 18.488.435,00	
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	$ 122.857.549,08	
NP - 17	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e intalacion de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminacion existente)	UNI	$ 4.641.000,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: **DEL 18 DE MAYO DE 2025 AL 24 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

NP - 26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML	$ 7.110.135,60	
NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	UN	$ 55.575.270,00	
NP - 35	Ajuste a los diseños redes de iluminación.	M2	$ 4.864.400,00	
NP - 36	Ajuste a los diseños redes cableado estructurado, eléctricas de orden normal y regulado	M2	$ 5.846.400,00	
NP - 37	Mesón en acero inoxidable, ancho 60 cm, con salpicaderos y lavaplatos incorporado. (Suministro e instalación, incluye grifería, canastilla, desagüe y demás elementos de	ML	$ 6.889.270,19	
NP - 39	Señalética de 15x15 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 2.177.360,00	
NP - 40	Señalética de 30x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 10.857.968,00	
NP - 41	Señalética de 100x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 1.295.604,00	
NP - 42	Certificación de puntos de anclajes existentes, según normatividad.	UNI	$ 5.423.000,00	
NP - 43	Kit válvula de pedal manos libres de alto tráfico, con dos acoples flexo metálicos. (Suministro e instalación, incluye acoples y accesorios)	UN	$ 243.000,00	
NP - 44	Estructura metálica tipo pérgola (Suministro e instalación, incluye estudios y ajustes de diseños)	M2	$ 105.764.120,00	
NP - 48	Enchape para pared o piso en mármol. (Suministro e instalación)	M2	$ 7.632.371,00	
NP - 50	Reparación nariz paso escaleras. (Incluye refuerzo, pirlan similar al existente)	ML	$ 1.680.900,00	
NP - 51	Lavado de fachadas o similar con hidro lavadora (Suministro e instalación)	M2	$ 465.520,00	
NP - 52	Cinta antideslizante 25mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)	ML	$ 244.308,45	
NP - 53	Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	$ 650.568,41	
NP - 54	Backer Rod de 3/8" y sikaflex 1A para dilataciones entre porcelanato (suministro e instalación)	ML	$ 4.073.986,32	
NP - 55	Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2	$ 42.917.400,00	
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalacion)	UN	$ 4.314.000,00	
NP - 62	Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalacion)	M2	$ 5.634.397,13	
NP-63	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 134.181.936,18	
		TOTAL	$ 204.776.371,62	

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2
PERIODO: DEL 25 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	-		VALOR ADICIÓN 2:	$	-	
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.188.100.700,39	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	334.111.971,00	75,20%	VALOR EJECUTADO:	$	6.002.741.513,84	83,51%
VALOR POR EJECUTAR:	$	110.212.573,00	24,80%	VALOR POR EJECUTAR:	$	1.185.359.186,55	16,49%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	73,21%	40,53%	-32,69%
Durante el periodo	21,62%	42,98%	21,36%
Acumulado Actual	94,83%	83,51%	-11,32%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	-14

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

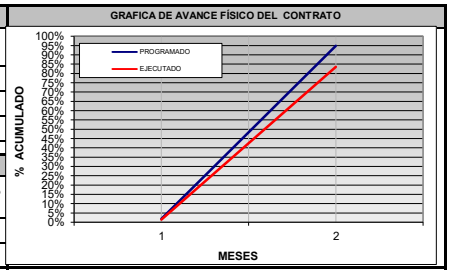

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 87.808,00	
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 2.859.904,70	
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 10.411.944,32	
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	$ 363.702,72	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 11.155.461,24	
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 2.284.236,24	
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 869.275,96	
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	$ 791.703,36	
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en	M2	$ 25.780.460,64	
11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	$ 19.531.957,44	
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	$ 35.204.530,80	
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	$ 846.790,00	
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 35.202.933,08	
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 18.636.900,00	
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML	$ 485.110,08	
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	$ 7.171.416,00	
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	$ 7.149.008,00	
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	$ 12.032.278,20	
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	$ 2.972.680,00	
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 4.805.838,00	
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 3.470.880,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: **DEL 25 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 15.925.718,50	
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 6.634.558,06	
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 3.555.552,00	
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 7.274.370,00	
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	$ 13.207.194,00	
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	$ 23.532.224,00	
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	$ 4.346.272,00	
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 7.339.304,00	
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 660.720,00	
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	$ 6.668.280,00	
16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 76.272,00	
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	$ 38.899.449,00	
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.413.060,00	
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.094.108,00	
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	$ 1.662.336,00	
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 1.017.912,00	
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 2.049.498,00	
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 6.787.382,80	
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 152.272,00	
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 125.476,00	
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 175.158,00	
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 172.340,00	
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 221.572,00	
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 5.998.720,00	
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 6.067.880,00	
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	$ 779.114,00	
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	$ 36.028.350,00	
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato	UN	$ 4.242.598,00	
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.348.816,00	
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.958.928,00	
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 12.606.953,00	
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 19.882.246,00	
20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.429.748,00	
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	$ 51.373.416,00	
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	$ 4.449.632,00	
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.123.688,00	
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 727.168,00	
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 718.200,00	
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	$ 16.509.848,74	
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI	$ 78.992.576,00	
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML	$ 18.488.435,00	
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	$ 122.857.549,08	
NP - 17	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e intalacion de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminacion existente)	UNI	$ 4.641.000,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: **DEL 25 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

NP - 26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML	$ 7.110.135,60	
NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	UN	$ 55.575.270,00	
NP - 35	Ajuste a los diseños redes de iluminación.	M2	$ 4.864.400,00	
NP - 36	Ajuste a los diseños redes cableado estructurado, eléctricas de orden normal y regulado	M2	$ 5.846.400,00	
NP - 37	Mesón en acero inoxidable, ancho 60 cm, con salpicaderos y lavaplatos incorporado. (Suministro e instalación, incluye grifería, canastilla, desagüe y demás elementos de	ML	$ 6.889.270,19	
NP - 39	Señalética de 15x15 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 2.177.360,00	
NP - 40	Señalética de 30x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 10.857.968,00	
NP - 41	Señalética de 100x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 1.295.604,00	
NP - 42	Certificación de puntos de anclajes existentes, según normatividad.	UNI	$ 5.423.000,00	
NP - 43	Kit válvula de pedal manos libres de alto tráfico, con dos acoples flexo metálicos. (Suministro e instalación, incluye acoples y accesorios)	UN	$ 243.000,00	
NP - 44	Estructura metálica tipo pérgola (Suministro e instalación, incluye estudios y ajustes de diseños)	M2	$ 105.764.120,00	
NP - 48	Enchape para pared o piso en mármol. (Suministro e instalación)	M2	$ 7.632.371,00	
NP - 50	Reparación nariz paso escaleras. (Incluye refuerzo, pirlan similar al existente)	ML	$ 1.680.900,00	
NP - 51	Lavado de fachadas o similar con hidro lavadora (Suministro e instalación)	M2	$ 465.520,00	
NP - 52	Cinta antideslizante 25mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)	ML	$ 244.308,45	
NP - 53	Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	$ 650.568,41	
NP - 54	Backer Rod de 3/8" y sikaflex 1A para dilataciones entre porcelanato (suministro e instalación)	ML	$ 4.073.986,32	
NP - 55	Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2	$ 42.917.400,00	
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalacion)	UN	$ 4.314.000,00	
NP - 62	Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalacion)	M2	$ 5.634.397,13	
NP-63	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 134.181.936,18	
		TOTAL	$ 204.776.371,62	

Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE 14)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024
INFORME MENSUAL No.	14
PERIODO:	DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024				LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00			7.000.000.000,00		
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00			188.100.700,39		
VALOR ADICIÓN 2:					-		
VALOR ACTUALIZADO:	$	444.324.544,00			7.188.100.700,39		
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024				31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:					28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE FEBRERO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	334.111.971,00	75,20%	VALOR EJECUTADO:	$	6.002.749.024,69	83,51%
VALOR POR EJECUTAR:	$	110.212.573,00	24,80%	VALOR POR EJECUTAR:	$	1.185.351.675,70	16,49%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	91,83%	72,11%	-32,69%
Durante el periodo	3,00%	11,40%	8,40%
Acumulado Actual	94,83%	83,51%	-11,32%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	-14

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

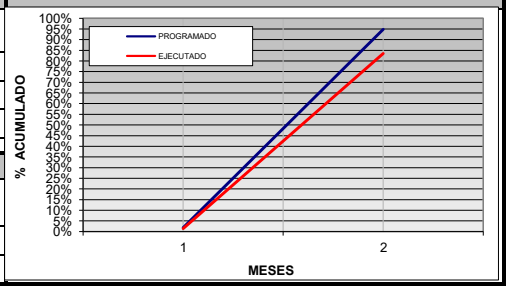

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.5	Desmonte de espejos. (Incluye trasiego y disposición final)	UN	$ 87.808,00	
6.4	Muro en Super Board doble cara, placa S8 de 8 mm, pintura Vinilo 1 mano. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, cinta metálica filos, pintura)	M2	$ 2.859.904,70	
9.1	Cielo raso en Drywall 1/2" junta perdida con acabado pintura Vinilo tipo 2 a 3 manos. (Suministro e instalación. Incluye perfilería, malla, cinta papel, pintura)	M2	$ 10.411.944,32	
9.4	Dilatación plástica Drywall. (Suministro e instalación)	ML	$ 363.702,72	
10.4	Pintura muros Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 11.155.461,24	
10.6	Pintura epóxica base agua muros/techos, a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 2.284.236,24	
10.7	Pintura exterior tipo Koraza, tres manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)	M2	$ 869.275,96	
10.10	Pintura esmalte lámina lineal. (Suministro y aplicación)	ML	$ 791.703,36	
11.18	Suministro e instalación de Piso laminado tipo SPC con recubrimiento vinilico protegido 4mm + 1mm, de alta resistencia al tráfico comercial, incluye reforzamiento en polietileno.	M2	$ 25.780.460,64	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024		
INFORME MENSUAL No.	14	PERIODO:	DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

11.38	Enchape pared cerámica 60x30 cm o similar. (Suministro e instalación. Incluye win)	M2	$ 19.531.957,44	
11.40	Mesón en Granito SAN GABRIEL. (Suministro e instalación. Incluye perforaciones, reengruese y salpicadero necesarios)	ML	$ 35.204.530,80	
11.42	Extractor de aire para baños axial 6", 110V, 43W.. (Suministro e instalación)	UN	$ 846.790,00	
12.10	Cubierta en policarbonato alveolar e= 6 mm. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 35.202.933,08	
12.13	Cubierta en UPVC. Color a definir. (Suministro e instalación. Incluye perfiles, remates, accesorios)	M2	$ 18.636.900,00	
12.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML	$ 485.110,08	
13.1	Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)	UN	$ 7.171.416,00	
13.3	Puerta en madera entamborada 0.90 m. (Suministro e instalación. Altura hasta 2.40m. Incluye marco)	UN	$ 7.149.008,00	
13.6	Mueble en madera tipo cocina. (bajo/alto). h=0,60-0,80 m ancho=0,30-0,60 m. (Suministro e instalación. Incluye soportes, herrajes, pintura, accesorios necesarios)	ML	$ 12.032.278,20	
14.5	Puerta en Aluminio 5020 de 0,90x2,40 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes y accesorios)	UN	$ 2.972.680,00	
14.12	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 0,90x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 4.805.838,00	
14.13	Puerta marco en aluminio con vidrio templado e=6 mm. 1,00x2,00 m. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	UN	$ 3.470.880,00	
14.18	Ventanería en aluminio con vidrio laminado incoloro 3+3 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 15.925.718,50	
15.13	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 6.634.558,06	
15.14	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2	$ 3.555.552,00	
16.5	Sanitario de piso linea institucional. (Suministro e instalación)	UN	$ 7.274.370,00	
16.8	Sistema de descarga de tazas (fluxometro ó válvula), sumin. e inst.	UN	$ 13.207.194,00	
16.9	Lavamanos linea institucional con grifería. (Suministro e instalación. Incluye grifería, sifón, desague, accesorios)	UN	$ 23.532.224,00	
16.10	Lavamanos de incrustar tipo Aquajet o similar con grifería tipo push. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN	$ 4.346.272,00	
16.12	Orinal tipo arrecife o similar con grifería antivandálica tipo push. (Suministro e instalación. Incluye equipos, accesorios)	UN	$ 7.339.304,00	
16.13	Lavaplatos en acero inoxidable con grifería. (Suministro e instalación. Inlcuye grifería, canastilla, desague, accesorios)	UN	$ 660.720,00	
16.18	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN	$ 6.668.280,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **14**
PERIODO: **DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

16.26	Rejilla metálica con sosco 5x3". (Suministro e instalación)	UN	$ 76.272,00	
19.5	Cable eléctrico 3x12 thhn. (Suministro e instalación)	ML	$ 38.899.449,00	
19.7	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 12 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.413.060,00	
19.8	Tablero trifásico 3F - 5H - 208/120V - 18 circuitos. (Suministro e instalación. Con puerta, chapa, espacio para totalizador)	UN	$ 1.094.108,00	
19.14	Breaker enchufable de 20A. (Suministro e instalación)	UN	$ 1.662.336,00	
19.22	Tubería EMT 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 1.017.912,00	
19.23	Tubería EMT 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 2.049.498,00	
19.24	Tubería EMT 1¨. (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 6.787.382,80	
19.27	Tubería EMT 2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML	$ 152.272,00	
19.37	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 125.476,00	
19.39	Caja de paso metálica 40x40 cm. (Suministro e instalación)	UN	$ 175.158,00	
19.42	Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 172.340,00	
19.45	Salida interruptor triple tipo Luminex. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, aparato, accesorios 3m)	UN	$ 221.572,00	
19.52	Salida toma doble red normal 5-15 R. (Suministro e instalación. Incluye caja, tubería, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 5.998.720,00	
19.54	Salida toma doble polo a tierra en canaleta. (Suministro e instalación. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)	UN	$ 6.067.880,00	
19.55	Toma doble P/T- 120V-GFCI. (Suministro e instalación. Incluye caja, toma, accesorios)	UN	$ 779.114,00	
19.60	Salida iluminación, tubería EMT. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tubería, accesorios necesarios 3m)	UN	$ 36.028.350,00	
19.65	Salida sensor de movimiento. (Suministro e instalación. Incluye equipos, caja, toma, cableado, terminales, tubería, sensor, accesorios necesarios 3m. No incluye aparato extractor)	UN	$ 4.242.598,00	
19.76	Lámpara tipo bala. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.348.816,00	
19.77	Lámpara de emergencia con batería de autonomía de 1.5 horas (2x5,4W), instaladas en pared. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UN	$ 1.958.928,00	
20.5	Bandeja tipo malla de 40cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 12.606.953,00	
20.8	Canaleta metálica 12x5 cm. (Suministro e instalación. Incluye anclajes, soportes, accesorios necesarios)	ML	$ 19.882.246,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024		
INFORME MENSUAL No.	14	PERIODO:	DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

20.12	Rack de datos principal cerrado de 2,1 m. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.429.748,00	
20.20	Cable Cat 6A/7, UTP 500Mhz, 10G 4x2x23AWG, color azul. . (Suministro e instalación)	ML	$ 51.373.416,00	
20.23	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Azul. (Suministro e instalación)	UN	$ 4.449.632,00	
20.24	Tracjack, Cat6A, UTP 10G, Rojo. (Suministro e instalación)	UN	$ 2.123.688,00	
20.25	Face plate sencillo, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 727.168,00	
20.26	Face plate doble, blanco marfil. (Suministro e instalación)	UN	$ 718.200,00	
NP - 01	Piso en cerámica 60x60 (incluye suministro e instalación)	M2	$ 16.509.848,74	
NP - 09	Lámpara Panel LED 60x60 cm, 40 W. (Suministro e instalación. Incluye clavija y cable encauchetado necesarios)	UNI	$ 78.992.576,00	
NP - 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO PARA SOPORTE DE MESON	ML	$ 18.488.435,00	
NP - 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA FENOLICA DE 12MM PARA BAÑOS (INCLUYE HERRAJES)	M2	$ 122.857.549,08	
NP - 17	LUMINARIA WALLPACK IP66, Suministro e intalacion de luminarias para exterior Wallpack ip66 stil led 110 (incluye retiro de iluminacion existente)	UNI	$ 4.641.000,00	
NP - 26	Guarda escobas en MDF (suministro e instalación).	ML	$ 7.110.135,60	
NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	UN	$ 55.575.270,00	
NP - 35	Ajuste a los diseños redes de iluminación.	M2	$ 4.864.400,00	
NP - 36	Ajuste a los diseños redes cableado estructurado, eléctricas de orden normal y regulado	M2	$ 5.846.400,00	
NP - 37	Mesón en acero inoxidable, ancho 60 cm, con salpicaderos y lavaplatos incorporado. (Suministro e instalación, incluye grifería, canastilla, desagüe y demás elementos de instalacion	ML	$ 6.889.270,19	
NP - 39	Señalética de 15x15 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 2.177.360,00	
NP - 40	Señalética de 30x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 10.857.968,00	
NP - 41	Señalética de 100x20 según manual, con marcación en braile. (Suministro e instalación, incluye accesorios)	UN	$ 1.295.604,00	
NP - 42	Certificación de puntos de anclajes existentes, según normatividad.	UNI	$ 5.423.000,00	
NP - 43	Kit válvula de pedal manos libres de alto tráfico, con dos acoples flexo metálicos. (Suministro e instalación, incluye acoples y accesorios)	UN	$ 243.000,00	
NP - 44	Estructura metálica tipo pérgola (Suministro e instalación, incluye estudios y ajustes de diseños)	M2	$ 105.764.120,00	

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024		
INFORME MENSUAL No.	14	PERIODO:	DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
		LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente		FECHA DE EXPEDICION	N/A
		No. DE RADICACION	N/A
		VIGENCIA	N/A

NP - 48	Enchape para pared o piso en mármol. (Suministro e instalación)	M2	$ 7.632.371,00	
NP - 50	Reparación nariz paso escaleras. (Incluye refuerzo, pirlan similar al existente)	ML	$ 1.680.900,00	
NP - 51	Lavado de fachadas o similar con hidro lavadora (Suministro e instalación)	M2	$ 465.520,00	
NP - 52	Cinta antideslizante 25mm similar a la existente. (Suministro e instalación, incluye sello)	ML	$ 244.308,45	
NP - 53	Filos en cinta metálica para muros (Suministro e instalación, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación)	ML	$ 650.568,41	
NP - 54	Backer Rod de 3/8" y sikaflex 1A para dilataciones entre porcelanato (suministro e instalación)	ML	$ 4.073.986,32	
NP - 55	Restauración de cubierta metálica (Suministro e instalación)	M2	$ 42.917.400,00	
NP-60	Sanitario de doble descarga (suministro e instalacion)	UN	$ 4.314.000,00	
NP - 62	Enchape piedra muñeca para muro fachada (suministro e instalacion)	M2	$ 5.634.397,13	
NP-63	Marquesina de vidrio templado laminado 5+5 con herrajes de Aluminio. (Suministro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2	$ 134.181.936,18	
		TOTAL	$ 819.105.486,47	

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE 14)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	083-2024
INFORME MENSUAL No.	14

PERIODO: **DEL 1 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025**


LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.985.928,40	100,01%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486,47	348,56%
	$ -		
VALOR TOTAL	**$ 6.816.754.844,73**	**$ 6.002.749.024,69**	**88,06%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

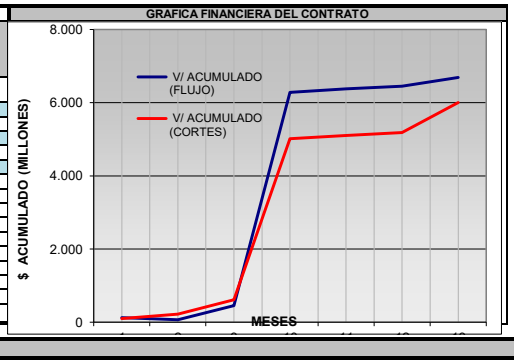

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA
