Informe Ejecutivo Semanal 1

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 1

PERIODO: **DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá
D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente

LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	18.603.822,00		VALOR ADICIÓN 2:	$	678.278.904,80	
VALOR ACTUALIZADO:	$	462.928.366,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.866.379.605,19	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:		31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:		28 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:		30-jul-25	
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:		14-ago-25	
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:		29 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION:	30 JULIO DE 2025			FECHA DE TERMINACION:		30 JULIO DE 2025	
VALOR EJECUTADO:	$	375.179.548,31	81,04%	VALOR EJECUTADO:	$	6.923.551.959,12	88,01%
VALOR POR EJECUTAR:	$	87.748.817,69	18,96%	VALOR POR EJECUTAR:	$	942.827.646,07	11,99%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96,36%	93,74%	-2,62%
Durante el periodo	-96,36%	-5,73%	90,63%
Acumulado Actual	0,00%	88,01%	88,01%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	109

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

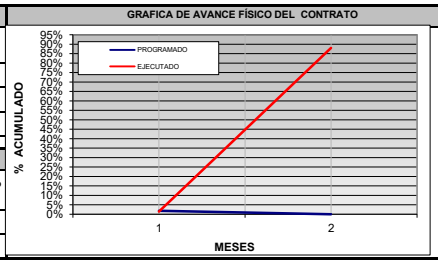

ACTIVIDADES EJECUTADAS

NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	$ 55.575.270,00
NP-72	Patch panel panduit categoria 6 48 puertos (suministro e instalacion)	$ 6.007.320,00
NP-73	Patch panel panduit categoria 6 24 puertos (suministro e instalacion)	$ 4.407.526,46
NP-74	Organizador de cable panduit (suministro e instalacion)	$ 482.685,72
	TOTAL	$ 29.694.978,91

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

1 (OBRA)	$	127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$	67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$	389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$	681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$	600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$	613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$	1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$	926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$	716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$	625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$	525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$	89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$	79.978.417,55	$ 79.985.928,40	100,01%
14 (OBRA)	$	235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$	110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$	72.000.000	$ 11.622.435,67	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$	2.100.000	$ 7.190.880,83	342,42%
18 (OBRA)	$	51.300.000	$ 265.555.736,82	517,65%
19(IVA)	$	135.945.856	$ 165.285.364,97	121,58%
20(AIU)	$	89.084.937	$ 29.694.978,91	33,33%
VALOR TOTAL	**$**	**6.924.160.962,73**	**$ 6.923.551.959,12**	**99,99%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

Informe Ejecutivo Semanal 1	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **1**

PERIODO: **DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Semanal 2	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 2

PERIODO: **DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	18.603.822,00		VALOR ADICIÓN 2:	$	678.278.904,80	
VALOR ACTUALIZADO:	$	462.928.366,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.866.379.605,19	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	30-jul-25		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	14-ago-25		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACION:	30 JULIO DE 2025			FECHA DE TERMINACION:	30 JULIO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	375.679.548,31	81,15%	VALOR EJECUTADO:	$	7.022.793.932,12	89,28%
VALOR POR EJECUTAR:	$	87.248.817,69	18,85%	VALOR POR EJECUTAR:	$	843.585.673,07	10,72%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	96,36%	93,74%	-2,62%
Durante el periodo	-96,36%	-4,47%	91,90%
Acumulado Actual	0,00%	89,28%	89,28%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	111

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

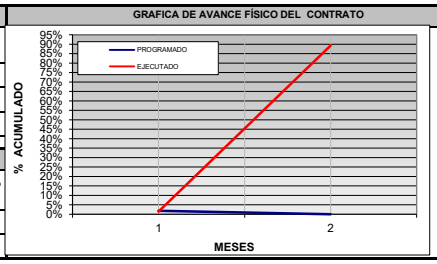

ACTIVIDADES EJECUTADAS

NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	$ 55.575.270,00
NP-72	Patch panel panduit categoria 6 48 puertos (suministro e instalacion)	$ 6.007.320,00
NP-73	Patch panel panduit categoria 6 24 puertos (suministro e instalacion)	$ 4.407.526,46
NP-74	Organizador de cable panduit (suministro e instalacion)	$ 482.685,72
	TOTAL	$ 89.084.936,74

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.985.928,40	100,01%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$ 110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$ 72.000.000	$ 11.622.435,67	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$ 2.100.000	$ 7.190.880,83	342,42%
18 (OBRA)	$ 51.300.000	$ 265.555.736,82	517,65%
19(IVA)	$ 135.945.856	$ 165.285.364,97	121,58%
20(AIU)	$ 89.084.937	$ 89.084.936,74	100,00%
VALOR TOTAL	**$ 7.052.154.844,73**	**$ 7.022.793.932,12**	**99,58%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

Informe Ejecutivo Semanal 2	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **2**

PERIODO: **DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE 20)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 083-2024
INFORME MENSUAL No. 20

PERIODO: **DEL 1 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:		
Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente	LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
	LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
	FECHA DE EXPEDICION	N/A
	No. DE RADICACION	N/A
	VIGENCIA	N/A

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA JUDICIAL		
CONTRATO No.:	091/18 JULIO DE 2024			CONTRATO No.:	LP-01-2024		
VALOR INICIAL:	$	333.243.408,00		VALOR INICIAL:	$	7.000.000.000,00	
VALOR ADICIÓN 1:	$	111.081.136,00		VALOR ADICIÓN 1:	$	188.100.700,39	
VALOR ADICIÓN 2:	$	18.603.822,00		VALOR ADICIÓN 2:	$	678.278.904,80	
VALOR ACTUALIZADO:	$	462.928.366,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	7.866.379.605,19	
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:				PLAZO ACTUALIZADO:	28 DE FEBRERO DE 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			FECHA DE SUSPENSIÓN:	30-jul-25		
FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			FECHA DE REINICIACIÓN:	14-ago-25		
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024			FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 JULIO DE 2025			FECHA DE TERMINACIÓN	30 JULIO DE 2025		
VALOR EJECUTADO:	$	376.679.548,31	81,37%	VALOR EJECUTADO:	$	7.277.164.233,83	92,51%
VALOR POR EJECUTAR:	$	86.248.817,69	18,63%	VALOR POR EJECUTAR:	$	589.215.371,36	7,49%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	89,65%	89,28%	-0,37%
Durante el periodo	2,86%	3,23%	0,37%
Acumulado Actual	92,51%	92,51%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
124	60	64	0

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

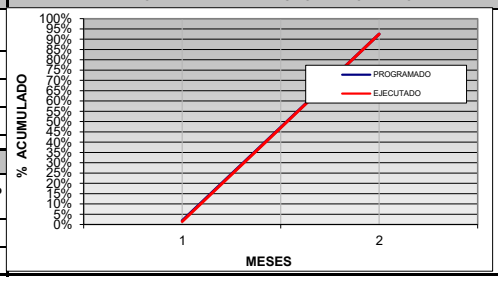

ACTIVIDADES EJECUTADAS

NP - 33	Switch Hp Aruba de 48 Puertos 6200M 48G CL4PoE 4SFP SW. (Suministro e instalación)	$ 55.575.270,00
NP-72	Patch panel panduit categoria 6 48 puertos (suministro e instalacion)	$ 6.007.320,00
NP-73	Patch panel panduit categoria 6 24 puertos (suministro e instalacion)	$ 4.407.526,46
NP-74	Organizador de cable panduit (suministro e instalacion)	$ 482.685,72
	TOTAL+	$ 89.084.936,74

Informe Ejecutivo Mensual (CORTE DE 20)	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. **083-2024**
INFORME MENSUAL No. **20**

PERIODO: **DEL 1 SEPTIEMBRE DE 2025 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Sedes del nivel central en la ciudad de Bogotá D.C., Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", Edificio de la Bolsa, Almacén y Archivo, ubicados en la Calle 12 7-65, Carrera 8 No. 12B-82 y calle 18 No. 32-90 respectivamente


LICENCIAS Y/O PERMISOS:	N/A
LICENCIA DE CONSTRUCCION No	N/A
FECHA DE EXPEDICION	N/A
No. DE RADICACION	N/A
VIGENCIA	N/A

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%)
1 (OBRA)	$ 127.993.882,00	$ 99.241.973,00	77,54%
2 (MOBILIARIO)	$ 67.098.864,23	$ 121.320.474,00	180,81%
3 (OBRA)	$ 389.609.923,00	$ 389.609.923,00	100,00%
4 (MOBILIARIO)	$ 681.811.150,16	$ 485.972.041,78	71,28%
5(OBRA)	$ 600.000.000,00	$ 423.842.510,54	70,64%
6 (mobiliario)	$ 613.287.789,68	$ 14.931.572,98	2,43%
7 (OBRA)	$ 1.138.963.037,29	$ 351.062.662,73	30,82%
8 (OBRA)	$ 926.813.863,00	$ 509.506.679,71	54,97%
9 (Mobiliario)	$ 716.897.000,00	$ 517.554.158,42	72,19%
10(obra)	$ 625.000.000,00	$ 1.584.558.399,02	253,53%
11 (Mobiliario)	$ 525.000.000,00	$ 516.756.296,81	98,43%
12(OBRA CALLE 73)	$ 89.300.917,83	$ 89.300.917,83	100,00%
13 (Mobiliario Calle 73)	$ 79.978.417,55	$ 79.985.928,40	100,01%
14 (OBRA)	$ 235.000.000	$ 819.105.486	348,56%
15(MOBILIARIO)	$ 110.000.000	$ 735.675.854,11	668,80%
16(OBRA)	$ 72.000.000	$ 11.622.435,67	16,14%
17 (MOBILIARIO)	$ 2.100.000	$ 7.190.880,83	342,42%
18 (OBRA)	$ 51.300.000	$ 265.555.736,82	517,65%
19(IVA)	$ 135.945.856	$ 165.285.364,97	121,58%
20(AIU)	$ 89.084.937	$ 89.084.936,74	100,00%
VALOR TOTAL	**$ 7.277.185.637,13**	**$ 7.277.164.233,83**	**100,00%**

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

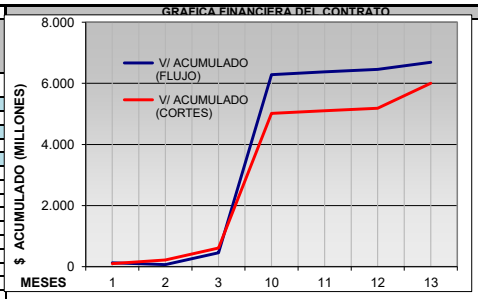

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

FERNEY PEÑA
Director de Obra
CONSORCIO RAMA JUDICIAL 2024
CONTRATISTA

LUIS CARLOS GALVIS
Director de Interventoría
2I PROYECTOS SAS BIC
INTERVENTORÍA
