REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y QUIPAMIENTO MUNICIPAL	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 23-12-2024

1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO: 1 PERIODO: 22/12/2025 al 26/12/2025

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Orden de compra N.°	835-2025	Fecha:	17/12/2025
Nombre completo del contratista:	ALFA METALMECANICA SAS		
Documento de identificación:	NIT 901472475-8		
Nombre del supervisor:	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ		
Unidad Administrativa:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		

Objeto del contrato: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	22	Mes	12	Año	2025	Día	31	Mes	12	Año	2025

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Reanudación: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*		Día		Mes		Año	

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2025002160	Fecha de CDP: 09/12/2025	Valor: $ 64.057.000
Número de RP: 2025002483	Fecha de RP: 22/12/2025	Valor: $ 63.742.447
Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)		
Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable	
Valor inicial del contrato: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE.	$ 63.742.447
Adición:	$ ---
Valor Total del contrato: SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE DE PESOS M/CTE.	$ 63.742.447

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 63.742.447	$ 63.742.447	$ 63.742.447	$ 0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)

Información del pago de seguridad social:

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y QUIPAMIENTO MUNICIPAL	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: F4-JA-PC5-1010 VERSIÓN: 6 FECHA: 23-12-2024

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N.° PIN	Referencia	Autorización
			2033945090
	Operador	Pago	N.° Planilla
	SOI	$413.300	7996494106
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	24/12/2025	Diciembre del 2025	

Observaciones al informe financiero y contable: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (Diciembre) del 2025, último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (Diciembre) del 2025. En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

INFORME TÉCNICO

El siguiente listado corresponde a los trabajos realizados en ejecución del contrato, discriminados por cada vehículo y equipo intervenido.

CAMIONETA OVR 083

- Revisión y reparación del motor Suzuki Gran Vitara, modelo 2010, incluyendo desmonte y rectificación.
- Suministro e instalación de bielas, pistones, cilindros y válvulas.
- Revisión y reparación del sistema eléctrico general, incluyendo cableado, pachas y escáner.
- Suministro e instalación de amortiguadores delanteros, incluyendo acoples, tornillería y ajuste en el torno.

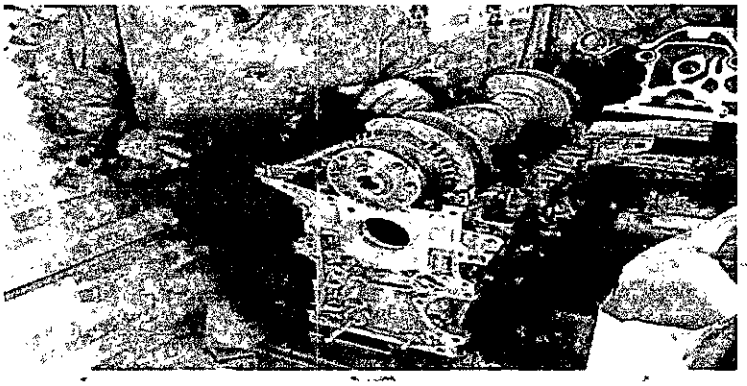


Imagen 1Revision de motor

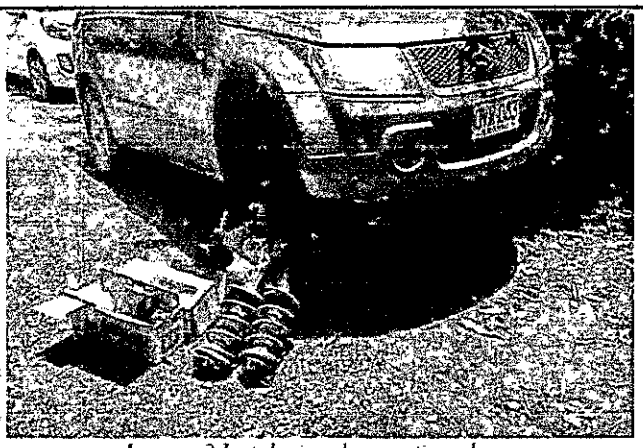


Imagen 2 Instalacion de amortiguadores

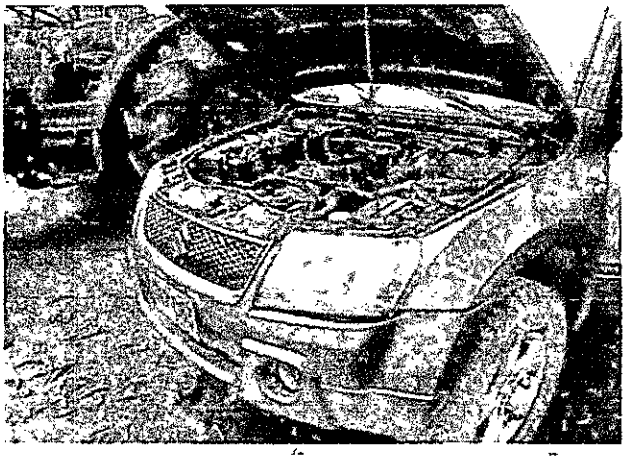


Imagen 3Revision de sistema eléctrico

VOLQUETA OVR 085

- Desmonte, revisión y reparación de la transmisión, incluyendo desmonte y montaje.
- Suministro e instalación de kit de ecualización de transmisión, incluyendo tornillería, arandelas de ajuste y silicona gris.
- Suministro y cambio de empaquetadura de válvula relay, cauchos, diafragmas, plato desactivador y horquilla de aceite, junto con la reparación de dos cámaras, válvulas relay y válvula chillona.
- Suministro e instalación de hoja de resorte 1SV, referencia 55-P124M, incluyendo tornillo central 1/6 x 6.
- Suministro e instalación de ventilador de 12 aspas para motor International DT 7300.



Imagen 4 Desmonte, suministro e instalación de kit de escualizacion

VOLQUETA OVR 087

- Suministro e instalación de bandas 4311S, arandelas, rodajas de 3/8", abrazaderas plásticas, bandeja de ruedas y cambio de la manguera principal del compresor. Incluye cambio de empaquetadura de bomba, racor unión B62, anillos y refuerzos, reparación de fugas y reemplazo de racores.
- Suministro y cambio de empaquetadura de válvula relay, cauchos, diafragmas, plato desactivador y horquilla de aceite, junto con la reparación de dos cámaras, válvulas relay y válvula chillona.
- Suministro e instalación de mangueras de motor y radiador, caucho–lona.
- Suministro e instalación de abrazaderas metálicas y tornillos centrales para hojas o muelles.

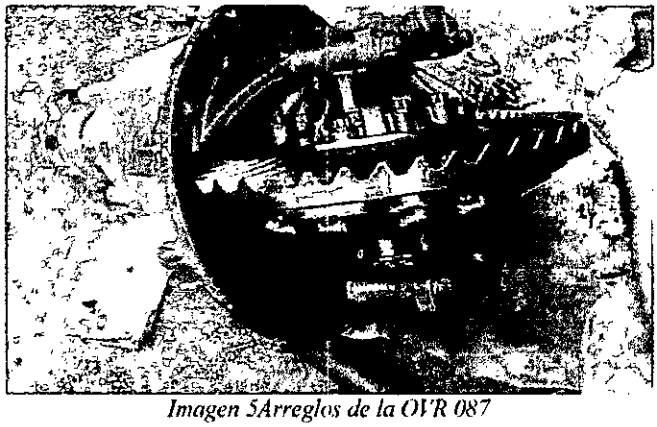


Imagen 5Arreglos de la OVR 087



Imagen 6 Arreglos de la OVR 087

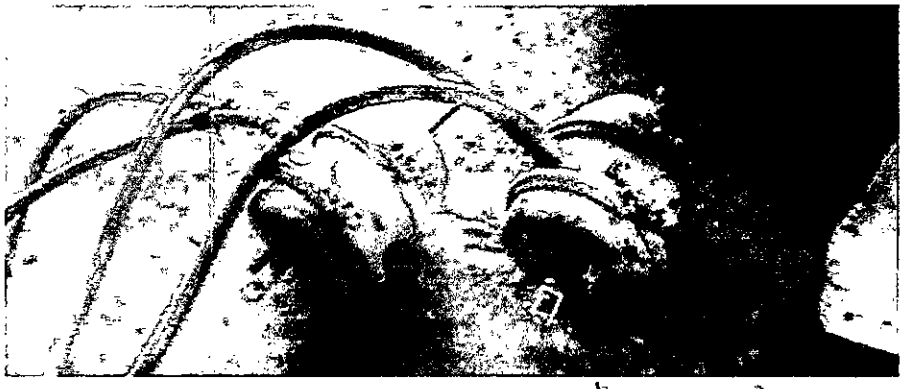


Imagen 7Arreglos de la OVR 087

VOLQUETA ONK-550

- Suministro e instalación de terminales y barra de dirección, incluyendo ajuste en torno, soldaduras y engrase.
- Suministro e instalación de corona y speed, con escualización completa de la transmisión, incluyendo arandelas de ajuste y silicona gris.



Imagen 8 Suministro e instalación de Corona y speed. escualización completa de transmisión

VOLQUETA ONK 551

- Desmonte, revisión y reparación de la transmisión, incluyendo desmonte y montaje.
- Suministro e instalación de hoja de resorte 2SV, referencia 55-P124M, incluyendo tornillo central 1/6 x 6.

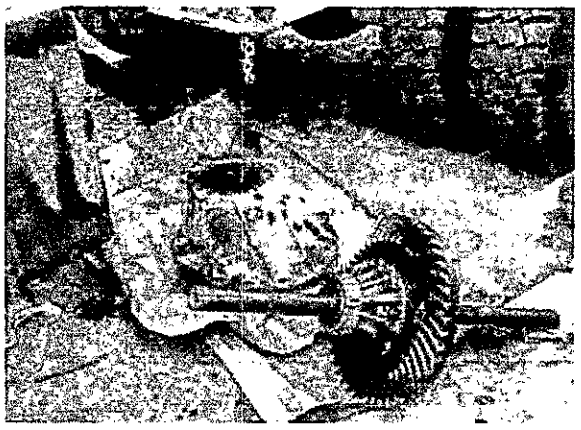


Imagen 9 Transmision de la ONK 551

VOLQUETA ONK 552

- Desmonte, revisión y reparación del gato del volco, incluyendo tornillos, bujes, retenes y aceites.
- Revisión y reparación de válvula booster sencilla, incluyendo revisión de empaquetadura, O-ring, hexagonales y aceites.
- Suministro y reparación del sistema de freno de ahogo, revisión general y puesta en funcionamiento.

- Desmonte, revisión y reparación de la transmisión, incluyendo desmonte y montaje.
- Suministro e instalación de repuestos de engranaje de transmisión, incluyendo planetarios y satélites.



Imagen 10 Arreglo del bolco onk 552

CAMIÓN DOBLE TROQUE OVR 092

- Desmonte, revisión y reparación del motor DT 408 para corrección de fugas, incluyendo empaquetadura y tornillería.
- Suministro e instalación de turbo nuevo para motor DT 408.
- Suministro e instalación de soportes de motor, incluyendo tornillería y ajustes en torno.
- Suministro e instalación de abrazaderas metálicas y tornillos centrales para hojas o muelles.
- Suministro e instalación de cruceta mixta 13 1/0, incluyendo ajuste en el torno y revisión del cardán principal.
- Revisión y reparación del sistema eléctrico general, incluyendo cableado, pachas y escáner.

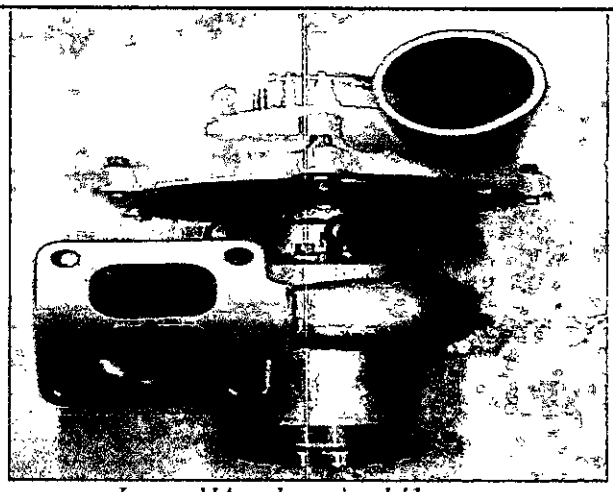


Imagen 11Arreglo camion doble troque

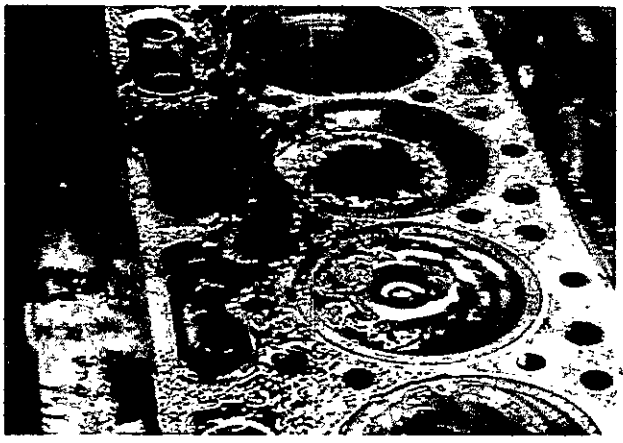


Imagen 12Arreglo camion doble troque

RETROEXCAVADORA DE ORUGA CASE SERIE CX135SR

- Suministro e instalación de mangueras de alta presión SAE R2 1/2" x 1,20 m, con acoples HEM y MCH de 1" y cápsulas.
- Suministro e instalación de mangueras de alta presión SAE R2 1/2" x 2,0 m, con acoples HEM y MCH de 1" y cápsulas.

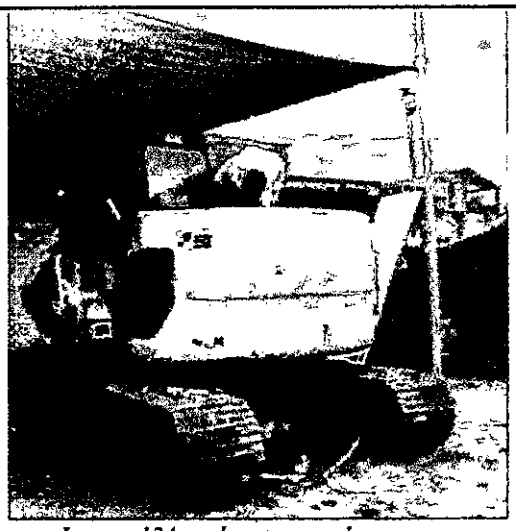


Imagen 13Arreglo retoexavadora orugas

RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 410K

- Suministro e instalación de manguera SAE R2 1/2" x 4,0 m, con acople HEM 13/16 RT y cápsulas REM.
- Reparación de gatos hidráulicos de los estabilizadores o gemelos traseros, incluyendo desmonte, revisión y cambio de empaquetadura.



Imagen 14Reparación gatos hidráulicos

MOTONIVELADORA JOHN DEERE SERIE 670G

- Suministro e instalación de cuchillas moto Sucyrus 13H, incluyendo tornillos 5/8 x 2 1/4, tornillos 5/8 x 2 3/4 y tuercas 5/8 R.O.

- Suministro e instalación de mangueras de alta presión SAE R2 1/2" x 4,2 m, con acoples HEM y MCH de 1" y cápsulas.
- Suministro e instalación de manguera y acople para sistema de refrigeración de 1,5 ml, incluyendo adaptación de codo a 90°.

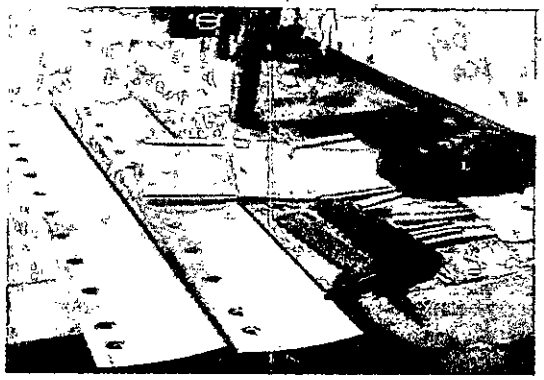


Imagen 15 Suministro e instalación Cuchillas

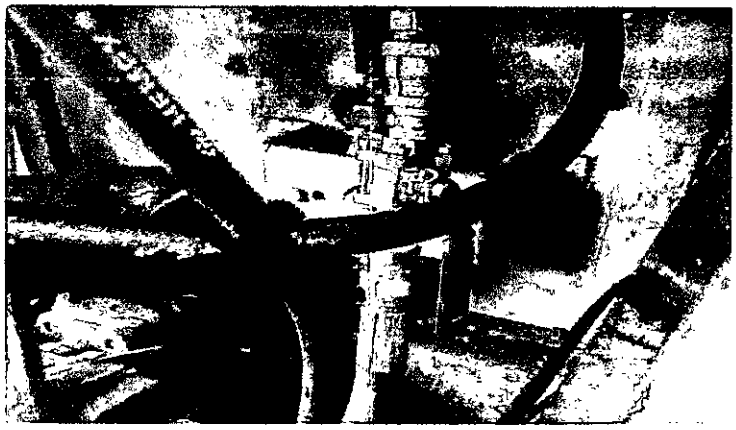


Imagen 16Suministro e instalacion de magueras

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 835de 2025 fecha 17/12/2025)

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico: N/A.

2. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No aplica.

3. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, 29 de diciembre del 2025.

Redactor/transcriptor: Carolina Capote Mosquera.
