ALCALDÍA DE VILLAMARIA

FORMATO 001

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
ACTA PARCIAL Nº	01
FECHA	DICIEMBRE 2025
SECRETARÍA	GOBIERNO
CONTRATO Nº	INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA SMC-076-2025
OBJETO	ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOVIGILIACIA, COMPUESTA POR CAMARAS DE SEGURIDAD Y SUS RESPECTIVOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA FISICA, RED DE COMUNICIACIONES, ENERGIA, CONECTIVIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, PARA LA IMPLEMENTACION DE CINCO (5) PUNTOS DE MONITOREO EN LA ZONA BAJA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAMARIA, CALDAS.
CONTRATISTA	CORPORACION CONSTRUCCION SOCIAL
NIT	901.922.977-5
SUPERVISOR	JHON EDISON GIRALDO GIRALDO
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Desde: EL 11 DE DICIEMBRE DE 2025 Hasta: EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL INVITACION PUBLICA M.C	$ 36.5483050
RUBRO	2.3.2.02.02.009
CDP N°	657 DEL 05/06/2025
RP N°	2916 DEL 11/12/2025
PRÓRROGAS	N /A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	---


VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES


ACTIVIDADES REALIZADAS


Instalación de CCTV Escuela de Partidas.


Se realiza el proceso de instalación de 4 cámaras de la marca Hikvision de 4 Megapíxeles, 2 al interior del colegio y dos en la parte externa. De igual manera se realiza la instalación de un NVR de 8 canales de la misma marca con un disco duro de 2 GB de la marca Western Digital. Las rutas para llevar el cableado UTP CAT6 a las cámaras se realiza utilizando tubería SCH 40, también se utilizan cajas rawelt 4X4 en zonas en las cuales se requiere cambio de sentido de la ruta y para el anclaje de las cámaras:

EQUIPO	MARCA	USUARIO	CONTRASEÑA
Cámaras	HIKVISION	N/A	N/A
NVR	HIKVISION	admin	Villamaria2025
Disco duro	WESTER DIGITAL	N/A	N/A

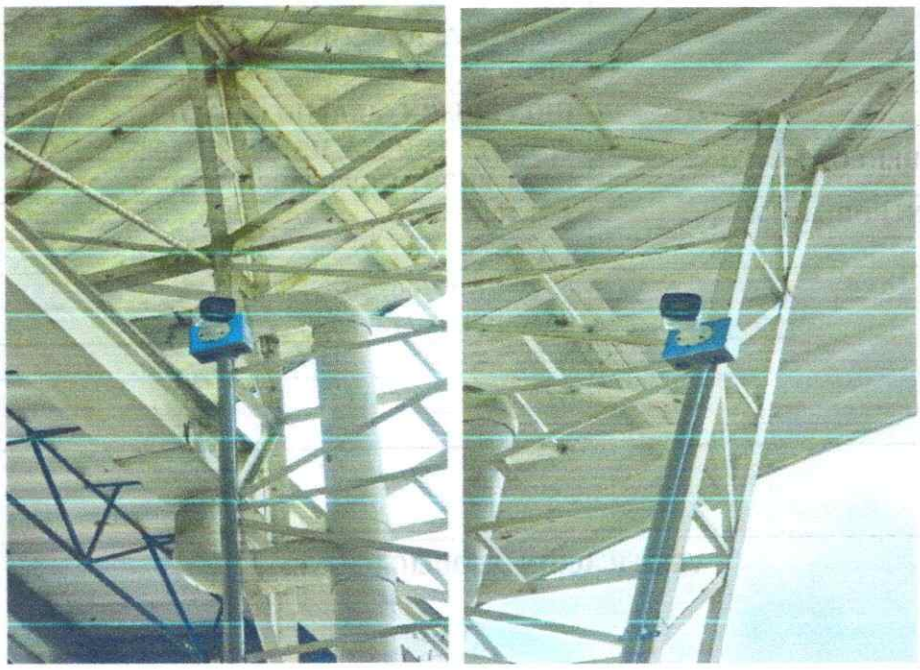

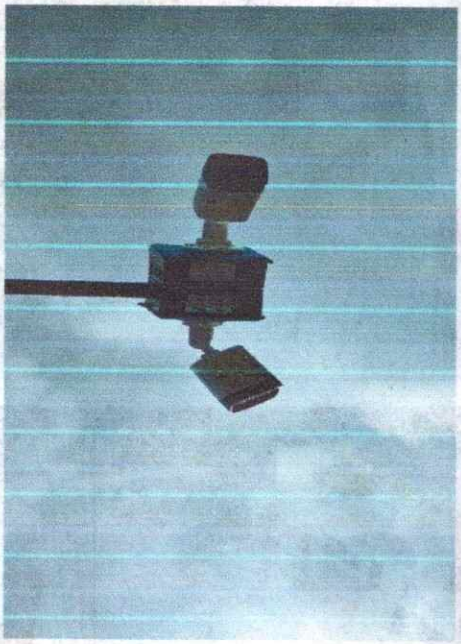

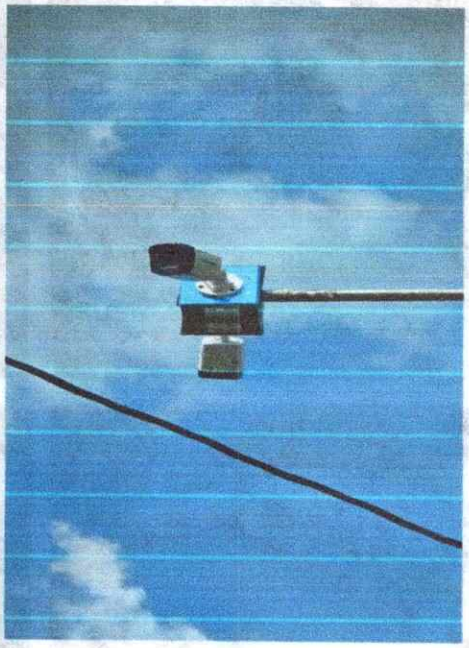

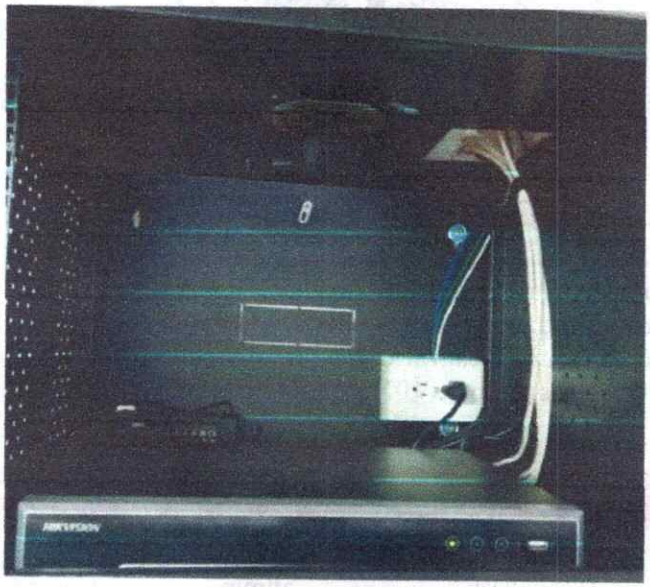





Instalación de CCTV Alto de la Cruz.

En la zona del Alto de la Cruz se realiza la instalación de 2 cámaras, gabinete y grabador junto con disco duro de 2GB. Las rutas al interior de la casa se realizaron utilizando tubería SCH y para llegar a las cámaras se utiliza UTP CAT6 tipo exterior con guaya como mensajero ya que se requirió realizar tramos entre varios postes. Para lograr el anclase de las cámaras en poste se utiliza cinta bandit junto con cajas plásticas 10X10.


EQUIPO	MARCA	USUARIO	CONTRASEÑA
Cámaras	HIKVISION	N/A	N/A
NVR	HIKVISION	admin	Villamaria2025
Disco duro	WESTER DIGITAL	N/A	N/A

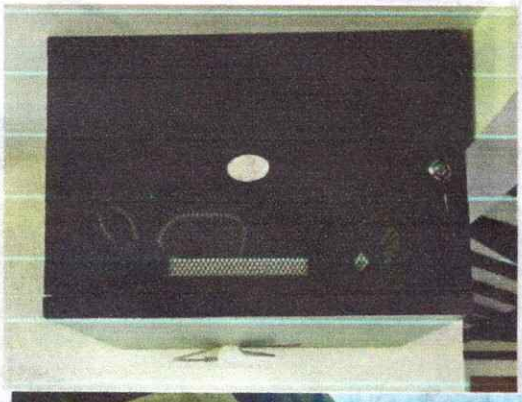


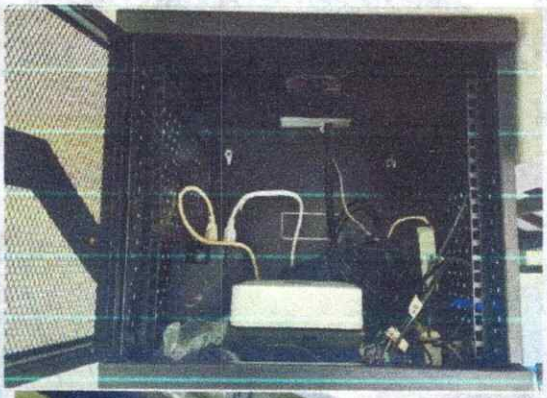




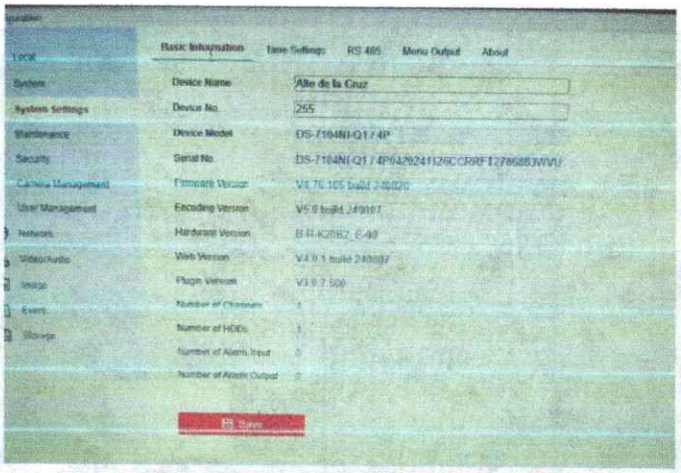


Basic Information
Time Settings
RS-485
Menu Output
About
Device Name
Alle de la Cruz
Device No.
255
Device Model
DS-7104NI-Q1/4P
Serial No.
Firmware Version
Encoding Version
Hardware Version
Web Version
Plugin Version
Number of Channels
Number of HDDs
Number of Alarm Input
Number of Alarm Output
Save

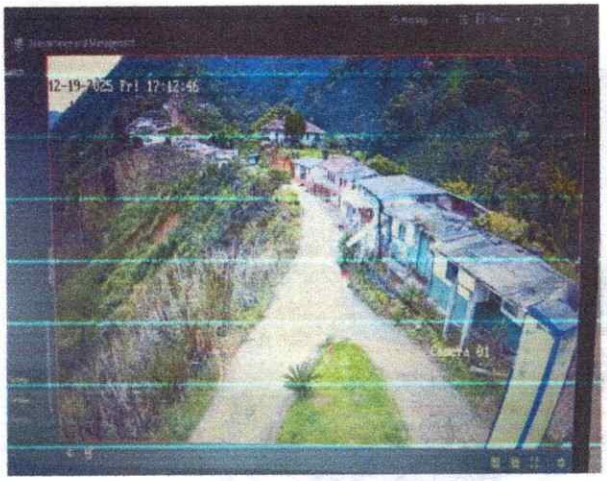


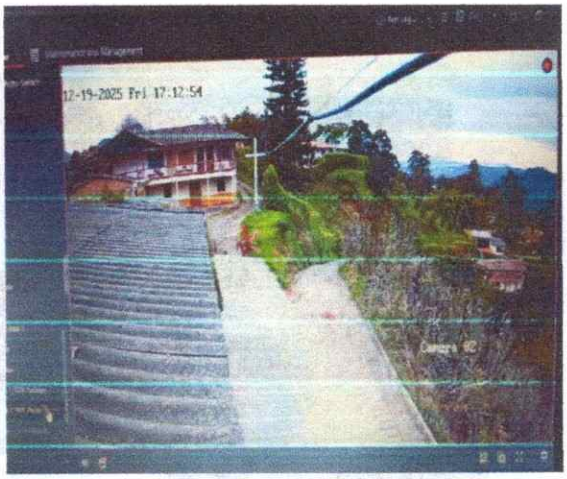



Instalación de CCTV Escuela de San Julián.


En la zona de la Escuela de San Julián, se realiza la instalación de 2 cámaras, gabinete y grabador junto con disco duro de 2GB. La ruta se realiza en tubería IMC y se utiliza cable UTP CAT6 tipo exterior para conectar las cámaras la cuales se ubican en poste. El anclaje de las cámaras se realiza utilizando cinta bandit y cajas platicas de 10X10.

EQUIPO	MARCA	USUARIO	CONTRASEÑA
Cámaras	HIKVISION	N/A	N/A
NVR	HIKVISION	admin	Villamaria2025
Disco duro	WESTER DIGITAL	N/A	N/A

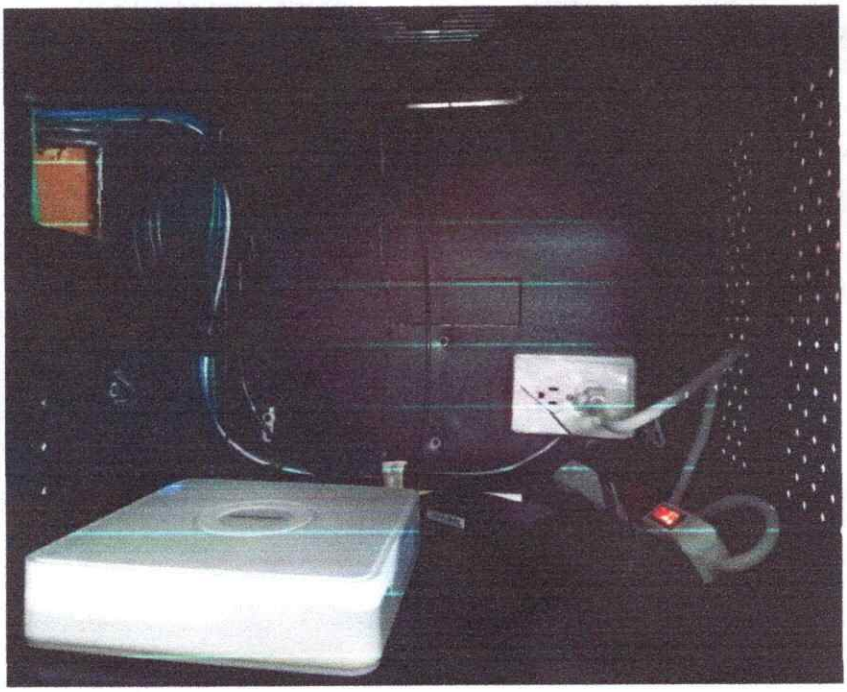


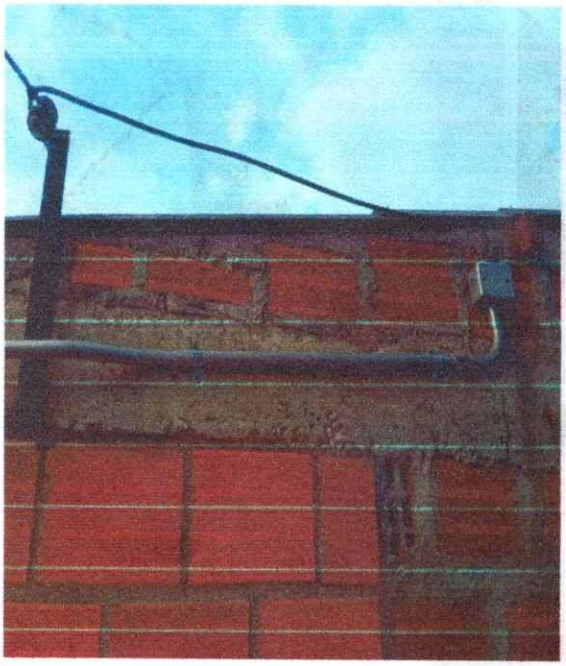


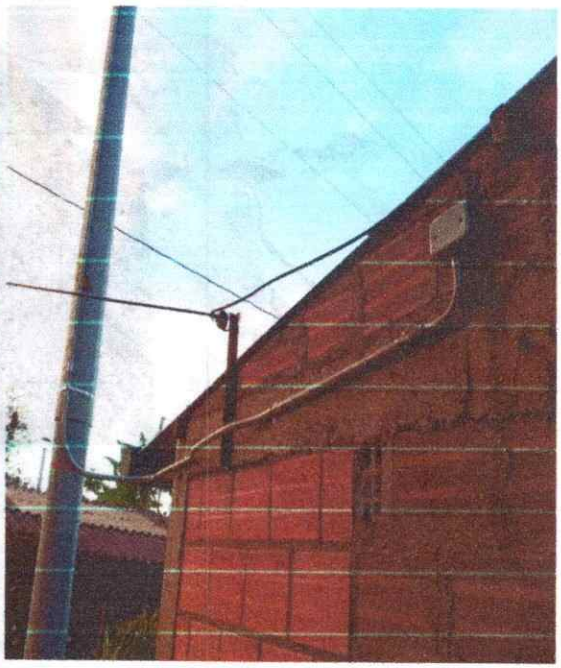


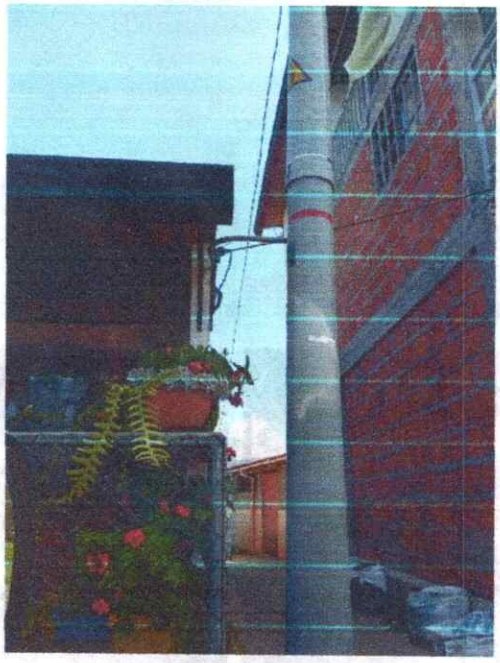



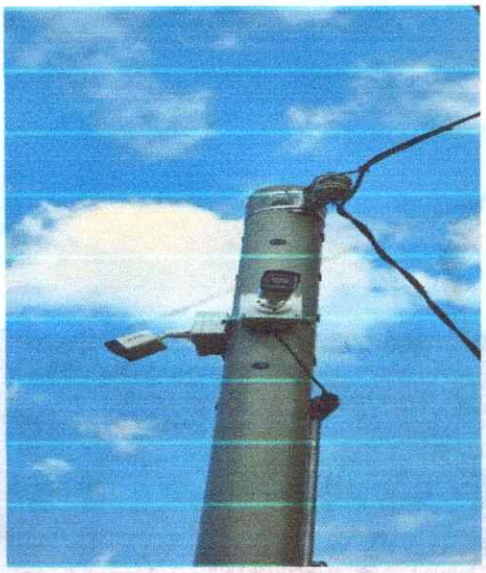

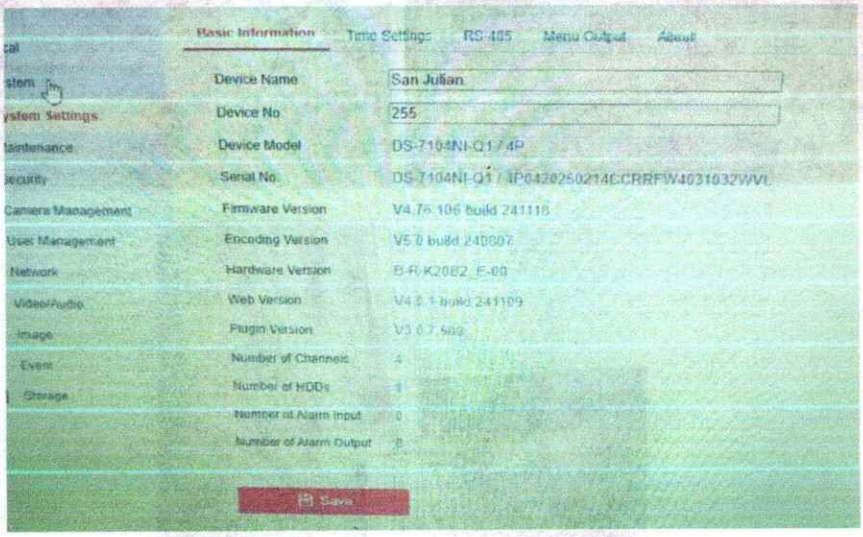
Basic Information
Time Settings
RS-485
Menu Output
About
Device Name
San Juan
Device No.
255
Device Model
DS-7104NI-Q1/4P
Serial No.
Firmware Version
Encoding Version
Hardware Version
Web Version
Plugin Version
Number of Channels
Number of HDDs
Number of Alarm Input
Number of Alarm Output
Save

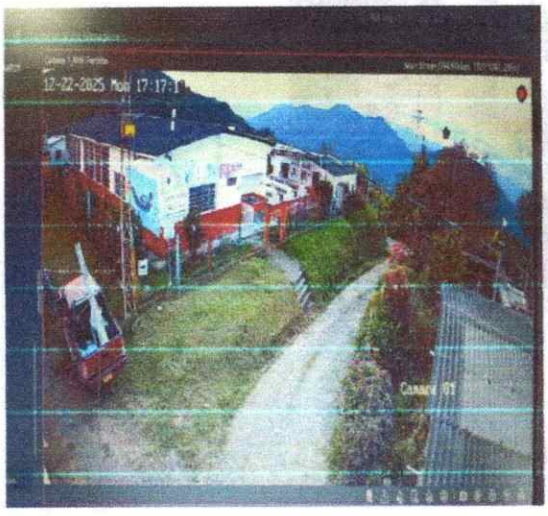




Instalación de CCTV Cancha San Julián

Para el área de la cancha de San Julián, se realiza la instalación de 2 cámaras, gabinete y grabador junto con disco duro de 2GB. La ruta se realiza en tubería SCH 40 y se utiliza cable UTP CAT6 tipo exterior para conectar las cámaras la cuales se ubican en un Tubo IMC de 2" incado, enterrando 1.5m. Para anclar las cámaras al tubo, se utiliza cinta bandit y cajas plásticas de 10X10.

EQUIPO	MARCA	USUARIO	CONTRASEÑA
Cámaras	HIKVISION	N/A	N/A
NVR	HIKVISION	admin	Villamaria2025
Disco duro	WESTER DIGITAL	N/A	N/A



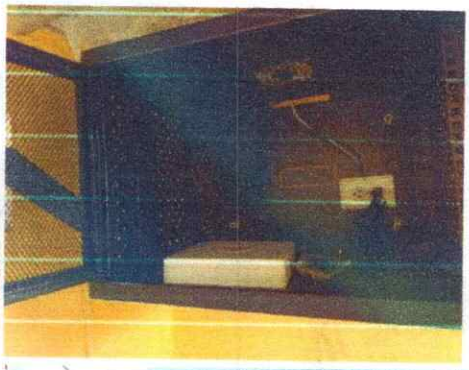







Basic Information
Time Settings
RS-485
Menu Output
About
Device Name
Cancha San Julian
Device No.
255
Device Model
DS-7104NI-Q1/ 4P
Serial No.
Firmware Version
Encoding Version
Hardware Version
Web Version
Plugin Version
Number of Channels
Number of HDD
Number of Alarm Input
Number of Alarm Output



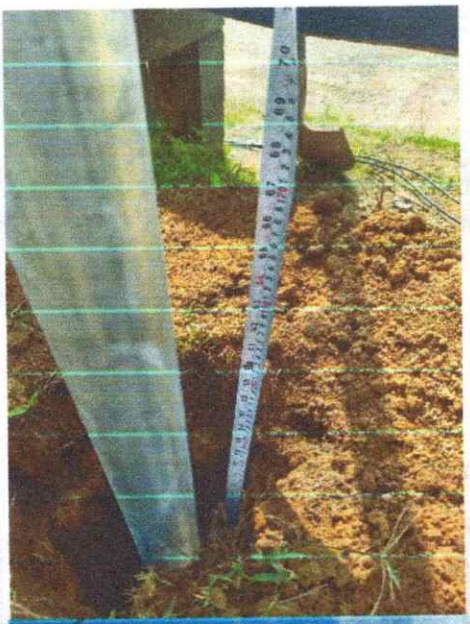







Instalación de CCTV Divisas de San Julián.

Para el área el sector divisas de San Julián, se realiza la instalación de 2 cámaras, gabinete y grabador junto con disco duro de 2GB. La ruta se realiza en tubería SCH 40 y se utiliza cable UTP CAT6 tipo exterior para conectar las cámaras la cuales se ubican en un Tubo IMC de 2" incado, enterrando 1.5m. Para anclar las cámaras al tubo, se utiliza cinta bandit y cajas plásticas de 10X10.


EQUIPO	MARCA	USUARIO	CONTRASEÑA
Cámaras	HIKVISION	N/A	N/A
NVR	HIKVISION	admin	Villamaria2025
Disco duro	WESTER DIGITAL	N/A	N/A



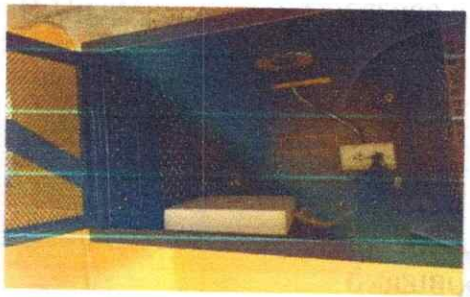

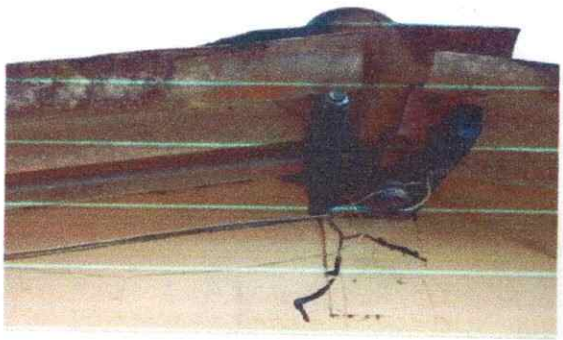



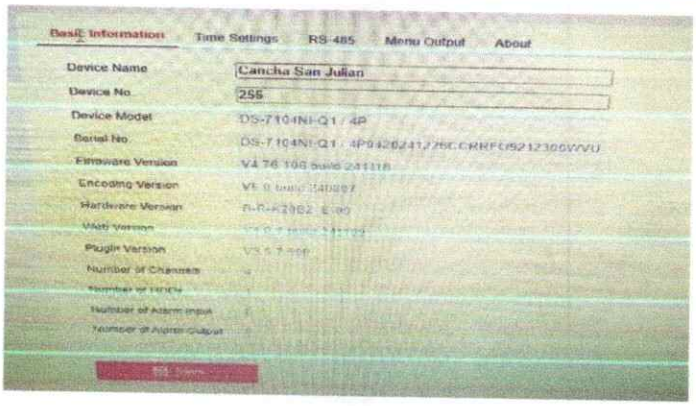

ALCALDÍA DE VILLAMARIA **FORMATO 001**

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS

RESUMEN DE PAGOS	
VALOR TOTAL INVITACION PUBLICA	**$ 36.548.050**
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA	$ 36.548.050
VALOR EJECUTADO	**$ 36.548.050**
VALOR POR EJECUTAR	**$ 0**

OBSERVACIONES: Hace parte integral de la presente acta de supervisión los soportes allegados por el contratista estos son:

- Informe de actividades,
- Certificación pago parafiscales, suscrito por contador publico titulado
- El contratista solicita se le consignen los honorarios en la cuenta de AHORROS Personeria Juridica número **860-0000320-1** del Banco BANCOLOMBIA.

JHON EDISON GIRALDO GIRALDO
SECRETARIO DE GOBIERNO
SUPERVISOR
