

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**COMPLEJO DEPORTIVO de GUANABANAL CCE-EICP-FM-116**	**69.5 días**	**vie 2/01/26**	**mar 31/03/26**	
2						
3		**4. ANDENES**	**35 días**	**lun 16/02/26**	**mar 31/03/26**	
4		EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	5 días	lun 16/02/26	vie 20/02/26	
5		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	3 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	6FC-2 días
6		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	4FC-2 días
7		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	4FC-4 días
8		RELLENO CON MATERIAL ROCA MUERTA (E= SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	4 días	sáb 21/02/26	jue 26/02/26	5FC-2 días
9		RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE (E=SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	5 días	sáb 7/03/26	vie 13/03/26	13FC-6 días
10		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	16 días	sáb 21/02/26	vie 13/03/26	8CC
11		ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATONAL INSTALADAS EN TRABA TIPO PANDERETE DIM 0.20X0.10X0.06 + MORTERO DE PEGA DE 3 CM	9 días	mié 18/03/26	sáb 28/03/26	9FC+3 días
12		CINTA DE CONFINAMIENTO	9 días	vie 20/03/26	mar 31/03/26	9FC+5 días
13		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80	15 días	mar 24/02/26	sáb 14/03/26	8FC-2 días
14		**6. SENDERO EN CONCRETO**	**11 días**	**mar 10/03/26**	**lun 23/03/26**	
15		RELLENO CON MATERIAL ROCA MUERTA (E= SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	6 días	mar 10/03/26	mar 17/03/26	
16		CONCRETO F´C=21MPA PARA PLACAS DE CONTRAPISO E=1	5 días	mar 17/03/26	lun 23/03/26	15
17		MALLA ELECTROSOLDADA	5 días	mar 17/03/26	lun 23/03/26	15

13 16 19 22

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	7 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26	15CC
19		**7. PISO EN CAUCHO**	**21 días**	**mar 3/03/26**	**sáb 28/03/26**	
20		EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	5 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26	
21		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM	4 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	20CC
22		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	4 días	mar 3/03/26	vie 6/03/26	20CC
23		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	3 días	vie 6/03/26	mar 10/03/26	22FC-1 día
24		RELLENO CON MATERIAL ROCA MUERTA (E= SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	4 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	23FC-1 día
25		RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE (E=SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	3 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	24
26		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	7 días	lun 9/03/26	mar 17/03/26	23FC-1 día
27		CONCRETO F´C=21MPA PARA PLACAS DE CONTRAPISO E=1	6 días	mié 18/03/26	mié 25/03/26	25
28		MALLA ELECTROSOLDADA	5 días	mié 18/03/26	mar 24/03/26	25
29		PISO EN CAUCHO	4 días	mar 24/03/26	sáb 28/03/26	27FC-1 día
30		**9. CERRAMIENTO PISCINA**	**43 días**	**mié 28/01/26**	**mar 24/03/26**	
31		EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	12 días	mar 3/02/26	mar 17/02/26	
32		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM	11 días	mar 3/02/26	lun 16/02/26	31CC
33		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	11 días	mar 3/02/26	lun 16/02/26	31CC
34		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	5 días	mié 4/02/26	mar 10/02/26	31FC-11 días
35		RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE (E=SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	13 días	mié 28/01/26	vie 13/02/26	34FC-10 días

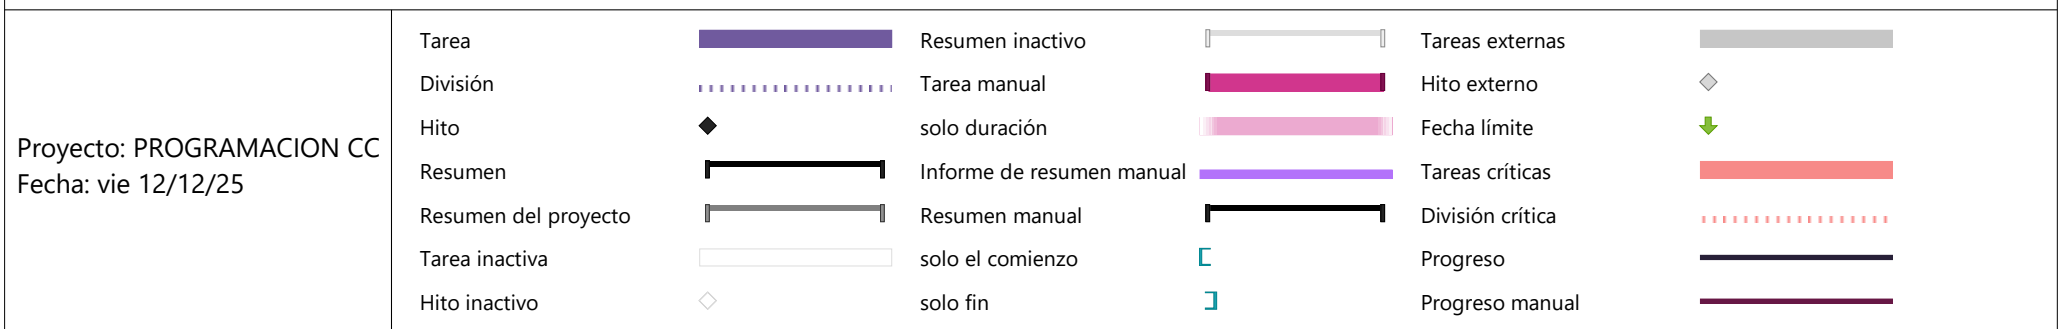


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
36		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	13 días	mié 28/01/26	vie 13/02/26	34FC-10 días
37		SOLADO DE LIMPIEZA E=0,07 CM	11 días	lun 9/02/26	lun 23/02/26	34CC+4 días
38		MEJORAMIENTO EN CICLOPEO ESPESOR E=5CM 3000PSI	2 días	sáb 21/02/26	mar 24/02/26	37FC-1 día
39		PEDESTAL DE CONCRETO ARMADO 21 MPa (3000 PSI)	21 días	mar 10/02/26	lun 9/03/26	37FC-10 días
40		CONCRETO F´C=21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) NO INCLUYE REFUERZO	21 días	mar 10/02/26	lun 9/03/26	39CC
41		ACERO DE REFUERZO FY=420MPA	21 días	mar 10/02/26	lun 9/03/26	39CC
42		ESTRUCTURA METALICA	30 días	vie 13/02/26	mar 24/03/26	39CC+3 días
43		MALLA PERIMETRAL	9 días	mar 10/03/26	vie 20/03/26	40FC+1 día
44		**10. PORTERIA**	**33 días**	**lun 2/02/26**	**sáb 14/03/26**	
45		EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	5 días	lun 2/02/26	vie 6/02/26	
46		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM	5 días	lun 2/02/26	vie 6/02/26	45CC
47		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	5 días	lun 2/02/26	vie 6/02/26	45CC
48		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	3 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26	46FC-2 días
49		RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE (E=SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	4 días	sáb 7/02/26	jue 12/02/26	48FC-1 día
50		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	4 días	sáb 7/02/26	jue 12/02/26	48FC-1 día
51		ACERO DE REFUERZO FY=420MPA	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	49
52		CONCRETO F´C=21 MPA PARA PEDESTALES DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) NO INCLUYE REFUERZO	4 días	jue 12/02/26	mar 17/02/26	49

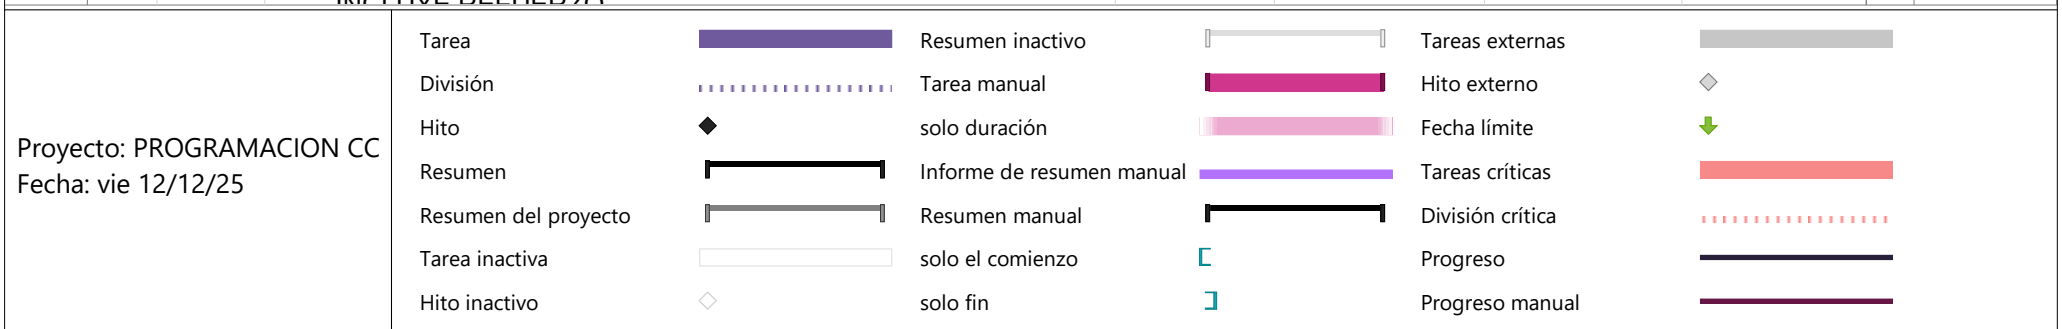

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
53		ESTRUCTURA METALICA	20 días	mié 18/02/26	sáb 14/03/26	52
54		CONCRETO F´C=21MPA PARA PLACAS DE CONTRAPISO E=1	12 días	mar 24/02/26	mié 11/03/26	52FC+5 días
55		**11. MOBILIARIO**	**13 días**	**mié 11/03/26**	**vie 27/03/26**	
56		BANCAS DE CONCRETO PREFABRICADAS (CUBOS)	4 días	mié 11/03/26	lun 16/03/26	25FC-5 días
57		MESA DE AJEDREZ PREFABRICADA	4 días	mar 17/03/26	vie 20/03/26	56
58		MOGADOR DE LOCALIZACIÓN (2,4mX1,7m)	5 días	sáb 21/03/26	vie 27/03/26	57
59		MOGADOR INSTRUCCIONES (1,8mX1,0m)	5 días	sáb 21/03/26	vie 27/03/26	57
60		**14. GRADERIA (TALUD)**	**18 días**	**vie 27/02/26**	**lun 23/03/26**	
61		MALLA ELECTROSOLDADA	12 días	vie 27/02/26	sáb 14/03/26	54FC-9 días
62		CONCRETO F´C=21MPA PARA PLACAS DE GRADERIA	18 días	vie 27/02/26	lun 23/03/26	54FC-9 días
63		**15. CASETA PISCINA**	**36 días**	**mar 3/02/26**	**jue 19/03/26**	
64		ESTRUCTURA METALICA	21 días	mar 3/02/26	sáb 28/02/26	
65		LOSA DE ENTREPISO E=10CM F´C=21 MPA	10 días	sáb 7/03/26	jue 19/03/26	64FC+5 días
66		**16. PISCINA**	**61 días**	**mar 6/01/26**	**mar 24/03/26**	
67		ENCHAPE DE FONDO DE PISCINA 25X25	12 días	mar 6/01/26	mar 20/01/26	
68		ENCHAPE DE MUROS DE PISCINA 25X25	11 días	mié 14/01/26	mié 28/01/26	67FC-5 días
69		ROMPE OLAS	6 días	lun 26/01/26	lun 2/02/26	68FC-2 días
70		CONCRETO F´C=21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN CUARTO TECNICO (INCLUYE FORMALETA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) NO INCLUYE REFUERZO	7 días	mar 20/01/26	mié 28/01/26	68FC-7 días



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
71		CONCRETO F´C=21 MPA PARA PEDESTALES DE CIMENTA-CIÓN CUARTO TECNICO (INCLUYE FORMALETA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) NO INCLUYE REFUERZO	7 días	mar 20/01/26	mié 28/01/26	68FC-7 días
72		ACERO DE REFUERZO FY=420MPA, CUARTO TECNICO	7 días	mar 20/01/26	mié 28/01/26	70CC
73		CUARTO TECNICO LOSA DE ENTREPISO E=10CM F´C=21 MP	5 días	mié 28/01/26	mar 3/02/26	71
74		LOSA CONCRETO MACIZA E=12cm FÇ=21 MPA, CUBIERTA CUARTO TECNICO	15 días	jue 5/03/26	mar 24/03/26	76
75		MURO LADRILLO BLOQUE ESTRUCTURAL CUARTO TECNICO (PEGA 1:3, 1CM REVITADO POR AMBAS CARAS)	10 días	mar 3/02/26	sáb 14/02/26	73FC-1 día
76		VIGA CONCRETO AEREA 4000 PSI CUARTO TECNICO PISCIN	15 días	vie 13/02/26	mié 4/03/26	75FC-1 día
77		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO EN 2 NAVES ABATIBLE.	5 días	lun 16/02/26	vie 20/02/26	75
78		CARRO ASPIRADOR 16 RUEDAS	3 días	mar 13/01/26	jue 15/01/26	
79		SISTEMA DE LIBERACIION DE VACIO ELECTRICO	4 días	mar 13/01/26	vie 16/01/26	78CC
80		SISTEMA DE DESINFECCION, CLORADOR EN LINEA	4 días	mar 13/01/26	vie 16/01/26	78CC
81		KIT INICIAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA	4 días	mar 13/01/26	vie 16/01/26	78CC
82		VALVULA MARIPOSA 3" PVC CON BRIDAS	4 días	mar 13/01/26	vie 16/01/26	78CC
83		VALVULA CHEQUE 3"	4 días	mar 13/01/26	vie 16/01/26	78CC
84		**17. PISO EXTERIOR DE PISCINA**	**15 días**	**vie 6/02/26**	**mié 25/02/26**	
85		CONCRETO F´C=21MPA PARA PISO EXTERIOR DE PISCINA	15 días	vie 6/02/26	mié 25/02/26	73FC+2 días
86		MALLA ELECTROSOLDADA	15 días	vie 6/02/26	mié 25/02/26	73FC+2 días
87		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	15 días	vie 6/02/26	mié 25/02/26	85CC

13 16 19 22


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
88		**18. ZONA VERDE**	**25 días**	**jue 26/02/26**	**lun 30/03/26**	
89		PRADO TRENZA	25 días	jue 26/02/26	lun 30/03/26	16FC-20 días
90		**19. VARIOS**	**69 días**	**vie 2/01/26**	**mar 31/03/26**	
91		DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	69 días	vie 2/01/26	mar 31/03/26	
92		**20.1 TUBERIA DOMICILIARIA ALIGERDADA**	**23 días**	**lun 2/02/26**	**lun 2/03/26**	
93		EXCAVACION EN CONGLOMERADO MANUAL	8 días	lun 2/02/26	mié 11/02/26	
94		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 10 A 20 Km. CON ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSI- CIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	7 días	mar 10/02/26	mié 18/02/26	93FC-1 día
95		COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARRE	6 días	jue 12/02/26	jue 19/02/26	93FC+1 día
96		TUBERIA DE ALIGERADA DE 12"	8 días	vie 20/02/26	lun 2/03/26	95
97		GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 O SIMILAR TRASLAPO 30CM	4 días	vie 20/02/26	mié 25/02/26	95
98		RELLENO DE ROCA MUERTA COMPACTADO CON RANA	8 días	mié 18/02/26	vie 27/02/26	94FC-1 día
99		**20.2 REDES SANITARIA BAÑOS**	**15 días**	**mar 10/02/26**	**sáb 28/02/26**	
100		EXCAVACION TIERRA A MANO	5 días	mar 10/02/26	lun 16/02/26	93FC-1 día
101		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO -EN BANCO- DE 10 A 20 Km. CON ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSI- CIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).	4 días	mar 10/02/26	sáb 14/02/26	100FC-5 días
102		COLCHON ARENA GRAVA	3 días	vie 13/02/26	mar 17/02/26	101FC-1 día
103		TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26	102FC-1 día

13 16 19 22


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
104		RELLENO DE ROCA MUERTA COMPACTADO CON RANA	4 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	101FC-1 día
105		SOLADO	4 días	jue 19/02/26	mar 24/02/26	104
106		CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]	4 días	jue 19/02/26	mar 24/02/26	104
107		TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71 - 80X80	4 días	jue 19/02/26	mar 24/02/26	104
108		TUBERIA PVC 4 SANITARIA (LOSA)	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
109		TUBERIA PVC 3 SANITARIA (LOSA)	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
110		YEE SANITARIA 2	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
111		TEE SANITARIA 4	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
112		TUBERIA PVC 2 SANITARIA (LOSA)	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
113		PUNTO SANITARIO PVC 2 [SIFON]	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
114		PUNTO SANITARIO PVC 2" [L]"	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
115		PUNTO SANITARIO PVC 4"	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
116		UNION SANITARIA PVC 2"	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
117		TUBERI PVC 2 VENTILACION	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
118		CODO SANITARIO PVC 45 CC-2	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
119		VALVULA VENTILACION 2" INCLUYE TAPA DE REGISTRO	4 días	mar 24/02/26	sáb 28/02/26	105
120		**20.3 REDES HIDRAULICAS BAÑOS**	**9 días**	**mar 17/02/26**	**vie 27/02/26**	
121		TUBERIA PVC ,1 1/2"	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	119FC-10 días
122		UNION PRESION PVC ,1 1/2"	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	119FC-10 días
123		TEE PRESION PVC ,1 1/2"	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	119FC-10 días
124		TEE PRESION PVC , REDUCIDA DE 2 A 1 1/2"	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	119FC-10 días
125		REDUCCION PVC 1 1/2" A 1/2"	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	119FC-10 días

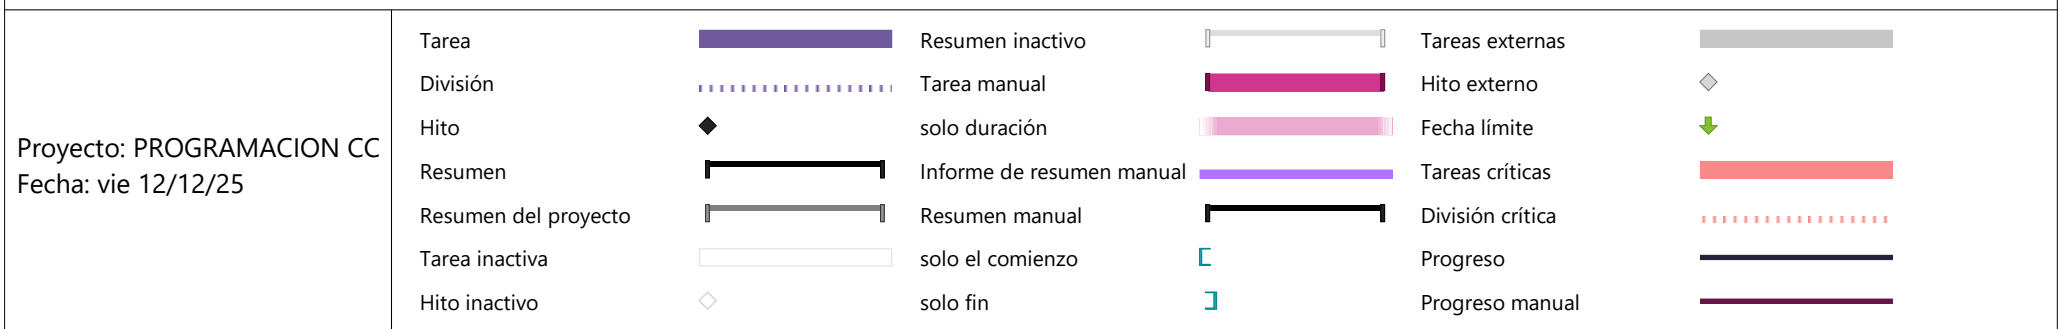


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
126		CODO 90 PRESION PVC ,1 1/2"	3 días	mar 17/02/26	jue 19/02/26	119FC-10 días
127		TUBERIA PVC ,3/4"	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	126FC-1 día
128		UNION PRESION PVC ,3/4"	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	126FC-1 día
129		TEE PRESION PVC ,1/2"	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	126FC-1 día
130		TEE PRESION PVC ,3/4"	3 días	jue 19/02/26	lun 23/02/26	126FC-1 día
131		CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	3 días	sáb 21/02/26	mié 25/02/26	129FC-1 día
132		CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	3 días	sáb 21/02/26	mié 25/02/26	130FC-1 día
133		CODO 45 PRESION PVC ,3/4"	3 días	sáb 21/02/26	mié 25/02/26	130FC-1 día
134		PUNTO AGUA FRIA ,1/2"	3 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	131FC-1 día
135		PUNTO AGUA FRIA ,1 1/2" FLUXOMETRO	3 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	131FC-1 día
136		VALVULA DE CIERRE METALICO 1 1/2"	2 días	mié 25/02/26	vie 27/02/26	134FC-2 días
137		VALVULA DE CIERRE METALICO 3/4"	3 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26	133FC-2 días
138		TAPA DE REGISTRO EN PVC PARA VALVULA 1 1/2"	3 días	mar 24/02/26	vie 27/02/26	134FC-3 días
139		**20.4 SISTEMA FILTRACION PISCINA SEMIOLIMPICA**	**12 días**	**mar 13/01/26**	**mar 27/01/26**	
140		MOTOBOMBA EQ1500 PENTAIR CON TRAMPA O SIMILAR	10 días	mar 13/01/26	sáb 24/01/26	
141		TABLERO PLASTICO IP65ARRANCADOR E/D 15 HP CERTIF	6 días	lun 19/01/26	lun 26/01/26	140FC-5 días
142		FILTRO DE ARENA K2300 COMERCIAL O SIMILAR	6 días	mar 20/01/26	mar 27/01/26	140FC-4 días
143		ARENA SILICE (40 K) K2300 O SIMILAR	6 días	mar 20/01/26	mar 27/01/26	140FC-4 días
144		MEDIDORES DE NPSH	5 días	mar 20/01/26	lun 26/01/26	140FC-4 días
145		**20.7 TUBERIA Y ACCESORIOS**	**30 días**	**mar 13/01/26**	**jue 19/02/26**	
146		SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS HIDRAULICOS	30 días	mar 13/01/26	jue 19/02/26	140CC




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
147		**SENDERO EN GRAVILLA**	**22 días**	**vie 2/01/26**	**jue 29/01/26**	
148		EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	4 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26	
149		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	3 días	mié 7/01/26	sáb 10/01/26	148
150		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM	5 días	vie 2/01/26	jue 8/01/26	148CC
151		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	5 días	vie 2/01/26	jue 8/01/26	148CC
152		RELLENO CON MATERIAL ROCA MUERTA (E= SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	3 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26	149
153		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	3 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26	149
154		GRAVILLA PARA SENDERO	6 días	jue 22/01/26	jue 29/01/26	155FC-2 días
155		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80	8 días	jue 15/01/26	sáb 24/01/26	152
156		**MALLA DE PROTECCION**	**55 días**	**mar 20/01/26**	**lun 30/03/26**	
157		EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	6 días	mar 20/01/26	mar 27/01/26	
158		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM	5 días	mié 21/01/26	mar 27/01/26	157CC+1 día
159		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	5 días	mié 21/01/26	mar 27/01/26	158CC
160		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	3 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	157
161		RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE (E=SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	10 días	vie 30/01/26	jue 12/02/26	160
162		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	10 días	vie 30/01/26	jue 12/02/26	160
163		SOLADO DE LIMPIEZA	8 días	jue 12/02/26	lun 23/02/26	161

13 16 19 22

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
164		CONCRETO F´C=21 MPA PARA ZAPATAS (INCLUYE FORMALETA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) NO INCLUYE REFUERZO	8 días	vie 20/02/26	lun 2/03/26	163FC-2 días
165		PEDESTAL DE CONCRETO ARMADO 21 MPa (3000 PSI)	8 días	vie 20/02/26	lun 2/03/26	163FC-2 días
166		CONCRETO F´C=21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN (INCLUYE FORMALETA Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) NO INCLUYE REFUERZO	10 días	jue 26/02/26	mié 11/03/26	165FC-3 días
167		ACERO DE REFUERZO FY=420MPA DE MALLA DE PROTECCI	15 días	vie 20/02/26	mié 11/03/26	164CC
168		ESTRUCTURA METALICA	10 días	mié 11/03/26	mar 24/03/26	166
169		MALLA PERIMETRAL	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	168FC-3 días
170		**SALON COMUNAL**	**66 días**	**mar 6/01/26**	**lun 30/03/26**	
171		ADOQUIN ROJO EN CONCRETO MACIZO DE TRAFICO PEATC	15 días	mar 10/03/26	sáb 28/03/26	172FC-4 días
172		BORDILLO FUNDIDO EN SITIO A80 SALON COMUNAL	10 días	mar 3/03/26	sáb 14/03/26	13FC-10 días
173		TRAZADO Y NIVELACIÓN	7 días	mar 6/01/26	mié 14/01/26	
174		EXCAVACIÓN MECANIZADA SIN RETIRO	7 días	lun 12/01/26	mar 20/01/26	173FC-2 días
175		EVACUACIÓN DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO	8 días	mar 20/01/26	jue 29/01/26	174FC-1 día
176		CARGUE MECÁNICO DE MATERIAL	7 días	lun 12/01/26	mar 20/01/26	174CC
177		PREPARACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	176FC-4 días
178		RELLENO ESTRUCTURAL ROCOSO	5 días	mar 20/01/26	lun 26/01/26	177FC-2 días
179		ACARREO DE MATERIAL PÉTREO	6 días	mar 20/01/26	mar 27/01/26	177FC-2 días
180		ZAPATA ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 psi	8 días	sáb 24/01/26	mar 3/02/26	178FC-1 día
181		PILAR EN CONCRETO ESTRUCTURAL 4000 psi	5 días	lun 2/02/26	vie 6/02/26	180FC-2 días
182		VIGA DE AMARRE INFERIOR 4000 psi	7 días	sáb 7/02/26	lun 16/02/26	181



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
183		LOSA DE PISO REFORZADA 4000 psi	6 días	lun 16/02/26	lun 23/02/26	182FC-1 día
184		VIGA ESTRUCTURAL ELEVADA 4000 psi	14 días	vie 20/02/26	mar 10/03/26	182FC+3 días
185		LOSA COLABORANTE	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	184
186		LÁMINA METÁLICA COLABORANTE	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	184
187		MALLA DE REFUERZO	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	184
188		VARILLA CORRUGADA DE ALTA RESISTENCIA	5 días	mar 10/03/26	lun 16/03/26	184
189		PERFIL ESTRUCTURAL A36	8 días	mar 10/03/26	jue 19/03/26	184
190		PERNOS ESTRUCTURALES 7/8"	7 días	mar 10/03/26	mié 18/03/26	184
191		TEJA TERMOACÚSTICA	8 días	mar 10/03/26	jue 19/03/26	184
192		PULIDO MECÁNICO ESMALTADO	3 días	vie 13/03/26	mar 17/03/26	186FC-2 días
193		MAMPOSTERÍA CERÁMICA ESTRUCTURAL	7 días	vie 13/03/26	lun 23/03/26	186FC-2 días
194		ACABADO TEXTURIZADO	5 días	vie 13/03/26	jue 19/03/26	186FC-2 días
195		VIGA DE CONFINAMIENTO	6 días	vie 13/03/26	vie 20/03/26	186FC-2 días
196		MURO EN DRYWALL	8 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26	186FC-2 días
197		MURO RH DOBLE PLACA	10 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	186FC-2 días
198		AISLANTE TÉRMICO LIVIANO	5 días	vie 13/03/26	jue 19/03/26	186FC-2 días
199		REVESTIMIENTO VINÍLICO	6 días	vie 13/03/26	vie 20/03/26	186FC-2 días
200		BALDOSA CERÁMICA DE TRÁFICO	12 días	vie 13/03/26	sáb 28/03/26	186FC-2 días
201		PISO PORCELÁNICO PULIDO	10 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	186FC-2 días
202		JARDINERA PREFABRICADA EN CONCRETO	10 días	vie 13/03/26	jue 26/03/26	186FC-2 días
203		CAPA DE GRAVA FILTRANTE	8 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26	186FC-2 días
204		TIERRA FÉRTIL	8 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26	186FC-2 días

13 16 19 22

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
205		MONSTERA ORNAMENTAL	8 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26	186FC-2 días
206		ENLUCIDO EN MEDIA CAÑA	8 días	vie 13/03/26	mar 24/03/26	186FC-2 días
207		IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO FIBRATADO	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	206FC-3 días
208		CORTINA METÁLICA INTERIOR	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26	206FC-3 días
209		CORTINA METÁLICA EXTERIOR	6 días	vie 20/03/26	vie 27/03/26	206FC-3 días
210		PUERTA MODULAR AJUSTABLE	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	206FC-3 días
211		SISTEMA CORREDIZO DE PUERTA	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	206FC-3 días
212		PUERTA TUBULAR METÁLICA	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	206FC-3 días
213		LAVAMANOS SUSPENDIDO	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	206FC-3 días
214		INODORO PARA FLUXÓMETRO	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	206FC-3 días
215		INODORO PARA FLUXÓMETRO SIN ACCESORIO	8 días	vie 20/03/26	lun 30/03/26	206FC-3 días
216		**ELECTRICO**	**18 días**	**lun 9/03/26**	**mar 31/03/26**	
217		TABLERO ELÉCTRICO BIFÁSICO 12 CIRCUITOS	18 días	lun 9/03/26	mar 31/03/26	
218		SALIDA PARA TOMA 120V EMT	17 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	217CC
219		PUNTO ELÉCTRICO S1 EN EMT	17 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	217CC
220		PUNTO DE ILUMINACIÓN EMT	17 días	lun 9/03/26	lun 30/03/26	217CC
221		**HIDRÁULICO**	**40.5 días**	**lun 9/02/26**	**mar 31/03/26**	
222		**PRELIMINARES**	**4 días**	**jue 12/02/26**	**mar 17/02/26**	
223		TRAZADO Y REPLANTEO HIDRÁULICO	4 días	jue 12/02/26	mar 17/02/26	
224		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**21 días**	**mar 17/02/26**	**lun 16/03/26**	
225		EXCAVACIÓN MANUAL	5 días	mar 17/02/26	lun 23/02/26	223
226		TRASLADO DE SOBRANTES CON MAQUINARIA	4 días	lun 23/02/26	jue 26/02/26	225FC-1 día

13 16 19 22


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
227		RELLENO CON GRAVA TRITURADA COMPACTADA	6 días	vie 27/02/26	vie 6/03/26	226
228		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO	7 días	vie 6/03/26	lun 16/03/26	227
229		**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**	**19 días**	**vie 6/03/26**	**mar 31/03/26**	
230		TUBERÍA PVC 1.5" PRESIÓN	12 días	vie 6/03/26	sáb 21/03/26	227
231		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21	12 días	vie 6/03/26	sáb 21/03/26	227
232		TUBERÍA PVC 0.75"	12 días	vie 6/03/26	sáb 21/03/26	227
233		TUBERÍA PVC 0.5"	12 días	vie 6/03/26	sáb 21/03/26	227
234		CODO PVC 90° 1/2"	12 días	vie 6/03/26	sáb 21/03/26	227
235		CODO PVC 90° 3/4"	12 días	vie 6/03/26	sáb 21/03/26	227
236		VÁLVULA METÁLICA DE CIERRE 1.5"	6 días	lun 23/03/26	lun 30/03/26	235
237		VÁLVULA METÁLICA DE CIERRE 1"	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	235
238		VÁLVULA METÁLICA DE CIERRE 1/2"	5 días	lun 23/03/26	vie 27/03/26	235
239		TEE PVC PRESIÓN 1.5"	4 días	lun 23/03/26	jue 26/03/26	235
240		TEE PVC PRESIÓN 1"	4 días	lun 23/03/26	jue 26/03/26	235
241		TEE PVC PRESIÓN 1/2"	4 días	lun 23/03/26	jue 26/03/26	235
242		TEE PVC PRESIÓN 3/4"	4 días	lun 23/03/26	jue 26/03/26	235
243		PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA 1/2"	3 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	242
244		PUNTO HIDRÁULICO PARA FLUXÓMETRO 1.5"	3 días	vie 27/03/26	mar 31/03/26	242
245		**SANITARIO**	**3 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
246		**PRELIMINARES**	**3 días**	**lun 23/02/26**	**mié 25/02/26**	
247		REPLANTEO SANITARIO	3 días	lun 23/02/26	mié 25/02/26	
248		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**5 días**	**jue 26/02/26**	**mié 4/03/26**	

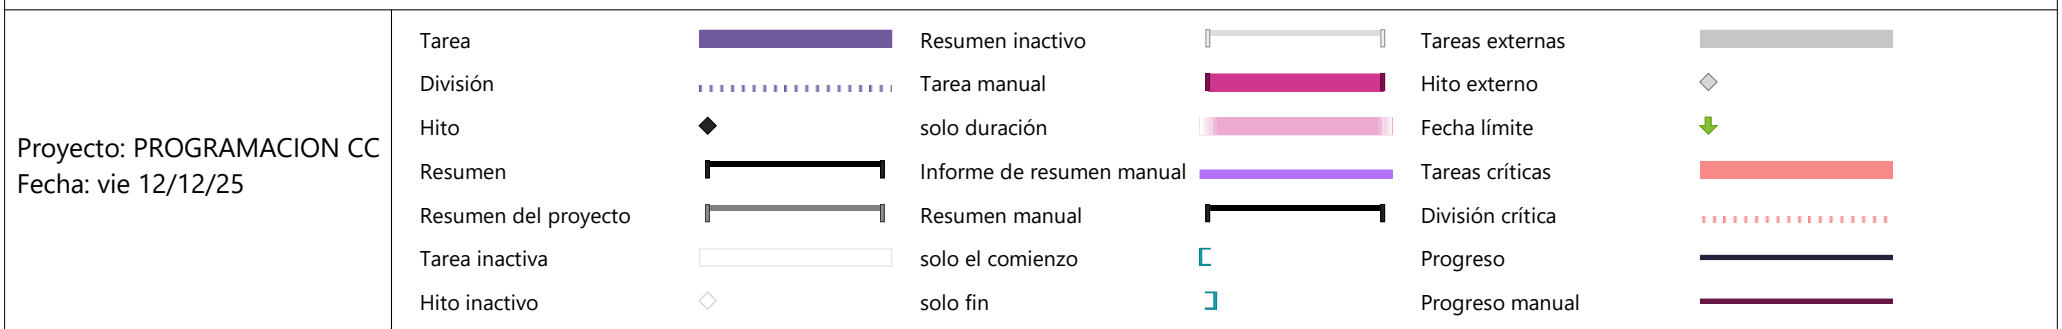


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
249		EXCAVACIÓN MANUAL	5 días	jue 26/02/26	mié 4/03/26	247
250		EVACUACIÓN DE SOBRANTES CON MAQUINARIA	5 días	jue 26/02/26	mié 4/03/26	247
251		RELLENO CON GRAVA TRITURADA COMPACTADA	5 días	jue 26/02/26	mié 4/03/26	247
252		RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	5 días	jue 26/02/26	mié 4/03/26	247
253		**TUBERÍAS, ACCESORIOS, CAJAS**	**20 días**	**mié 4/03/26**	**lun 30/03/26**	
254		TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
255		TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
256		TUBERÍA PVC NOVAFORT 6"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
257		PUNTO SANITARIO 2"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
258		PUNTO SANITARIO 4"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
259		CODO SANITARIO PVC 45° 4"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
260		SIFÓN SANITARIO 4"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
261		YEE SANITARIA SIMPLE 4"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
262		CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
263		YEE SANITARIA 4"X2"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
264		YEE SANITARIA 6"X4"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
265		CODO SANITARIO 45° PVC 2"	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
266		CAJA DE INSPECCIÓN 40X40 CM	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
267		CAJA DE INSPECCIÓN 100X100 CM	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
268		CAJA DE INSPECCIÓN 110X110 CM	20 días	mié 4/03/26	lun 30/03/26	252
269		**PLUVIAL**	**4 días**	**lun 9/02/26**	**jue 12/02/26**	
270		**PRELIMINARES**	**4 días**	**lun 9/02/26**	**jue 12/02/26**	



Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
271		REPLANTEO PLUVIAL	4 días	lun 9/02/26	jue 12/02/26	
272		**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**5 días**	**jue 12/02/26**	**mié 18/02/26**	
273		EXCAVACIÓN MANUAL	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	271FC-1 día
274		TRANSPORTE DE SOBRANTES	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	271FC-1 día
275		RELLENO CON GRAVA TRITURADA	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	271FC-1 día
276		RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	271FC-1 día
277		**TUBERÍAS Y ACCESORIOS**	**31 días**	**mar 17/02/26**	**vie 27/03/26**	
278		DESCARGA PLUVIAL PVC 4"	21 días	mar 17/02/26	lun 16/03/26	276FC-1 día
279		ABRAZADERA PVC 4"	21 días	mié 18/02/26	mar 17/03/26	278CC+1 día
280		CODO PVC 90° 4"	21 días	mié 18/02/26	mar 17/03/26	278CC+1 día
281		CAJA DE INSPECCIÓN 80X80 CM INTERIOR	21 días	mié 18/02/26	mar 17/03/26	278CC+1 día
282		CAJA DE INSPECCIÓN 100X100 CM	21 días	mié 18/02/26	mar 17/03/26	278CC+1 día
283		TRAGANTE TIPO TCI 4"	21 días	mié 18/02/26	mar 17/03/26	278CC+1 día
284		TUBERÍA PVC NOVAFORT 8"	30 días	mié 18/02/26	vie 27/03/26	278CC+1 día
285		TUBERÍA PVC NOVAFORT 4"	25 días	mié 18/02/26	sáb 21/03/26	278CC+1 día
286		SIFÓN SANITARIO 6"	25 días	mié 18/02/26	sáb 21/03/26	278CC+1 día
287		**5. PARQUEADEROS**	**35 días**	**lun 16/02/26**	**mar 31/03/26**	
288		EXCAVACIÓN A MÁQUINA SIN RETIRO	7 días	lun 16/02/26	mar 24/02/26	
289		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE	5 días	mar 24/02/26	lun 2/03/26	288
290		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KLOM	8 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26	288CC+1 día
291		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	8 días	mar 17/02/26	jue 26/02/26	288CC+1 día




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
292		RELLENO CON MATERIAL ROCA MUERTA (E= SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	5 días	mar 3/03/26	lun 9/03/26	289
293		RELLENO CON MATERIAL TIPO SUB BASE (E=SEGUN DISEÑO) NO INCLUYE TRANSPORTE	5 días	lun 9/03/26	sáb 14/03/26	292
294		TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	10 días	mar 3/03/26	sáb 14/03/26	289
295		RIEGO DE IMPRIMACION	3 días	lun 16/03/26	mié 18/03/26	294
296		MEZCLA ASFALTICA MDC10 E=0,05	6 días	jue 19/03/26	jue 26/03/26	295
297		TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA, INCLUYE PAGO DE PEAJE (0 A 34KM)	6 días	jue 19/03/26	jue 26/03/26	295
298		PINTURA SOBRE CONCRETO	3 días	jue 26/03/26	lun 30/03/26	296
299		LINEA DE DEMARCACION A=12CM	4 días	jue 26/03/26	mar 31/03/26	296
300		**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**69 días**	**vie 2/01/26**	**mar 31/03/26**	
301		PMA	69 días	vie 2/01/26	mar 31/03/26	
302		**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**69 días**	**vie 2/01/26**	**mar 31/03/26**	
303		PMT	69 días	vie 2/01/26	mar 31/03/26	

13 16 19 22


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

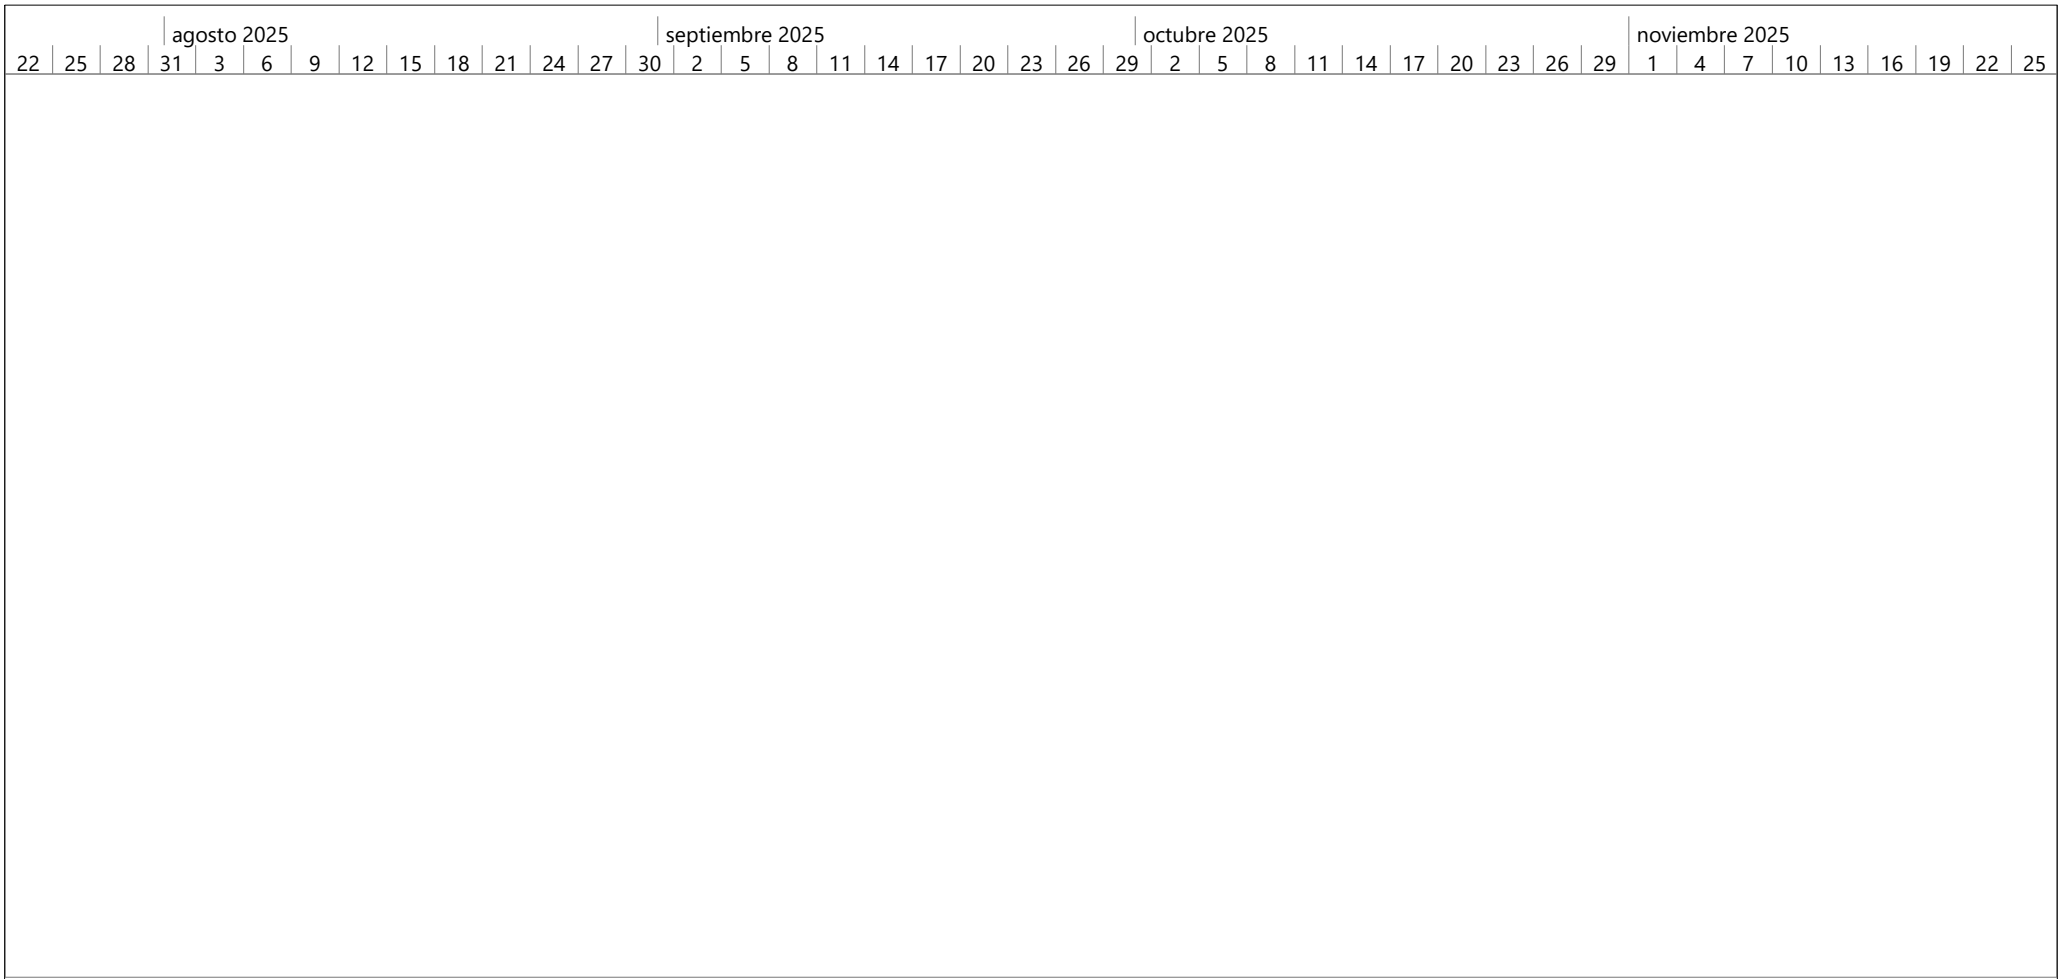


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

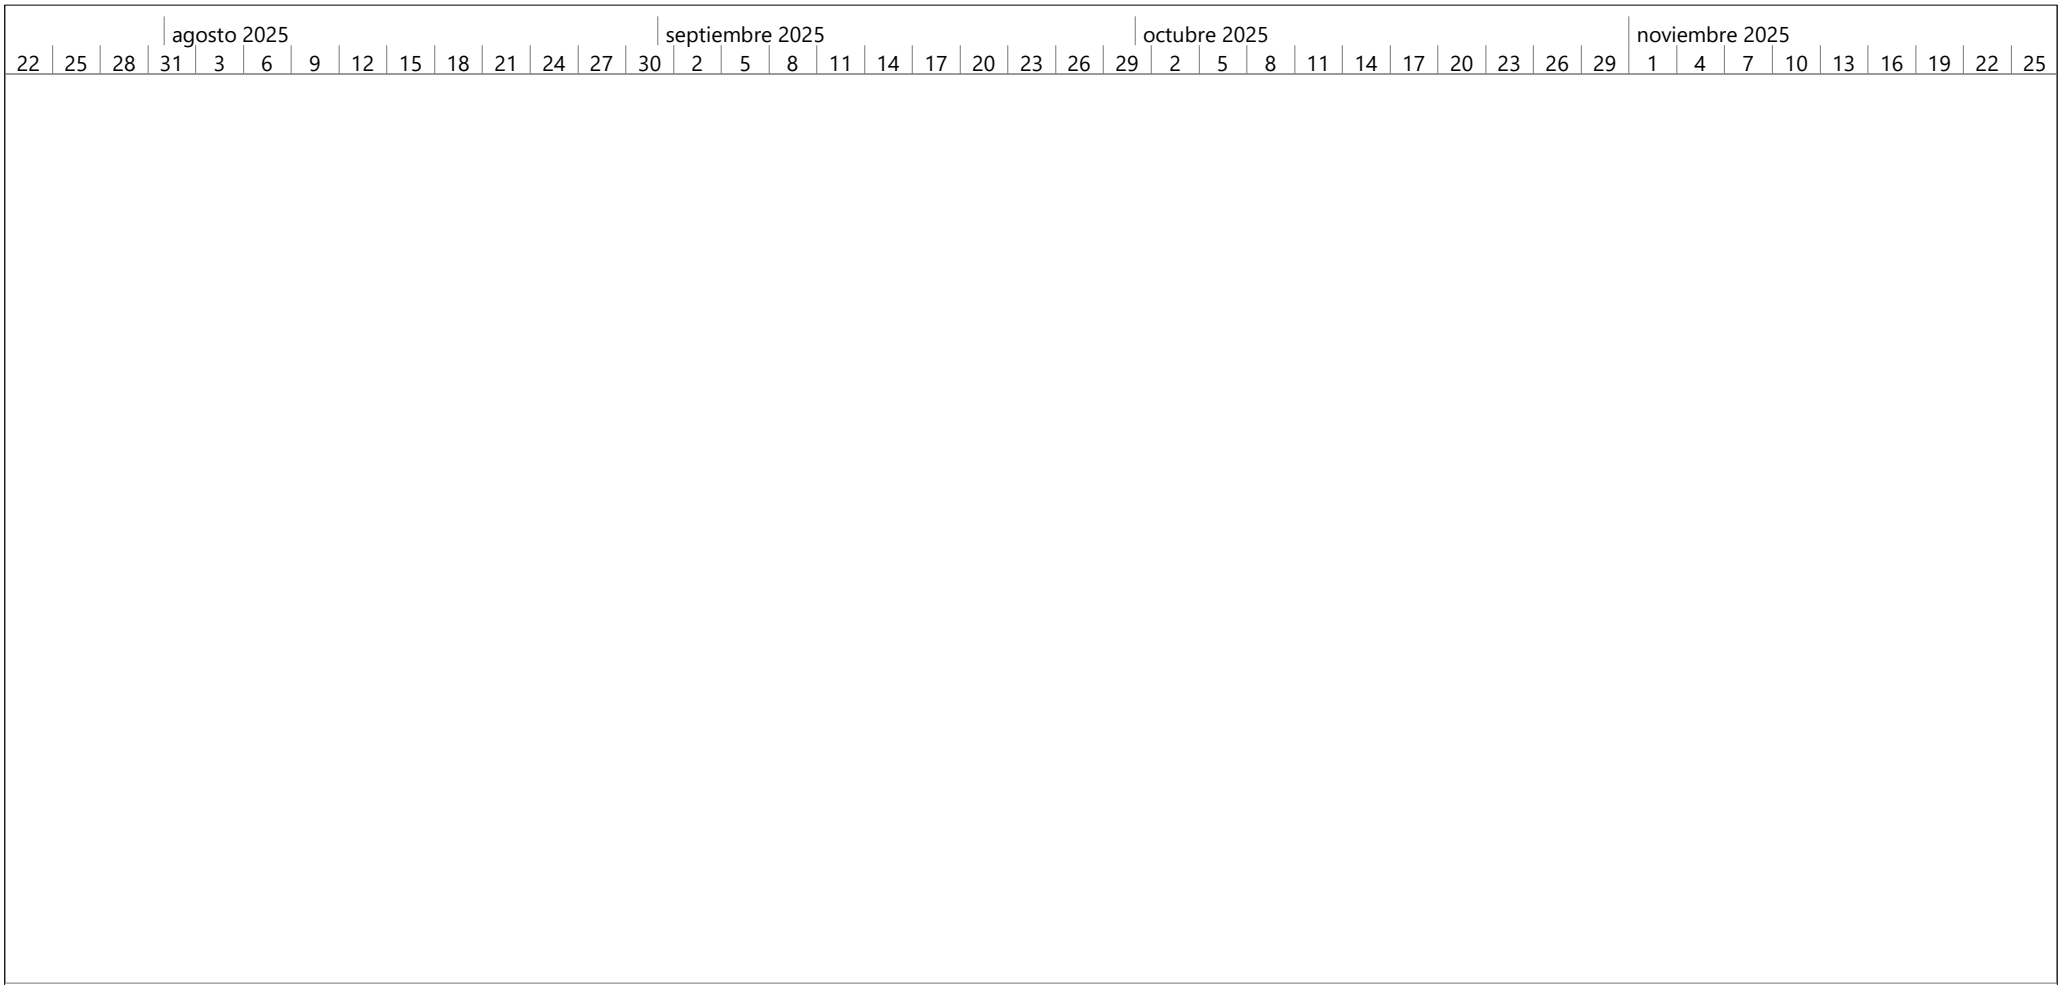


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

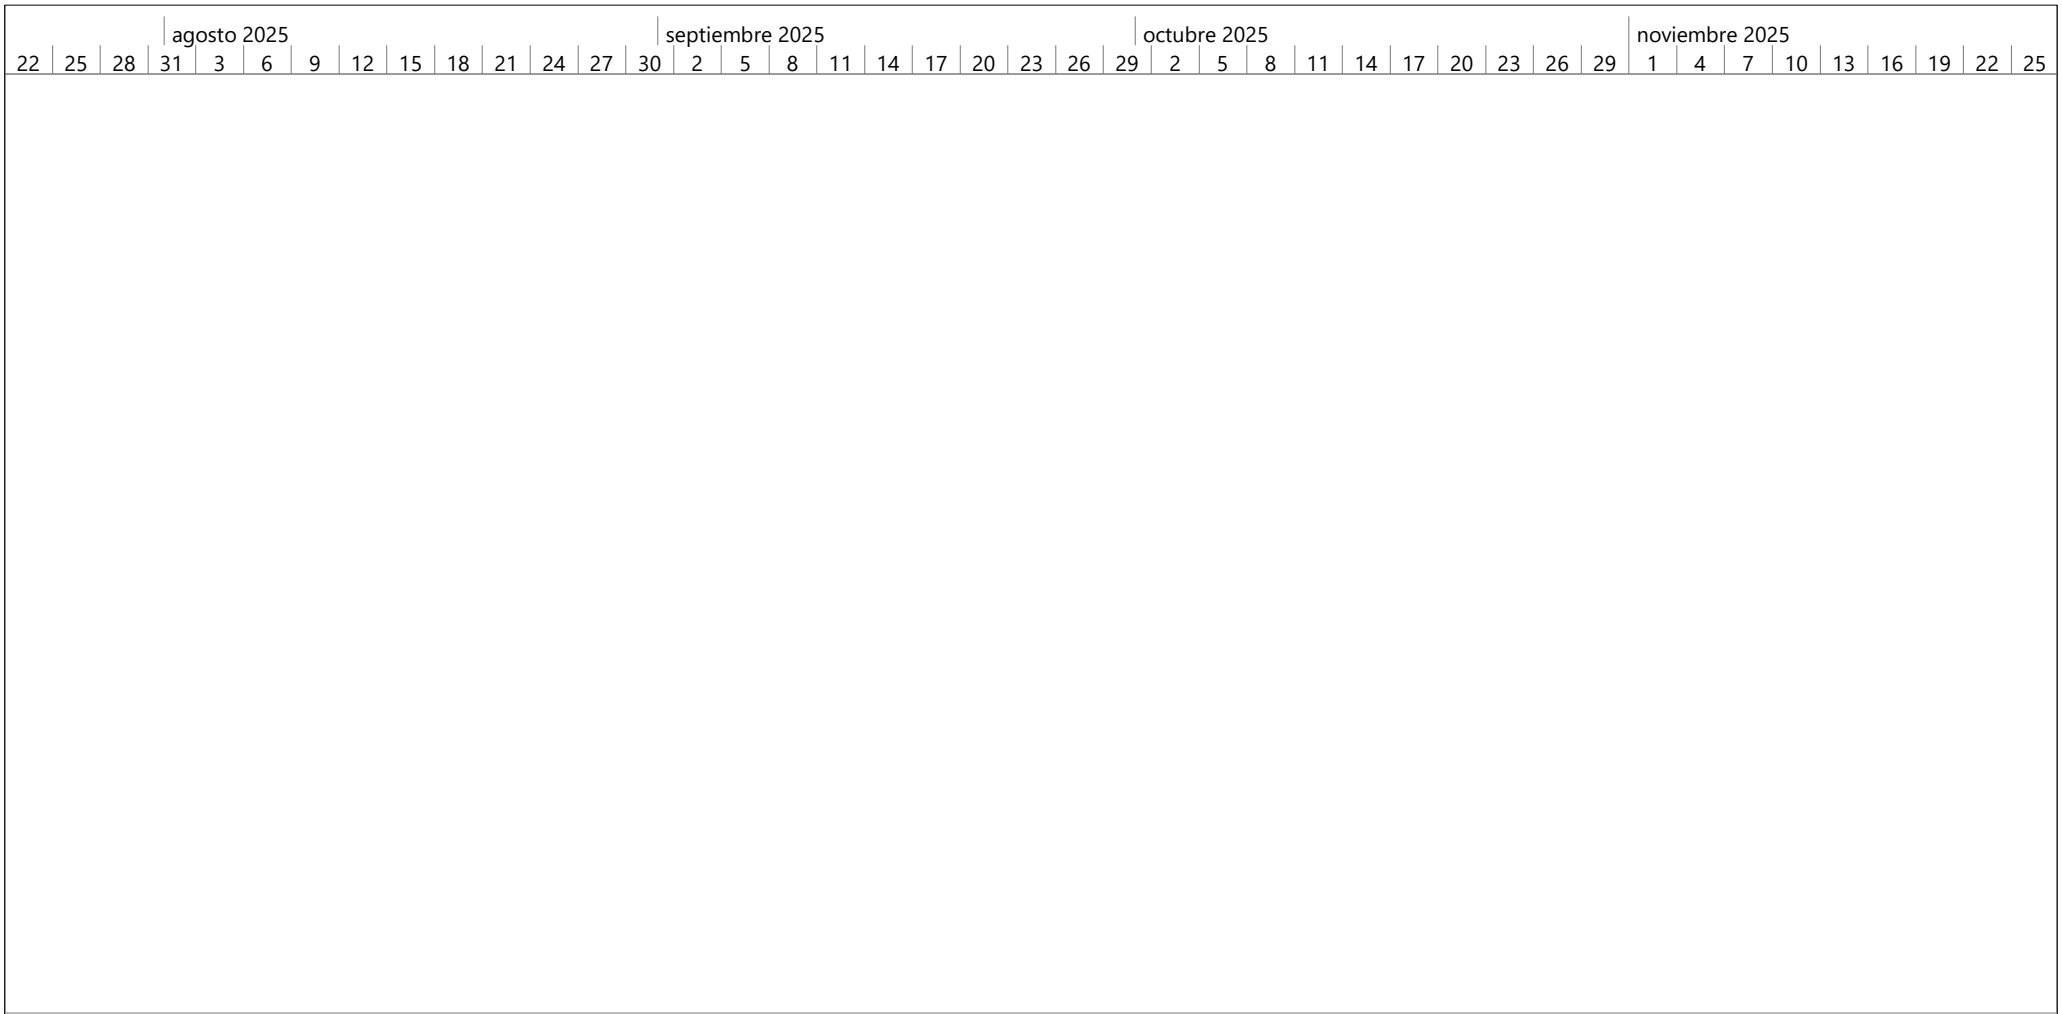


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

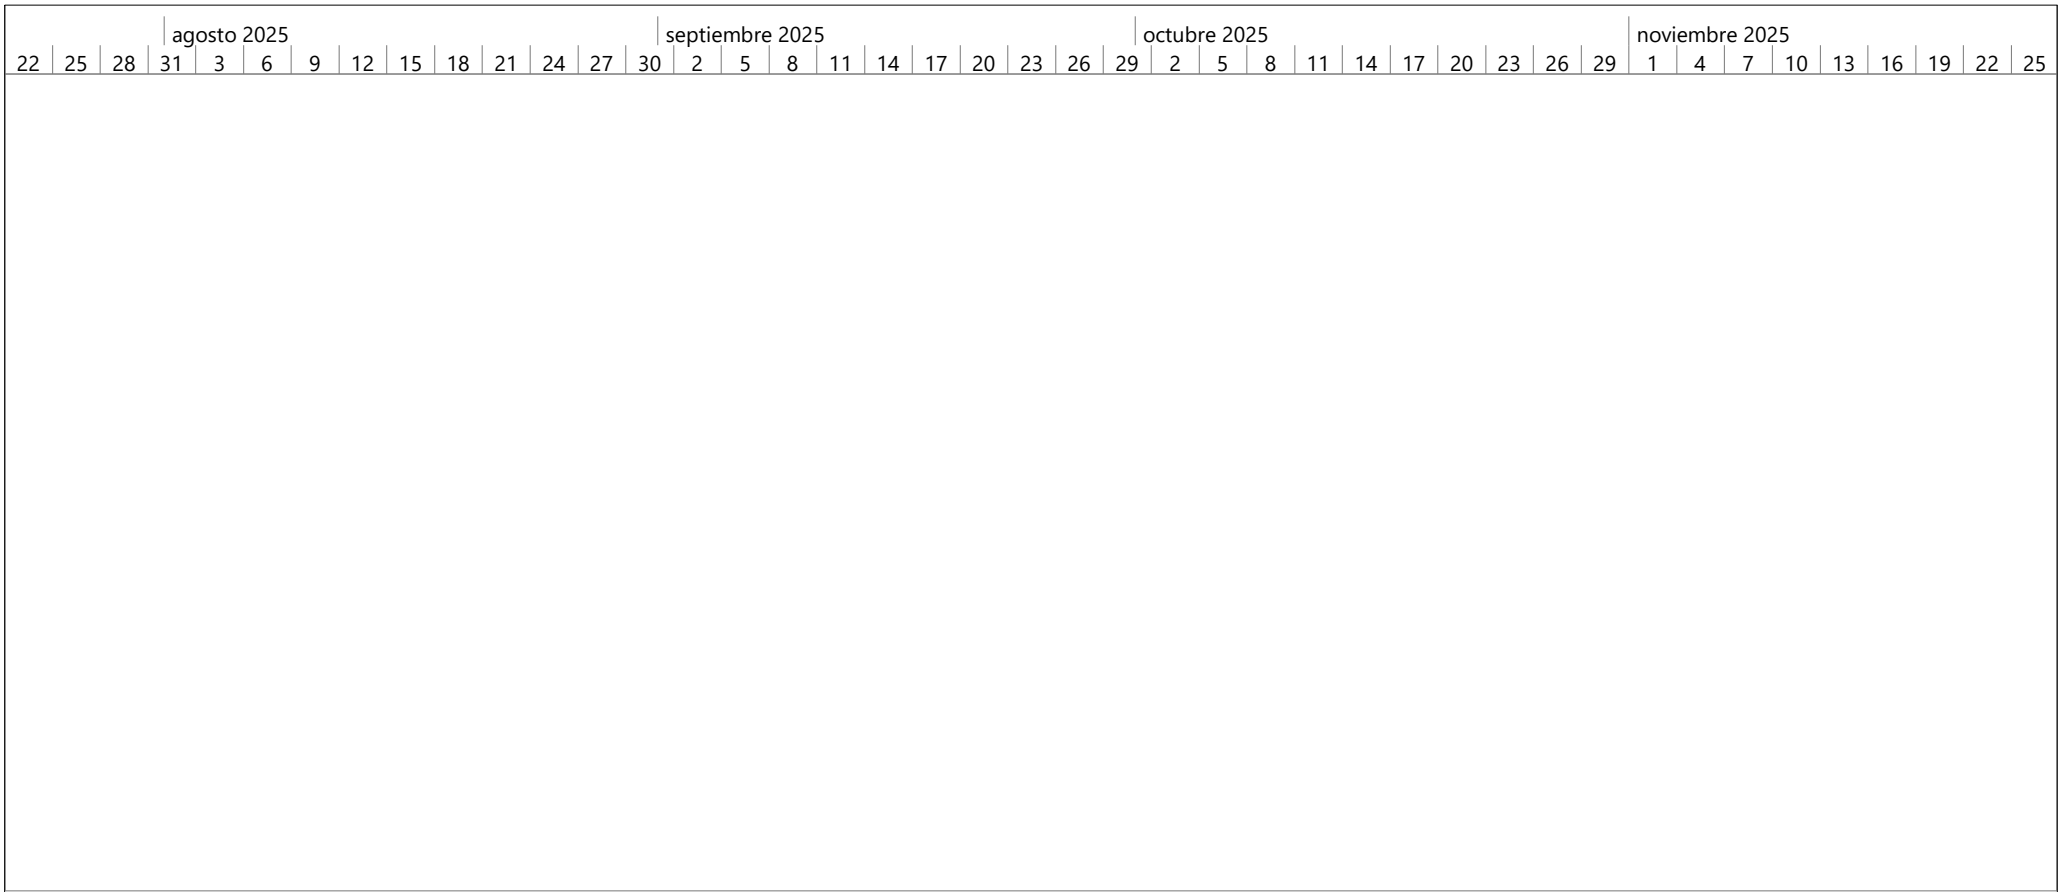


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

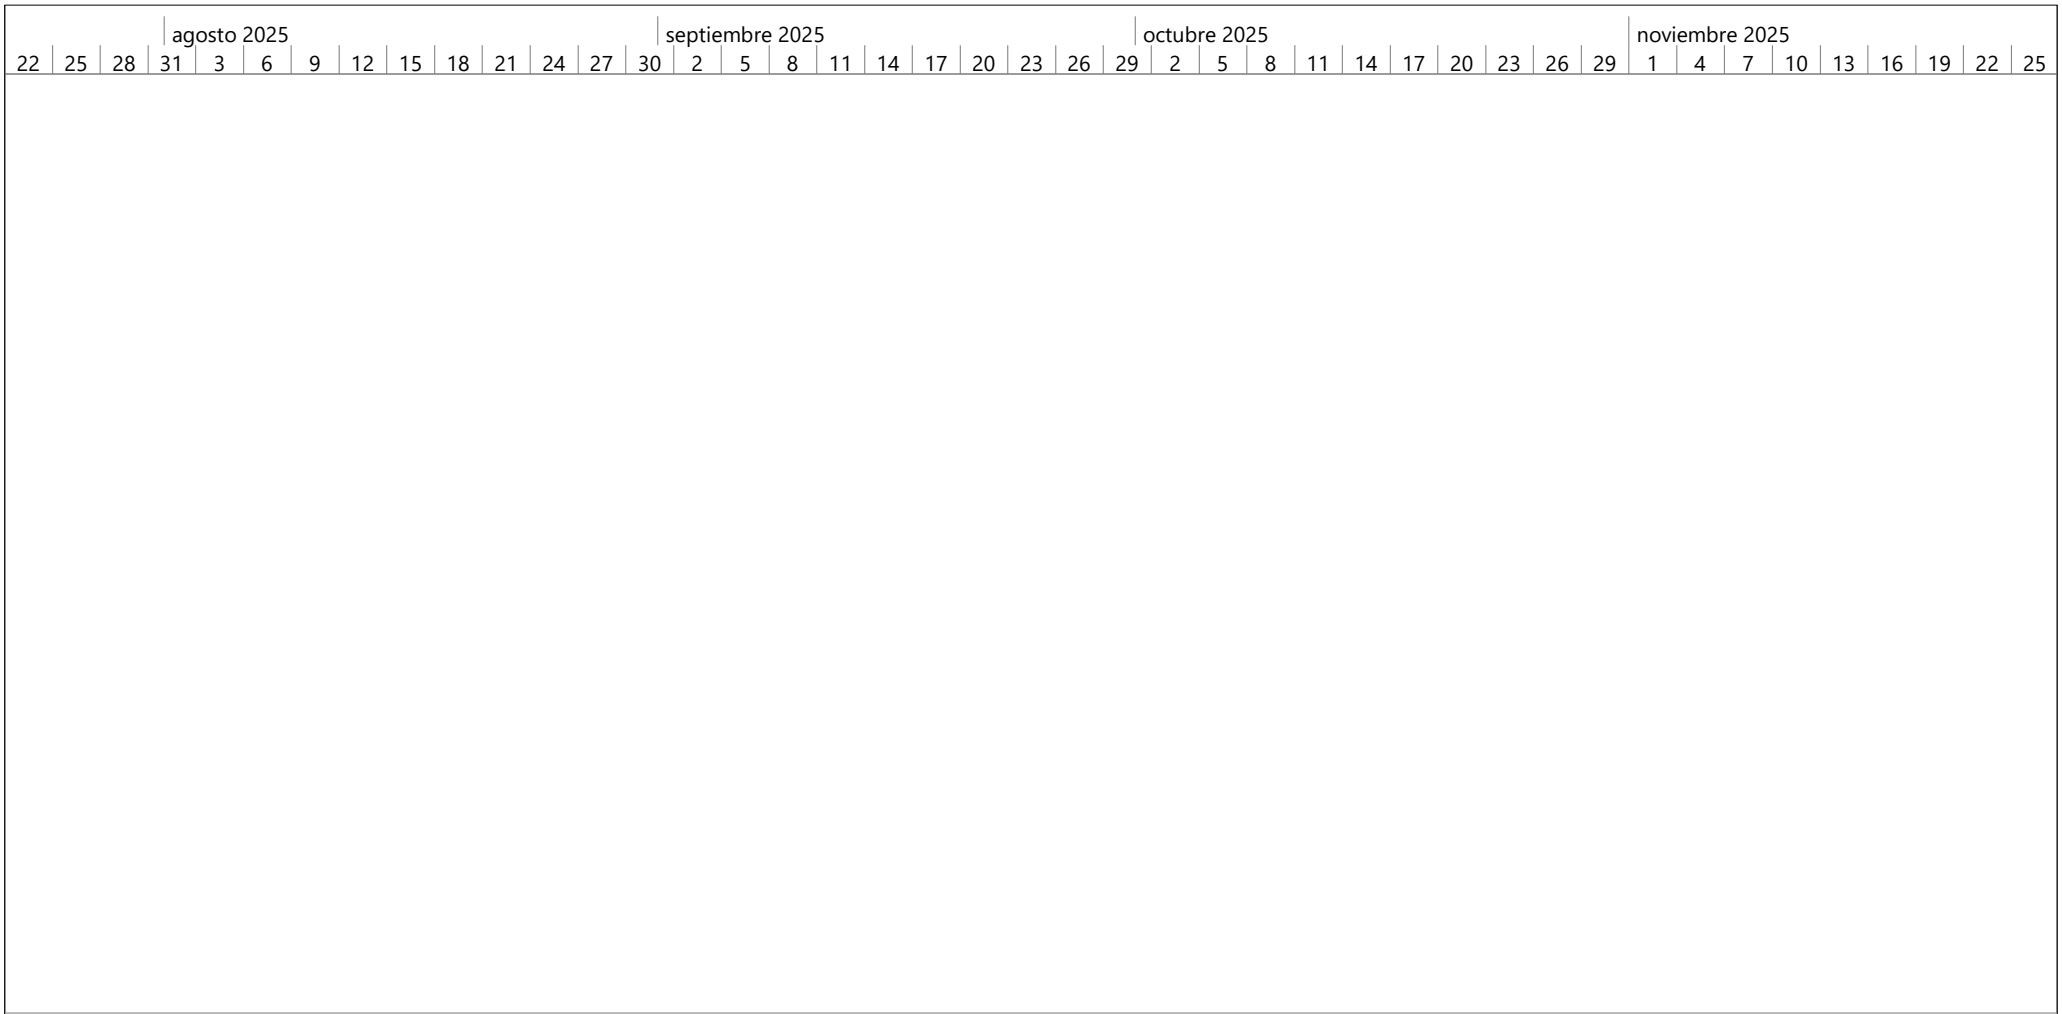


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

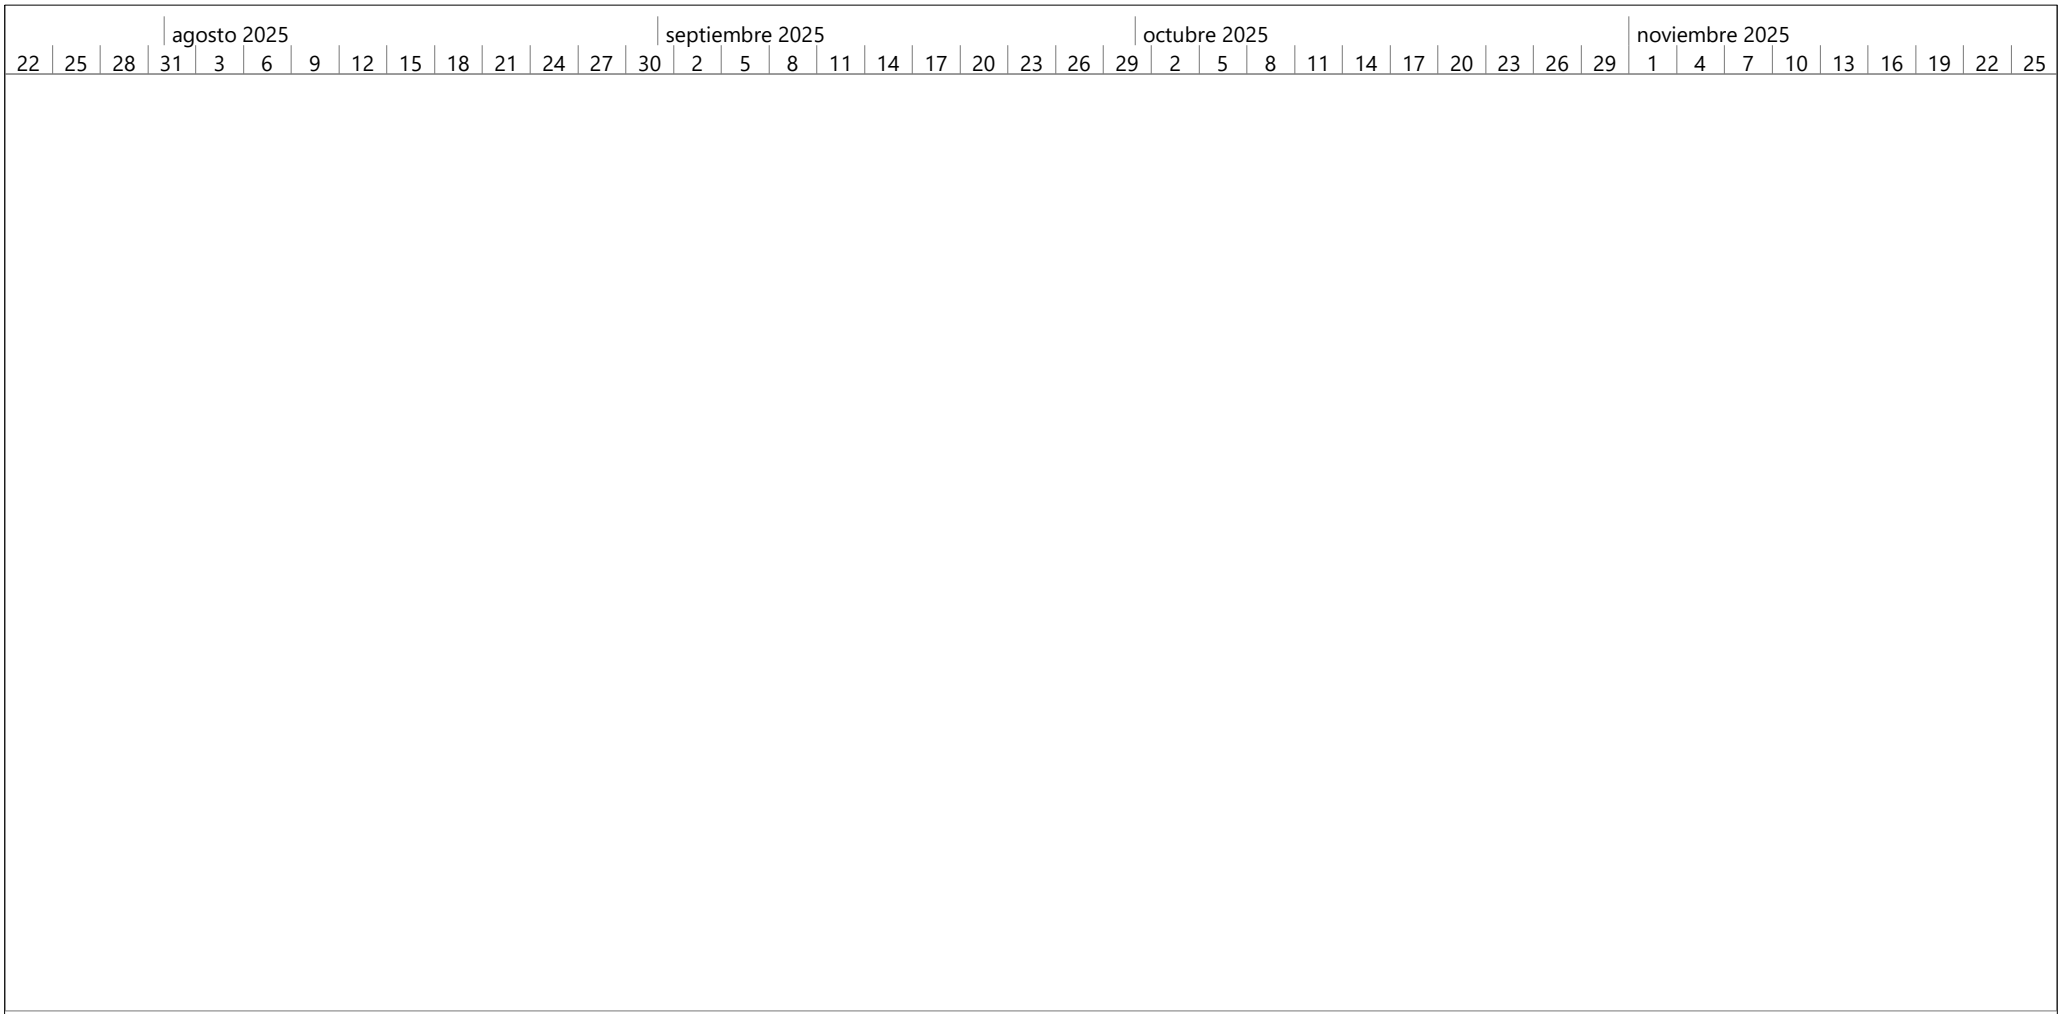


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

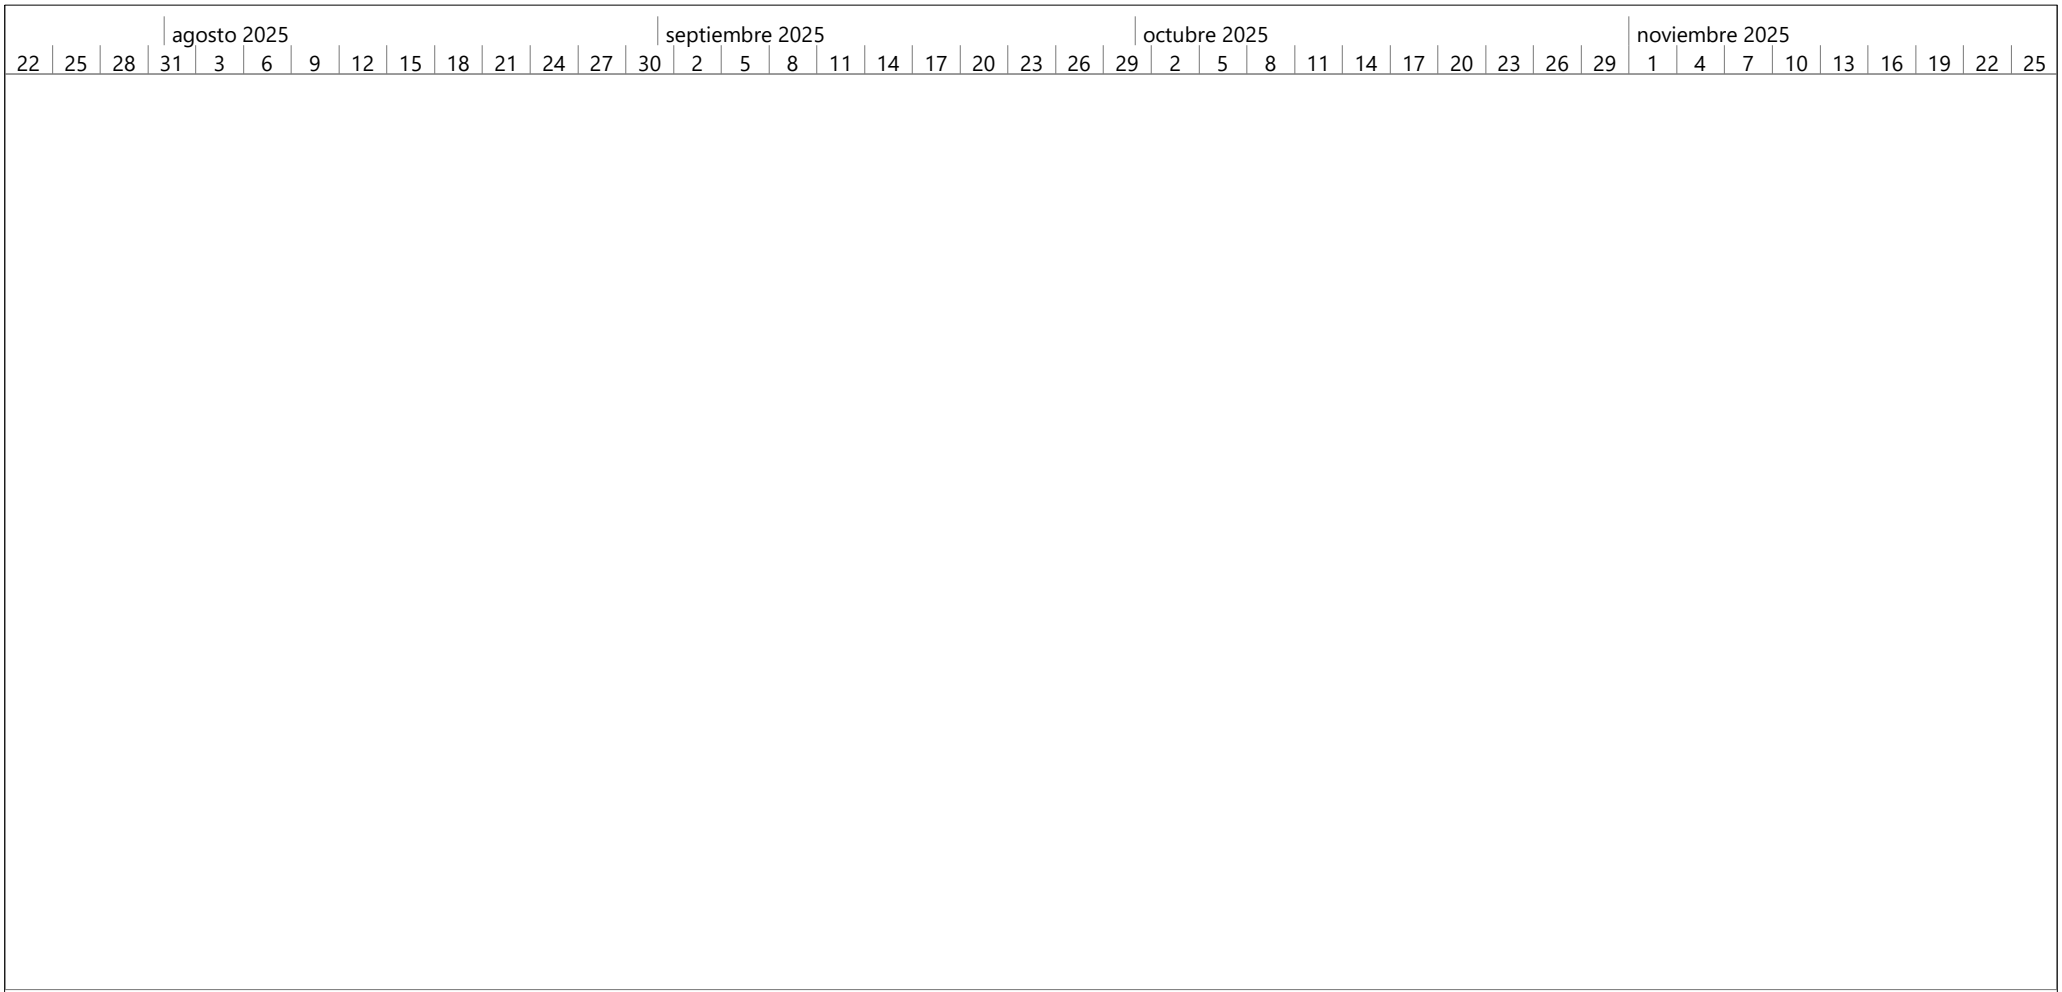


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

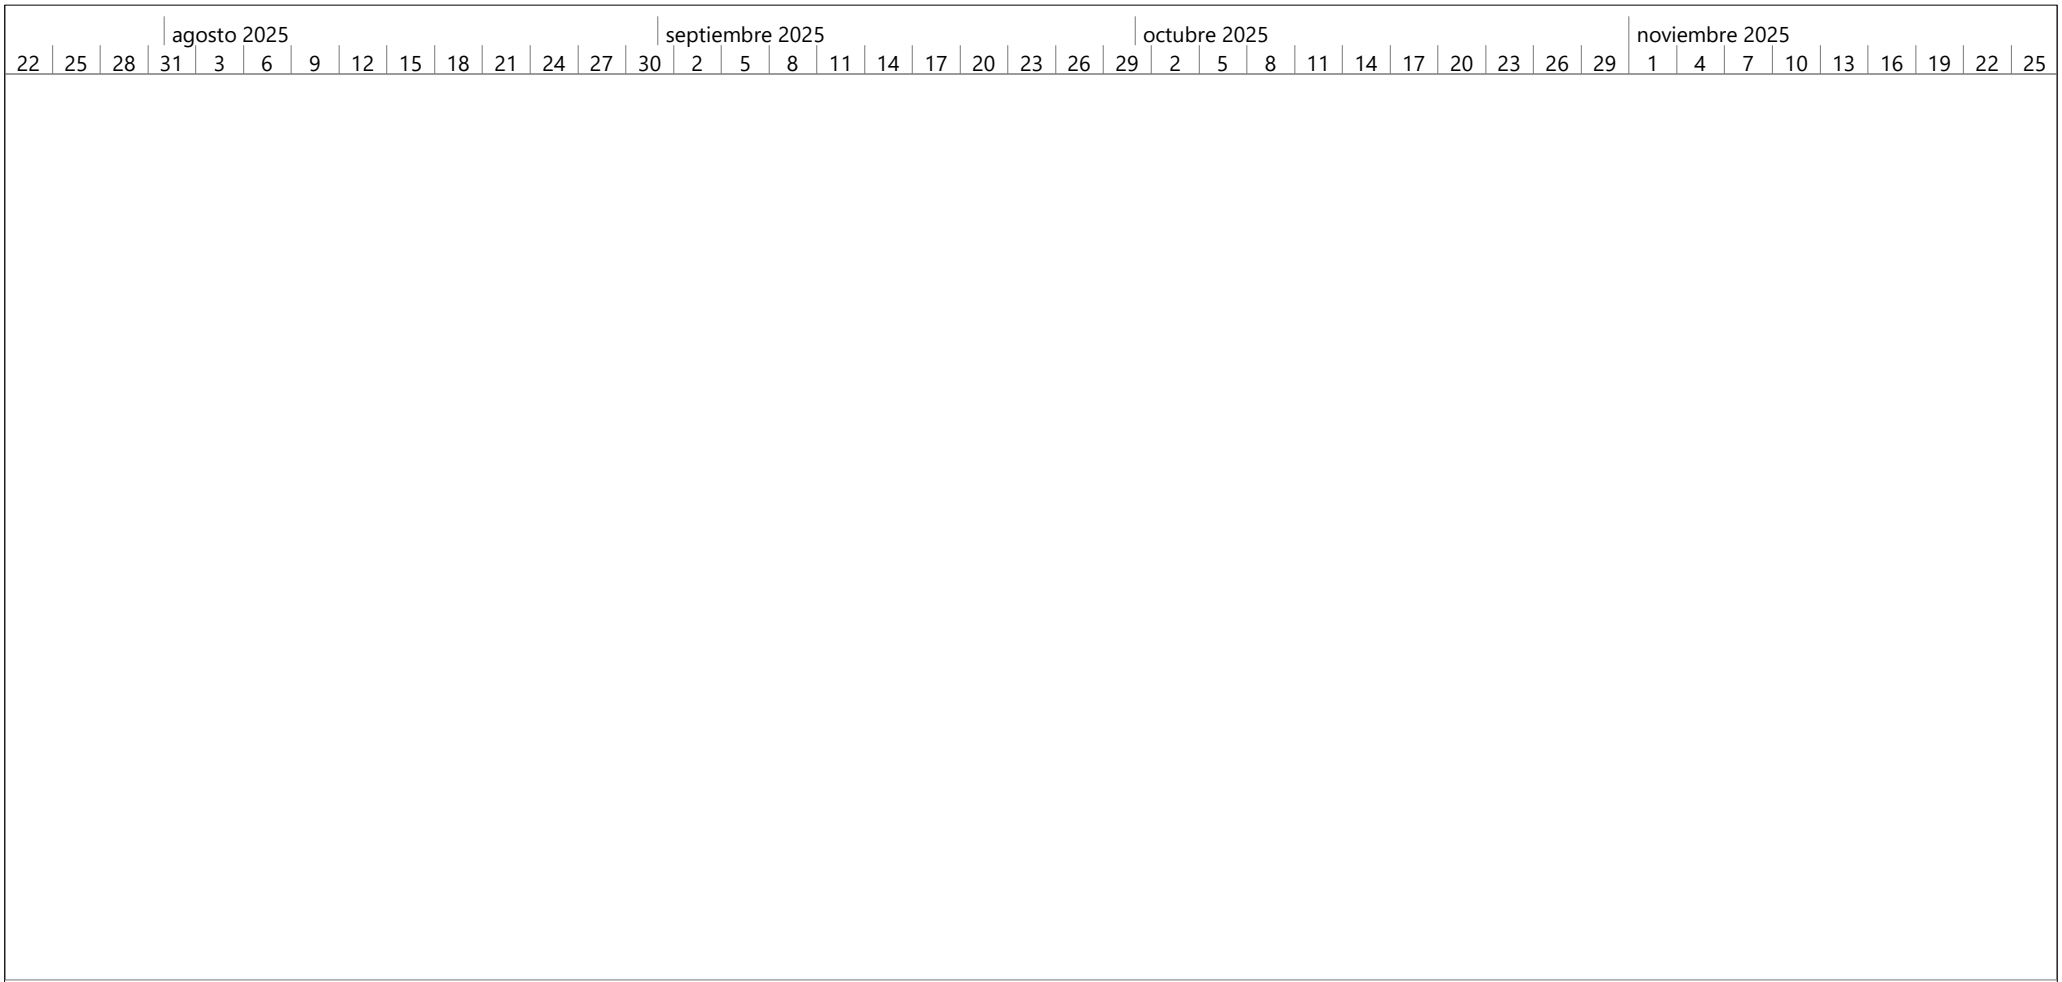


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

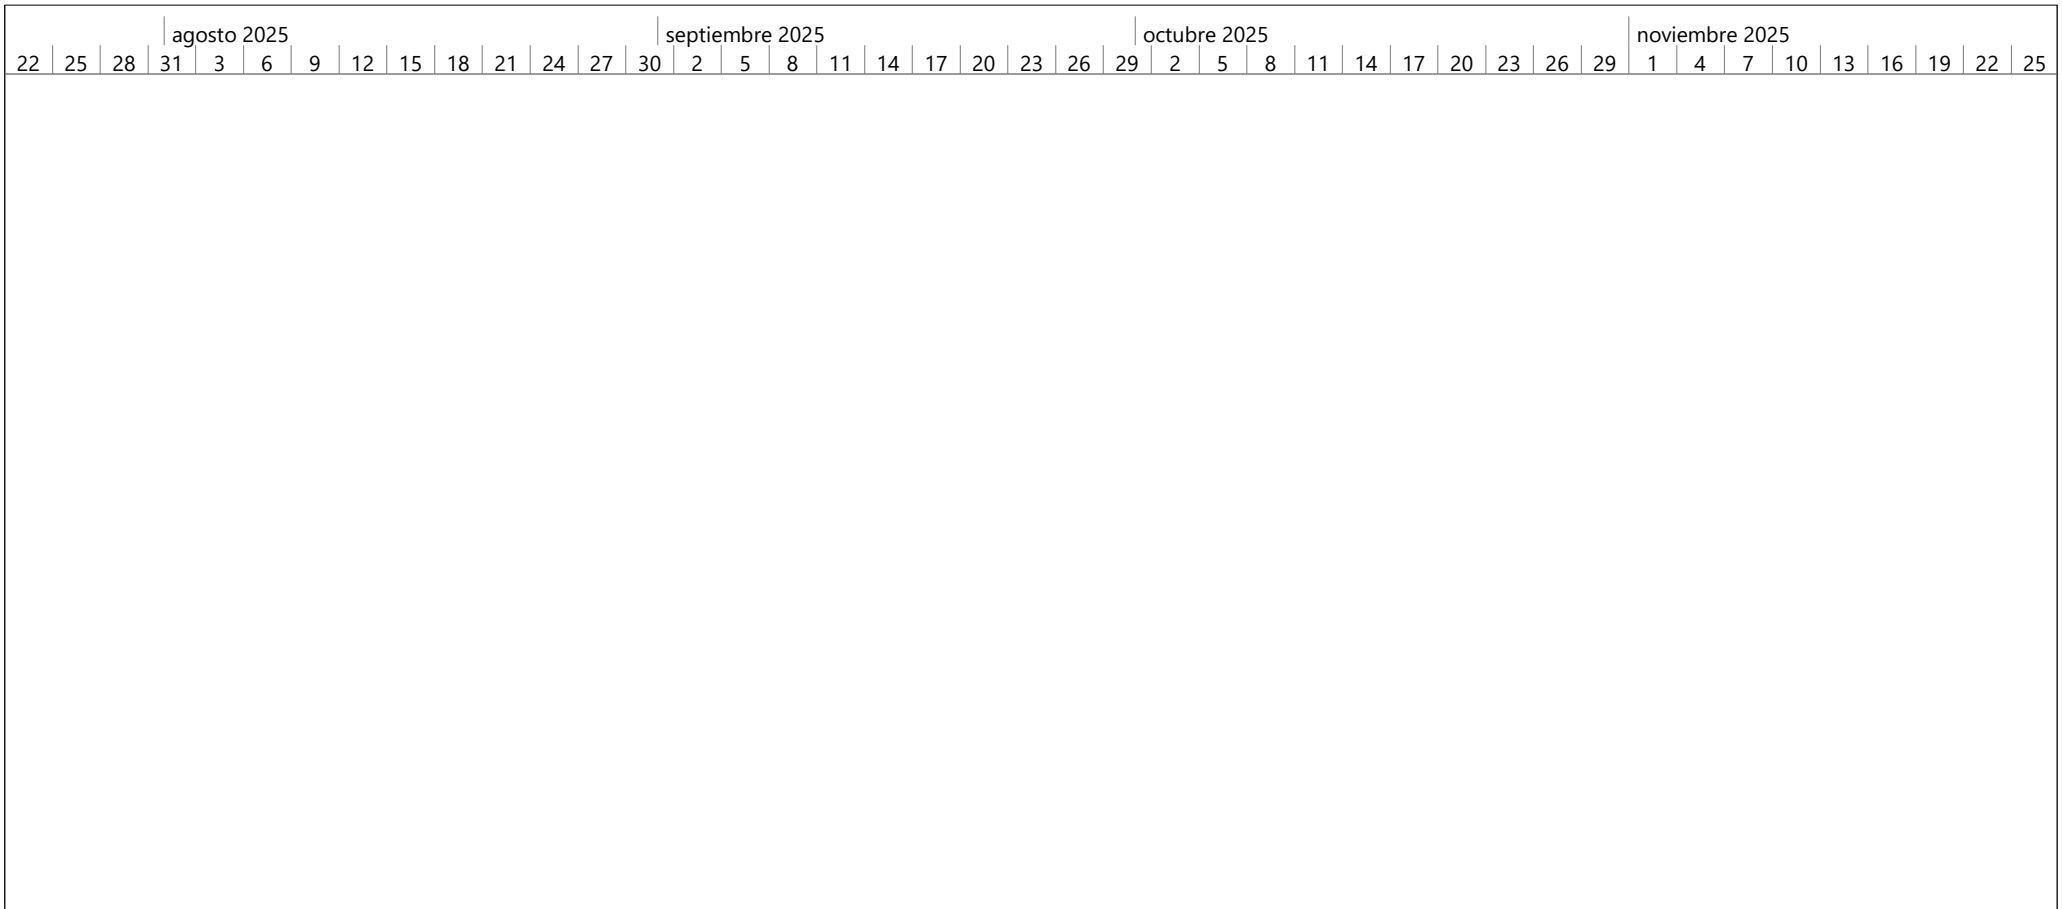


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

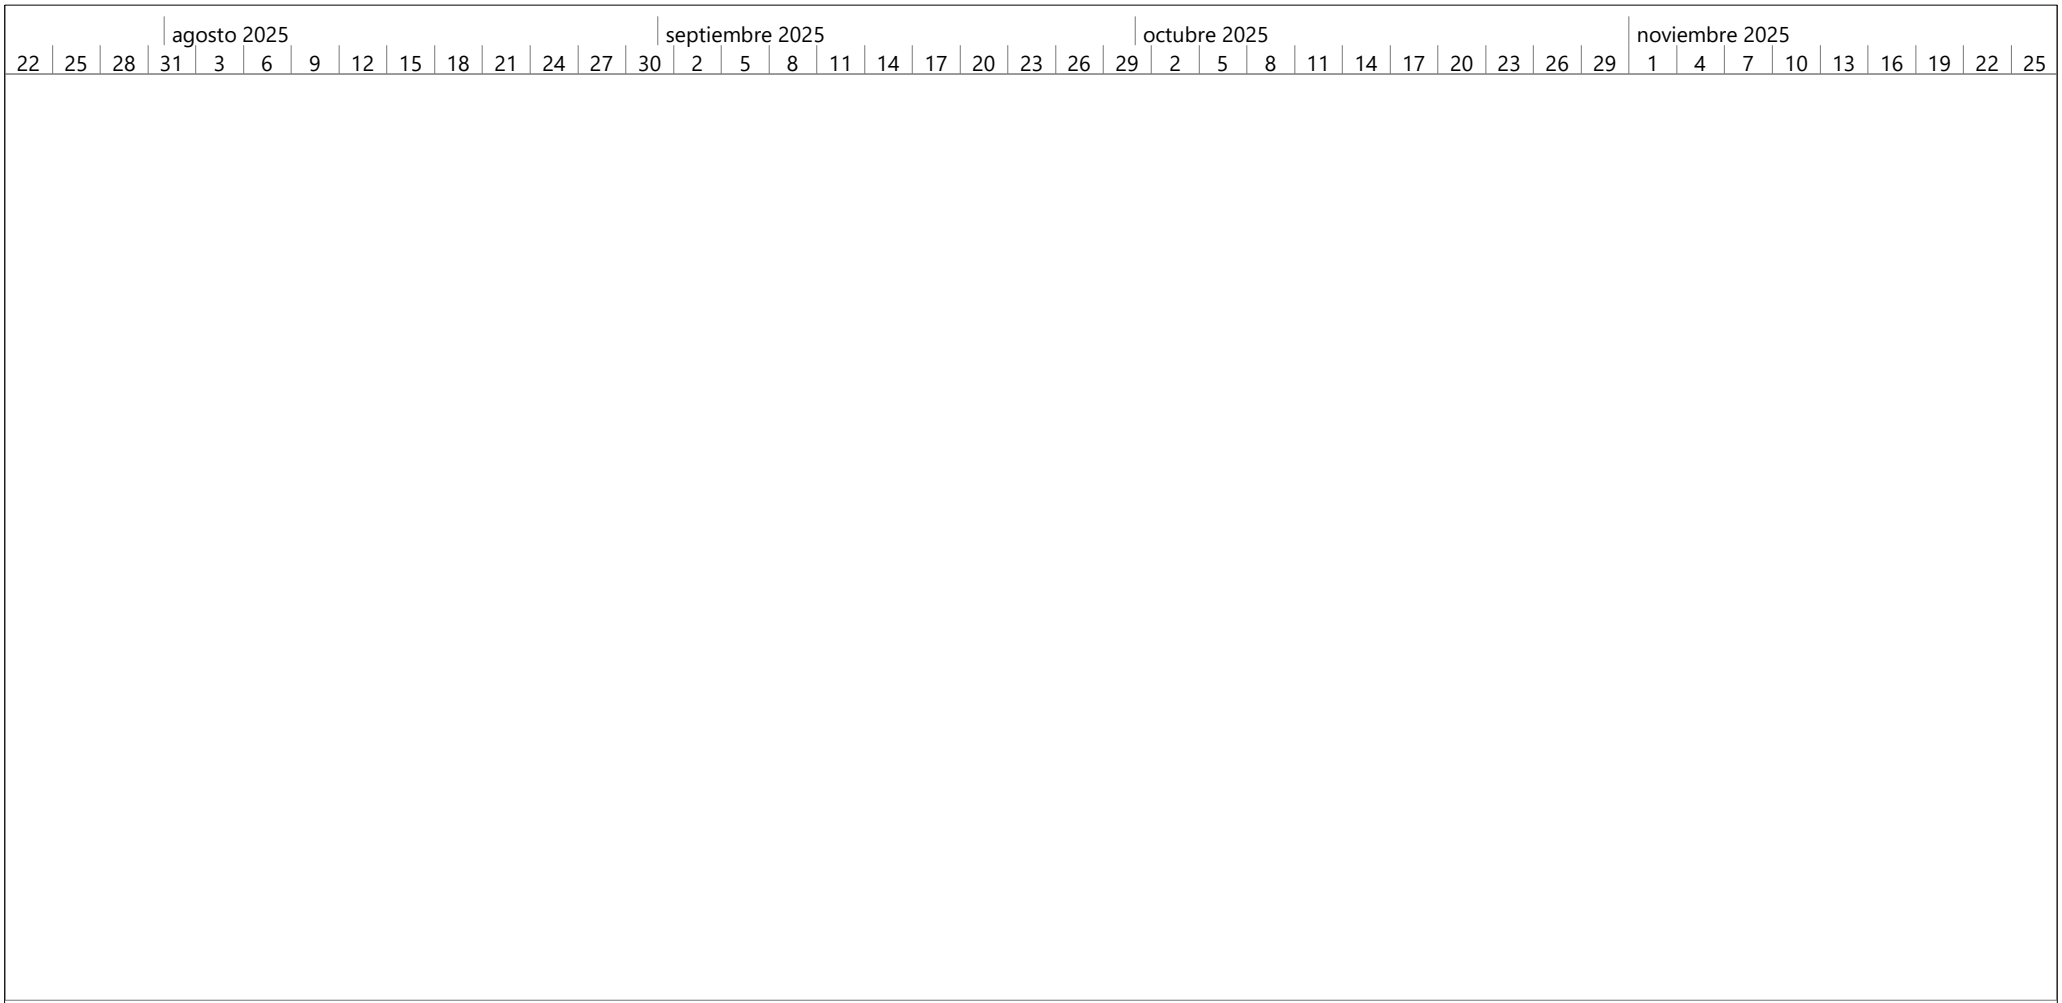


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

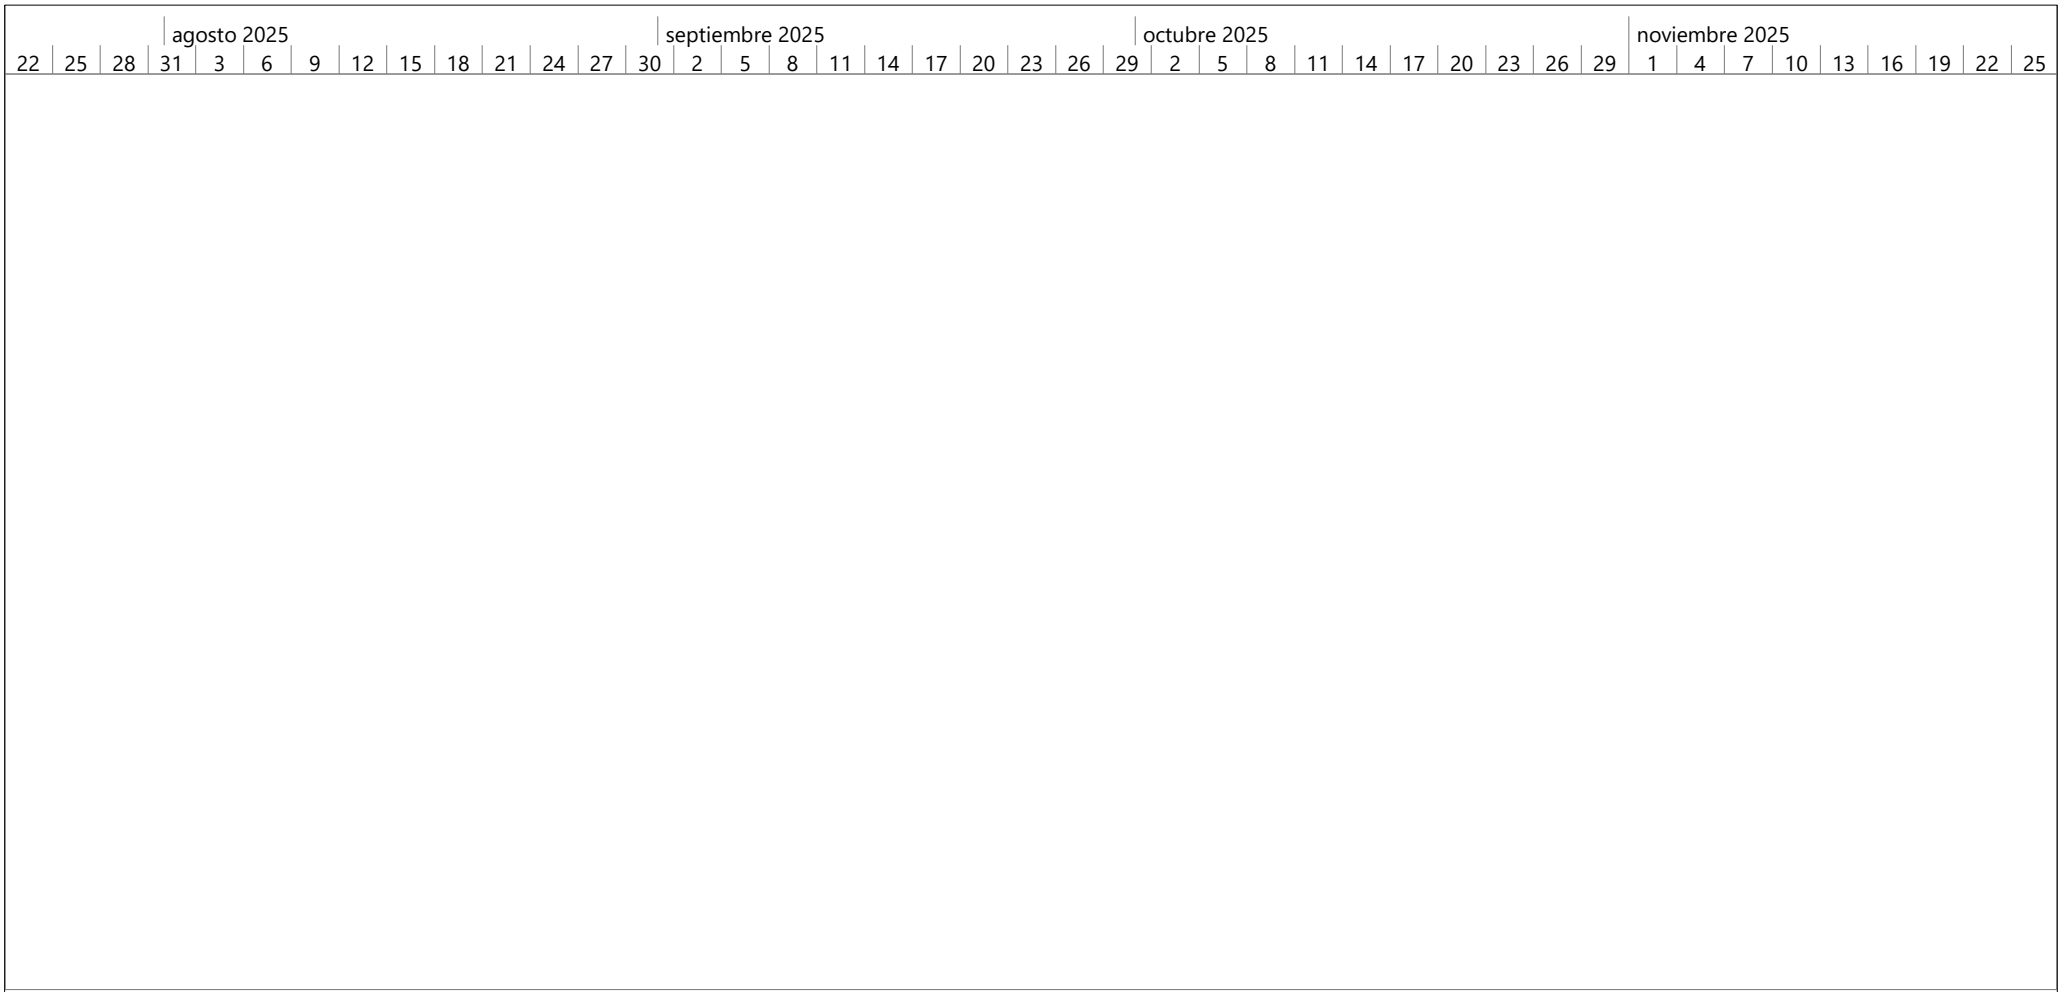


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

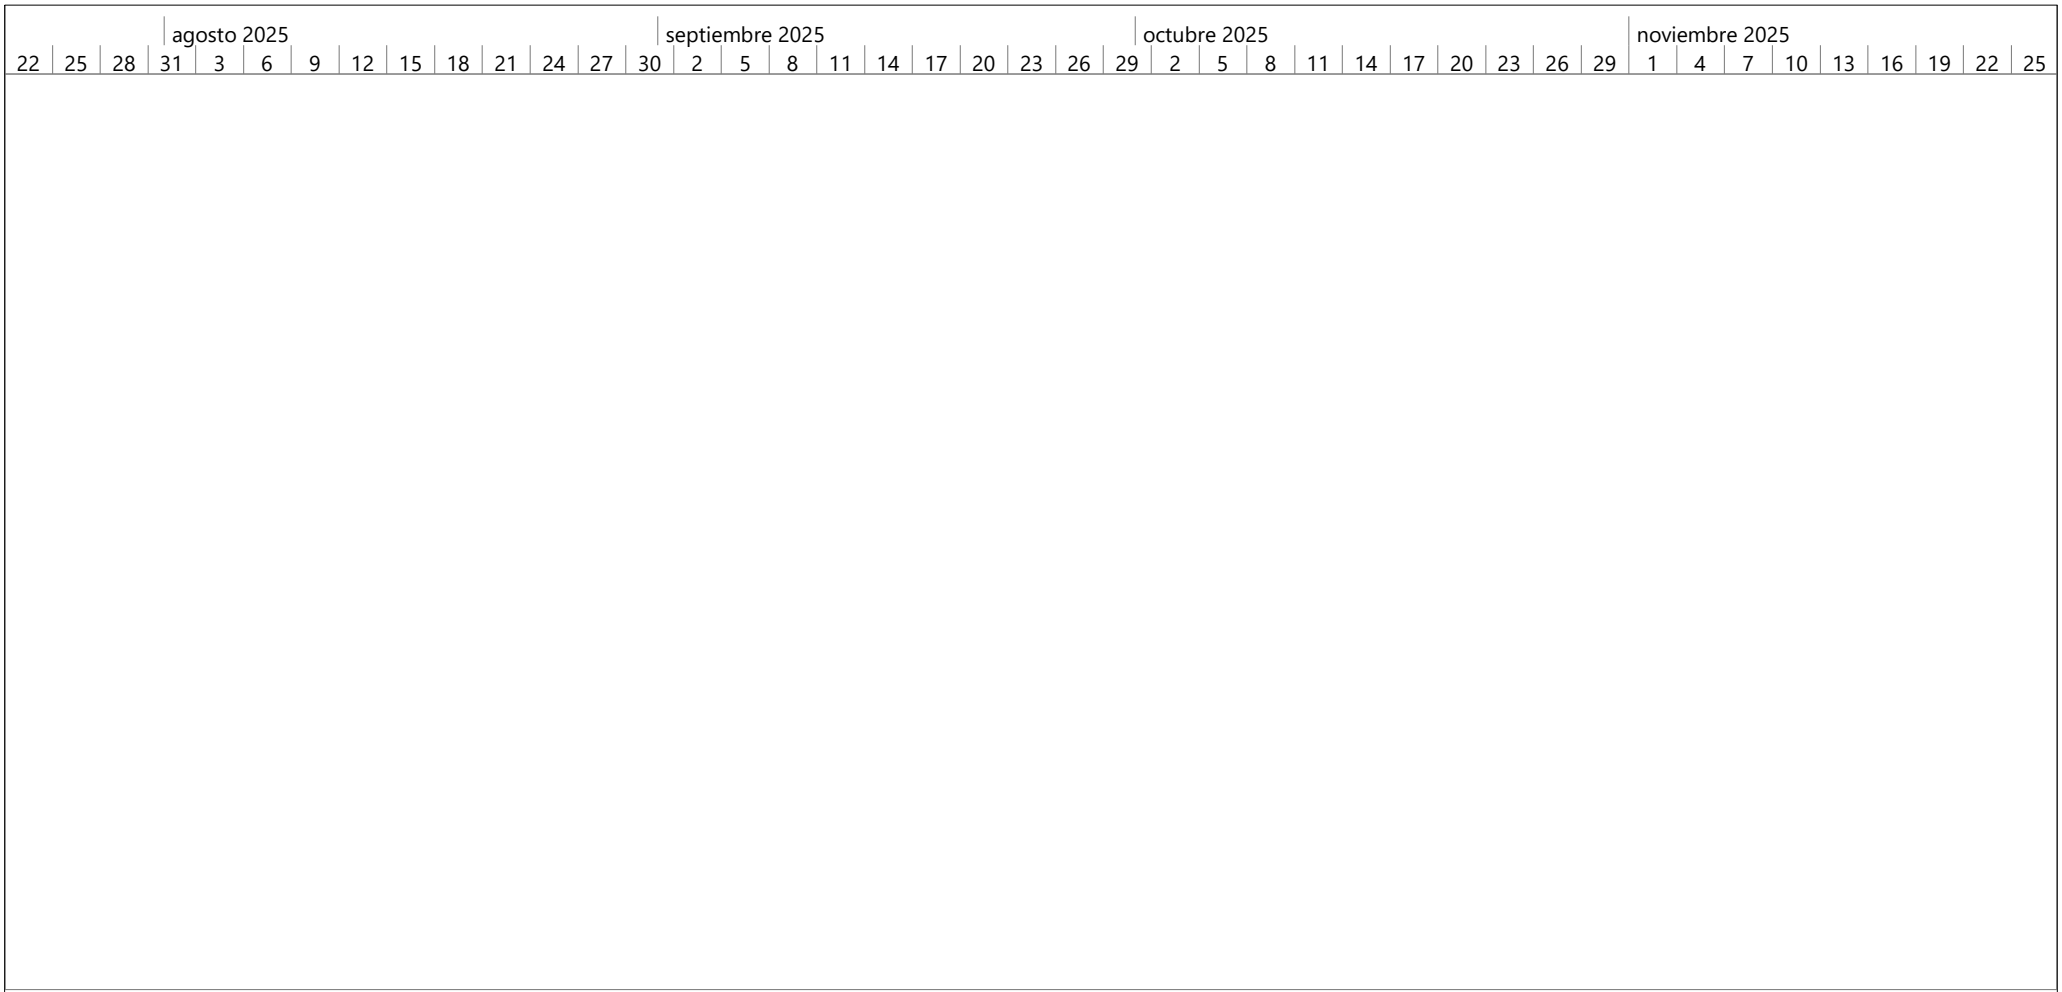


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

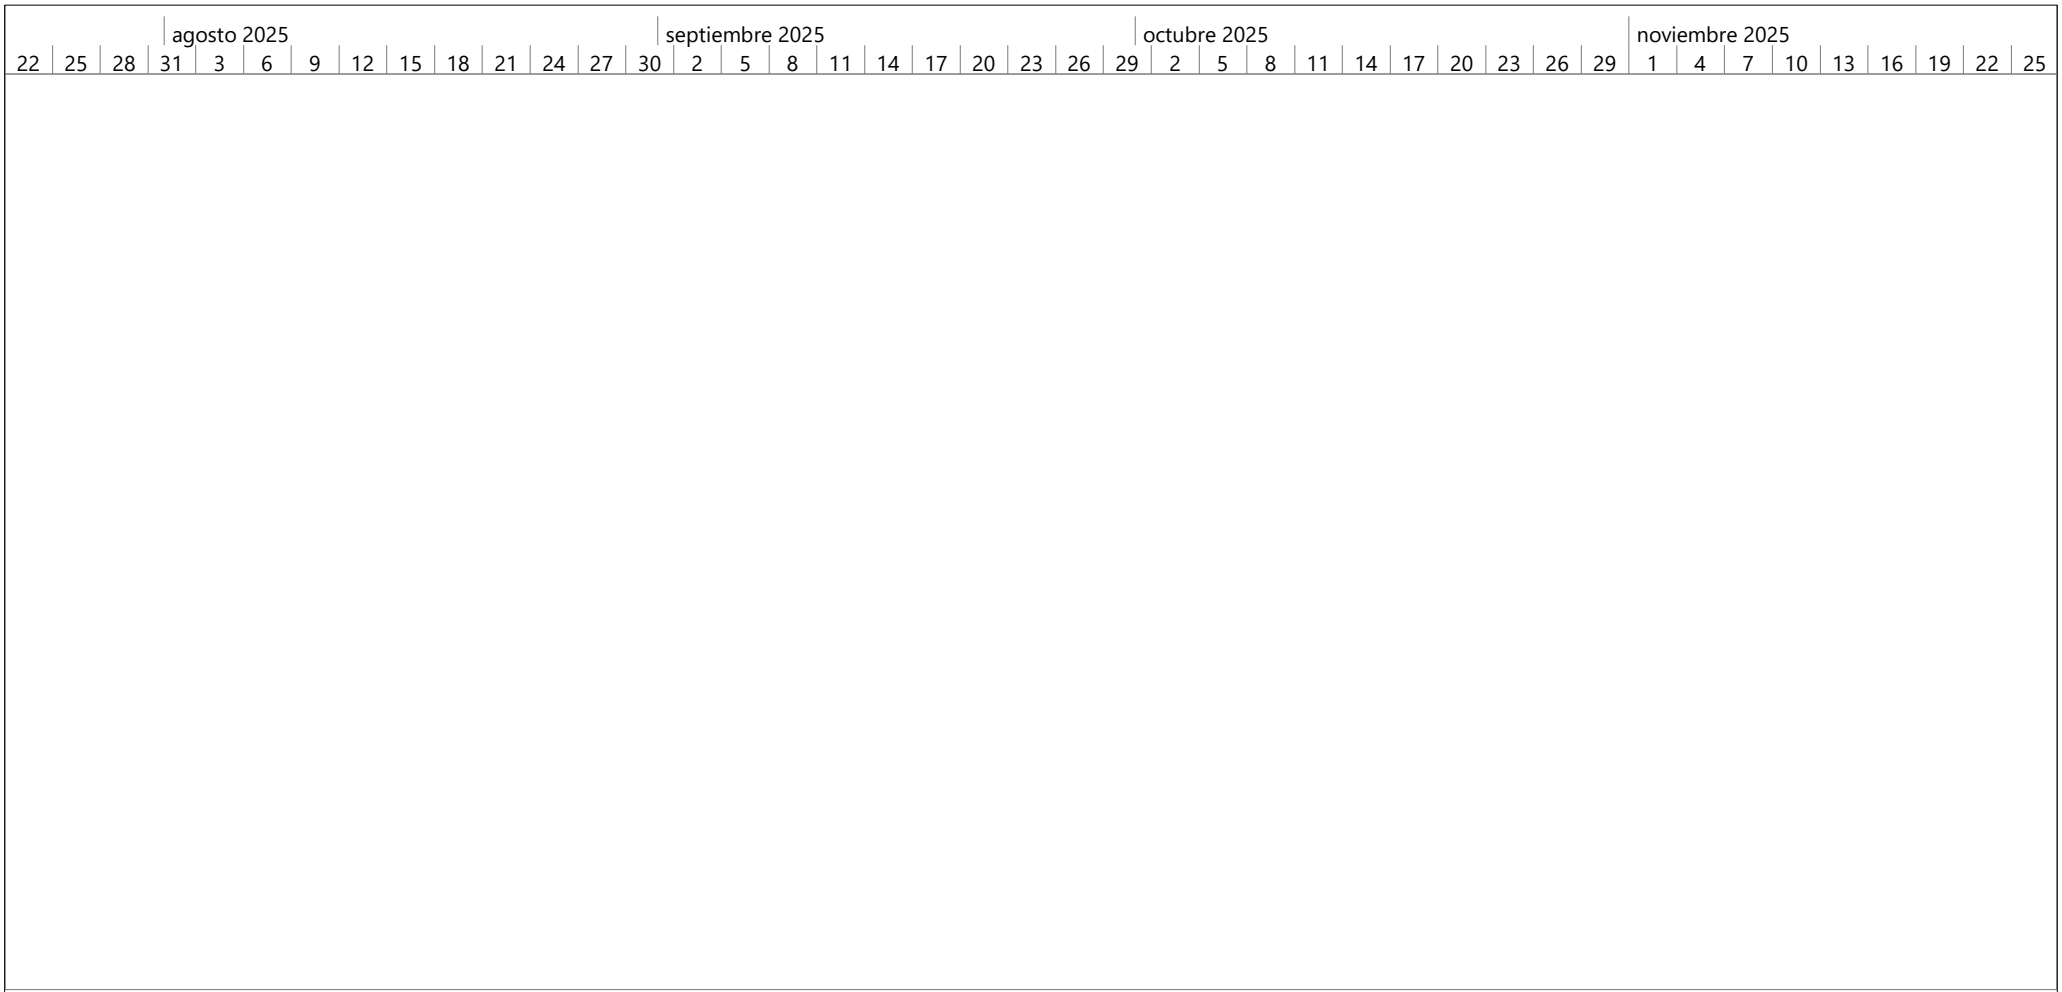


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

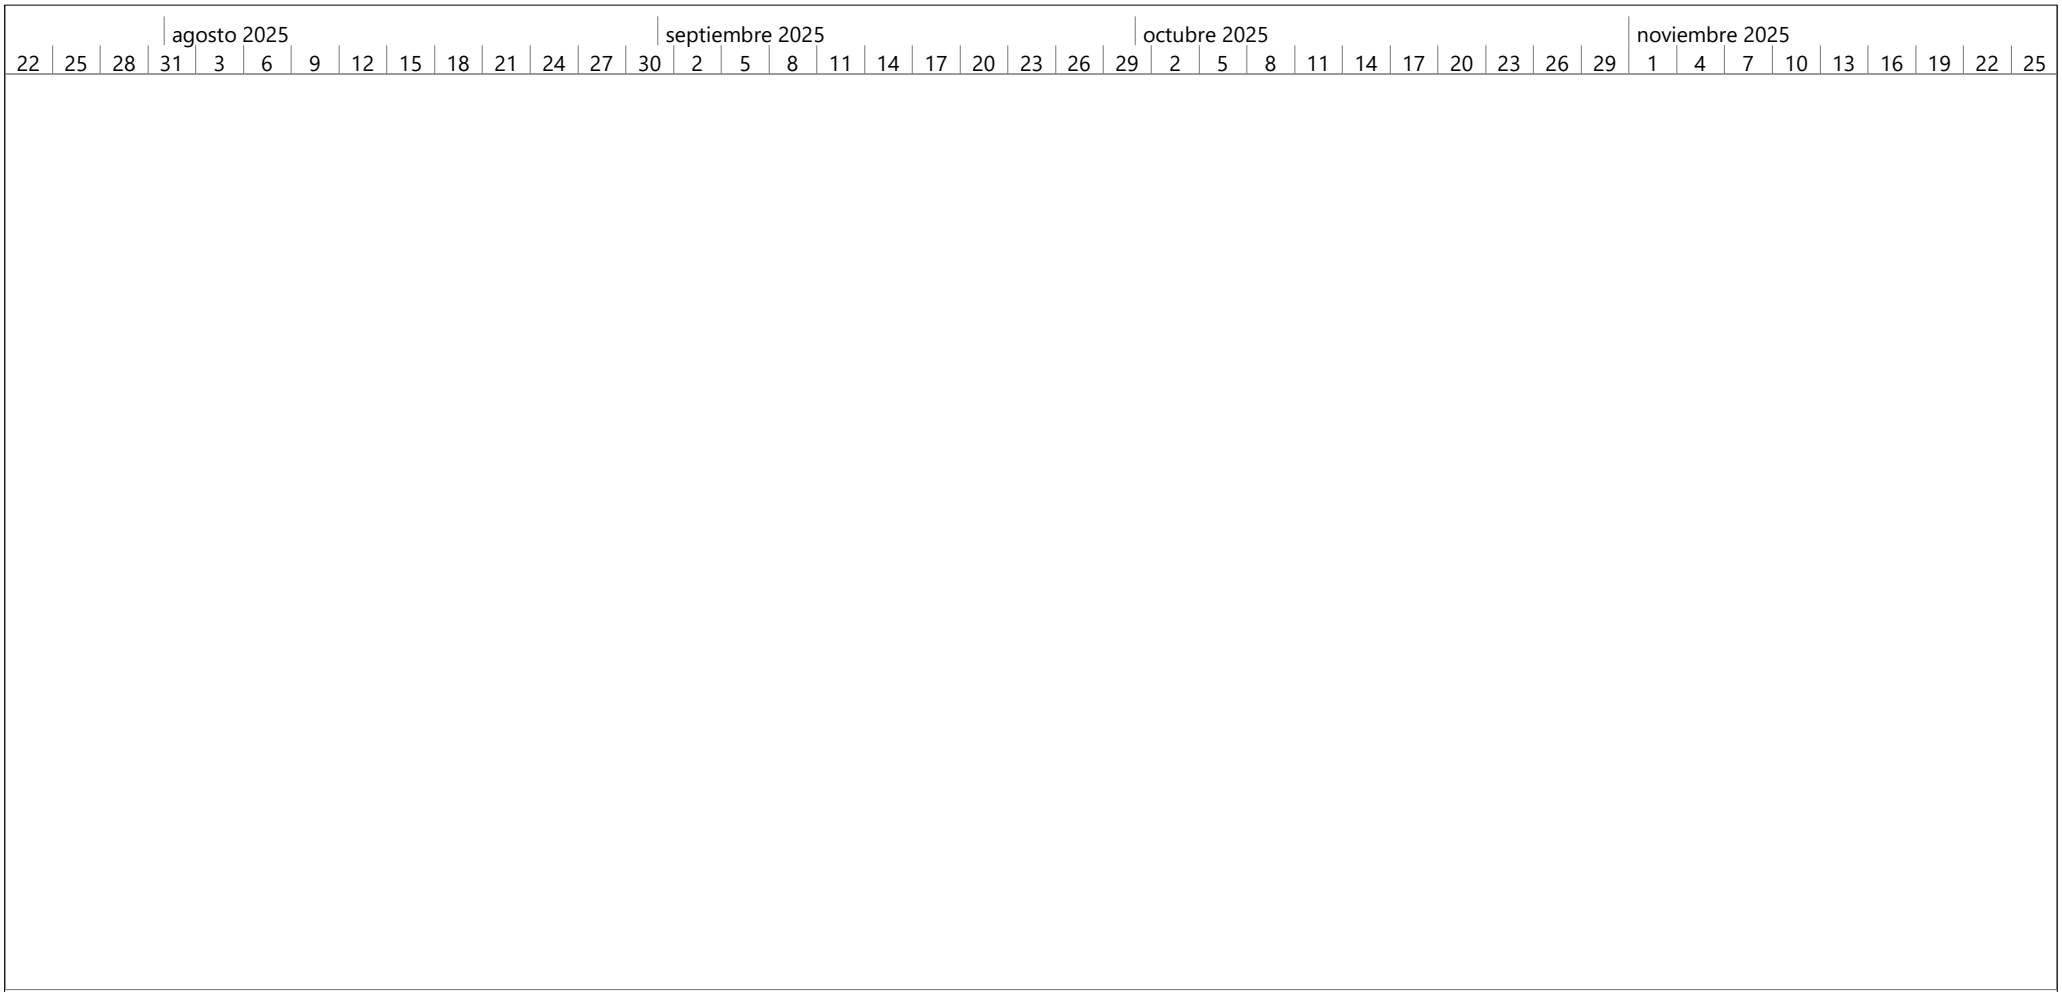


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

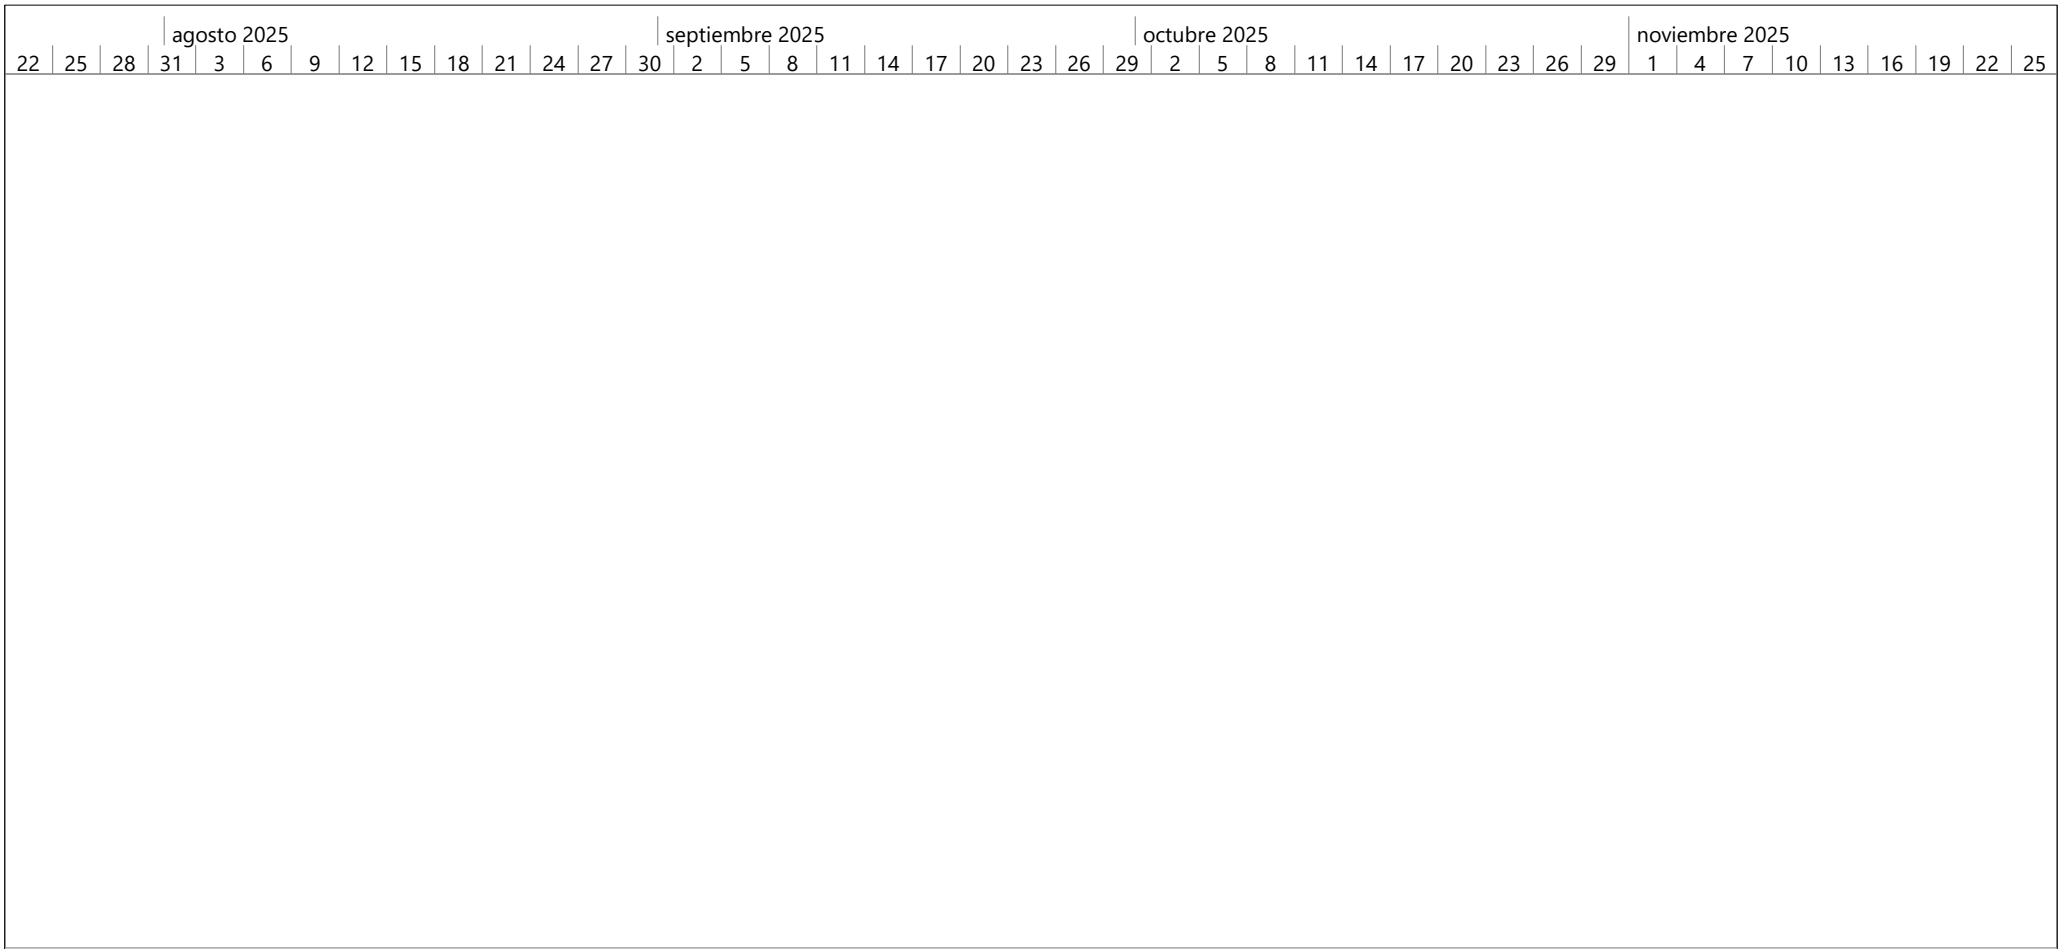


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

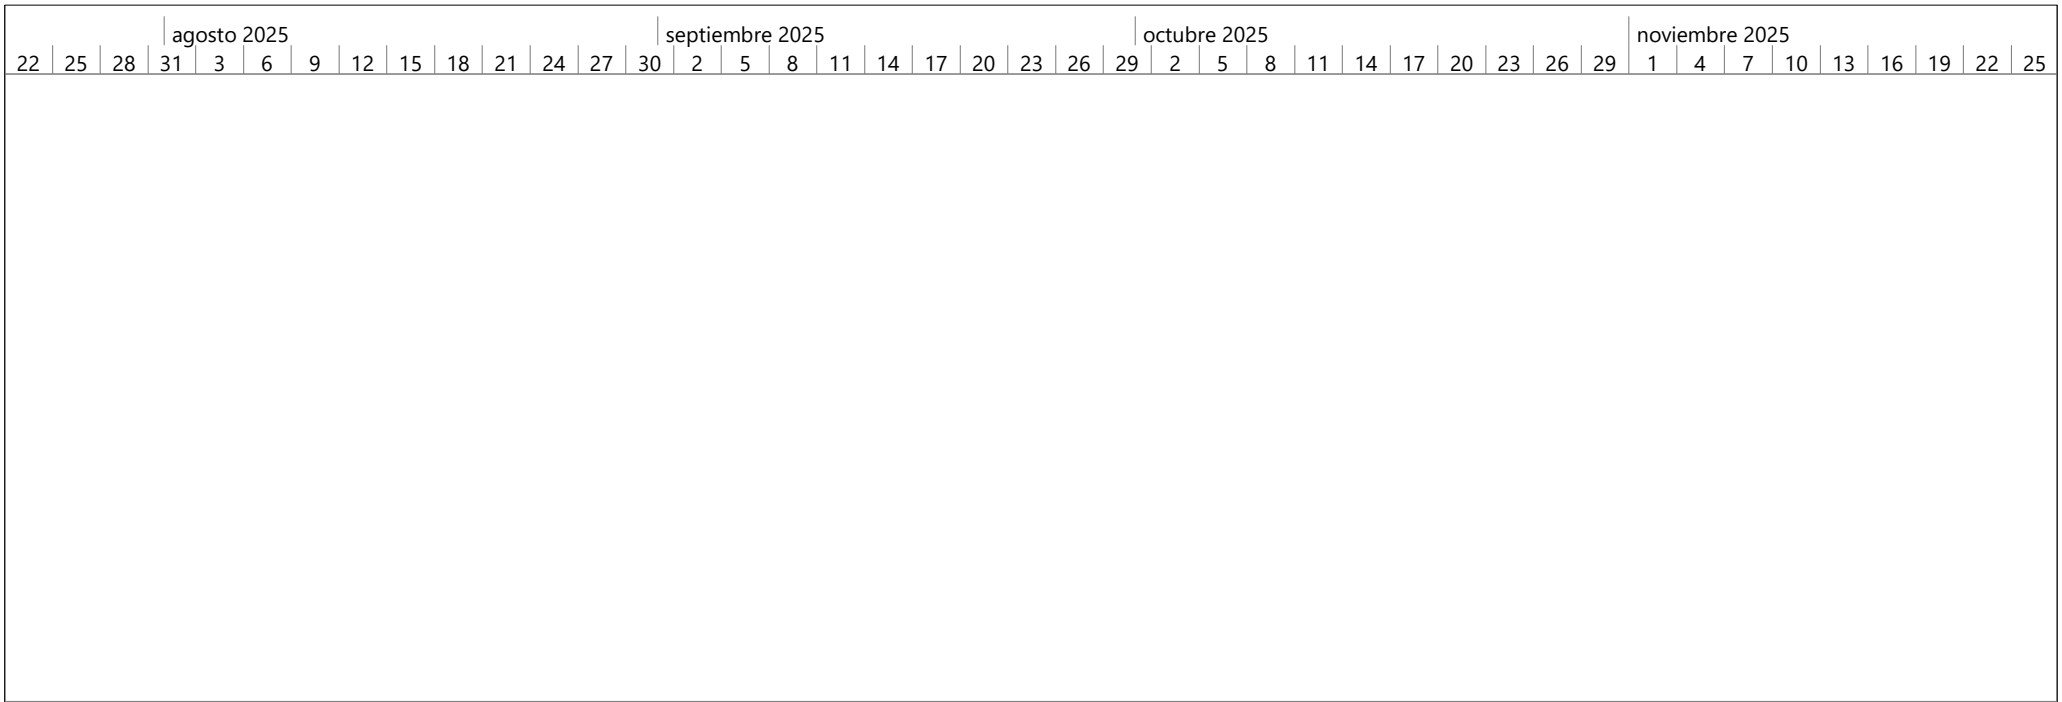


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

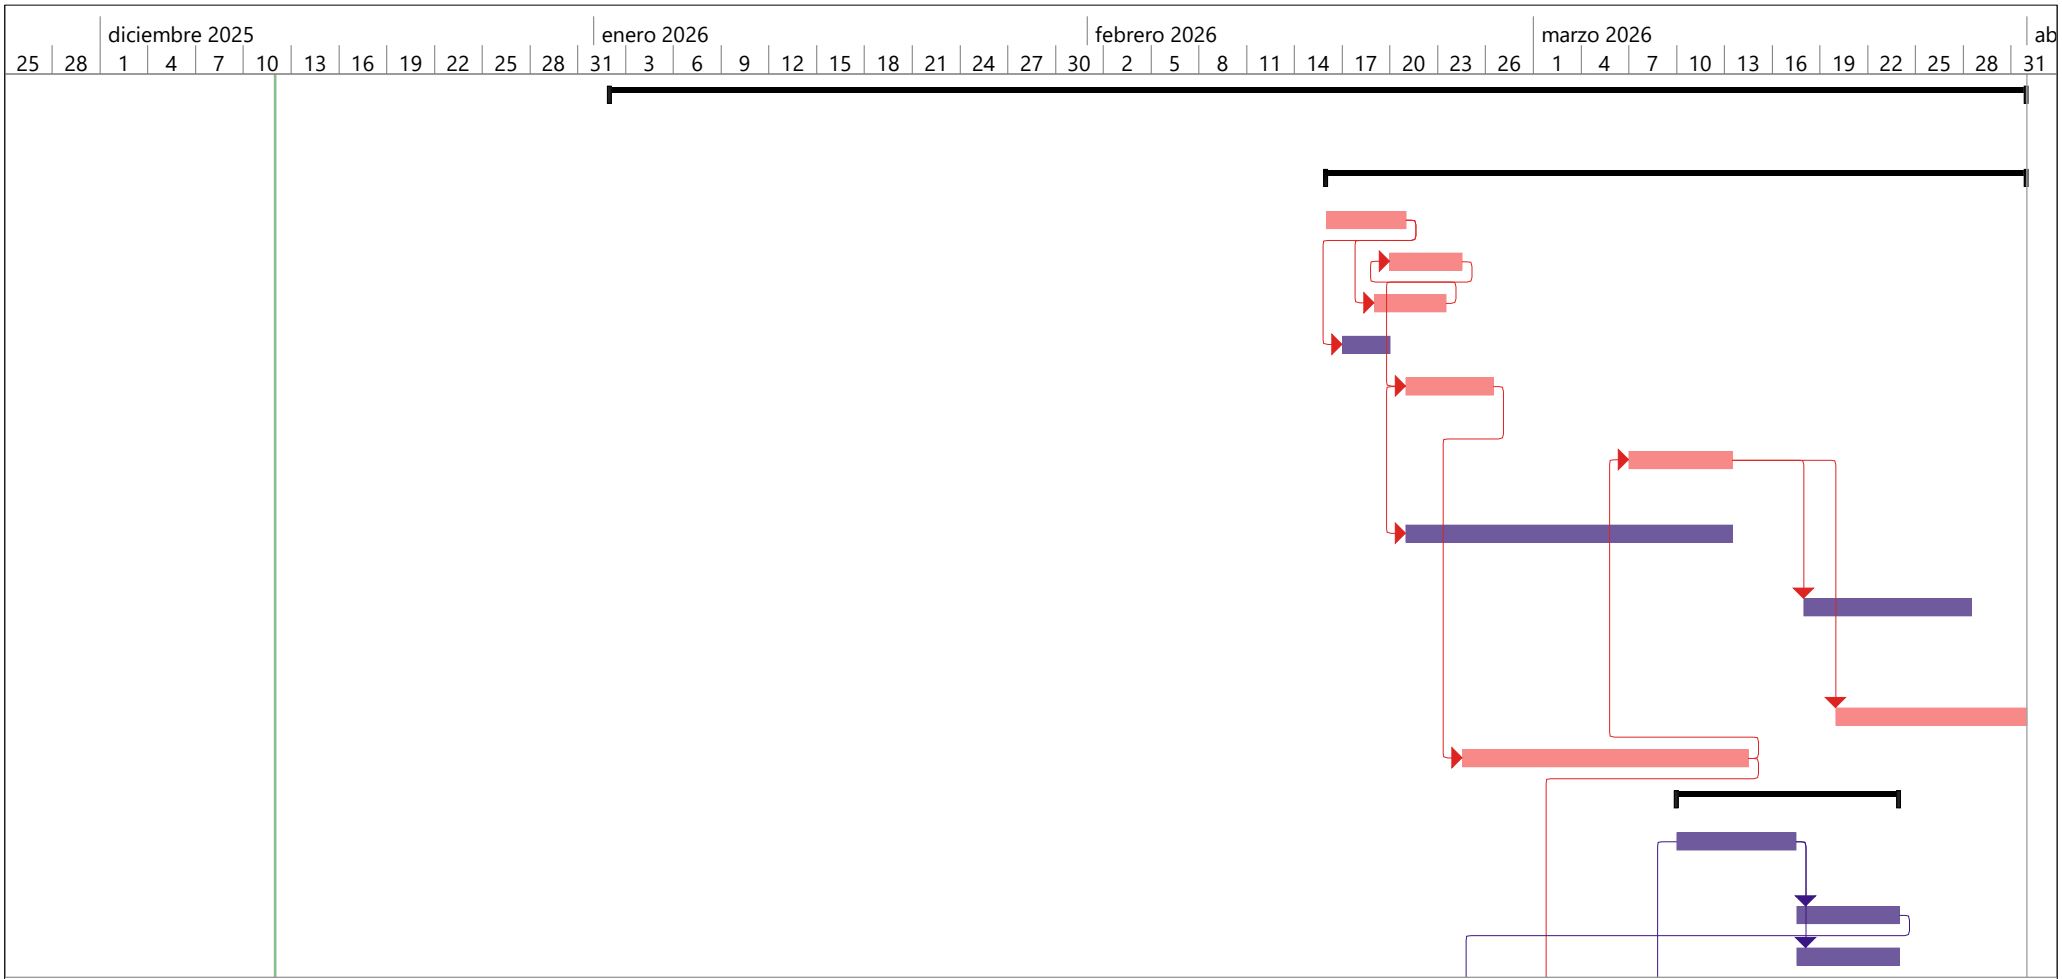


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

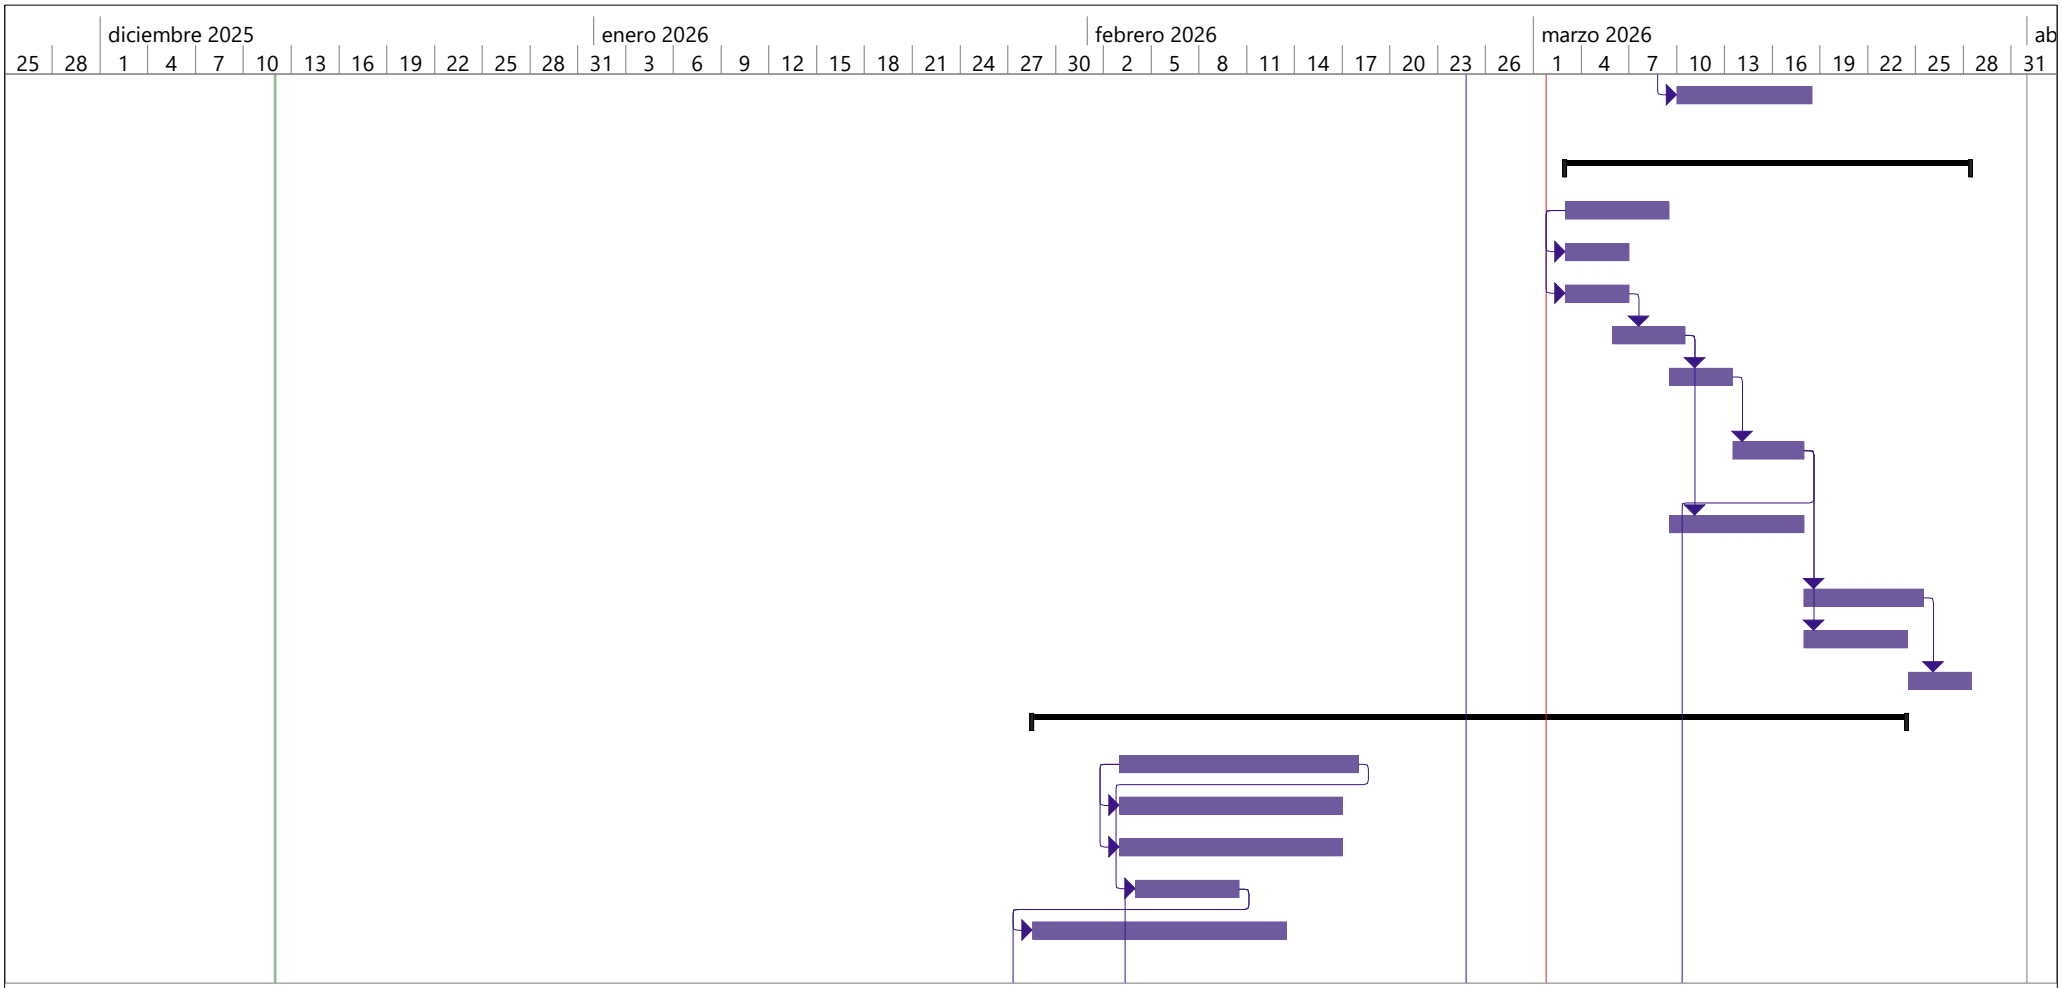


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

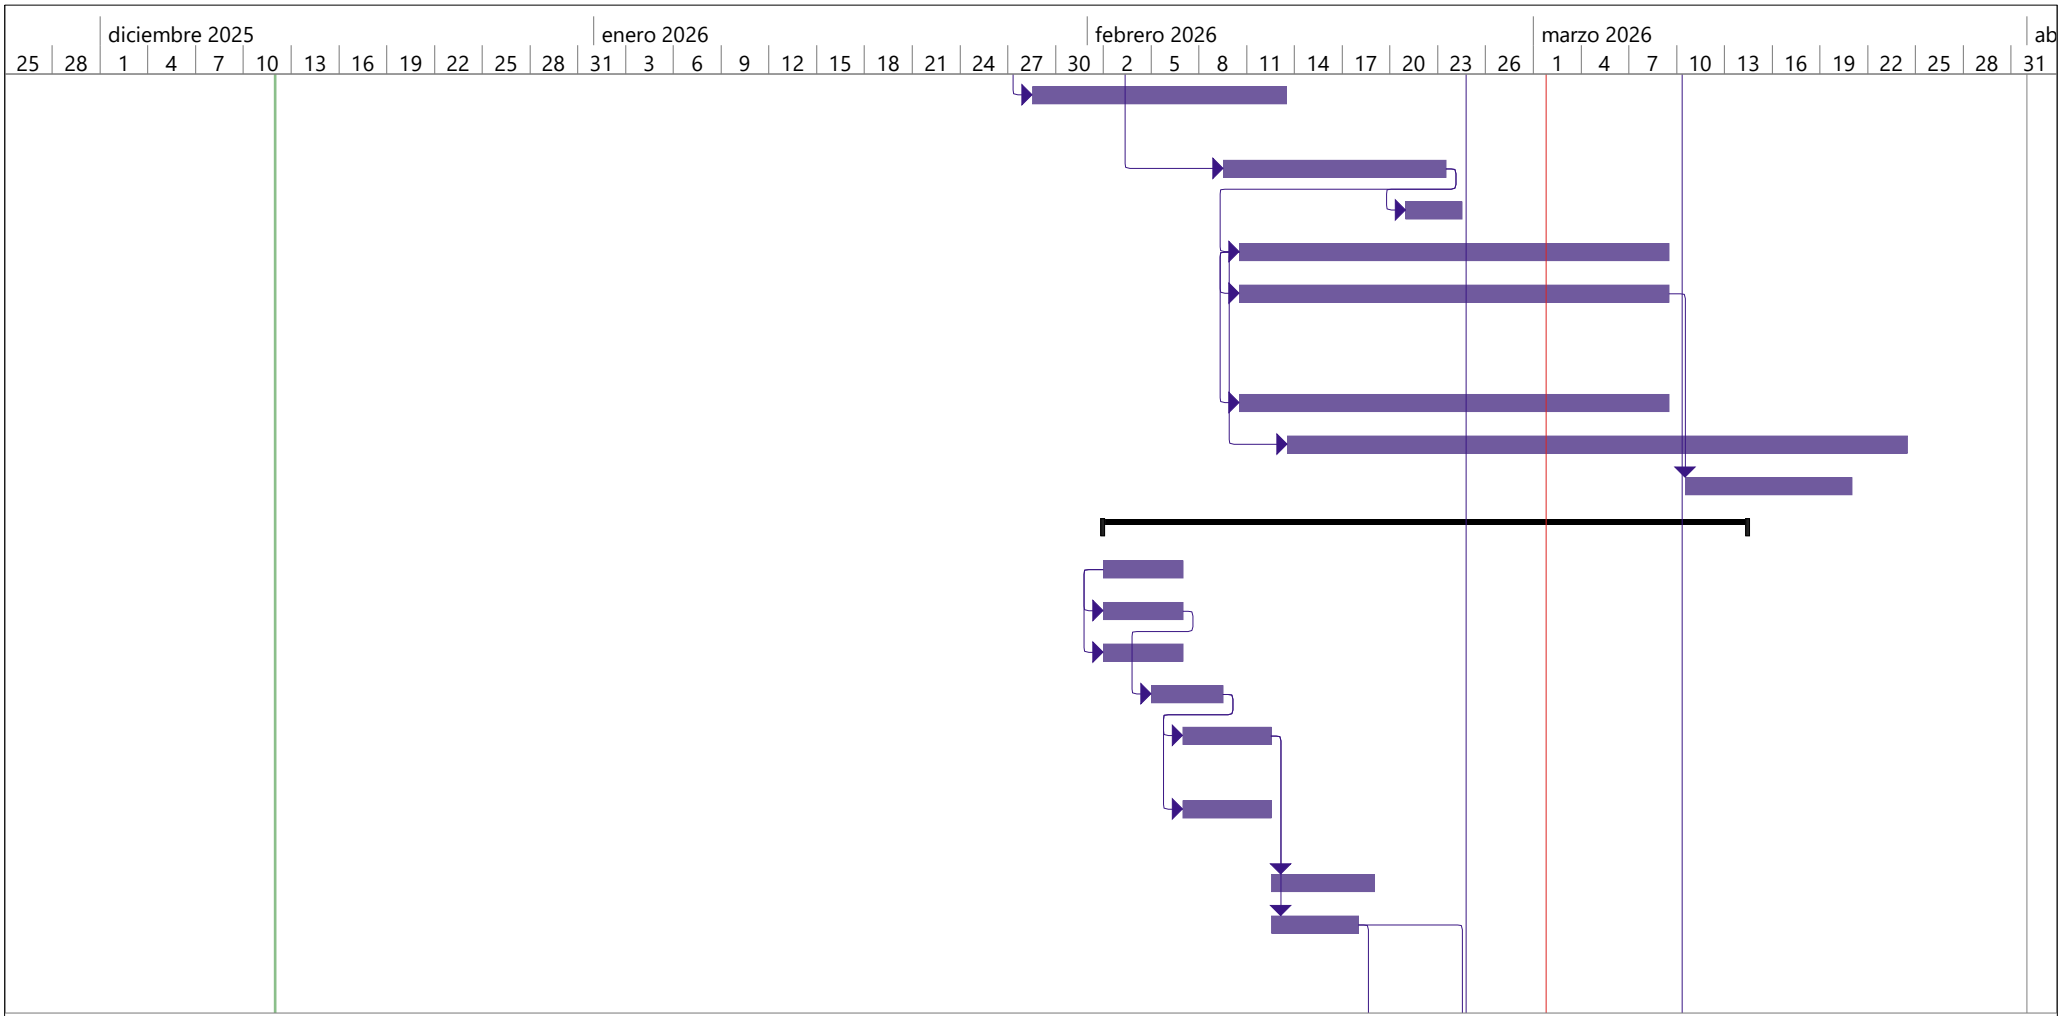


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

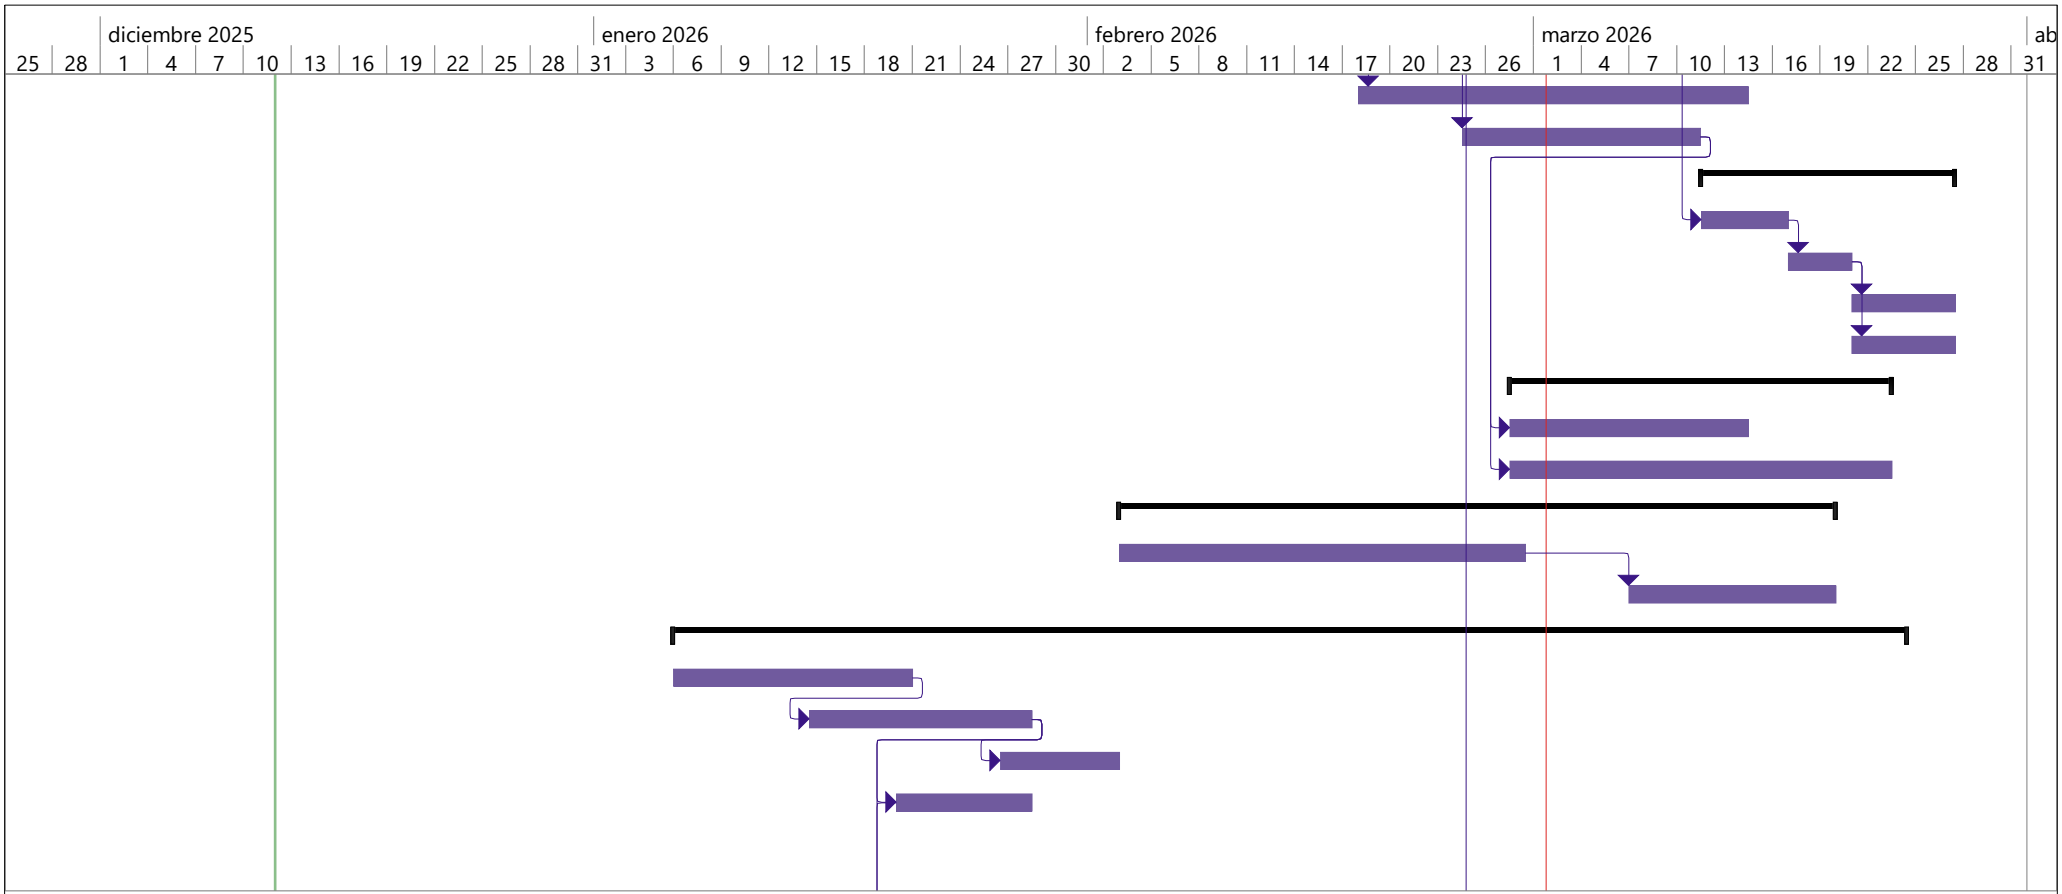


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

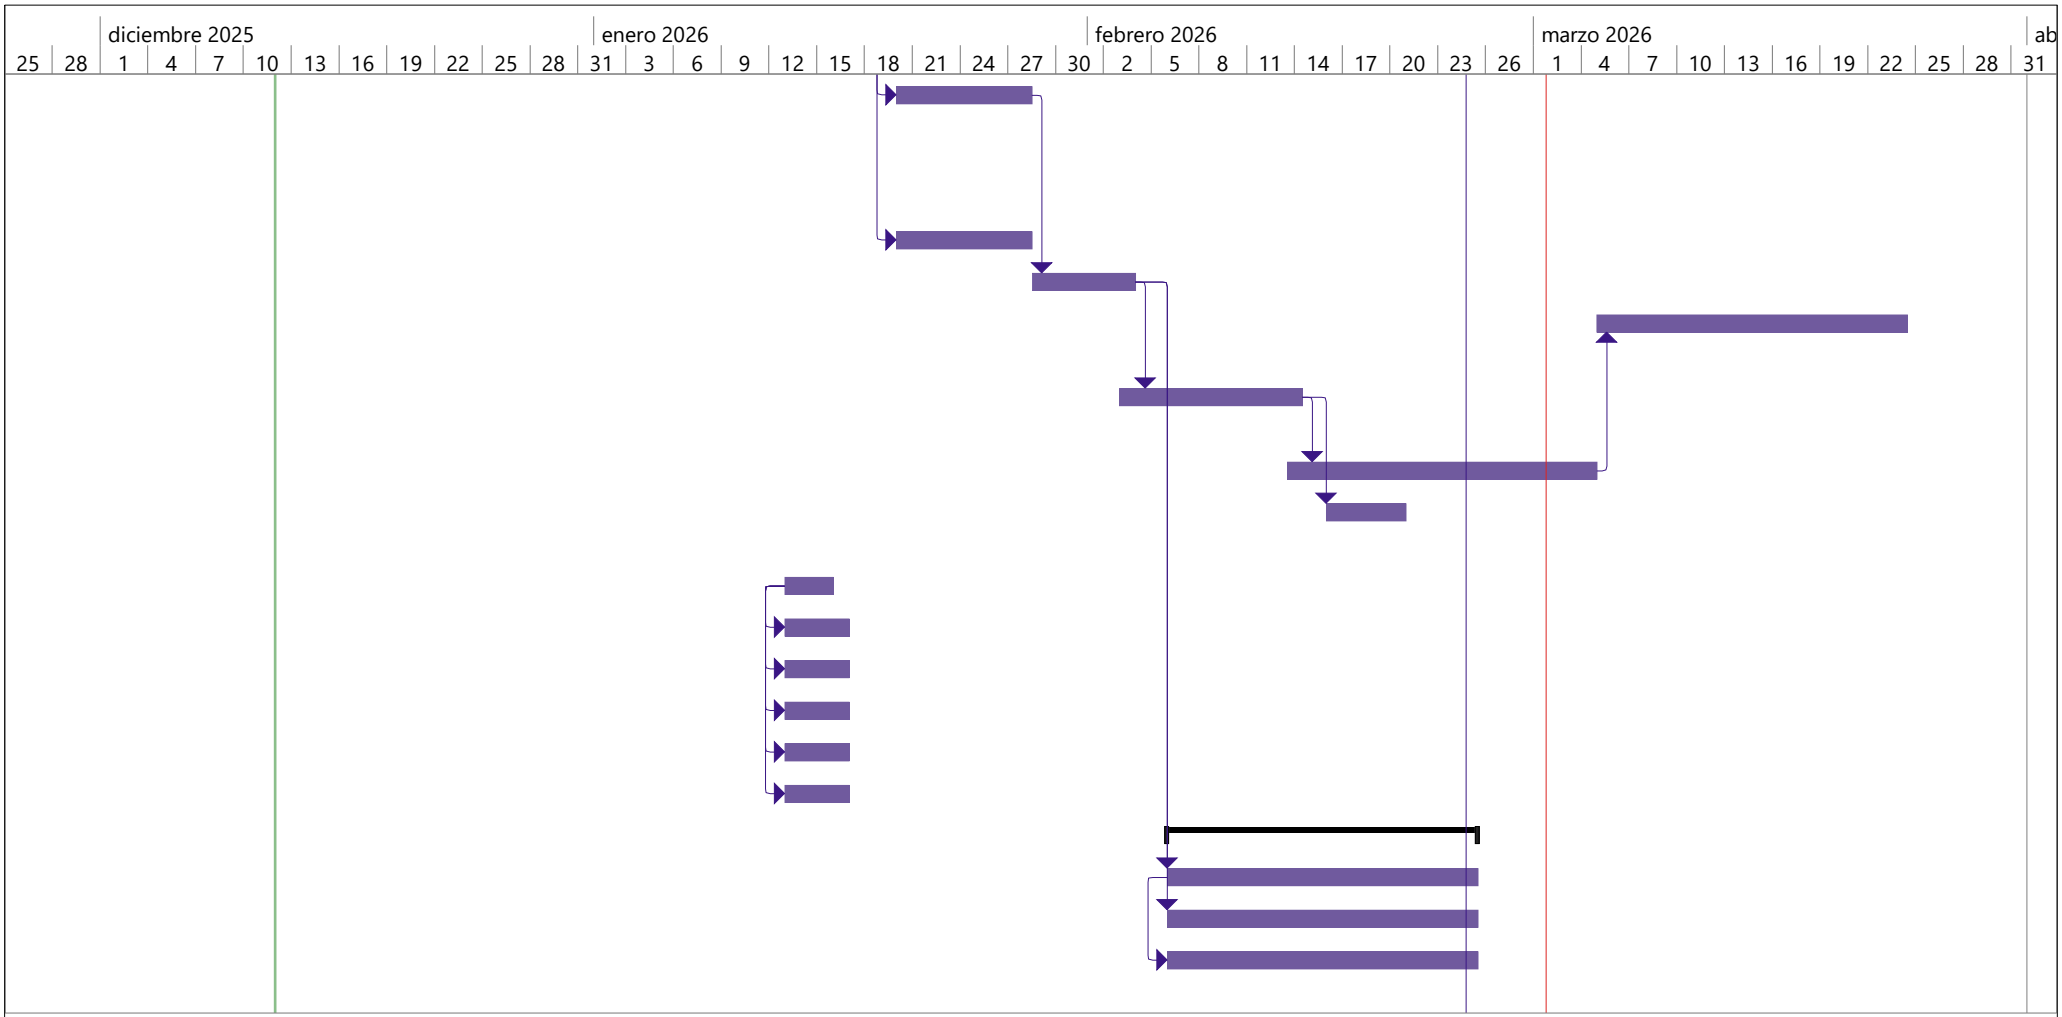


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

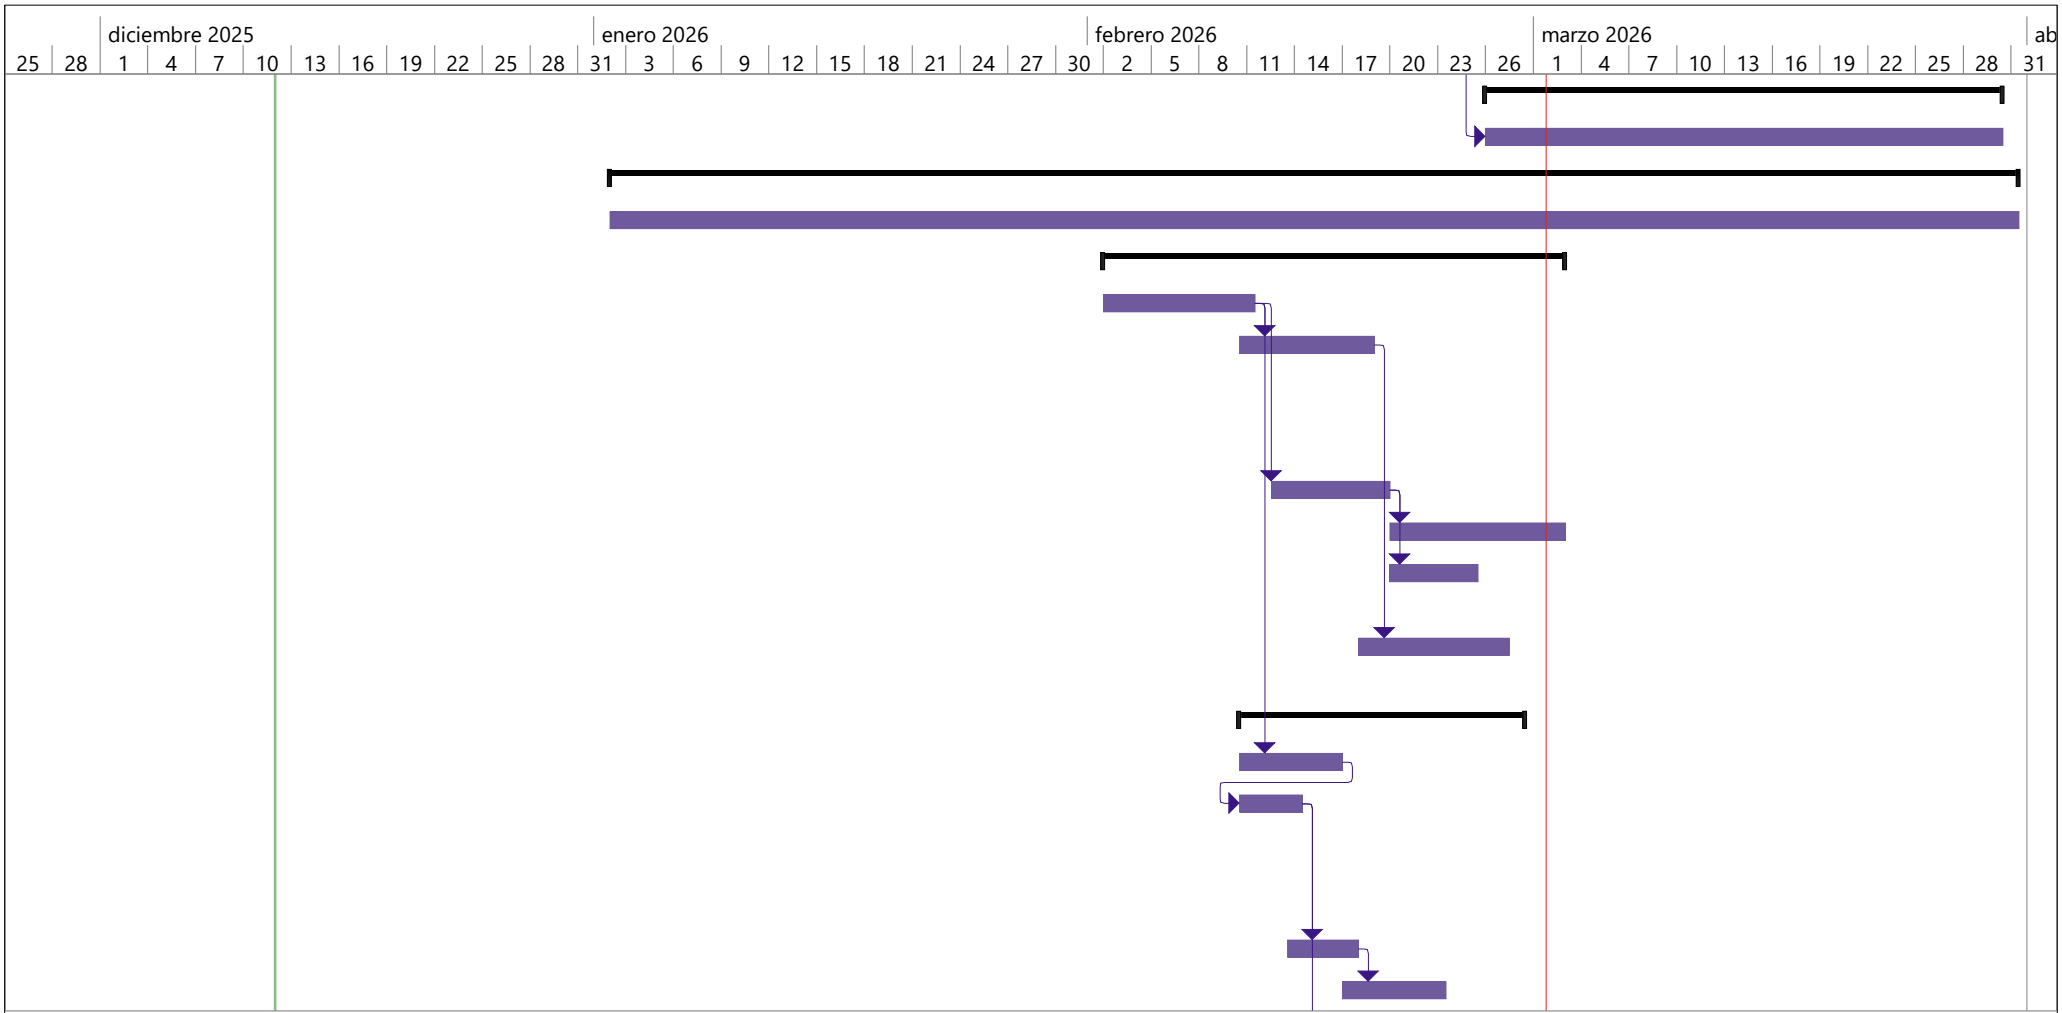


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

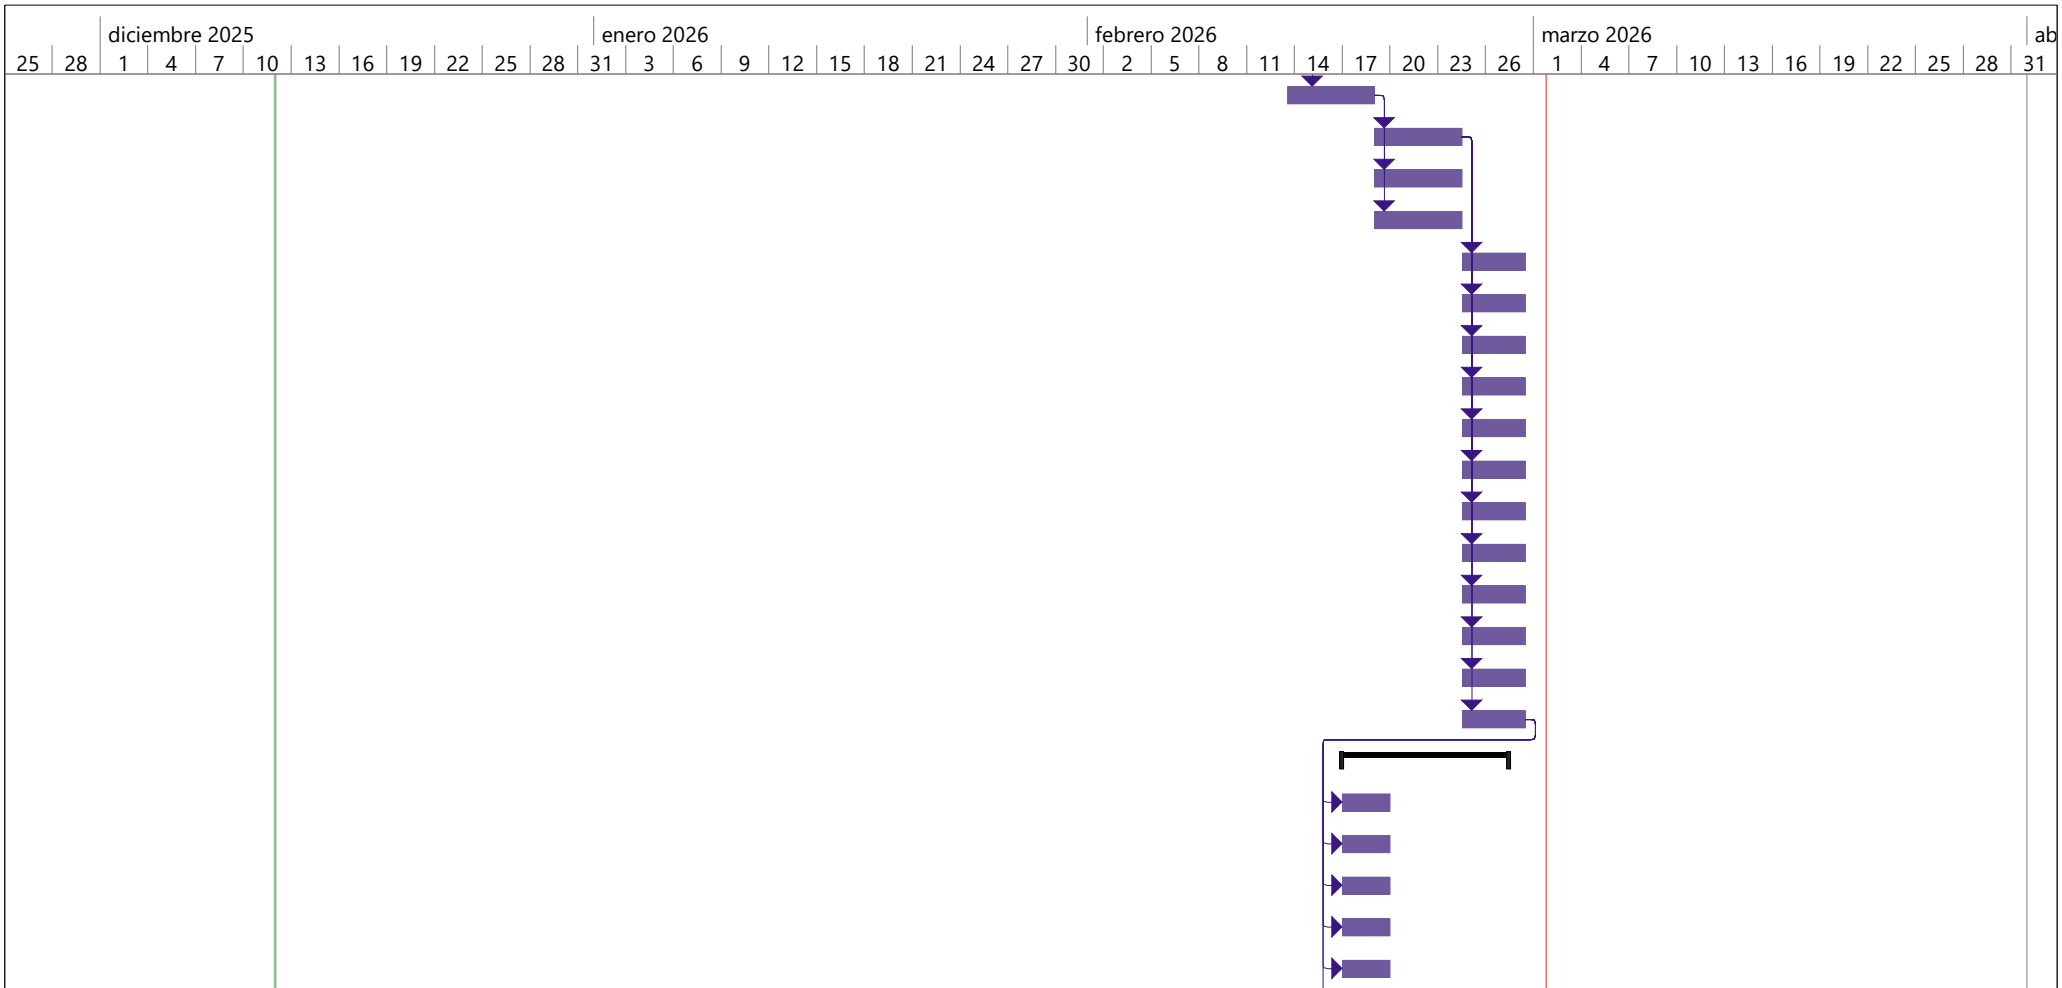


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

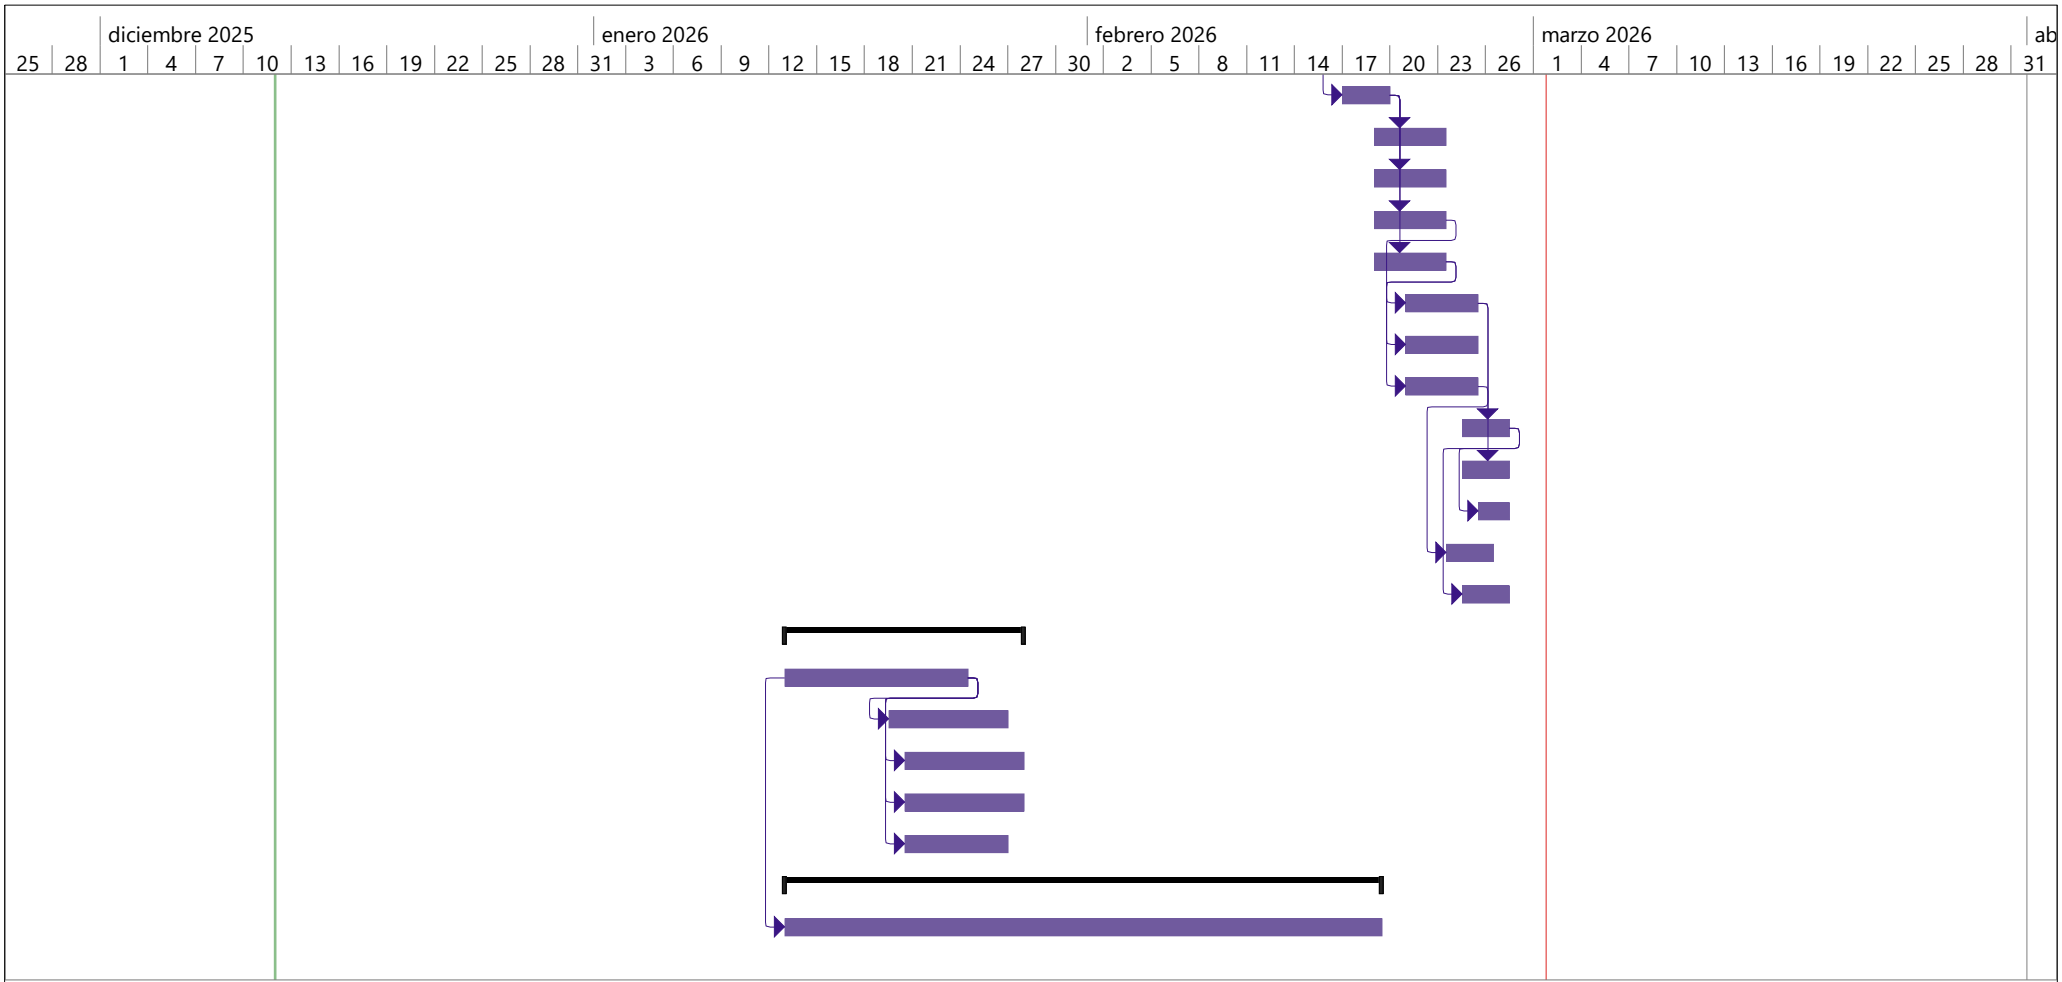


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

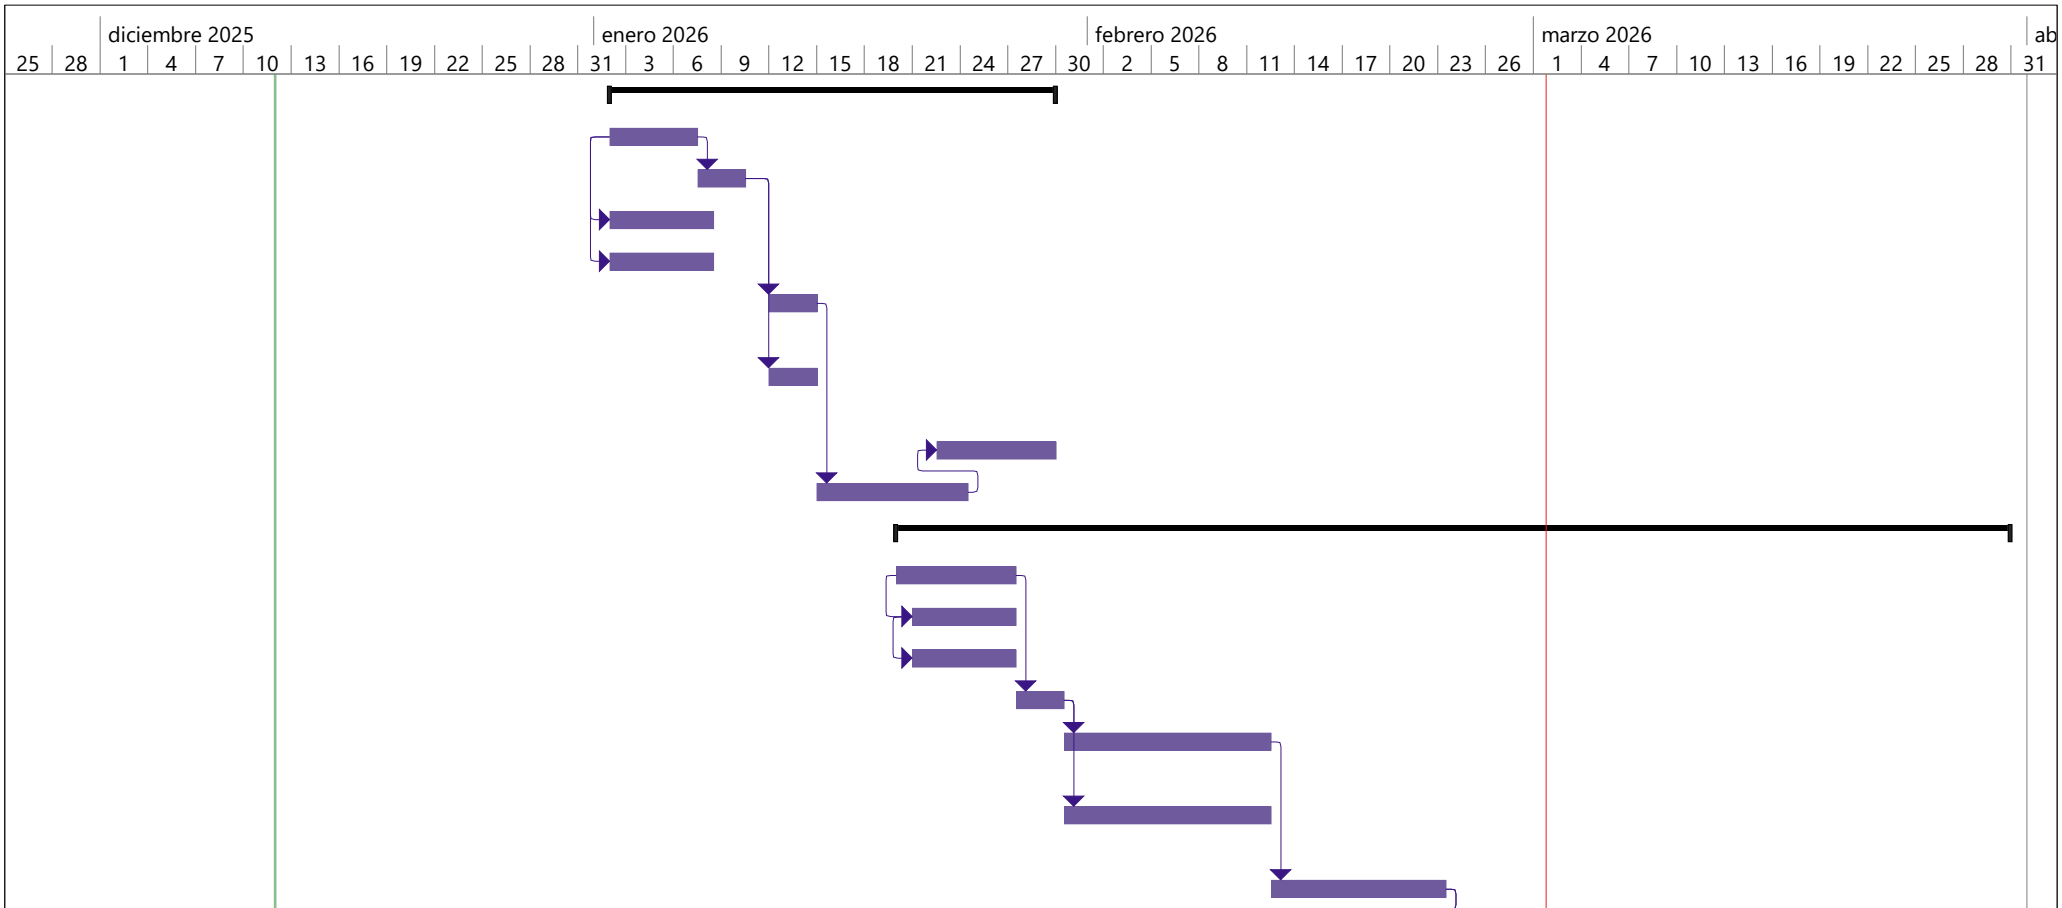


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

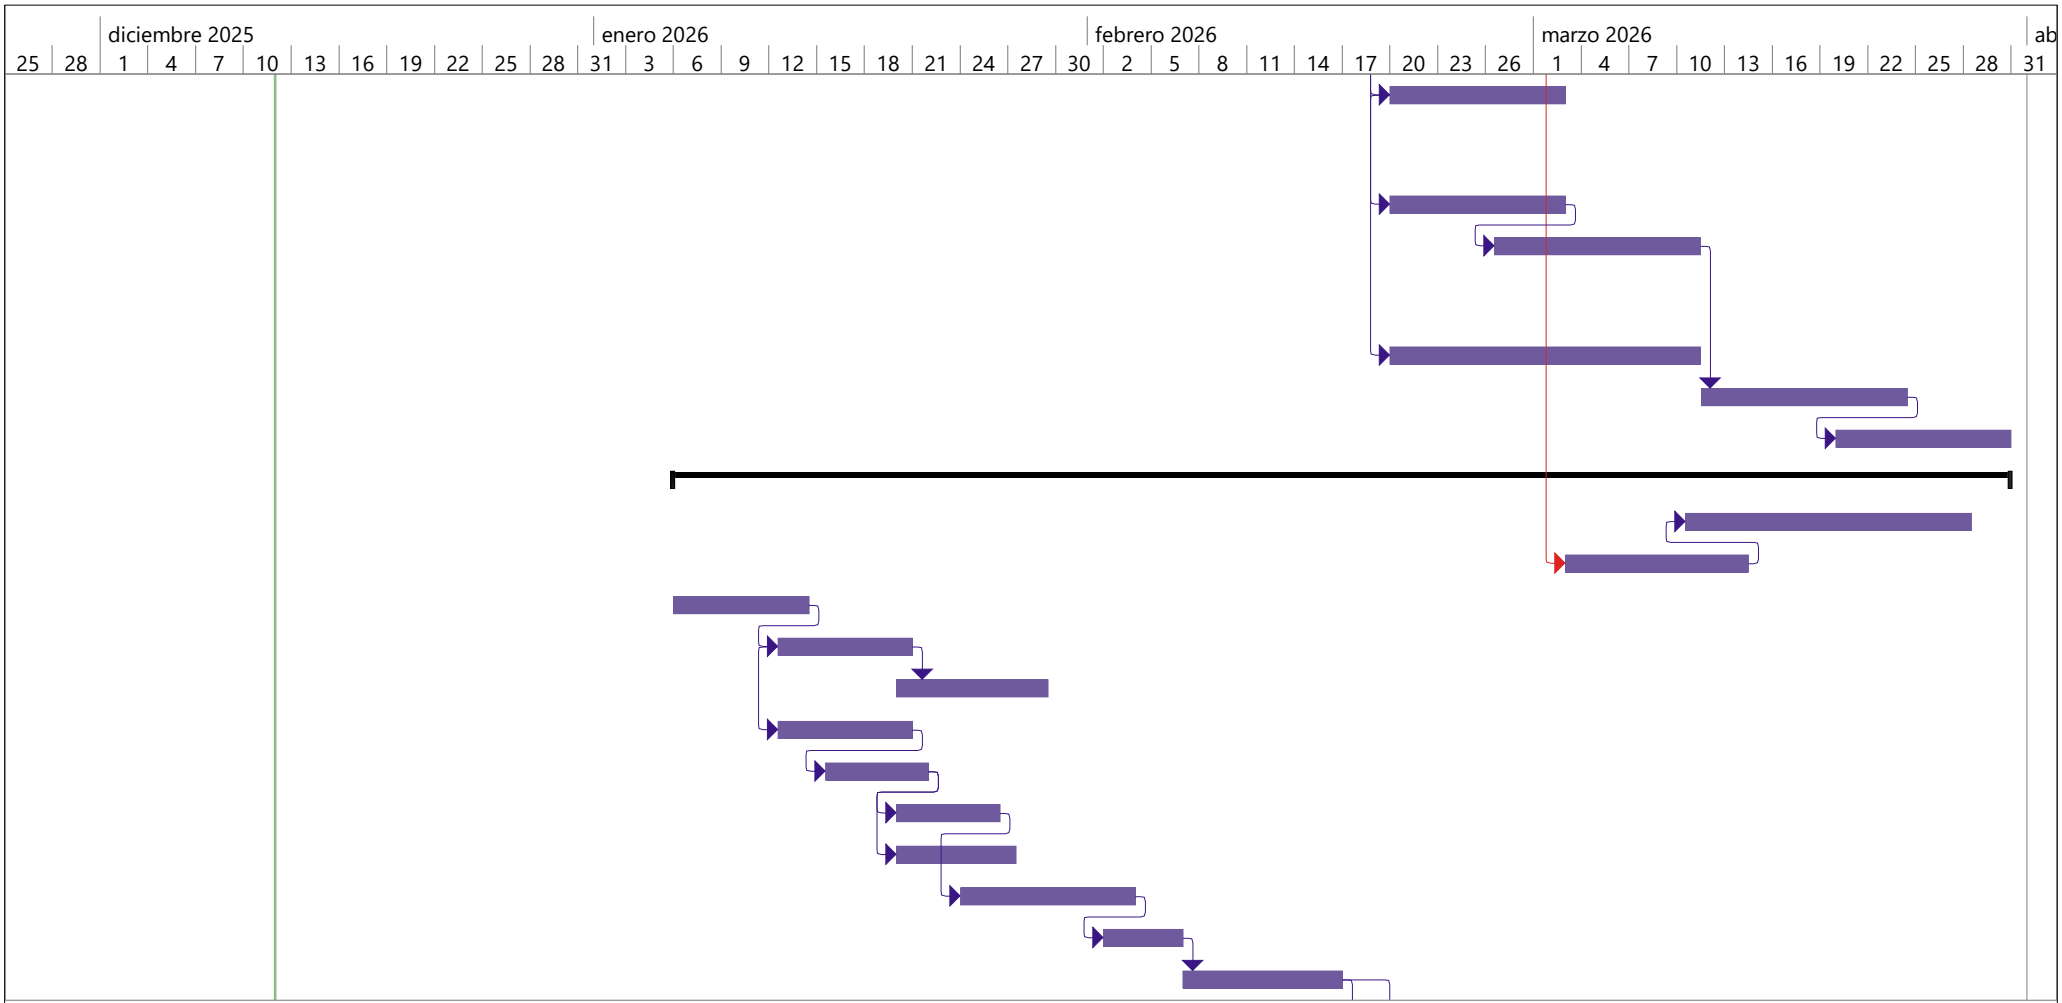


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

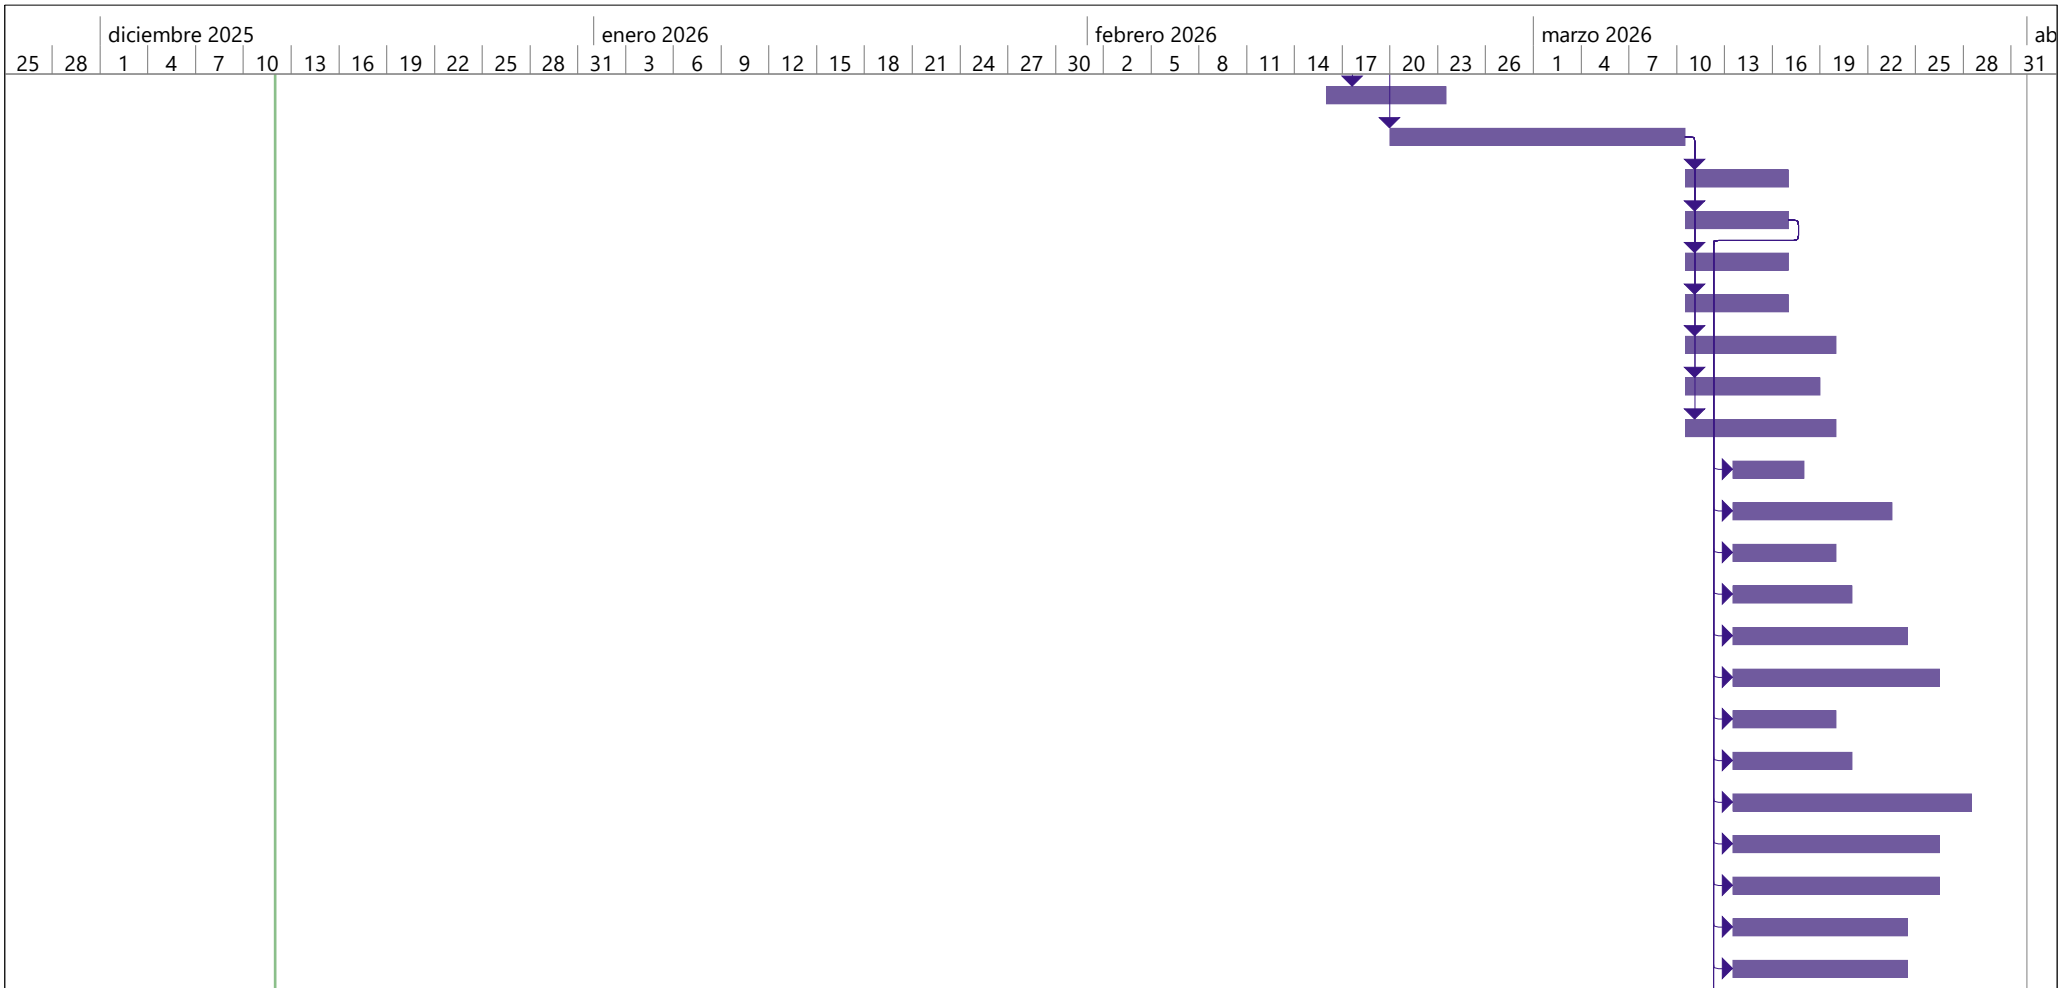


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

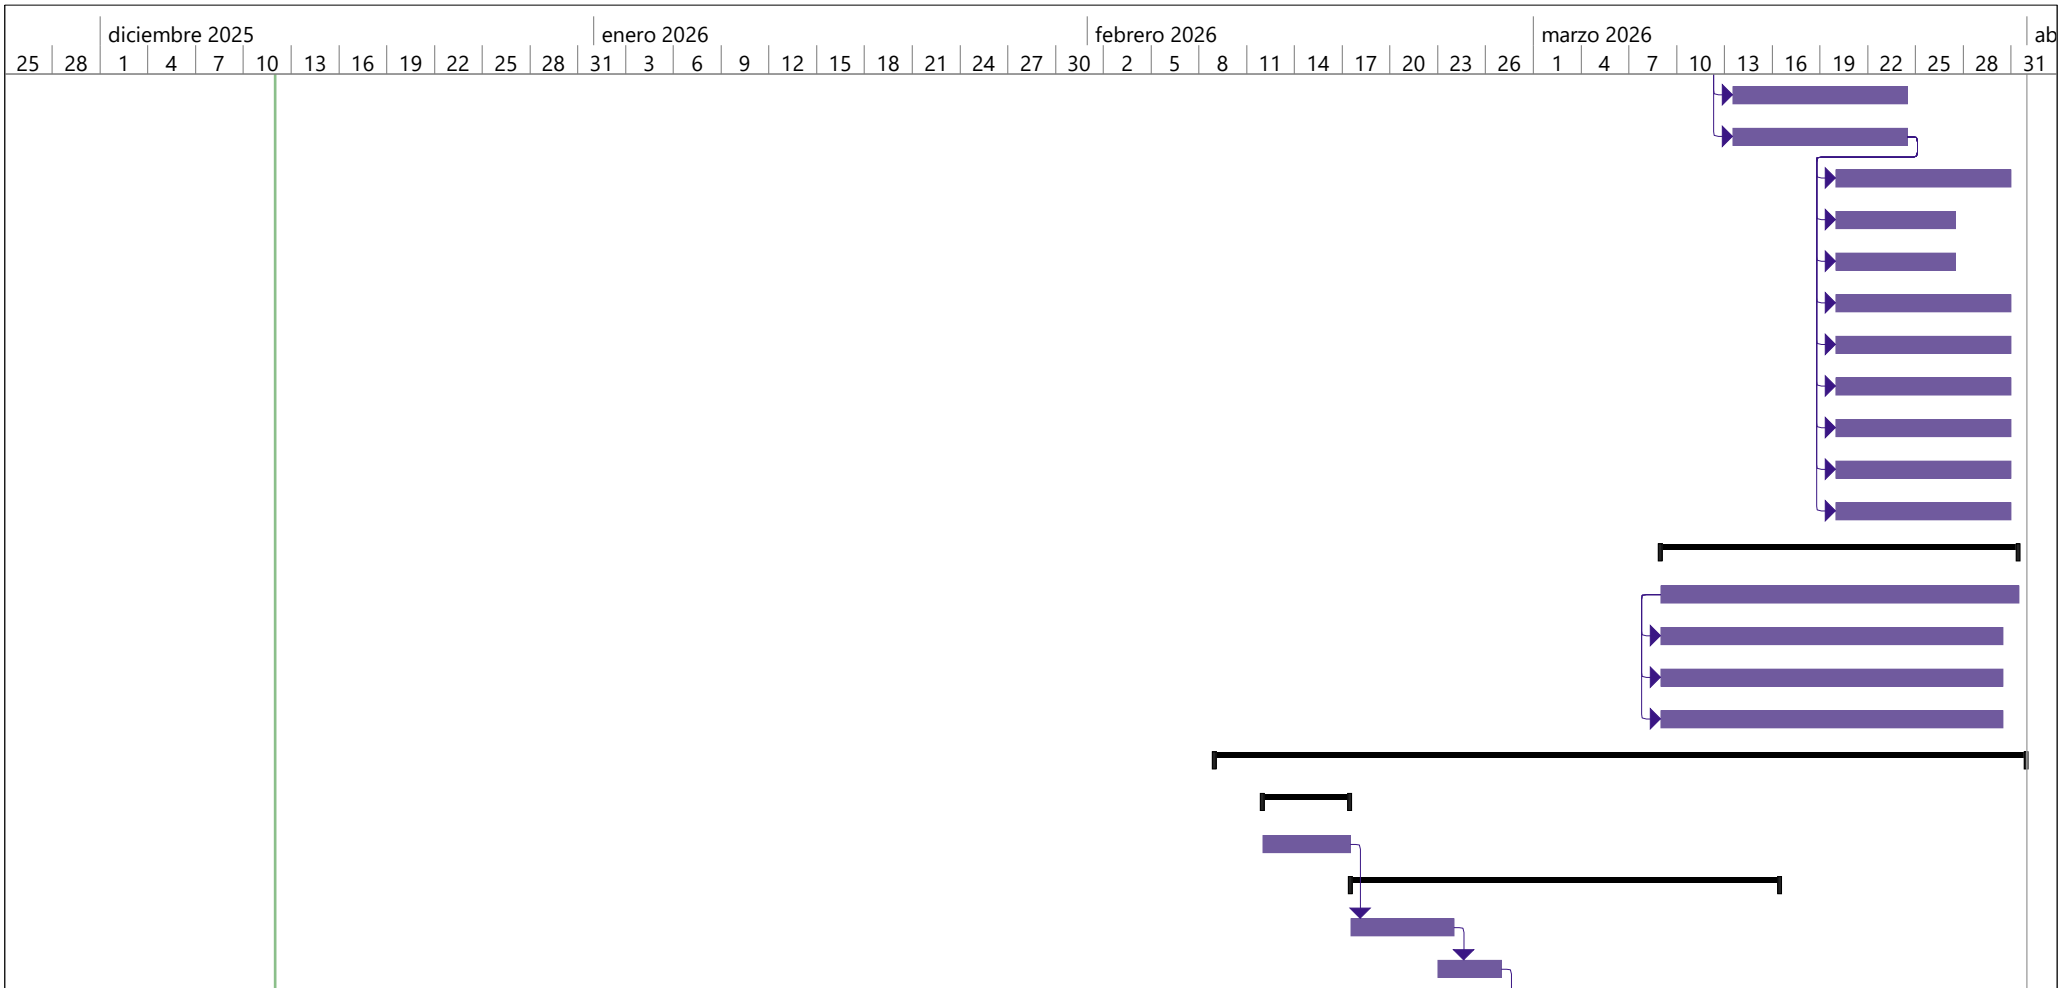


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

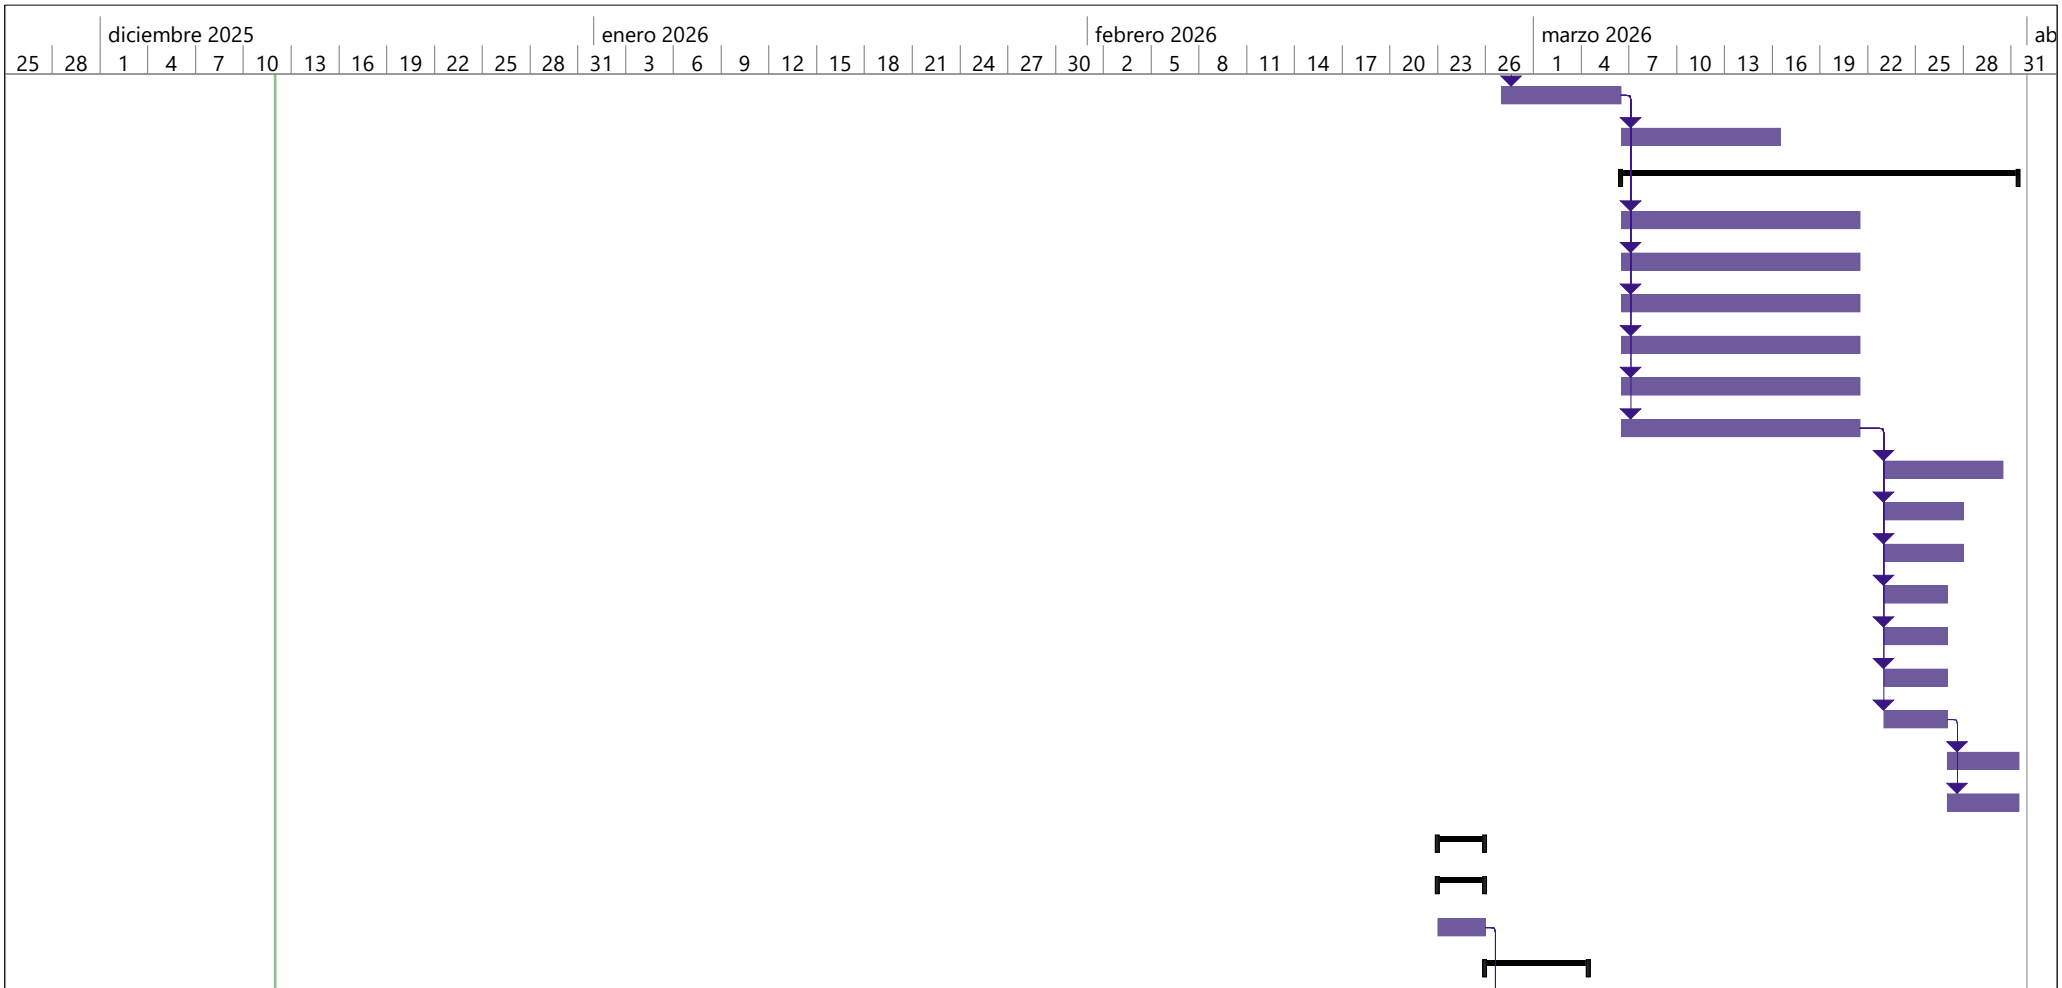


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

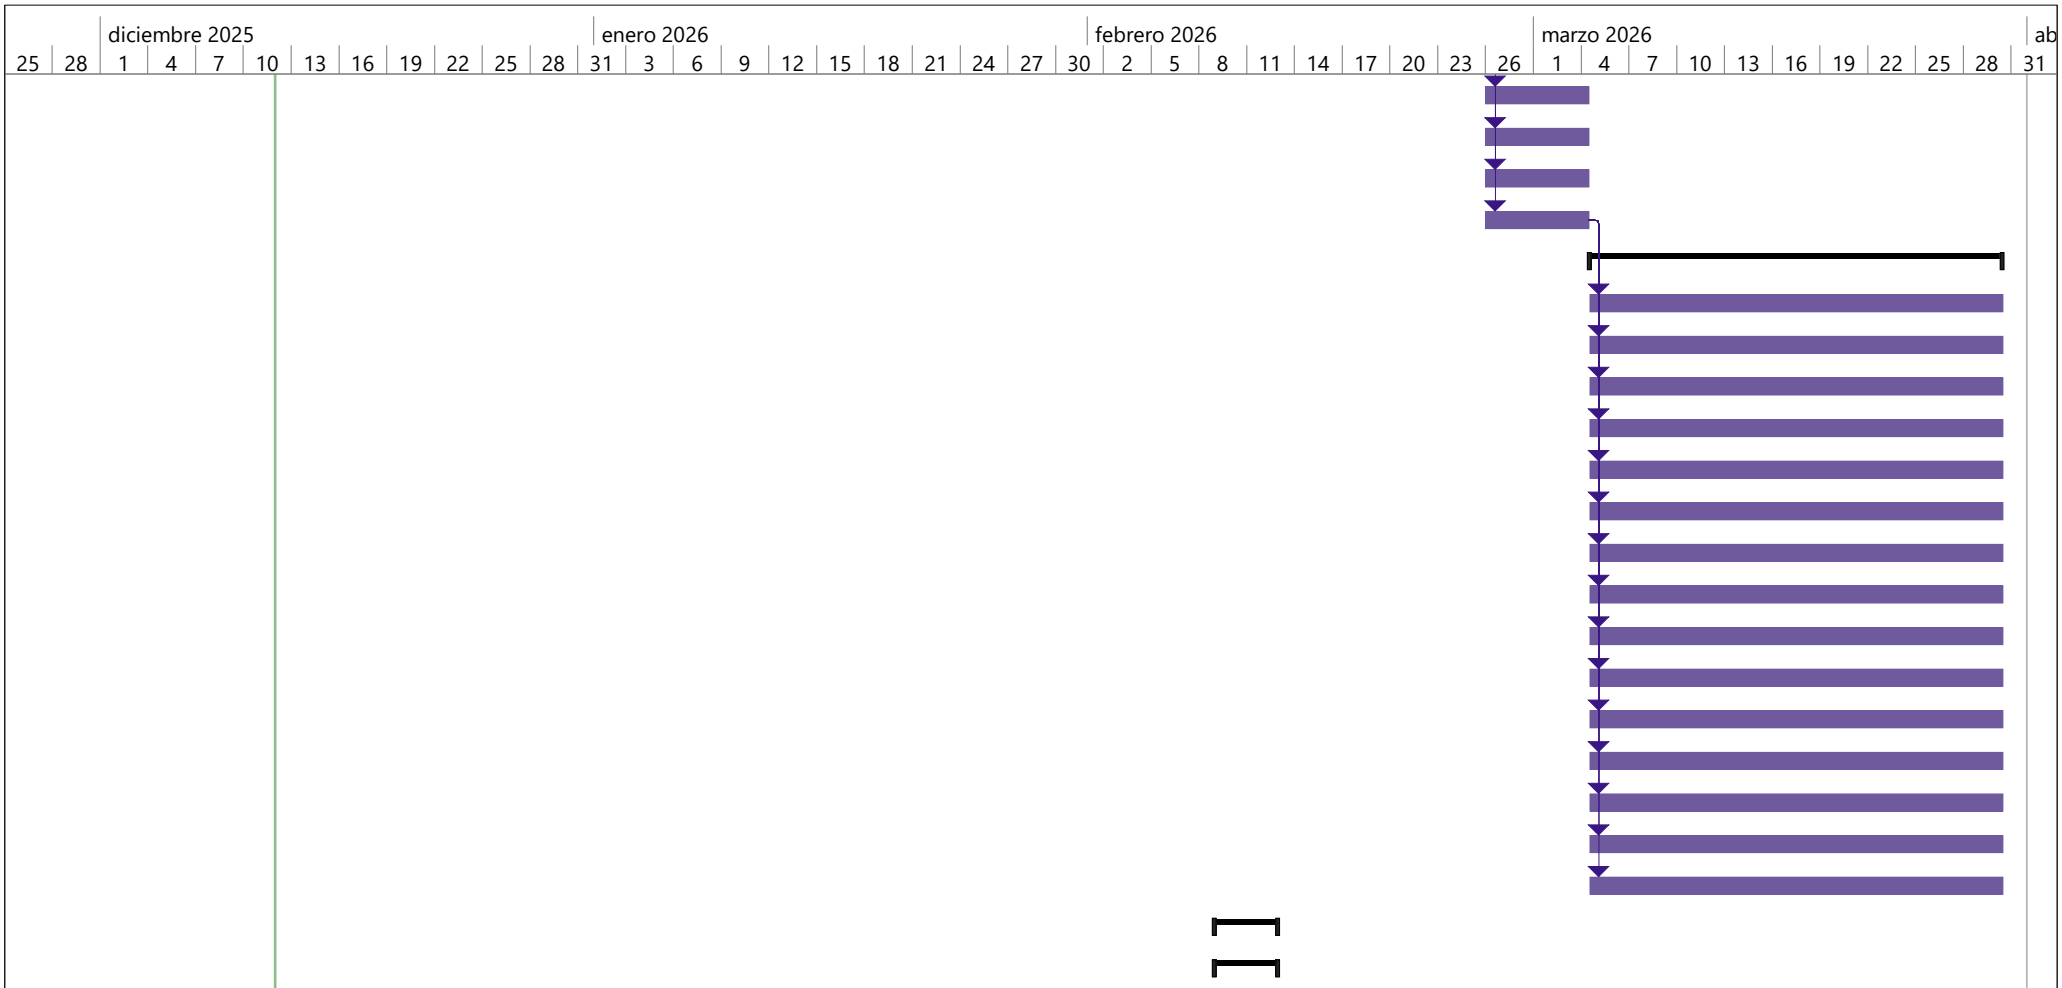


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

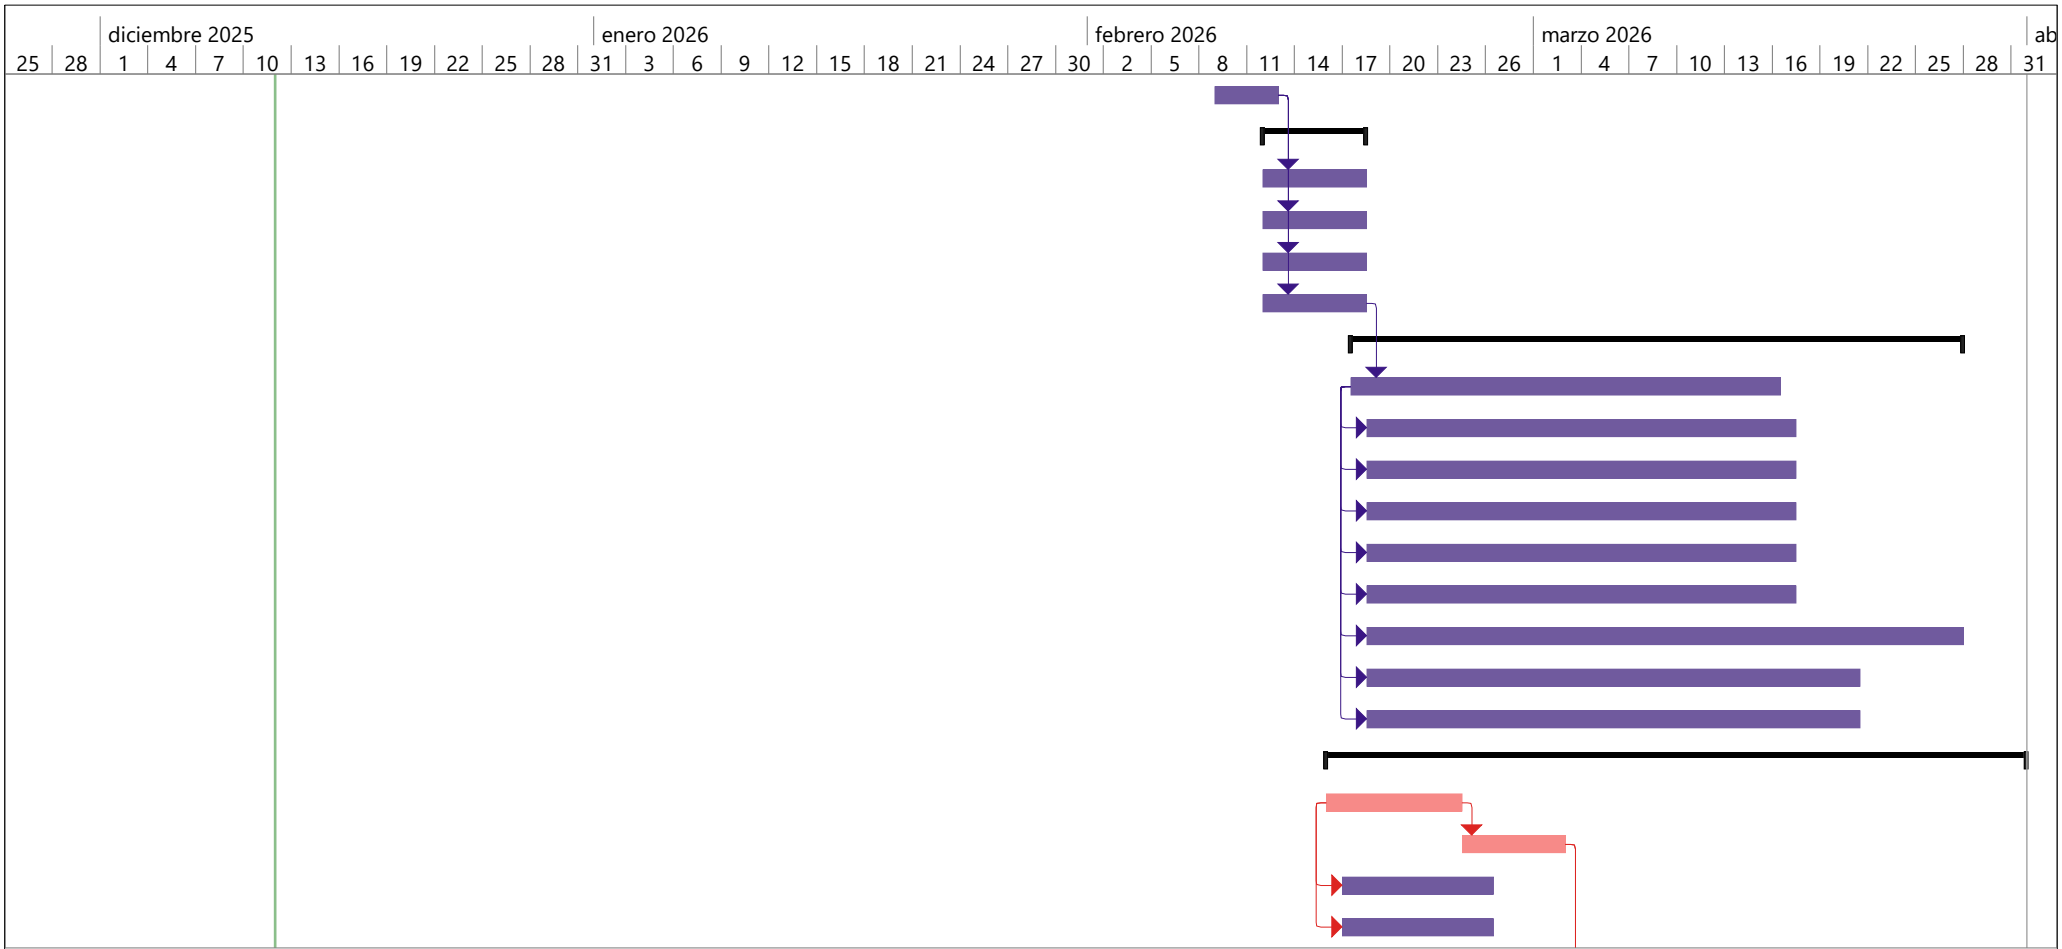


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

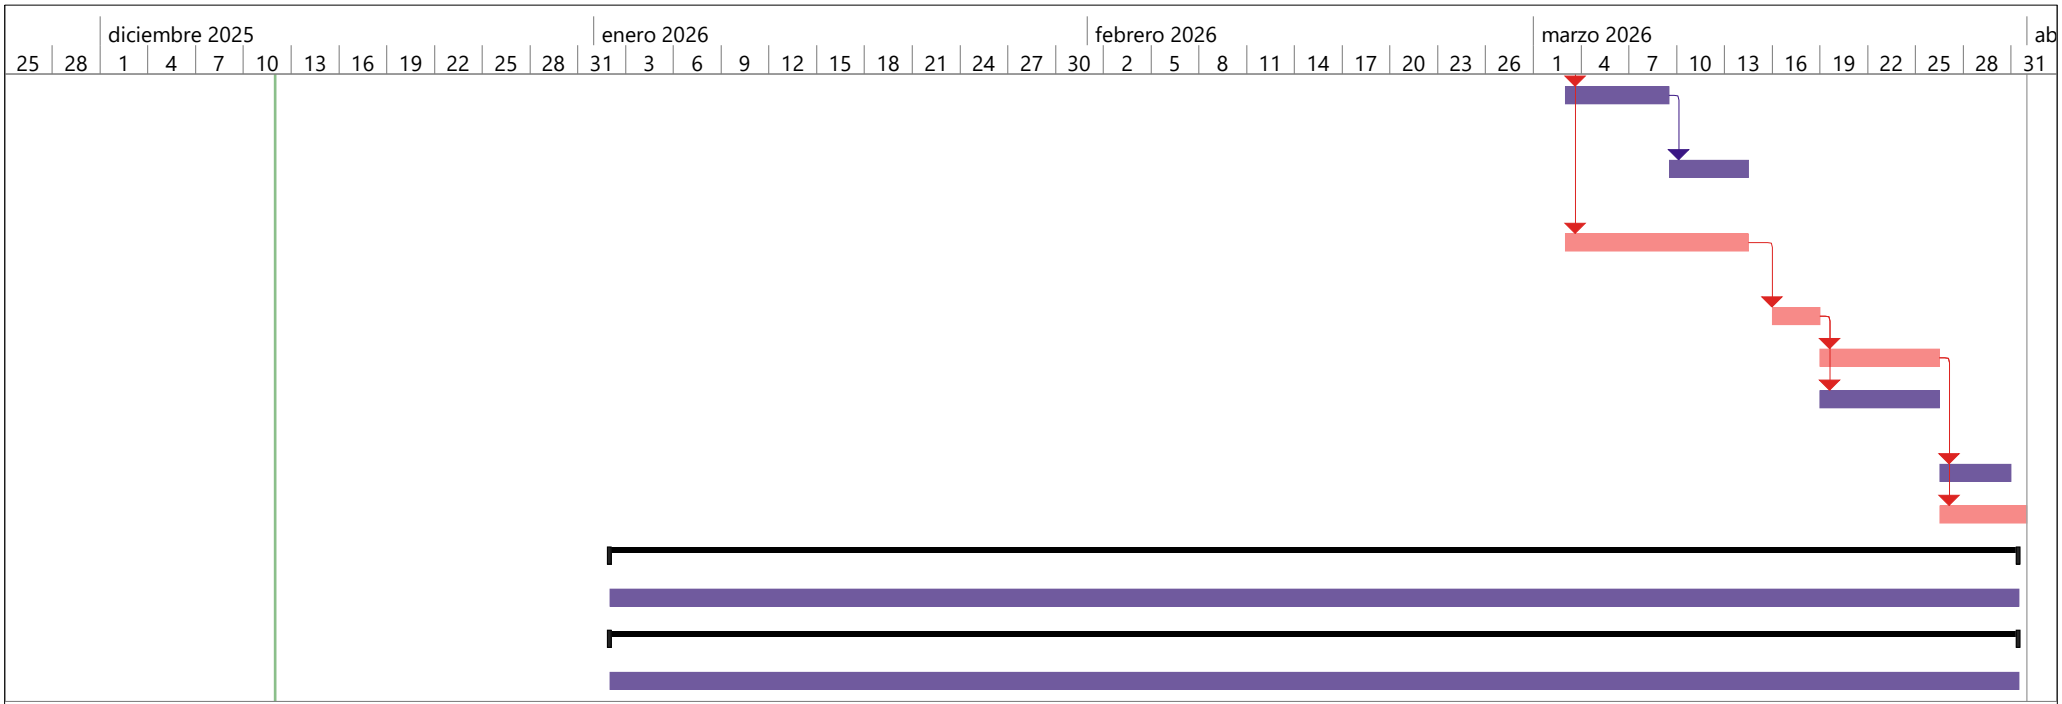


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

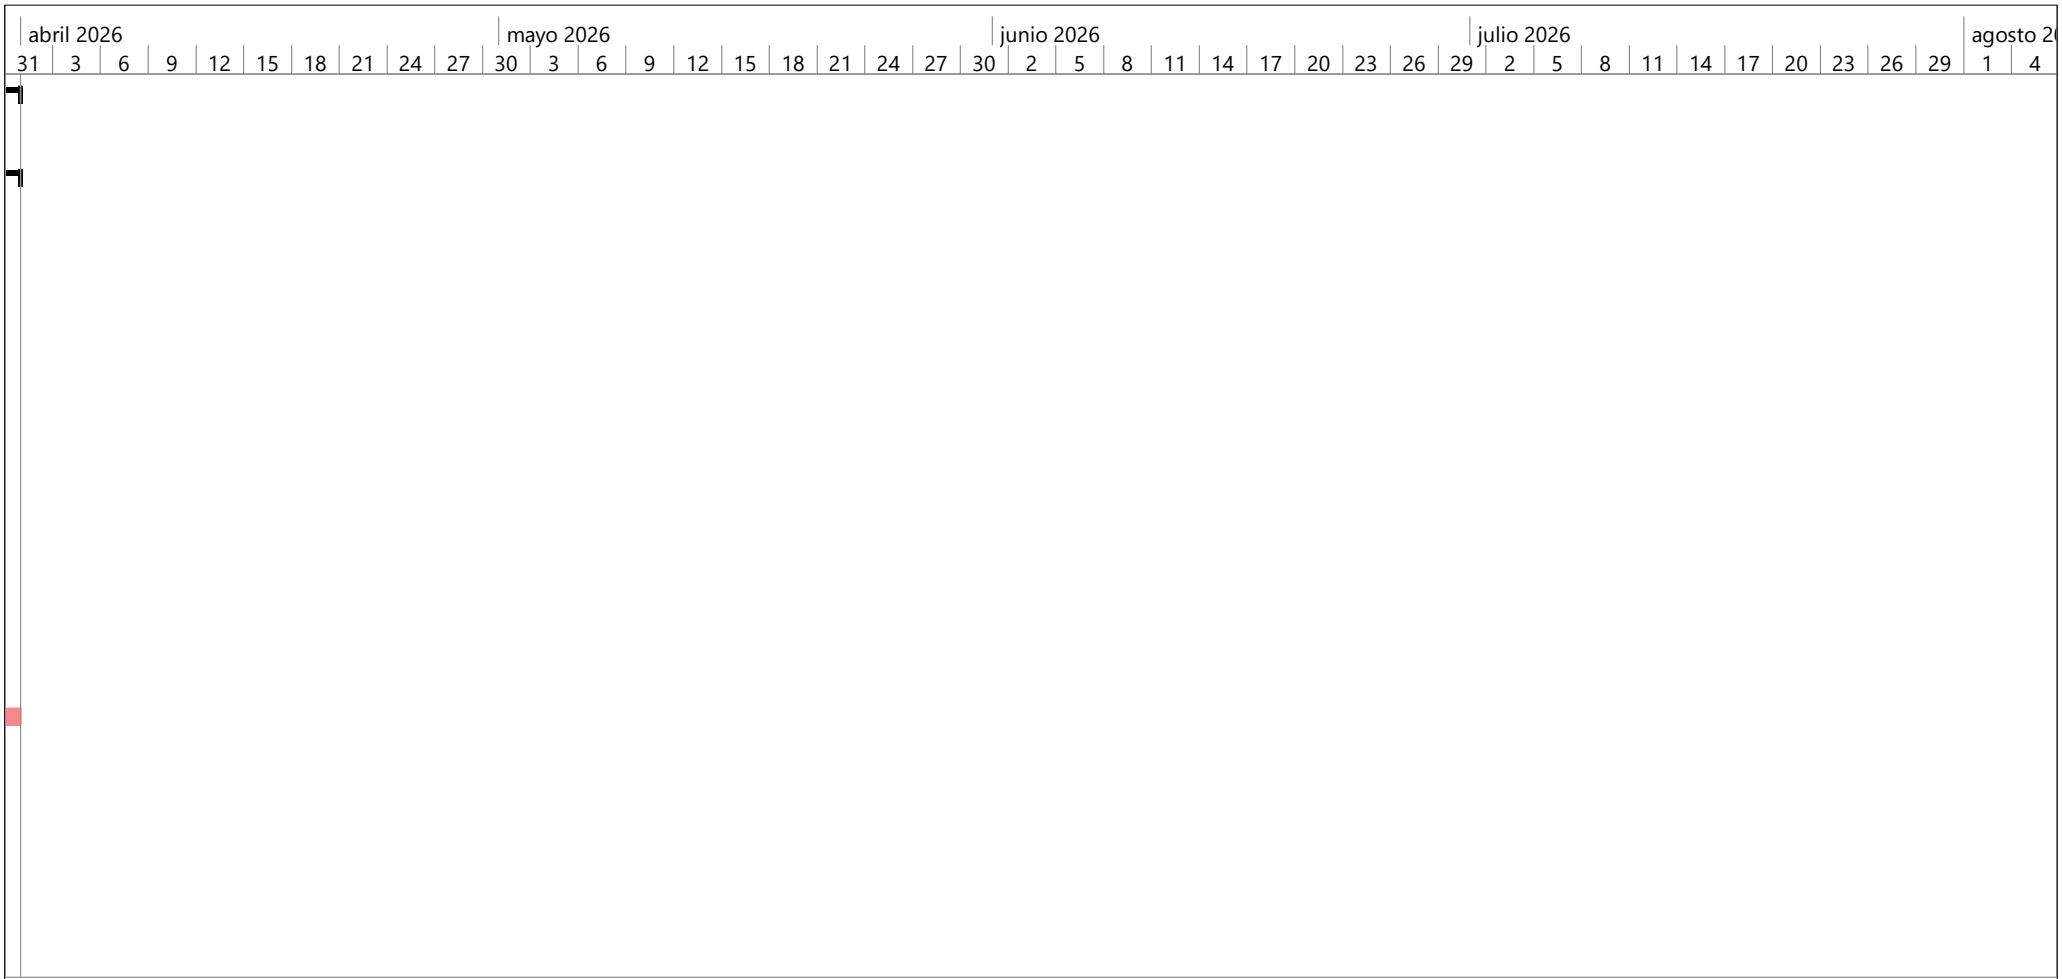


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

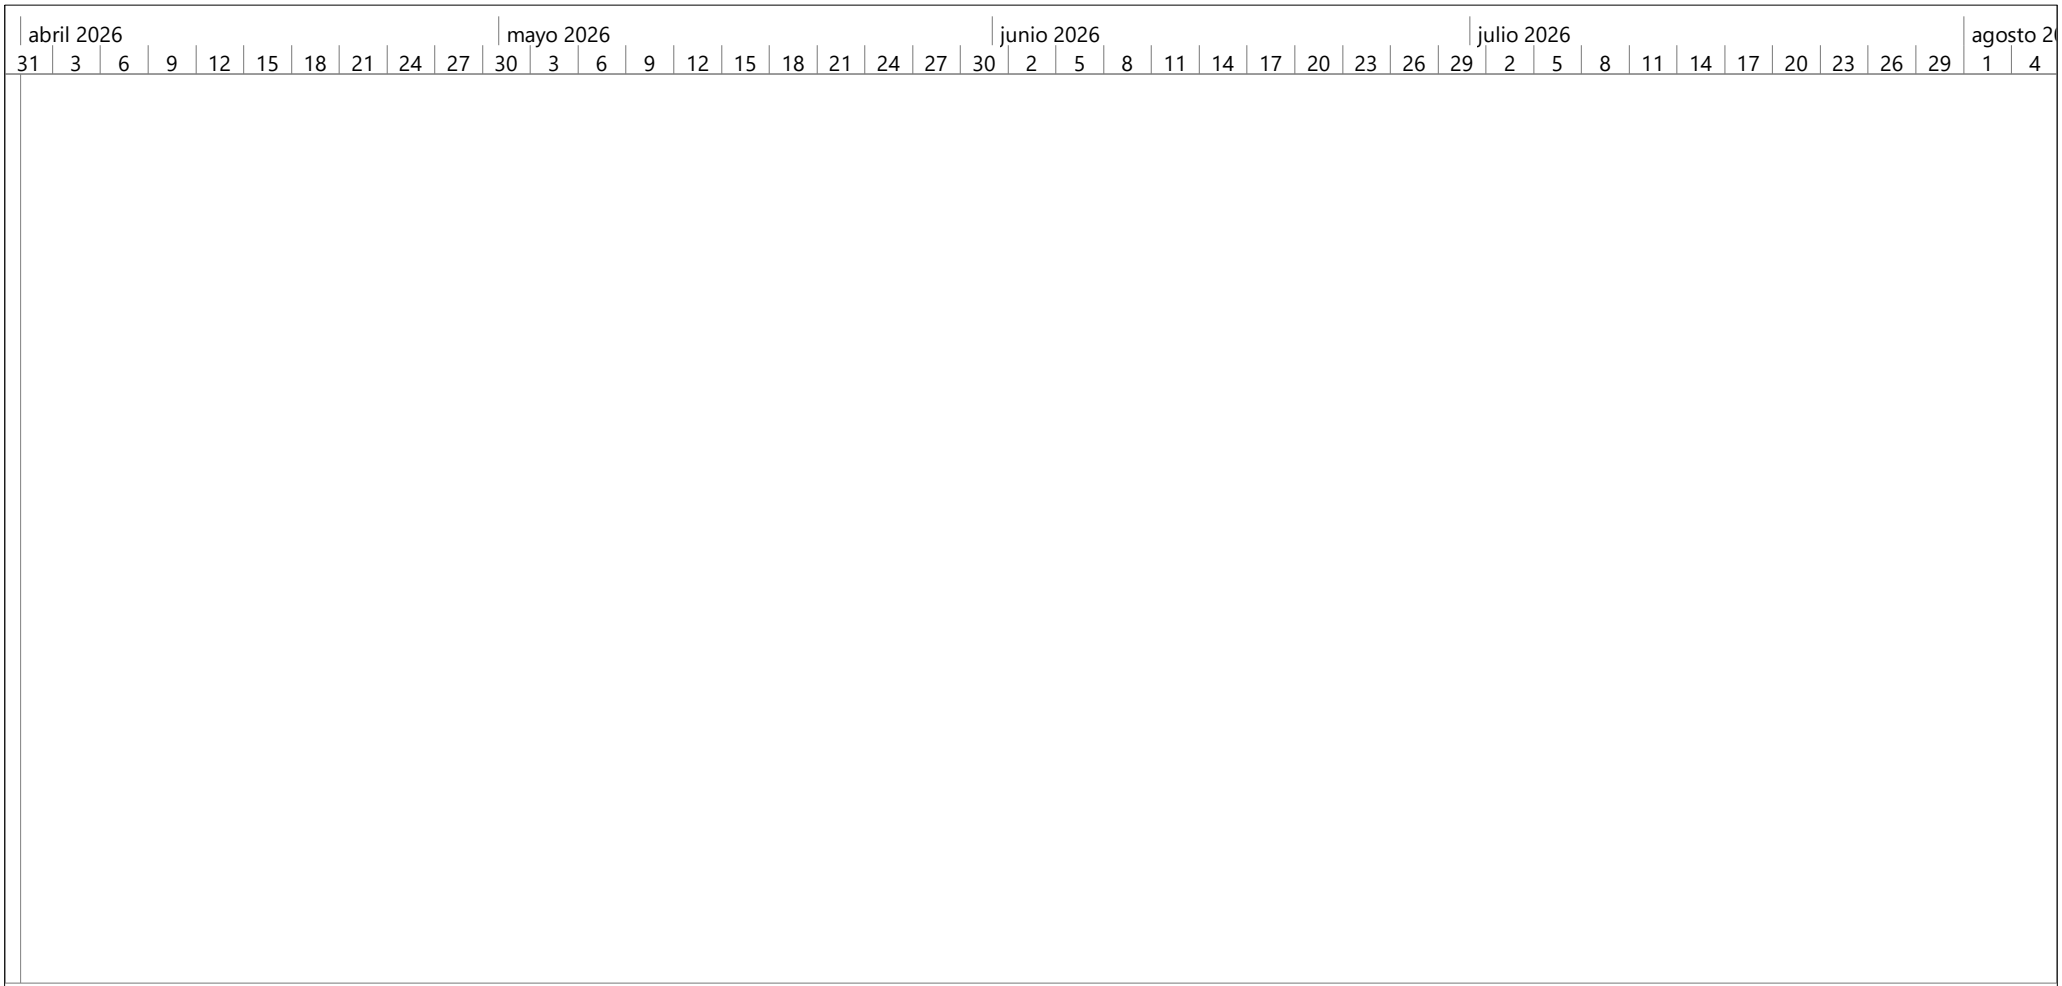


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

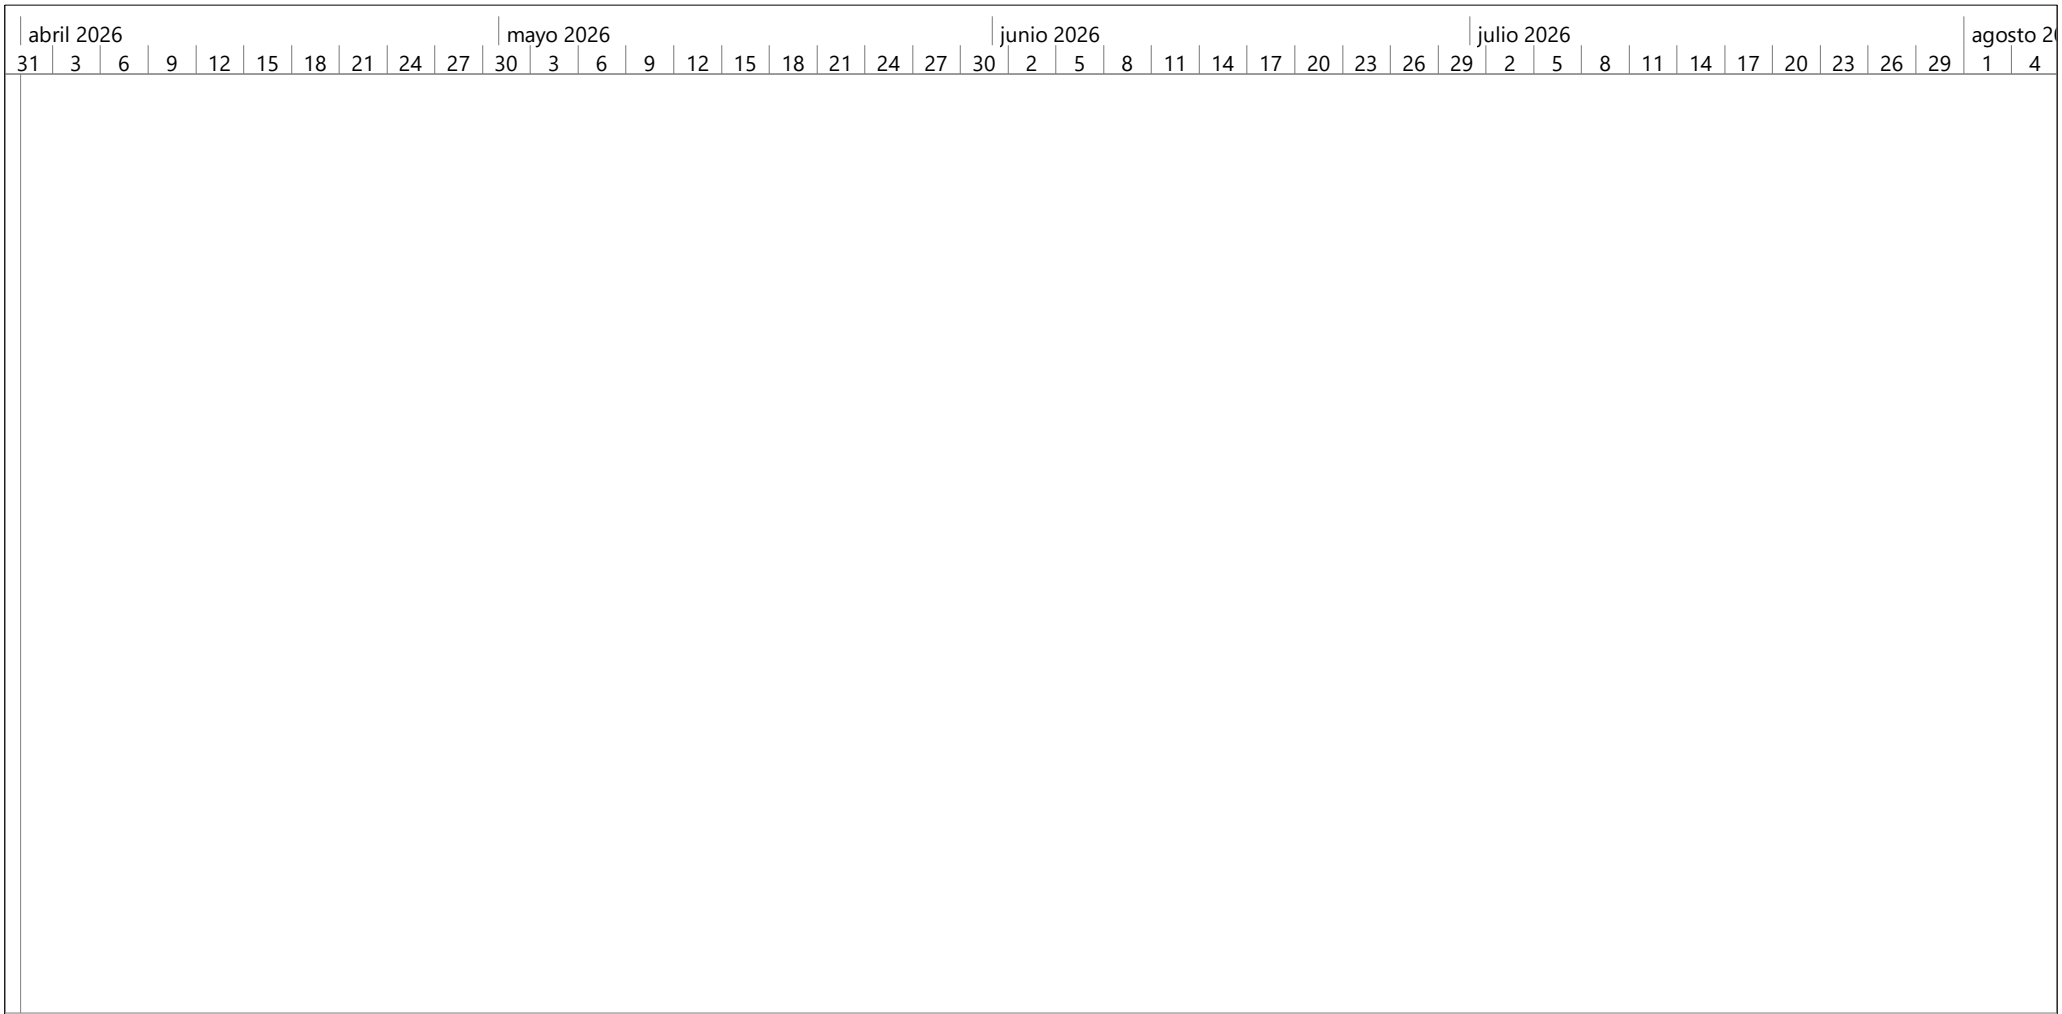


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

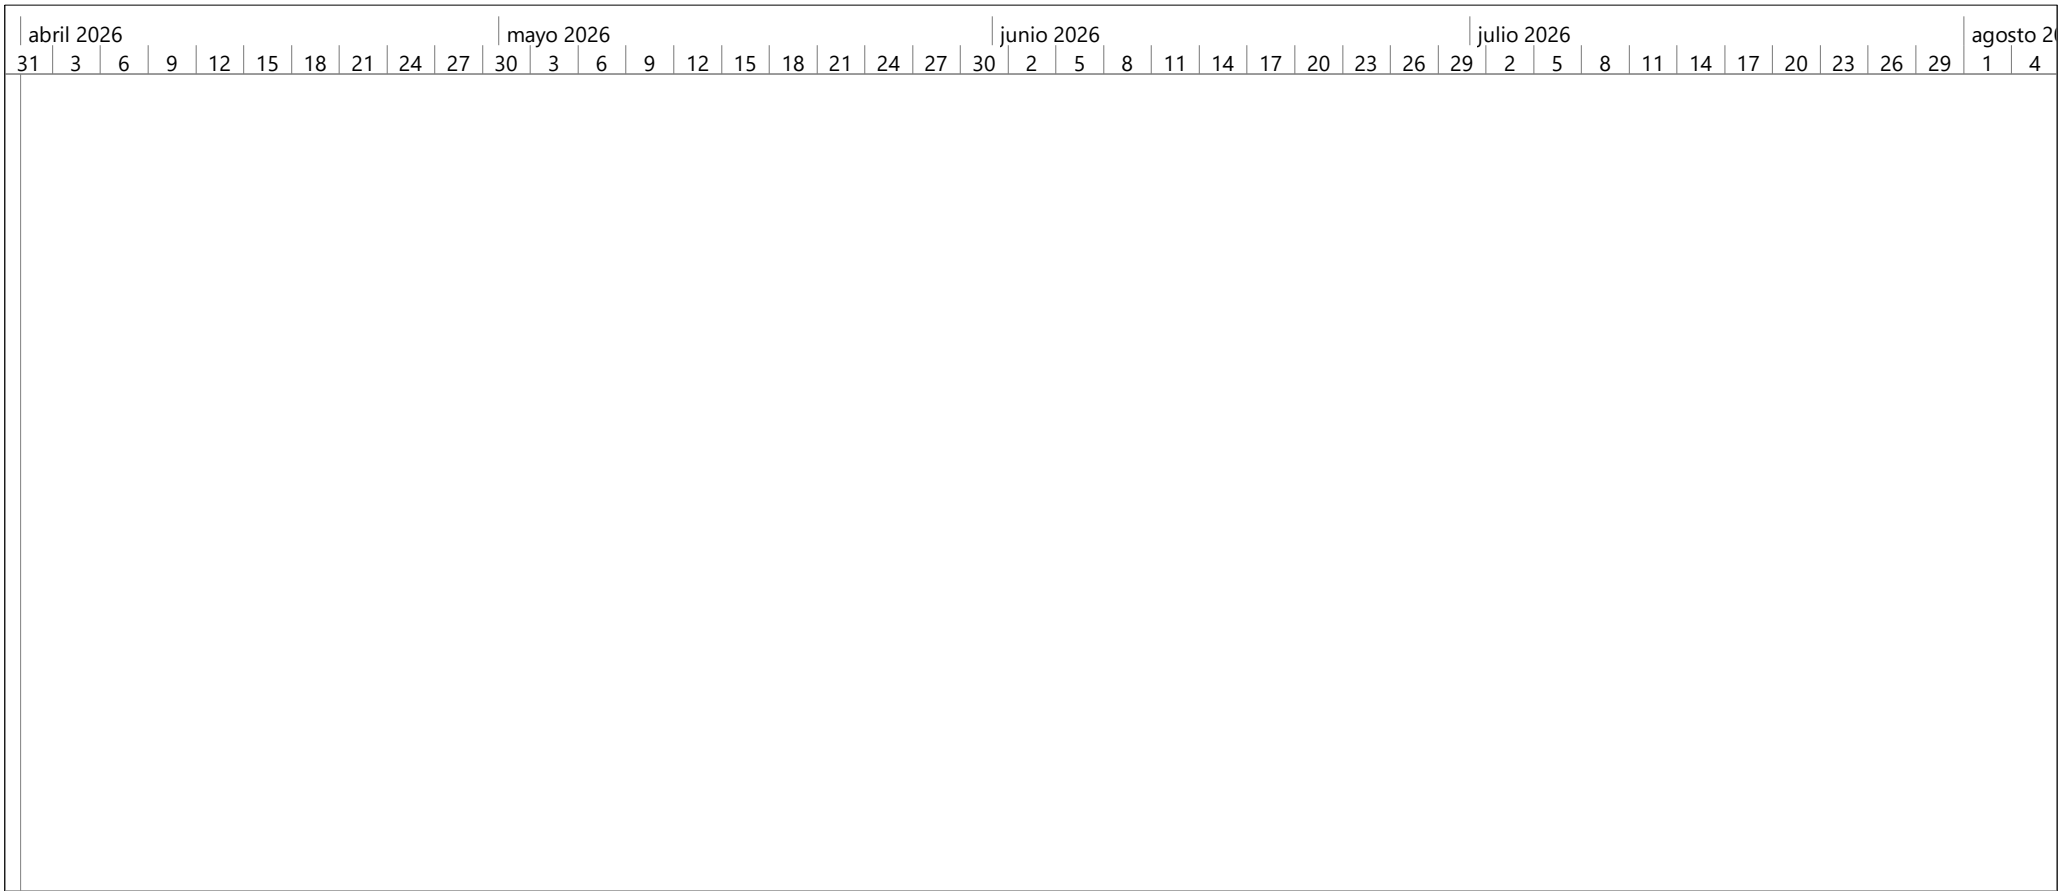


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

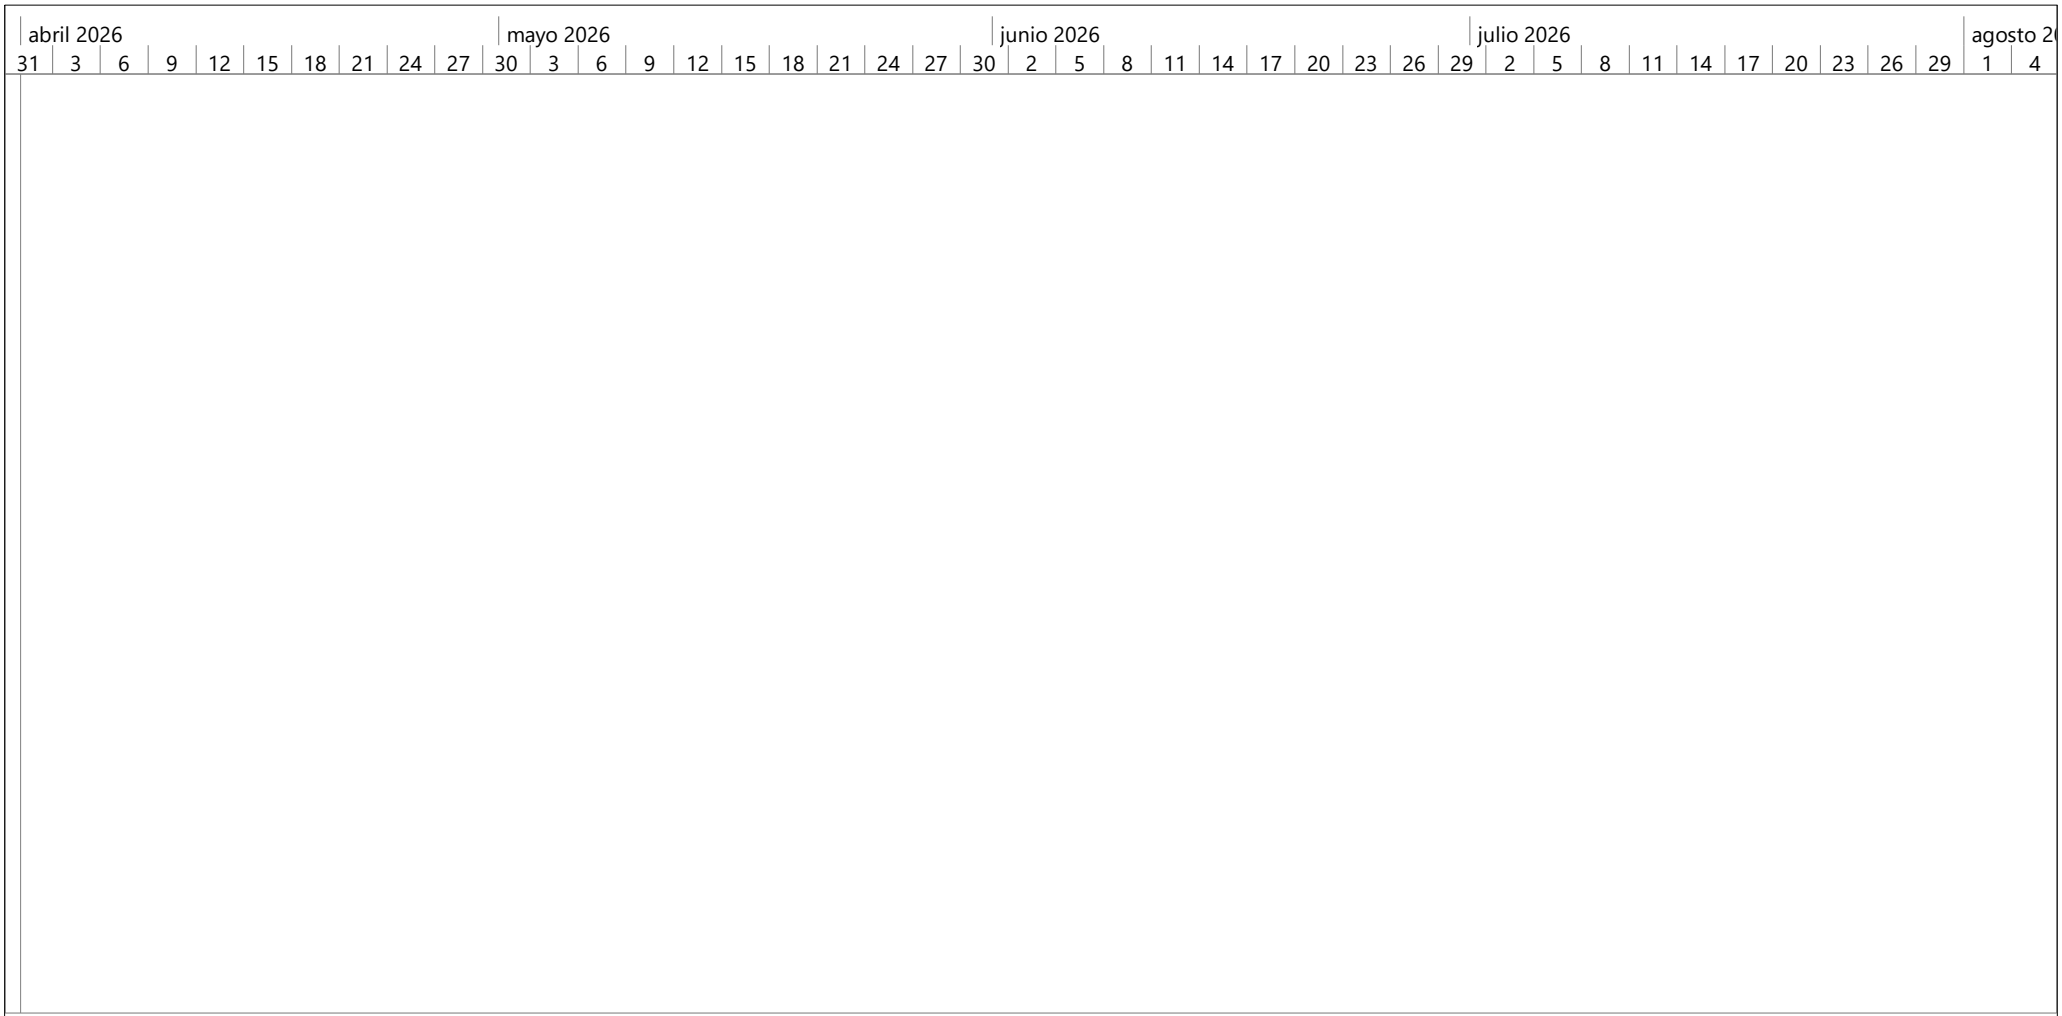

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

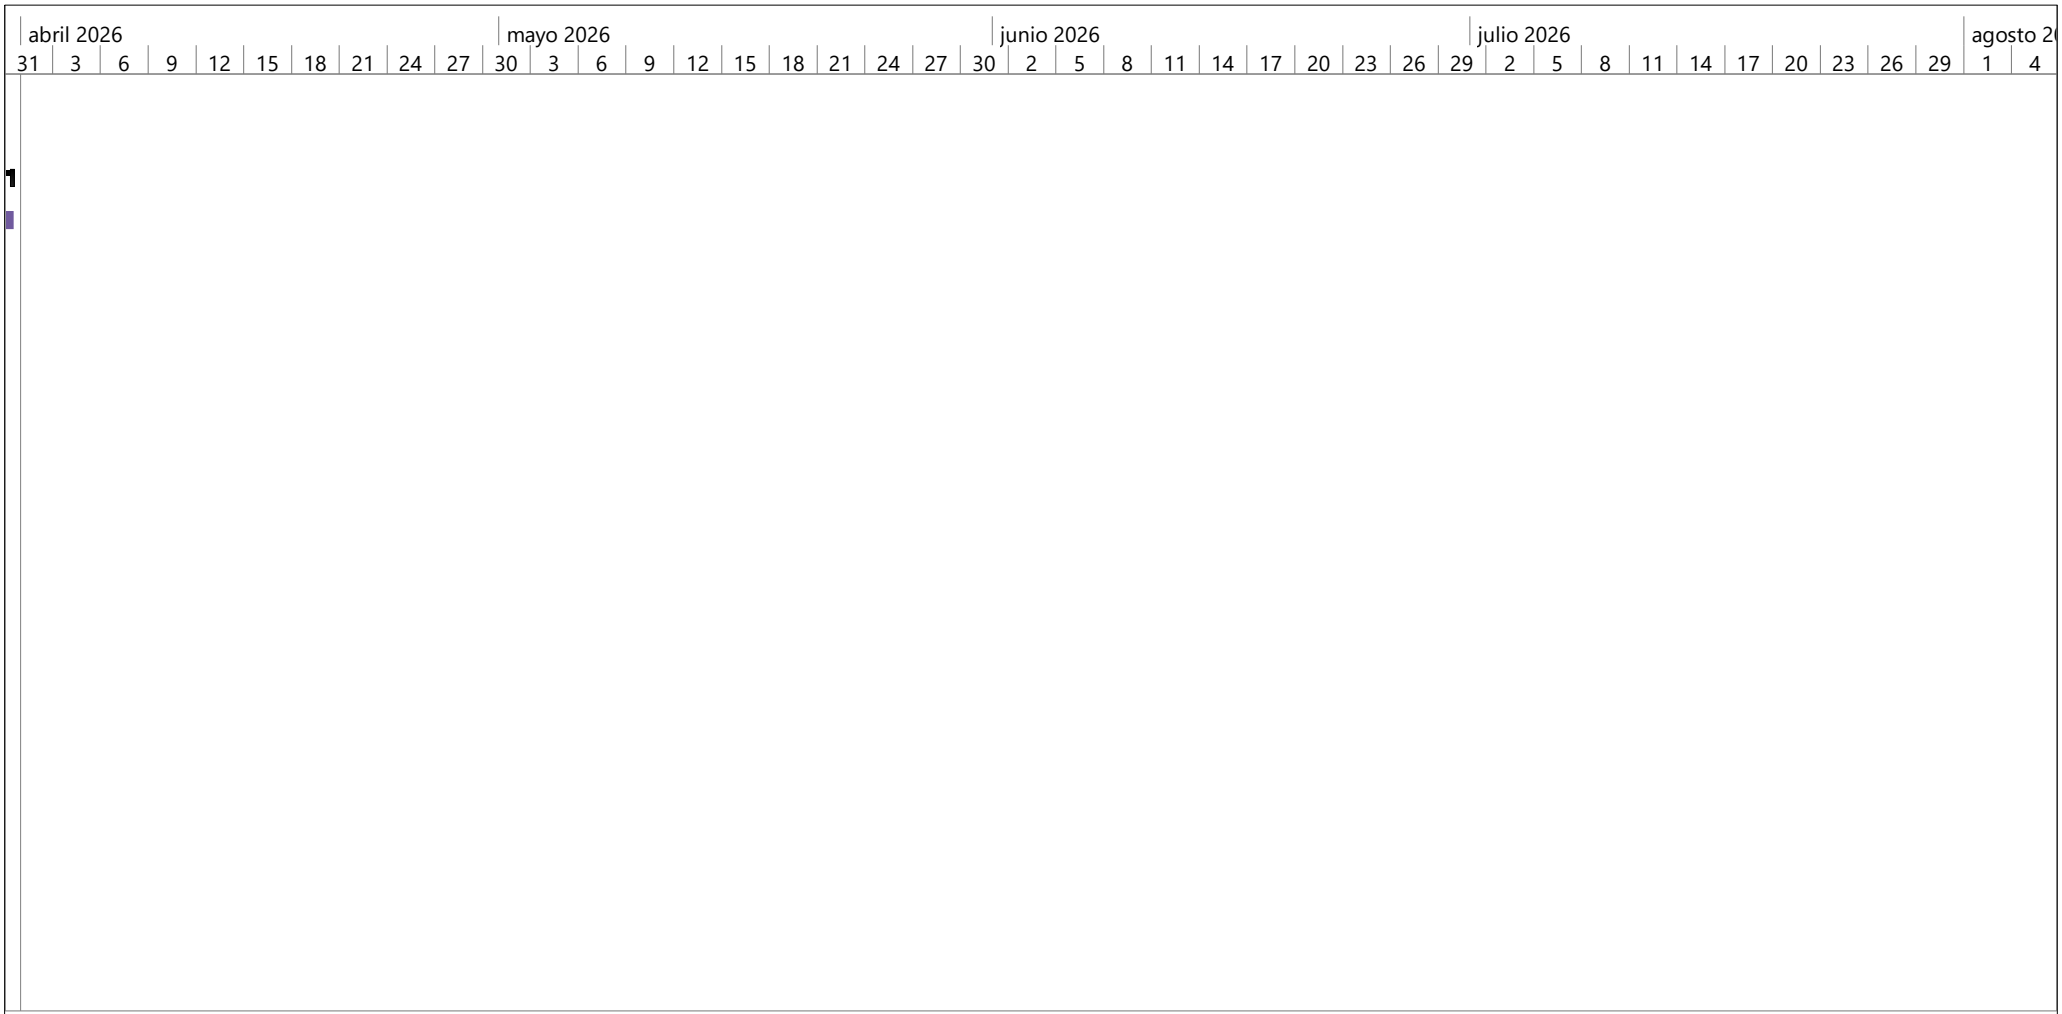


Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

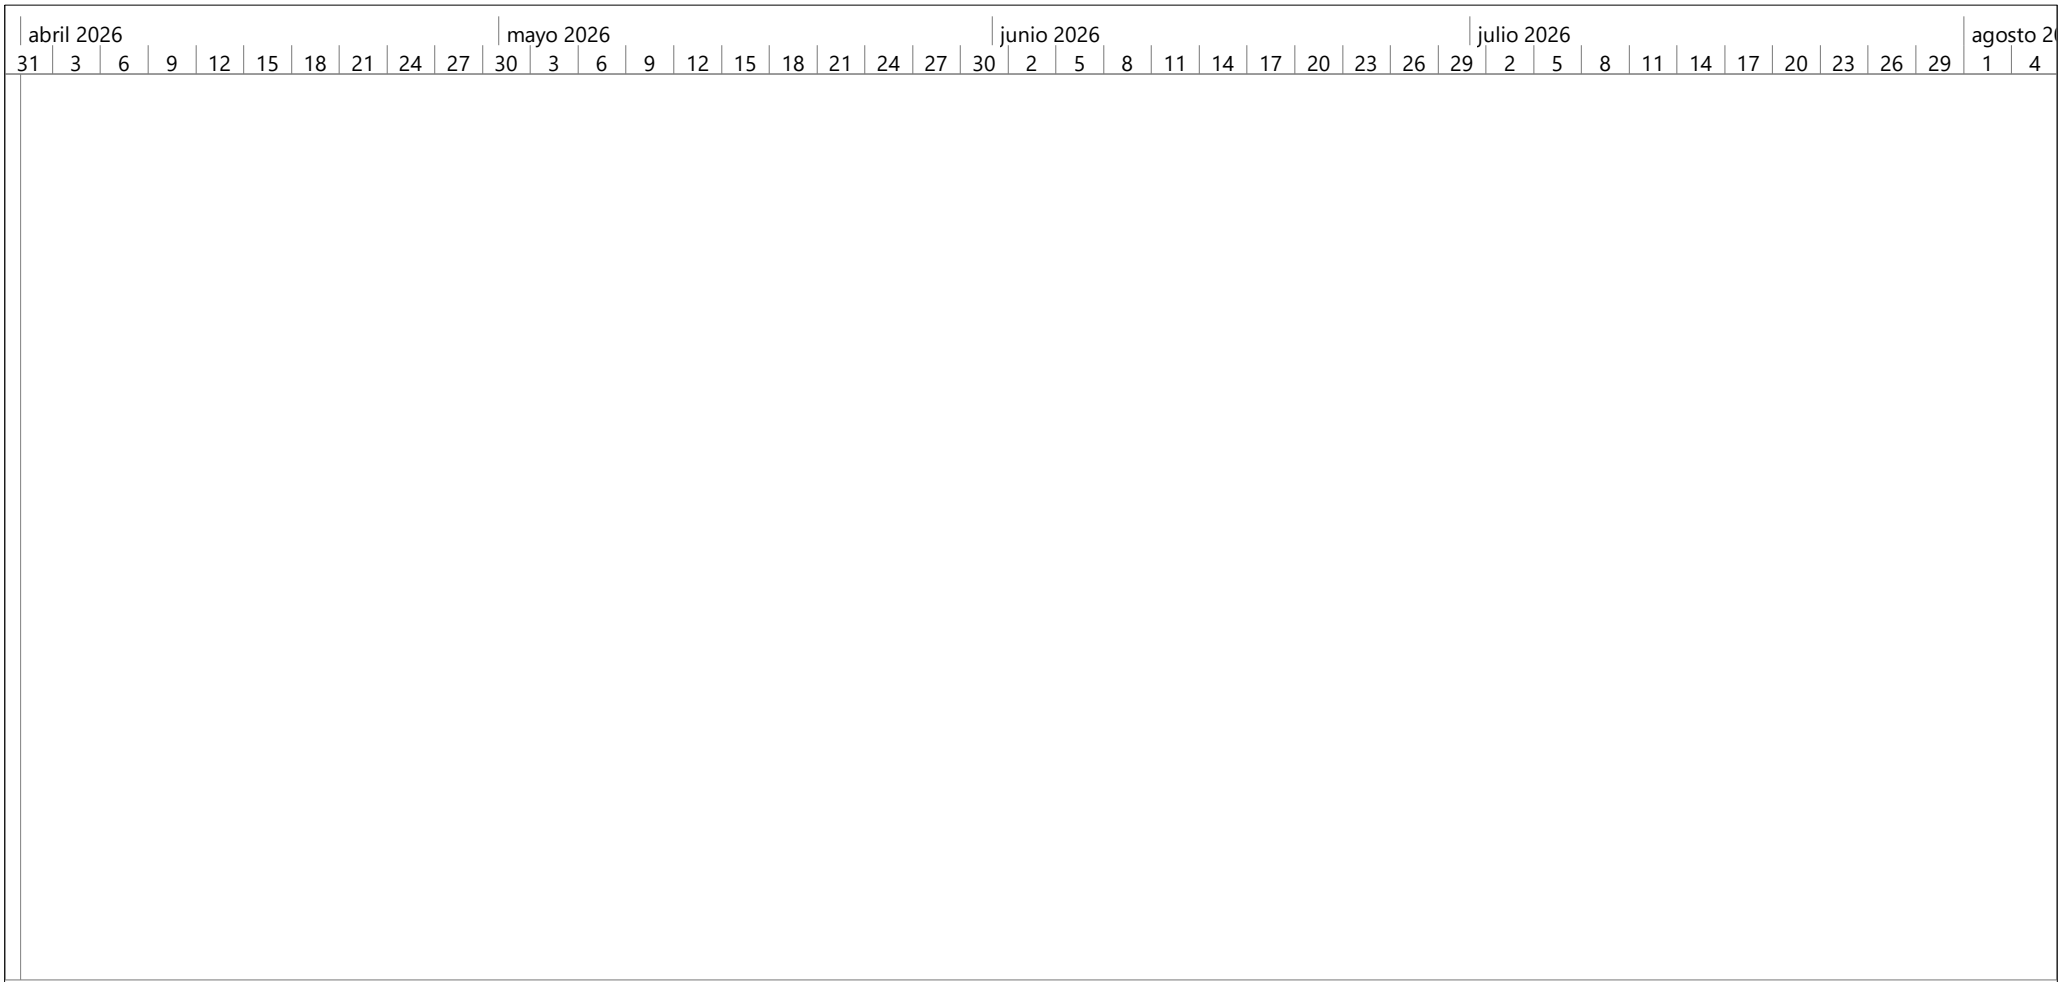

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

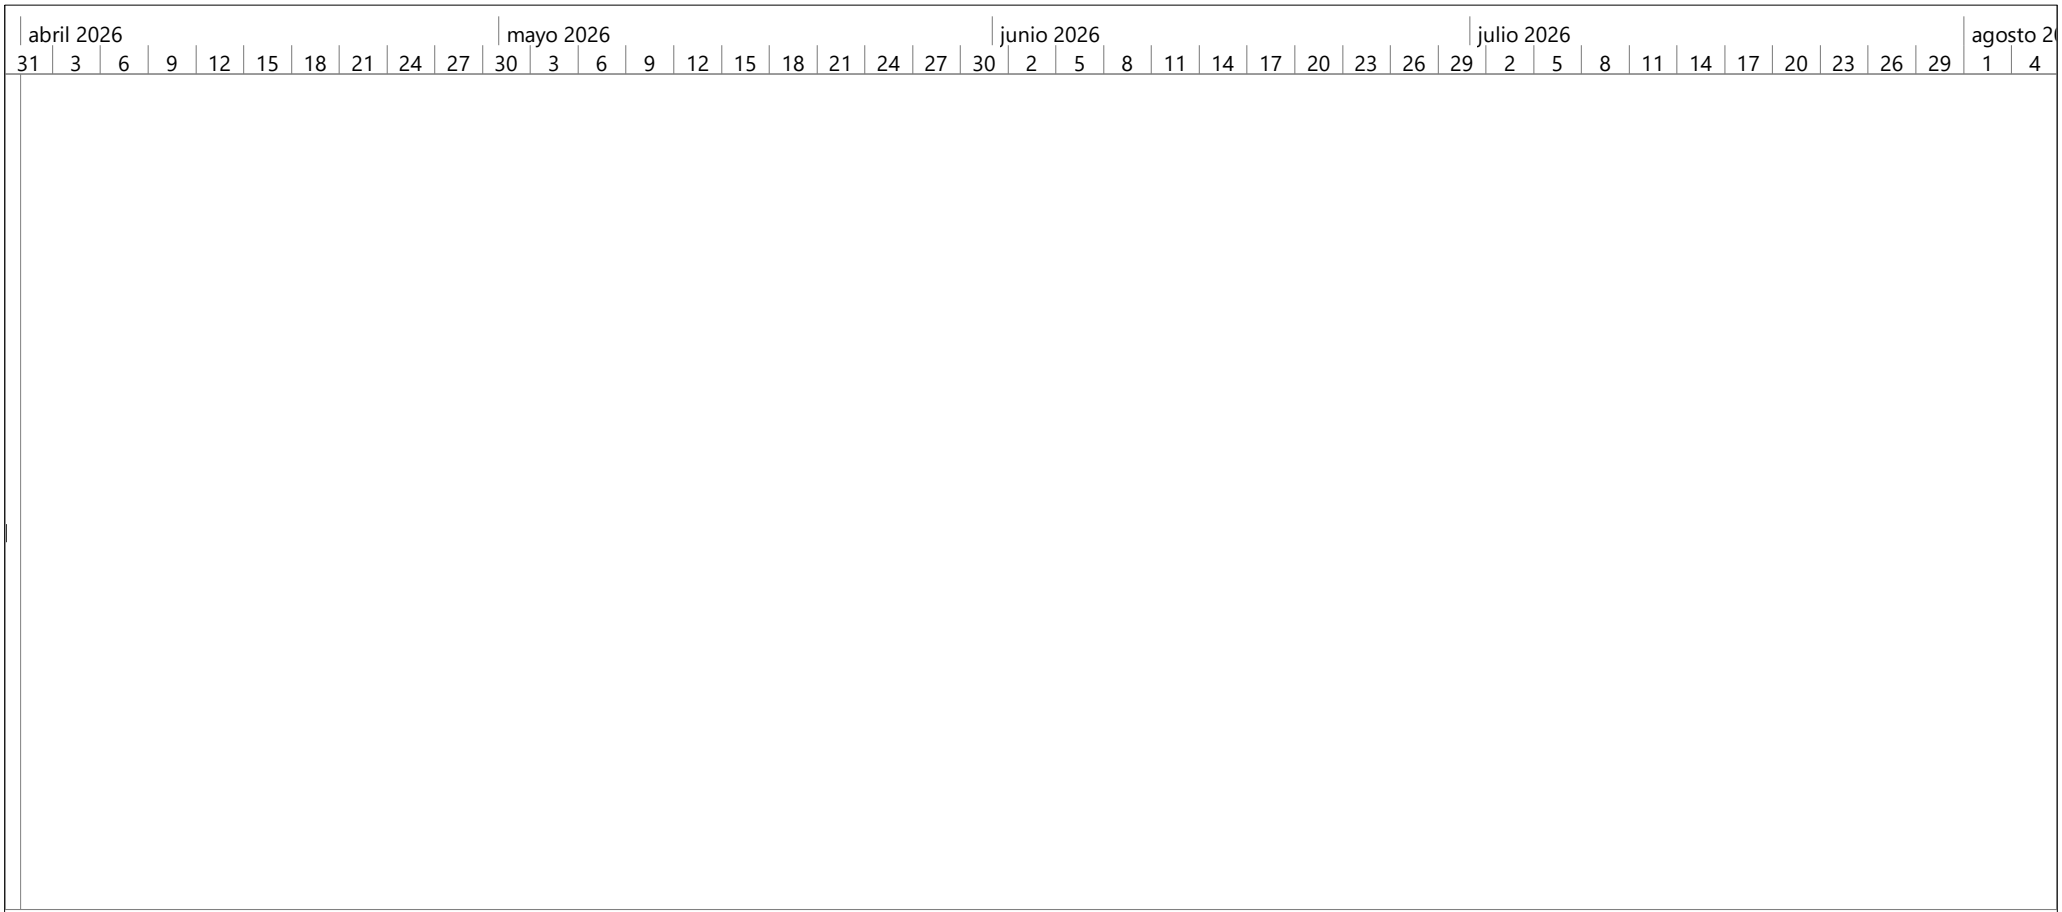

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

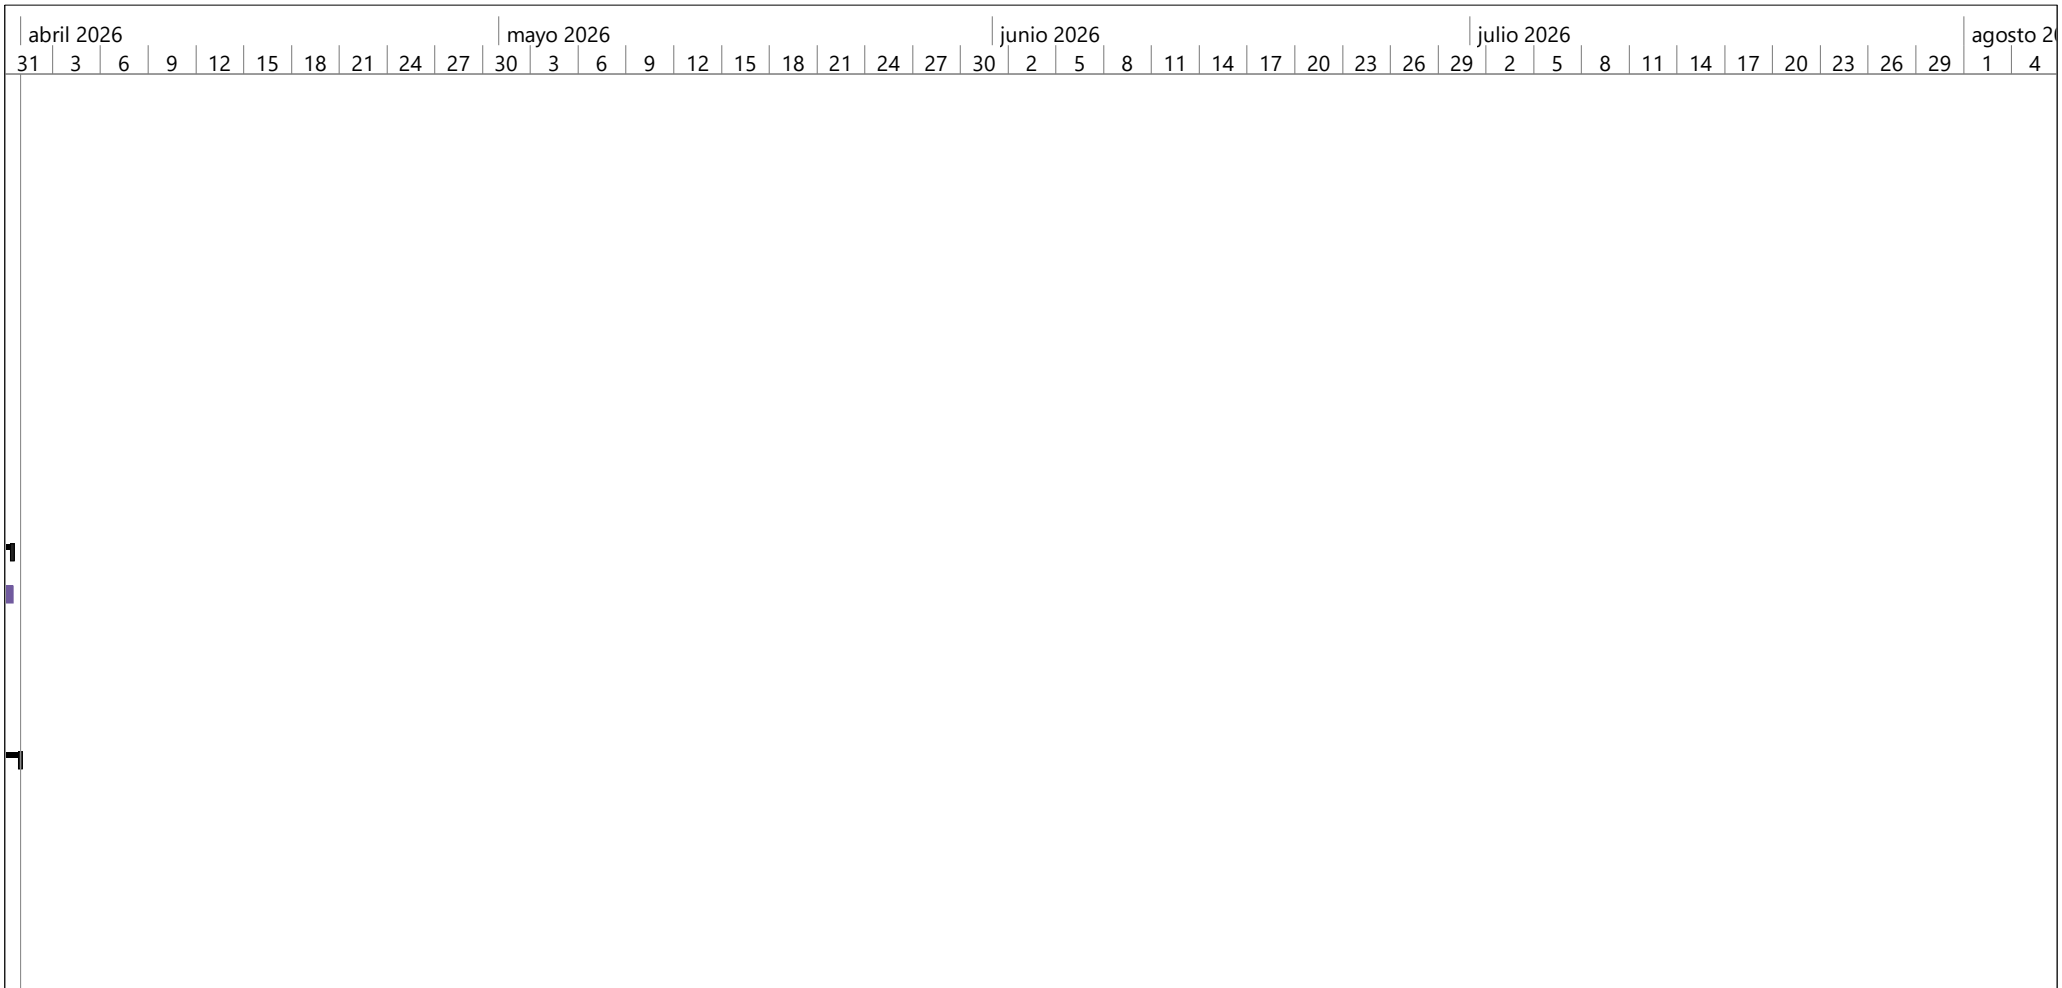

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	




Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

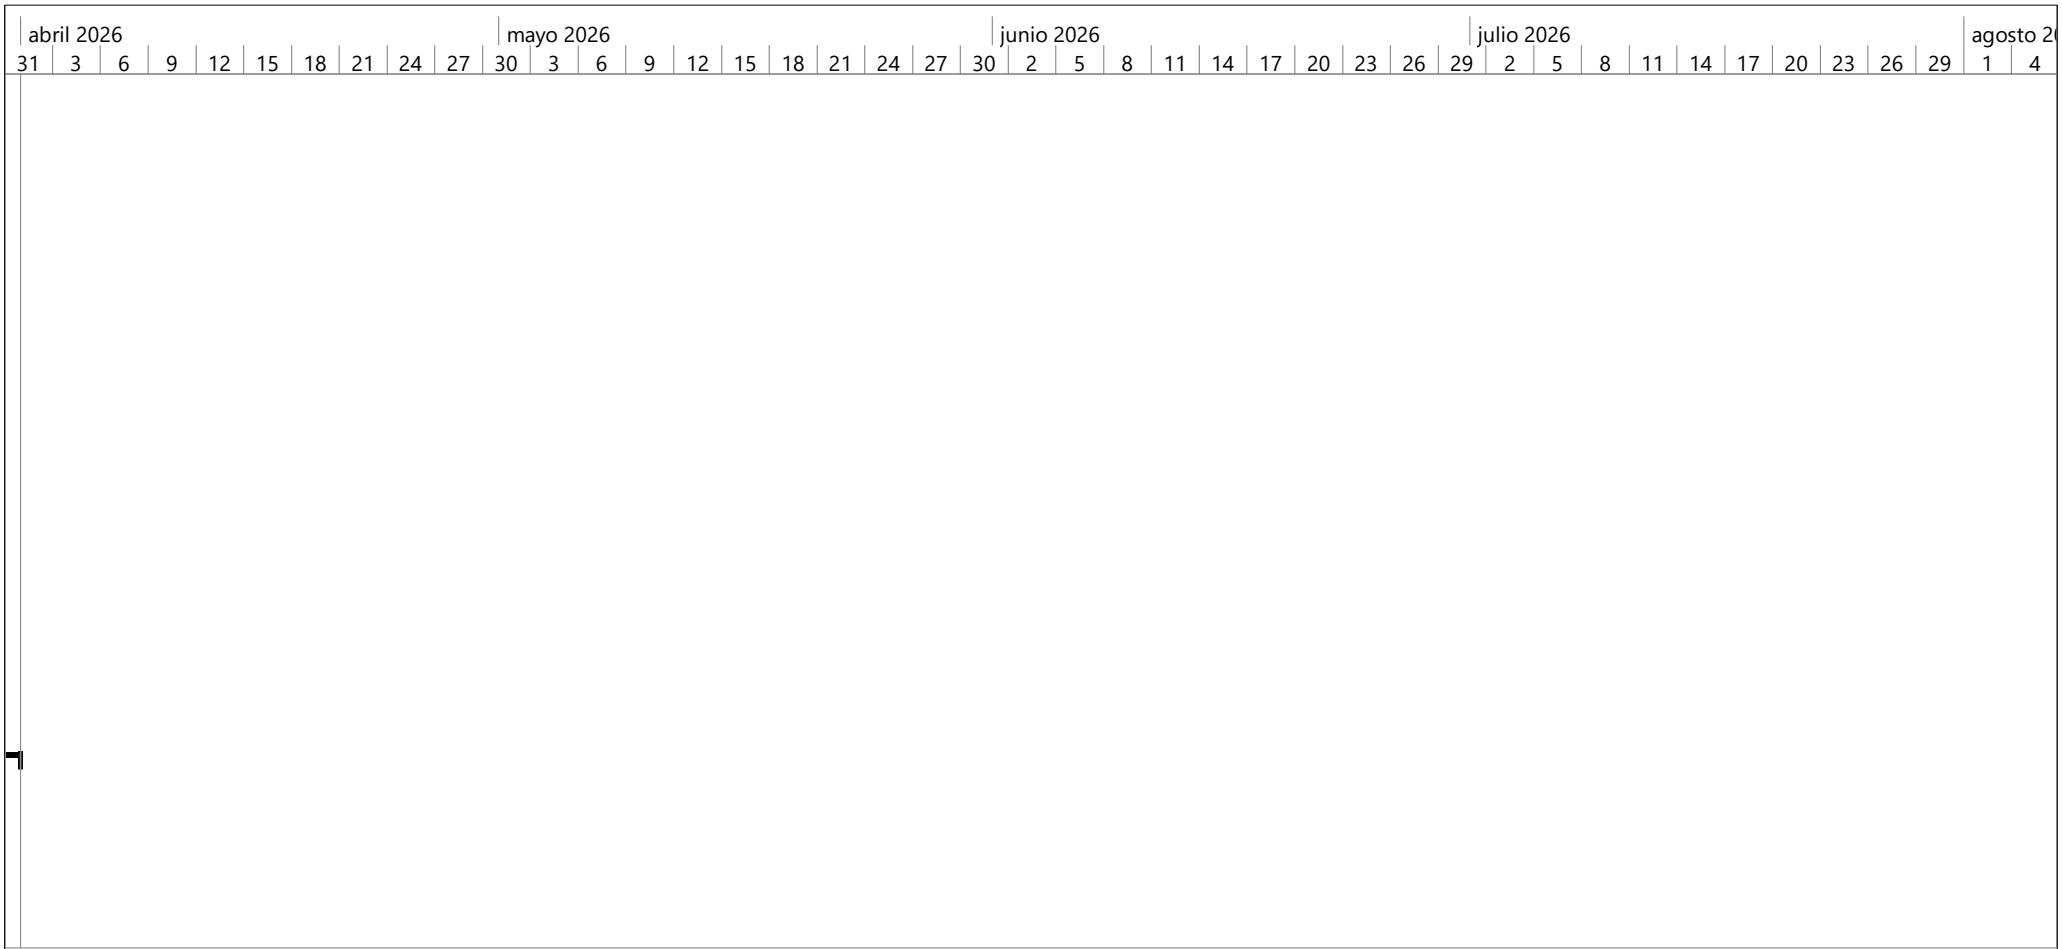

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

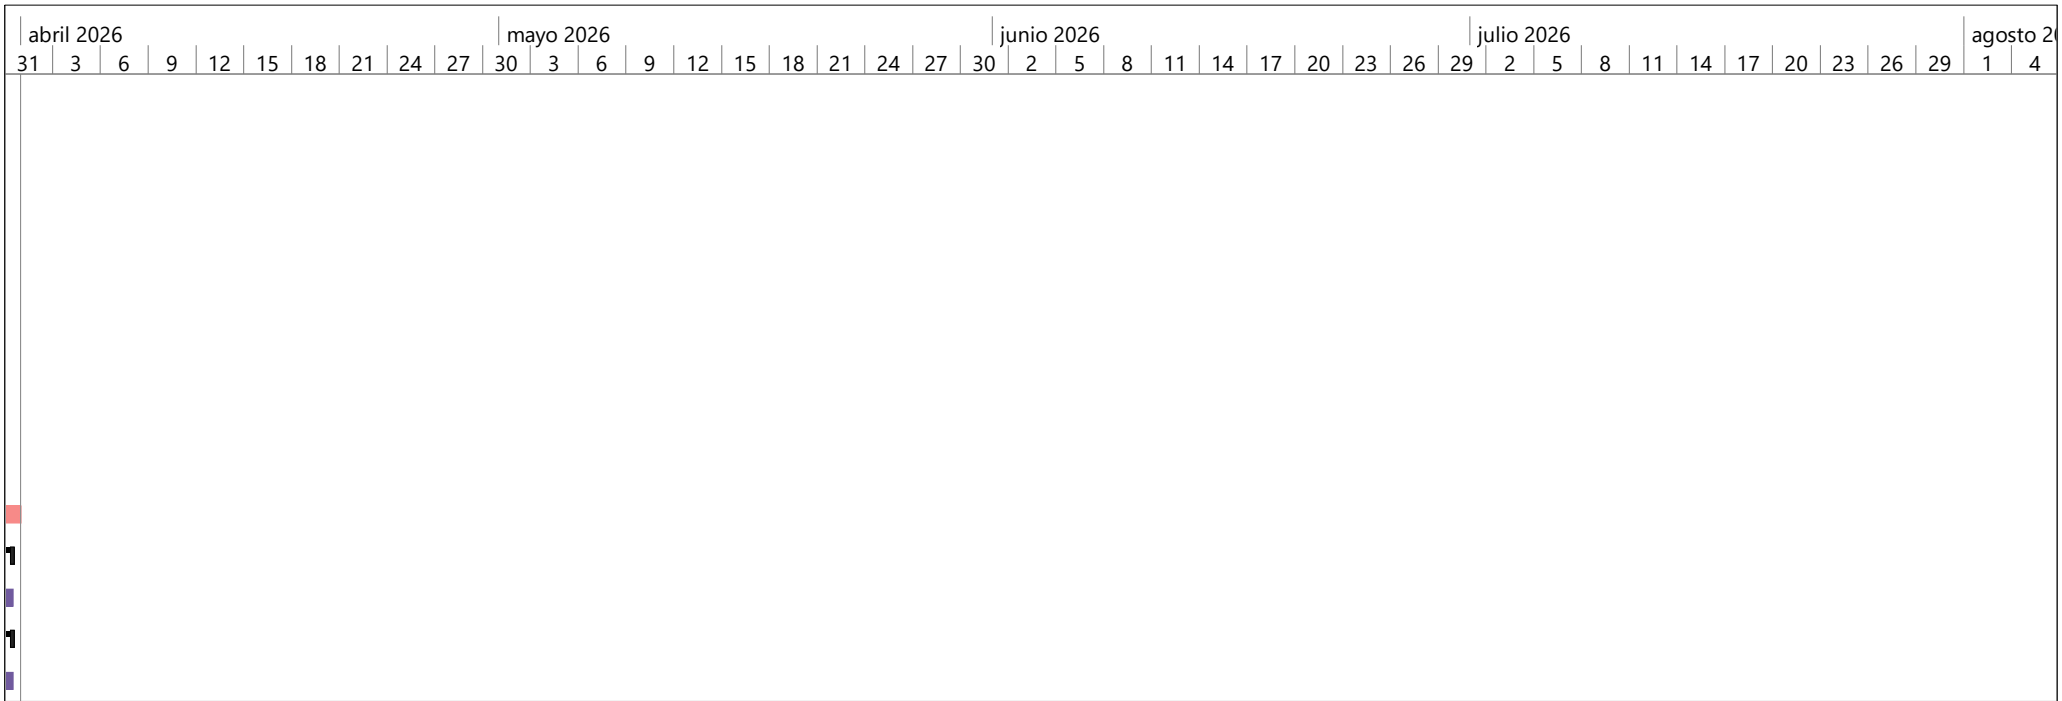

Proyecto: PROGRAMACION CC
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
