ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
NIT 891.200.461-3
Cra 19 Cll 10 Esquina - 4221640
Codigo Postal: 862070

COMPROMISO PRESUPUESTAL REGALIAS
2025100006

Fecha 2025-09-26 **Identificacion** 901379301

Tercero CARLOT S.A.S ZOMAC

Dirección CR 23 10 36 BR SAN NICOLAS **Telefono** 3115255341

Detalle INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27 BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO.

Codigo	Nivel	Nombre	Doc	VALOR
2.3	CCPET	Inversión	2025100010	0.00
2.3.V2.3	CCPET	Inversión	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2	CCPET	Adquisición de bienes y servicios	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02	CCPET	Adquisiciones diferentes de activos	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02	CCPET	Adquisición de servicios	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005	CCPET	Servicios de la construcción	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019	Auxiliares	Construcción De Alcantarillado Pluvial Sobre La Carrera 26 Entre Calle 24 Y Calle 26, Calle 26 Entre Carrera 26 Y 27, Barrio Buenos Aires, Municipio De Puerto Asís, Departamento Del Putumayo	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019.16	Sección presupuestal	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019.16.2.2.8.2.00	Fuentes	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN LOCAL	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019.16.2.2.8.2.00.2	Situación de Fondos	SIN SITUACION DE FONDOS	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019.16.2.2.8.2.00.2.40	Sectores	Vivienda, Ciudad y Territorio	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019.16.2.2.8.2.00.2.40.4003	Programa	Acceso de la poblacion a los servicios de agua potable y saneamiento basico	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019.16.2.2.8.2.00.2.40.4003.014	Producto	Servicio de Alcantarillado	2025100010	0.00
2.3.V2.3.2.02.02.005.019.16.2.2.8.2.00.2.40.4003.014.2025865680005	Bpin	Construcción De Alcantarillado Pluvial Sobre La Carrera 26 Entre Calle 24 Y Calle 26, Calle 26 Entre Carrera 26 Y 27, Barrio Buenos Aires, Municipio De Puerto Asís, Departamento Del Putumayo		21,785,949.00

DANE (21,785,949.00)	VALOR
53290 - Otras obras de ingeniería civil	21,785,949.00

TOTAL 21,785,949.00

SON : VEINTE Y UNO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

Claudia Elena Gomez Cabrales
Elaboró

Aprobó

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHcegomez	CLAUDIA ELENA GOMEZ CABRALES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	02-86568	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema	2025-09-26-3 12 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2325 de fecha 2025-07-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	2325	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-86568 MUNICIPIO DE PUERTO ASIS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	21.785.949,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	21.785.949,00	**Saldo x Obligar:**	21.785.949,00

TERCERO

Identificacion:	901379301	**Razon Social:**	CARLOT S.A.S ZOMAC	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	726019904	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	18127336	**Nombre:**	JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ	**Cargo:**	ALCALDE

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificacion:	**Fecha de Registro:**		**Numero:**	386-2025	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2025-09-18

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-86568 MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	00IL-4003-1400-2025-86568-0005 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26 CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27 BARRIO BUENOS AIRES MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Nacion	IL86568	CSF	2025-09-26	21.785.949,00	0,00		
					Total:	21.785.949,00	0,00	21.785.949,00	21.785.949,00

Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26. CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27 BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-86568	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	SGR-AIL	ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2025-10-30	21.785.949,00	21.785.949,00	NINGUNO

SPGR

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHcegomez	CLAUDIA ELENA GOMEZ CABRALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	02-86568	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS
Fecha y Hora Sistema	2025-09-26-3:12 p. m.	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2f6716ee4b24ac65eef96a746c226f063f8ce45b70c165000fba310afbb1c766890db36f793222aefcec73debc318773

Número de Factura: FECT-12
Fecha de Emisión: 16/12/2025
Fecha de Vencimiento: 16/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CARLOT S.A.S ZOMAC
Nombre Comercial: CARLOT S.A.S ZOMAC
Nit del Emisor: 901379301
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: MZ 3 CL 12 BRR MODELO
Teléfono / Móvil: 3138243005
Correo: carlotsaszomac@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO ASIS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891200461
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: Calle 10 carrera 19 esquina Barrio el Centro
Teléfono / Móvil: 4221640
Correo: alcaldia@puertoasis-putumayo.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0011	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 386 2025 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERAS 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIP	NIU	1,00	$ 18.307.520,17	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.478.428,83	19.00			$ 18.307.520,17

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/12/2025 10:37:54
Documento validado por la DIAN:
16/12/2025 10:37:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		18307520.17
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		18307520.17
IVA		3478428.83
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		3478428.83
Total neto factura (=)		21785949
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 21785949

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		18.307.520,17
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		18.307.520,17
IVA		3.478.428,83
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.478.428,83
Total neto factura (=)		21.785.949,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$21.785.949,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086308529 Rango desde: 10 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-12-28

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL, Identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.123.209.227** en calidad de representante legal de **CARLOT SAS ZOMAC** identificada con **NIT 901.379.301-8** y **HAROLD JAVIER CULTID MOSQUERA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **12.990.141** expedida en **Pasto**, y tarjeta profesional T.P **55924-T** en mi calidad de Contadora de **CARLOT S.A.S ZOMAC,** con **NIT 901.379.301-8,** debidamente inscrito en la cámara de comercio del Putumayo, certificamos el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar, pagados por la compañía durante los últimos (06) meses.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el decreto 2650 de 1993.

Expedida en la ciudad de Puerto Asís, departamento de Putumayo el 15 del mes de DICIEMBRE de 2025.

JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
C.C: 1.123.209.227
R/L: CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT: 901.379.301-8

JAVIER CULTID MOSQUERA
CC.: 12.990.141
TP.: 55924-T
Contador

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

12.990.141

CALVO MOSQUERA

HAROLD JAVIER



15-JUL-1967

PASTO
(NARIÑO)

1.67 O+ M

10 AGO 1981 PASTO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

55924-T



HAROLD JAVIER
CURTID MOSQUERA
C.C. 12938141
RESOLUCION INSCRIPCION 166
UNIVERSIDAD MARIANA

FECHA 23/10/97

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos si quien encuentre esta tarjeta, devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

012502

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

CCEAFD844A9D9DC8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HAROLD JAVIER CULTID MOSQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12990141 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 55924-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901379301	8	CARLOT SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES	CARRERA 23 10 36 BARRIO SAN NICOLAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	2002067787	9496360200	E	2025/11/05	2025/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	37	$309,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCCIONES (1 Afiliados)																					$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$6,500		$0	$0		$302,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																					$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$6,500		$0	$0		$302,700
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$6,500		$0	$0		$302,700
1	CC	1123209227	ROMO JAZMIN	X															230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF63	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	0.522%	$6,500	26	$0	$0	Si	$302,700
Total		**Afiliados(1)**																			$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700	$49,400			$1,233,700		$6,500		$0	$0		$302,700

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,400	$4,600	$0	$202,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$197,400	$4,600	$0	$202,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,500	$200	$0	$6,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,500	$200	$0	$6,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,400	$1,200	$0	$50,600
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$49,400	$1,200	$0	$50,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,400	$1,200	$0	$50,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$49,400	$1,200	$0	$50,600
TOTAL				**1**	**$302,700**	**$7,200**	**$0**	**$309,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901379301	8	CARLOT SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSTRUCCIONES	CARRERA 23 10 36 BARRIO SAN NICOLAS	PUERTO ASIS-PUTUMAYO	1111111	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2002077835	9496360348	E	2025/12/02	2025/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	10	$351,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSTRUCCIONES (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1123209227	ROMO JAZMIN		X															230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF63	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$1,500	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$57,000	$400	$0	$57,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$400	$0	$57,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$400	$0	$57,400
TOTAL				**1**	**$349,300**	**$2,400**	**$0**	**$351,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14298136		GUZMAN BOCANEGRA CAMILO HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la Carmelita	MOCOA-PUTUMAYO	7543198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1925299990	9493711974	1	2025/11/12	2025/11/13	BANCOLOMBIA	1	$406,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/12/12 11:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14298136		GUZMAN BOCANEGRA CAMILO HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la Carmelita	MOCOA-PUTUMAYO	7543198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1925299990	9493711974	1	2025/11/12	2025/11/13	BANCOLOMBIA	1	$406,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$400**	**$0**	**$406,200**

2025/12/12 11:30 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14298136		GUZMAN BOCANEGRA CAMILO HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la Carmelita	MOCOA-PUTUMAYO	7543198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1997141519	949165778	I	2025/12/10	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	14298136	GUZMAN CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total			Afiliados(1)																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14298136		GUZMAN BOCANEGRA CAMILO HUMBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda la Carmelita	MOCOA-PUTUMAYO	7543198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1997141519	9495165778	I	2025/12/10	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141161724399

(415)7707212489984(8020) 000014116172439 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 3 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CARLOT S.A.S ZOMAC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Puerto Asís 5 6 8

41. Dirección principal
MZ 3 CL 12 BRR MODELO

42. Correo electrónico carlotsas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 8 1 1 8 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 0 3 2 0	8 2 3 0	2 0 2 5 0 1 1 0	0 1 6 1	0 1 6 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO ROMO ANDREA KARIMEN
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141161724399

(415)7707212489984(8020) 000014116172439 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 3 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 1	5
73. Fecha	2 0 2 0 0 3 2 0	2 0 2 3 0 1 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 0 0 3 2 0	2 0 2 3 0 3 0 4
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 0 7 5 0 8 5	0 0 0 0 0 0 7 5 0 8 5
78. Departamento	8 6	8 6
79. Ciudad/Municipio	5 6 8	4 6

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 0 0 3 2 0	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 5 2 9		-
2	4 9	2 0 2 0 0 3 2 0		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		5 3 0 1 2 2 4 6	1

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: DELGADO ROMO ANDREA KARIMEN

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141161724399

(415)7707212489984(8020) 000014116172439 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 9 3 0 1	8	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 9 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 3 0 1 2 2 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	ROMO	ANDREA	KARIMEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-02-2025 09:33:17PM

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA


Que **CARLOT S.A.S ZOMAC** identificado(a) con **número 901.379.301** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130726000100019904** aperturada el **24 de septiembre de 2020**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **726019904**
10 dígitos: **0726019904**
16 dígitos: **0726000100019904**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **27** de octubre de **2025** a las **15:03**, con destino a **Quien Interese.**



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No.386-2025

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

PERIODO: 06/10/2025 AL 05/12/2025

INFORME DE INTERVENTORÍA

Contratante:
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

Contratista de obra:
ING. JESUS EDINSON CARREÑO TEZ
CC. 18.187.685

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT: 901379301-8

DICIEMBRE DE 2025

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. RESUMEN EJECUTIVO 4
2.1. Datos generales del contrato de obra e interventoría 4
2.1.1. Información general del contrato de obra 4
2.1.2. Información general del contrato de interventoría 4
2.1.3. Seguimiento garantías contractuales – contrato de obra 5
2.1.4. Seguimiento garantías contractuales – contrato de interventoría 7
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 8
4. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS CONTRATADOS 9
5. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 10
6. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA 11
6.1. AVANCE FÍSICO 11
6.2. AVANCE FINANCIERO 11
7. RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA NO.369-2025 11
1. REALIZAR PRELIMINARES 12
1.01. Localización y replanteo 12
2. REALIZAR EXCAVACIONES 12
2.01. Excavación manual para alcantarillado pluvial 12
3. INSTALAR TUBERÍA 13
3.01. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 24" (para alcantarillado aguas lluvias) 13
3.02. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 27" (para alcantarillado aguas lluvias) 13
3.04. Encamado en arena para nivelación de tubería E= 15 cm 14
4. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO 15
4.03. Cárcamo para protección de tubería de 27" Y 24", (Incluye acero de refuerzo) 16
5. REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS 17
5.01. Relleno compacto con material de rio seleccionado 17
8. Informe implementación PAGA 17
9. Informe implementación Plan de Manejo de Transito 19
10. CONCLUSIONES 21
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 22
12. ANEXOS ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de interventoría se elabora en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas para la supervisión técnica, administrativa, financiera al proyecto denominado *"Construcción de alcantarillado pluvial sobre la carrera 26 entre calle 24 y calle 26, calle 26 entre carrera 26 y 27, barrio Buenos Aires, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo"*.

Este proyecto forma parte de las acciones adelantadas por la administración municipal para fortalecer la infraestructura de saneamiento básico y mejorar las condiciones de vida de la comunidad del barrio Buenos Aires, mediante la implementación de un sistema de drenaje pluvial que permita mitigar los problemas de inundación y deterioro vial ocasionados por la falta de un adecuado manejo de las aguas lluvias.

La interventoría, en su rol de garante del cumplimiento del contrato de obra, presenta en este documento el seguimiento detallado a las actividades ejecutadas, los avances físicos y financieros, las gestiones administrativas realizadas, las observaciones técnicas relevantes y las recomendaciones orientadas a asegurar la correcta ejecución del proyecto conforme a las especificaciones contractuales, normativas vigentes y principios de transparencia en la gestión pública.

Con ello, se busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura urbana del municipio de Puerto Asís y al cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en materia de desarrollo territorial, sostenibilidad ambiental y bienestar comunitario.

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

2. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. Datos generales del contrato de obra e interventoría

2.1.1. Información general del contrato de obra

CONTRATO No.	369-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.200.461-3
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C. ($363.500.000,00)
CONTRATISTA:	JESUS EDINSON CARREÑO TEZ CC. 18.187.685 DE PUERTO ASÍS (PTYO)
PLAZO:	Dos (02) meses
FECHA DE INICIO	06 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de diciembre de 2025

2.1.2. Información general del contrato de interventoría

CONTRATO No.	386-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.200.461-3
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/C ($21.785.949)
CONTRATISTA:	CARLOT S.A.S ZOMAC NIT: 901379301-8 Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
PLAZO:	Dos (02) meses
FECHA DE INICIO	06 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	05 de diciembre de 2025

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

2.1.3. Seguimiento garantías contractuales – contrato de obra

La garantía del contrato de obra No. 369-2025, se encuentra asegurada por SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT. 860.009.578-6, que amparan el Contrato de OBRA–cumplen con los requisitos de valor y tiempo del contrato.

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas anteriormente mencionadas junto con el valor asegurado.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Anexo 0: Emisión Original**
  Póliza de cumplimiento No. 11-44-101263389
  Fecha de expedición: 29 de agosto de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento del contrato	$ 36.350.000,00	29/08/2025	30/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 18.175.000,00	29/08/2025	30/10/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 72.700.000,00	Si ampara 5 años, 0 meses y o días*	

- **Anexo 2: Anexo Traslado De Vigencia**
  Póliza de cumplimiento No. 11-44-101263389
  Fecha de expedición: 07 de octubre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento del contrato	$ 36.350.000,00	06/10/2025	07/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 18.175.000,00	06/10/2025	07/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 72.700.000,00	Si ampara 5 años, 0 meses y o días*	

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

- **Anexo 3: Anexo Traslado De Vigencia**

Póliza de cumplimiento No. 11-44-101263389
Fecha de expedición: 10 de diciembre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento del contrato	$ 36.350.000,00	06/10/2025	07/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 18.175.000,00	06/10/2025	07/12/2026
Estabilidad y calidad de la obra	$ 72.700.000,00	05/12/2025	05/12/2030

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOS.

- **Anexo 0: Emisión Original**

Póliza RCE No. 11-40-101082261
Fecha de expedición: 29 de agosto de 2025

AMPARO	VALOR	DEDUCIBLE	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios labores y operaciones	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	29/08/2025	30/10/2025
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	29/08/2025	30/10/2025
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	29/08/2025	30/10/2025
Responsabilidad civil patronal	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	29/08/2025	30/10/2025
Gastos médicos	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	29/08/2025	30/10/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	29/08/2025	30/10/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	29/08/2025	30/10/2025

- **Anexo 2.**

Póliza RCE No. 11-40-101082261
Fecha de expedición: 07 de octubre de 2025

AMPARO	VALOR	DEDUCIBLE	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
Predios labores y operaciones	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	06/10/2025	07/12/2025

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	06/10/2025	07/12/2025
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	06/10/2025	07/12/2025
Responsabilidad civil patronal	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	06/10/2025	07/12/2025
Gastos médicos	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	06/10/2025	07/12/2025
Daño emergente y lucro cesante	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	06/10/2025	07/12/2025
Perjuicios extrapatrimoniales	$ 284.700.000,00	10,00% del valor de la perdida -mínimo=1,00SMMLV	06/10/2025	07/12/2025

2.1.4. Seguimiento garantías contractuales – contrato de interventoría

La garantía del contrato de obra No. 386-2025, se encuentra aseguradas por SEGUROS DEL ESTADO S.A. que amparan el Contrato de interventoría–cumplen con los requisitos de valor y tiempo del contrato.

A continuación, se presentan las fechas de vigencia de las pólizas anteriormente mencionadas junto con el valor asegurado.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

- **Anexo 0.**
  Póliza de cumplimiento No. 11-44-101265178
  Fecha de expedición: 22 de agosto de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento del contrato	$2.178.594,90	18/09/2025	20/05/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.089.297,45	18/09/2025	20/11/2028
Calidad del servicio	$2.178.594,90	18/09/2025	18/11/2030

- **Anexo 2: ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**
  Póliza de cumplimiento No. 11-44-101265178
  Fecha de expedición: 09 de octubre de 2025

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com


AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento del contrato	$2.178.594,90	06/10/2025	07/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.089.297,45	06/10/2025	08/12/2028
Calidad del servicio	$2.178.594,90	06/12/2025	06/12/2030

- **Anexo 3: ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**
  Póliza de cumplimiento No. 11-44-101265178
  Fecha de expedición: 11 de diciembre de 2025

AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimento del contrato	$2.178.594,90	06/10/2025	07/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.089.297,45	06/10/2025	08/12/2028
Calidad del servicio	$2.178.594,90	05/12/2025	05/12/2030

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecuta en el barrio buenos aires sobre la carrera 26 entre calle 24 y calle 26, calle 26 entre carrera 26 y 27.

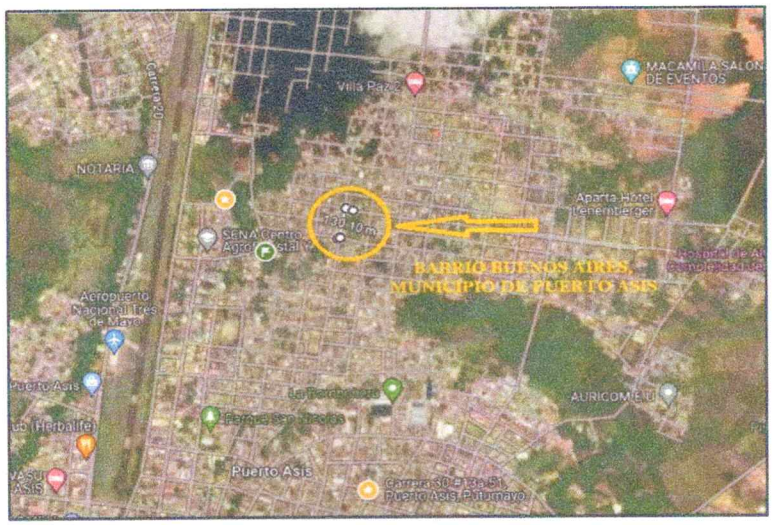

UBICACIÓN PROYECTO EN EJECUCION –
Localizado en ***Latitud**: 0°30'19.7"N 76°29'45.0"W, **Longitud**: - 0°30'22.7"N 76°29'43.7"W*

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com



LOCALIZACIÓN TRAMOS A MEJORAR, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS (Google Earth). COORDENDAS INICIAL: 0°30'19.7"N 76°29'45.0"W
FINAL: 0°30'22.7"N 76°29'43.7"W

4. CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS CONTRATADOS

CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL POR CAPITULO
1,00	**REALIZAR PREMILIMARES**					**$ 864.517,81**
1,01	Localización y replanteo	M2	213,63	$ 4.046,80	$ 864.517,81	
2,00	**REALIZAR EXCAVACIONES**					**$ 12.000.176,35**
2,01	Excavación manual para alcantarillado pluvial	M3	320,45	$ 37.447,89	$ 12.000.176,35	
3,00	**INSTALAR TUBERIA**					**$ 110.112.214,61**
3,01	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 24" (para alcantarillado aguas lluvias)	ML	70,52	$ 705.220,85	$ 49.732.174,34	
3,02	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 27" (para alcantarillado aguas lluvias)	ML	59,11	$ 793.504,15	$ 46.904.030,31	
3,03	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 10" (para conexión sumideros)	ML	84,00	$ 125.494,29	$ 10.541.520,36	
3,04	Encamado en arena para nivelación de tubería E= 15 cm	M3	36,39	$ 80.640,00	$ 2.934.489,60	
4,00	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO**					**$ 110.077.384,86**
4,01	Sumidero de aguas lluvias tipo SL -100 en concreto de 3500 PSI, (Incluye rejilla metálica)	UNO	14,00	$ 1.972.763,14	$ 27.618.683,96	
4,02	Cámara de inspección en concreto 4000 PSI, D= 1,20 m, H=1,00 - 1,50 m	UNO	4,00	$ 4.494.058,40	$ 17.9762 33,60	
4,03	Cárcamo para protección de tubería de 27" Y 24", (Incluye acero de refuerzo)	ML	81,23	$ 793.825,77	$ 64.482.467,30	

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

5,00	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS					$ 14.804.965,63
5,01	Relleno compacto con material de rio seleccionado	M3	148,33	$ 99.811,00	$ 14.804.965,63	
	VALOR COSTOS DIRECTOS					$ 247.859.259,26
	ADMINISTRACION			A	30,00%	$ 74.357.777,78
	IMPREVISTOS			I	2,00%	$ 4.957.185,19
	UTILIDAD			U	3,00%	$ 7.435.777,78
	PLAN MANEJO AMBIENTAL	UND			1,00	$ 11.800.000,00
	PLAN MANEJO DE TRÁNSITO	UND			1,00	$ 17.090.000,00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO					363.500.000,00

5. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA - CONTRATO No. 369 DEL 2025

OBJETO : "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

			CANTIDADES CONTRATADAS ORIGINALES			CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS			CANTIDADES FINALES EJECUTADAS		
ITEM	CAPITULOS Y ACTIVIDADES	UND	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL	CANT	VR.UNIT	VR.TOTAL
1,00	REALIZAR PREMILIMARES										
1,01	Localizacion y replanteo	m2	213,63	$ 4.046,80	$ 864.517,81	213,63	$ 4.046,80	$ 864.517,81	213,63	$ 4.046,80	$ 864.517,81
				SUBTOTAL	$ 864.517,81		SUBTOTAL	$ 864.517,81		SUBTOTAL	$ 864.517,81
2,00	REALIZAR EXCAVACIONES										
2,01	Excavación manual para alcantarillado pluvial	m3	320,45	$ 37.447,89	$ 12.000.176,35	320,45	$ 37.447,89	$ 12.000.176,35	320,45	$ 37.447,89	$ 12.000.176,35
				SUBTOTAL	$ 12.000.176,35		SUBTOTAL	$ 12.000.176,35		SUBTOTAL	$ 12.000.176,35
3,00	INSTALAR TUBERIA										
3,01	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 24" (para alcantarillado aguas lluvias)	ml	70,52	$ 705.220,85	$ 49.732.174,34	70,52	$ 705.220,85	$ 49.732.174,34	70,52	$ 705.220,85	$ 49.732.174,34
3,02	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 27" (para alcantarillado aguas lluvias)	ml	59,11	$ 793.504,15	$ 46.904.030,31	59,11	$ 793.504,15	$ 46.904.030,31	59,11	$ 793.504,15	$ 46.904.030,31
3,03	Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 10" (para conexión sumideros)	ml	84,00	$ 125.494,29	$ 10.541.520,36	84,00	$ 125.494,29	$ 10.541.520,36	84,00	$ 125.494,29	$ 10.541.520,36
3,04	Encamado en arena para nivelación de tubería E = 15 cm	m3	36,39	$ 80.640,00	$ 2.934.489,60	36,39	$ 80.640,00	$ 2.934.489,60	36,39	$ 80.640,00	$ 2.934.489,60
				SUBTOTAL	$ 110.112.214,61		SUBTOTAL	$ 110.112.214,61		SUBTOTAL	$ 110.112.214,61
4,00	CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
4,01	Sumidero de aguas lluvias tipo SL -100 en concreto de 3500 PSI, (Incluye rejilla metalica)	und	14,0	$ 1.972.763,14	$ 27.618.683,96	14,00	$ 1.972.763,14	$ 27.618.683,96	14,00	$ 1.972.763,14	$ 27.618.683,96
4,02	Camara de inspeccion en concreto 4000 PSI, D= 1,20 m , H=1,00 - 1,50 m	und	4,0	$ 4.494.058,40	$ 17.976.233,60	4,00	$ 4.494.058,40	$ 17.976.233,60	4,00	$ 4.494.058,40	$ 17.976.233,60
4,03	Carcamo para proteccion de tuberia de 27" Y 24", (Incluye acero de refuerzo)	ml	81,2	$ 793.825,77	$ 64.482.467,30	81,23	$ 793.825,77	$ 64.482.467,30	81,23	$ 793.825,77	$ 64.482.467,30
				SUBTOTAL	$ 110.077.384,86		SUBTOTAL	$ 110.077.384,86		SUBTOTAL	$ 110.077.384,86
5,00	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS										
5,01	Relleno compacto con material de rio seleccionado	ml	148,3	$ 99.811,00	$ 14.804.965,63	148,33	$ 99.811,00	$ 14.804.965,63	148,33	$ 99.811,00	$ 14.804.965,63
				SUBTOTAL	$ 14.804.965,63		SUBTOTAL	$ 14.804.965,63		SUBTOTAL	$ 14.804.965,63

COSTO DIRECTO						
			$ 247.859.259,26		$ 247.859.259,26	$ 247.859.259,26
ADMINISTRACIÓN	A	30,00%	$ 74.357.777,78		$ 74.357.777,78	$ 74.357.777,78
IMPREVISTOS	I	2,00%	$ 4.957.185,19		$ 4.957.185,19	$ 4.957.185,19
UTILIDAD	U	3,00%	$ 7.435.777,78		$ 7.435.777,78	$ 7.435.777,78
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	und	1,00	$ 11.800.000,00		$ 11.800.000,00	$ 11.800.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	und	1,00	$ 17.090.000,00		$ 17.090.000,00	$ 17.090.000,00
COSTO TOTAL			$ 363.500.000,00		$ 363.500.000,00	VALOR EJECUTADO FINAL $ 363.500.000,00

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

6. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA

6.1. AVANCE FÍSICO

El porcentaje de avance físico general del contrato de obra ejecutado en el periodo 06/10/2025 al 05/12/2025:

AVANCE FÍSICO TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA.	100,00%

6.2. AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

El avance financiero correspondiente al periodo comprendido entre 06/10/2025 al 05/12/2025 del contrato de obra:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO No.369-2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 363.500.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 363.500.000,00
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA DE OBRA – ACTA PARCIAL No.1	$ 181.750.000,00
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCION PAGADO	50,00%
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCION ACUMULADO	100,00%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 363.500.000,00
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	$ 181.750.000,00
PORCENTAJE (%) PENDIENTE POR CANCELAR	50,00%
VALOR POR CANCELAR AL CONTRATISTA DE OBRA	
VALOR POR CANCELAR AL CONTRATISTA SEGÚN ACTA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 181.750.000,00) MDA/CTE
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE OBRA FINAL	100,00%

7. RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA NO.369-2025

A continuación, se describe las actividades que se ejecutaron en el transcurso de la ejecución de la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas del aludido contrato de obra.

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

1. REALIZAR PRELIMINARES

1.01. Localización y replanteo

Consiste en la localización, nivelación, control y verificación de las obras a ejecutar, realizadas con apoyo del equipo de topografía y bajo supervisión de la interventoría, siguiendo las referencias de los planos que integran la documentación técnica del proyecto.

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro cuadrado (m2); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/10/2025–5/11/2025)	213,63	213,63	152,59	71,43%
Totales acumuladas	**213,63**	**213,63**	**152,59**	**71,43%**

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	213,63	213,63	61,04	28,57%
Totales acumuladas	**213,63**	**213,63**	**61,04**	**28,57%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

2. REALIZAR EXCAVACIONES

2.01. Excavación manual para alcantarillado pluvial

Consiste en la ejecución de excavaciones manuales destinadas a la instalación de las tuberías del sistema de alcantarillado pluvial, realizadas conforme a las dimensiones, profundidades y pendientes establecidas en los planos de diseño y especificaciones técnicas del proyecto.

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro cubico (m3); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/10/2025–05/11/2025)	320,45	320,45	191,27	59,69%
Totales acumuladas	**320,45**	**320,45**	**191,27**	**59,69%**

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	320,45	320,45	129,18	40,31%
Totales acumuladas	**320,45**	**320,45**	**129,18**	**40,31%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

3. INSTALAR TUBERÍA

3.01. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 24" (para alcantarillado aguas lluvias)

Consiste en el suministro e instalación de tubería corrugada en PVC de **24 pulgadas de diámetro**, destinada al sistema de alcantarillado pluvial. La instalación se efectuó una vez verificadas las condiciones del fondo de la zanja, cumpliendo con las pendientes, alineaciones y especificaciones establecidas en los planos de diseño del proyecto.

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro lineal (ML); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/10/2025–5/11/2025)	70,52	70,52	42,00	59,56%
Totales acumuladas	**70,52**	**70,52**	**42,00**	**59,56%**

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	70,52	70,52	28,52	40,44%
Totales acumuladas	**70,52**	**70,52**	**28,52**	**40,44%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

3.02. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 27" (para alcantarillado aguas lluvias)

Consiste en el tendido y acople de tubería corrugada en PVC de 27 pulgadas de diámetro, correspondiente a uno de los tramos principales del sistema de drenaje pluvial. Las actividades incluyeron la limpieza del fondo de la zanja, el control de pendientes y la verificación del correcto encaje de las juntas.

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro lineal (ML); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/10/2025–05/11/2025)	59,11	59,11	47,55	80,46%
Totales acumuladas	**59,11**	**59,11**	**47,55**	**80,46%**

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	59,11	59,11	11,55	19,54%
Totales acumuladas	**59,11**	**59,11**	**11,55**	**19,54%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

3.03. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 10" (para conexión sumideros).

Consiste acople de la tubería corrugada PVC de 10" para la conexión de los sumideros al tramo principal del sistema de drenaje pluvial. El proceso incluyó la limpieza del fondo de la zanja, el control de pendientes y la verificación del correcto encaje de las juntas.

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro lineal (ML); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	84,00	84,00	84,00	100%
Totales acumuladas	**84,00**	**84,00**	**84,00**	**100%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

3.04. Encamado en arena para nivelación de tubería E= 15 cm

Consiste en la nivelación del fondo de la zanja mediante la colocación de una capa de arena limpia con un espesor promedio de **15 cm**, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro cubico (m3); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/10/2025–05/11/2025)	36,39	36,39	19,73	54,22%
Totales acumuladas	**36,39**	**36,39**	**19,73**	**54,22%**

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	36,39	36,39	16,66	45,78%
Totales acumuladas	**36,39**	**36,39**	**16,66**	**45,78%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

4. CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO

4.01. Sumidero de aguas lluvias tipo SL -100 en concreto de 3500 PSI, (Incluye rejilla metálica)

Consiste en la ejecución integral de las obras asociadas a la construcción del sumidero tipo SL-100 en concreto de 3.500 psi (incluida rejilla metálica). Las actividades desarrolladas abarcaron la excavación, retiro y transporte del material sobrante, formaletería, colocación, curado y descimbrado, todo ello conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La estructura fue edificada para garantizar la adecuada captación de aguas de escorrentía y su conducción hacia las estructuras de conexión o pozos de inspección del sistema de alcantarillado pluvial.

Medida y pago

Esta actividad se paga por unidad (und); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	14,00	14,00	14,00	100%
Totales acumuladas	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**100%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

4.02. Cámara de inspección en concreto 4000 PSI, D= 1,20 m, H=1,00 - 1,50 m

Consiste en la construcción de las cámaras de inspección en concreto de 4.000 psi, con diámetro de 1,20 m y alturas entre 1,00 y 1,50 m. Las actividades ejecutadas comprendieron la excavación, retiro y transporte del material sobrante, formaletería, colocación del concreto, curado y descimbrado, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Estas estructuras corresponden a los pozos de inspección destinados a la conexión y operación del sistema de alcantarillado de aguas lluvias.

Medida y pago

Esta actividad se paga por unidad (und); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	4,00	4,00	4,00	100%
Totales acumuladas	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**100%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

4.03. Cárcamo para protección de tubería de 27" Y 24", (Incluye acero de refuerzo)

Consiste en la construcción de cárcamos en concreto reforzado, destinados a la protección estructural de las tuberías principales de 27" y 24". Las actividades comprendieron el encofrado, la colocación del acero de refuerzo y el vaciado del concreto, ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro lineal (ML); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/10/2025–05/11/2025)	81,23	81,23	52,00	64,02%
Totales acumuladas	**81,23**	**81,23**	**52,00**	**64,02%**

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	81,23	81,23	29,23	35,98%
Totales acumuladas	**81,23**	**81,23**	**29,23**	**35,98%**

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

5. REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.01. Relleno compacto con material de rio seleccionado

Consiste en la ejecución del relleno de las zanjas con material de río seleccionado, previamente aprobado por la interventoría, posterior a la instalación y verificación de la tubería.

Medida y pago

Esta actividad se paga por metro cubico (m3); incluye costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/10/2025–5/11/2025)	148,33	148,33	78,00	52,59%
Totales acumuladas	**148,33**	**148,33**	**78,00**	**52,59%**

Periodo de ejecución	Cantidad contratada	Cantidad modificada	Cantidad ejecutada	Porcentaje de ejecución
(06/11/2025–05/12/2025)	148,33	148,33	70,33	47,41%
Totales acumuladas	**148,33**	**148,33**	**70,33**	**47,41%**

Total, Porcentaje ejecutado *(06/10/2025 -05/12/2025)*	**100,00%**

8. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- El ingeniero JESUS EDINSON CARREÑO TEZ en su calidad de contratista de obra del contrato No.369-2025, inicio labores el día 06 de octubre de 2025, iniciando con el desplazamiento y visita conjunta con el residente de interventoría del contrato, el ingeniero CAMILO HUMBERTO GUZMAN BOCA NEGRA como parte del equipo técnico de la firma CARLOT S.A.S ZOMAC interventora del proyecto y la supervisión del contrato a cargo de funcionarios de la secretaria de infraestructura municipal de Puerto Asís al sitio de la obra el día 06 de octubre de 2025.

- El primer día de iniciación de labores de ejecución de la obra, se solicitó muy comedidamente se nos proporcione todos los documentos presentados por el contratista de obra y su equipo de trabajo para revisar el contrato de obra, pólizas, cronogramas y presupuesto de obra; para poder llevar un control de las actividades realizadas por el contratista y así mismo agilizar la ejecución proyectada del mismo.

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

- La interventoría realizó el seguimiento técnico, financiero y administrativo del contrato de obra No. 369-2025 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, sin que se presenten inconvenientes en el transcurso del desarrollo de las actividades contractuales.

- Durante el desarrollo del contrato, como interventoría se veló por la correcta ejecución de las actividades, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la adecuada utilización de los recursos, y la coordinación entre los actores responsables, sin que se presentaran inconvenientes que afectaran la normal ejecución del proyecto.

9. Seguimiento a la implementación PAGA

Como parte del seguimiento a las labores el contratista y supervisadas por la interventoría, a continuación, se presenta el resumen de los temas más relevante en relación con los aspectos del PAGA.

Objetivo General.

Presentar las actividades realizadas en cumplimiento al desarrollo del Plan de adaptación de la guía ambiental (PAGA), en obediencia a la normatividad ambiental vigente y al requerimiento contractual del contrato de obra 369-2025 de 29/08/2025.

Programa gestión ambiental medio abiótico

Instalaciones de infraestructura temporal.

Este programa establece las medidas mínimas que el contratista debe implementar para la instalación, operación y desmantelamiento de los campamentos y sitios de acopio temporal (bodegas) requeridos para la ejecución de las obras del proyecto. Asimismo, define los lineamientos ambientales que deberán aplicarse durante todas las fases de funcionamiento de dichas instalaciones.

El contratista implementó el campamento y/o las áreas de acopio temporal destinadas al almacenamiento de materiales de construcción, residuos de excavación, escombros de demolición y zonas para el parqueo de maquinaria, entre otros, garantizando el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas para minimizar los impactos sobre el suelo, el aire y la vegetación circundante.

Manejo de excavaciones, rellenos y movimiento de tierras

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

Se revisa el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental descritas para las actividades de excavación y relleno. Se verifica que:

- El almacenamiento del material de descapote y excavación se realice de forma ordenada dentro del área de obra, evitando la obstrucción de las zonas de trabajo.
- El volumen reportado de 320,45 m³ de material de excavación corresponde al material efectivamente removido y dispuesto según las áreas autorizadas, lo cual fue corroborado mediante inspección visual y revisión de los registros de transporte.
- Las volquetas empleadas para el transporte de material de excavación, relleno o descapote deben mantener el uso obligatorio de lonas o cobertores durante todo el recorrido. Esta medida es fundamental para evitar la dispersión de partículas, la caída de material en la vía y la generación de polvo, contribuyendo así al cumplimiento de las normas ambientales y de seguridad vial.

Manejo integral de materiales de construcción

Durante la revisión de las actividades correspondientes al manejo integral de materiales de construcción, la interventoría realizó la verificación en campo de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, evidenciando un cumplimiento satisfactorio de las disposiciones aplicables.

- Los materiales fueron almacenados adecuadamente, en zonas ventiladas, secas, aisladas del suelo y protegidas de la lluvia.
- El cemento se mantuvo en lugares secos y libres de humedad.
- El personal de obra hizo uso de los elementos de protección personal (EPP) requeridos para la manipulación y transporte de materiales, garantizando condiciones seguras de trabajo.
- No se realizaron mezclas directamente sobre el suelo y se evitó el lavado de mezcladoras en frentes de obra o cuerpos de agua, previniendo afectaciones ambientales.

10. Seguimiento a la implementación Plan de Manejo de Transito

Como parte del seguimiento a las labores el contratista y supervisadas por la interventoría, a continuación, se presenta el resumen de los temas más relevante en relación con los aspectos del Plan de Manejo de tránsito.

El contratista implementó las medidas de señalización, control y orientación del tránsito vehicular y peatonal, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de la vía, los trabajadores y la comunidad aledaña. Las acciones ejecutadas se desarrollaron conforme a lo establecido en el PMT aprobado.

- Se instalaron señales preventivas, reglamentarias e informativas en puntos estratégicos de ingreso, tránsito y salida de los vehículos relacionados con la obra.

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

- Se mantuvo comunicación constante con la comunidad y las autoridades de tránsito para mitigar molestias o riesgos durante la ejecución de los trabajos.
- Las maniobras de transporte de materiales se realizaron en horarios establecidos para reducir congestión y minimizar el impacto sobre la movilidad local.
- No se reportaron incidentes viales durante el periodo evaluado.

11. REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES Y CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.

11.1. Actas generadas (06/10/2025 – 05/12/2025)

NO. DE ACTA	FECHA DEL ACTA	ACTA

11.2. Correspondencia enviada (06/10/2025 – 05/12/2025)

Fecha	Consecutivo	Asunto	Destinatario
01/10/2025	INT-386-2025-OF-001	Solicitud de planos, especificaciones técnicas y proceso constructivos	Secretaría de infraestructura s.infraestructura@puertoasis-putumayo.gov.co
08/10/2025	INT-386-2025-OF-002	Solicitud de información inicial del contrato de obra	Ing. JESÚS EDINSON CARREÑO TEZ edisonco128@gmail.com contratista de obra
15/10/2025	INT-386-2025-OF-003	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de obra	Ing. JESÚS EDINSON CARREÑO TEZ edisonco128@gmail.com contratista de obra
23/10/2025	INT-386-2025-OF-004	Solicitud de reparación de daño en red sanitaria	Ing. JESÚS EDINSON CARREÑO TEZ edisonco128@gmail.com contratista de obra
28/10/2025	INT-386-2025-OF-005	Puesta en conocimiento y solicitud de acciones correctivas	Ing. JESÚS EDINSON CARREÑO TEZ edisonco128@gmail.com contratista de obra
31/10/2025	INT-386-2025-OF-006	Solicitud de informe mensual de avance – Octubre de 2025	Ing. JESÚS EDINSON CARREÑO TEZ edisonco128@gmail.com contratista de obra
31/10/2025	INT-386-2025-OF-007	Afectación de box culvert durante la ejecución de actividades de obra	Ing. JESÚS EDINSON CARREÑO TEZ edisonco128@gmail.com contratista de obra
31/10/2025	INT-386-2025-OF-008	Solicitud de comité técnico No. 01	Secretaría de infraestructura s.infraestructura@puertoasis-putumayo.gov.co

11.3. Correspondencia recibida (06/10/2025 – 05/12/2025)

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

Fecha	Consecutivo	Asunto	Destinatario
14/10/2025	NA	asunto: entrega de documentación inicial solicitada según oficio de radicado no int-386-2025-of-002.	CARLOT S.A.S ZOMAC Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
31/10/2025	SN	SOLICITUD FORMAL DE COMITÉ TÉCNICO PARA EL DÍA MARTES (04/11/2025)	CARLOT S.A.S ZOMAC Rep. Legal: JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL

10. CONCLUSIONES


1. La interventoría presenta el informe final correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de octubre y el 05 de diciembre de 2025, con base en las actividades verificadas y documentadas durante dicho intervalo.
2. La obra se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas contractuales, alcanzando un avance físico acumulado del 100 % entre el 06 de octubre y el 05 de diciembre de 2025, según lo constatado en las visitas de verificación realizadas en campo por la interventoría.
3. El contratista de obra cumplió con la implementación de las actividades establecidas en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA, conforme a los lineamientos ambientales del proyecto.
4. Durante el desarrollo de la obra, el contratista mantuvo el cumplimiento satisfactorio de las medidas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, asegurando la entrega de elementos de protección personal, la instalación de señalización preventiva y la ejecución de prácticas seguras en el frente de obra.
5. El contratista presentó el Concepto Técnico No. 688, correspondiente a la evaluación y autorización para la ocupación de cauce requerida para la ejecución del proyecto "Construcción de alcantarillado pluvial sobre la Carrera 26 entre Calle 24 y Calle 26, Calle 26 entre Carrera 26 y 27, Barrio Buenos Aires, Municipio de Puerto Asís, Putumayo".
6. El contratista de obra cumplió con los requisitos contractuales, manteniendo debidamente actualizadas las pólizas exigidas para la vigencia del contrato.
7. Se recomienda a la entidad contratante realizar la entrega oficial del sistema de alcantarillado pluvial instalado a la empresa prestadora de los servicios públicos del municipio de Puerto Asís, con el fin de garantizar su mantenimiento periódico, asegurando así la correcta prestación del servicio a la comunidad..

PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com


11. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. REALIZAR PREMILIMARES
1.01. Localización y replanteo



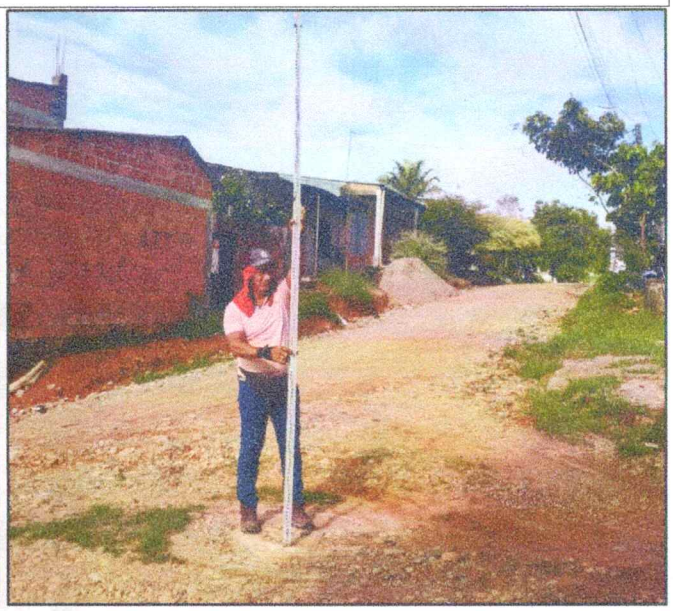

2. REALIZAR EXCAVACIONES
2.01. Excavación manual para alcantarillado pluvial

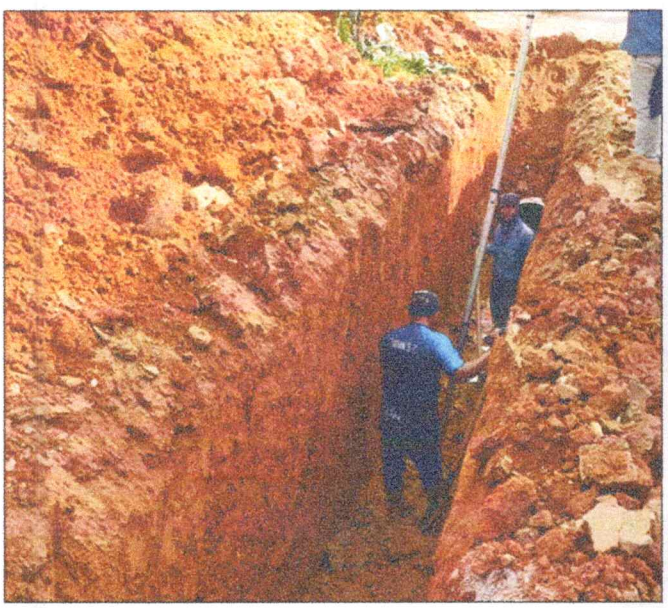



PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

3. INSTALAR TUBERIA

3.01. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 24" (para alcantarillado aguas lluvias)





3.02. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 27" (para alcantarillado aguas lluvias)





PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

3.03. Suministro e instalación de tubería corrugada PVC de 10" (para conexión sumideros)





3..04. Encamado en arena para nivelación de tubería E= 15 cm






PUERTO ASIS – PUTUMAYO
Mzn 3 Calle 12 / Barrio Modelo, Teléfono: 3142811822, Email: carlotsas@hotmail.com

4. CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO
4.01. Sumidero de aguas lluvias tipo SL -100 en concreto de 3500 PSI, (Incluye rejilla metalica)





4.02. Cámara de inspección en concreto 4000 PSI, D= 1,20 m, H=1,00 - 1,50 m

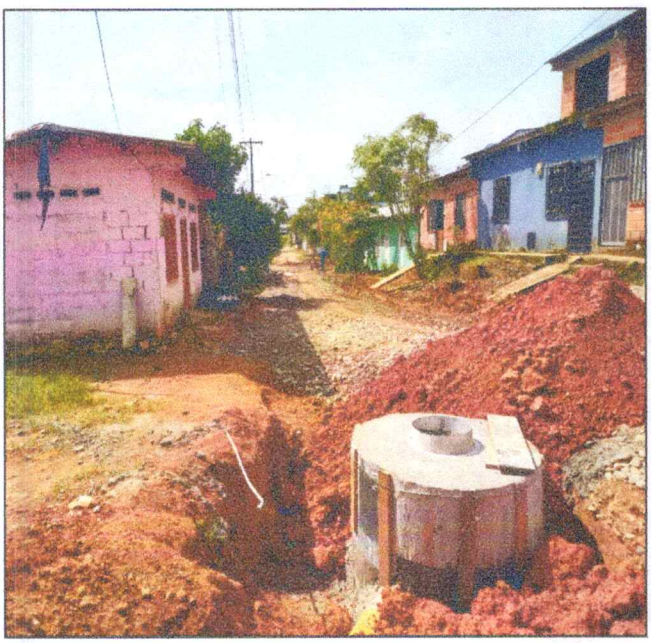



4.03.	Cárcamo para protección de tubería de 27" Y 24", (Incluye acero de refuerzo)





5.	REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS
5.01.	Relleno compacto con material de rio seleccionado





Cordialmente,

JAZMIN ROCIO ROMO BERNAL
C.C. No 1.123.209.227 de Puerto Asís (Putumayo)
Repr. Legal: CARLOT S.A.S ZOMAC
NIT: 901379301-8
Correo: carlotsaszomac@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101265178	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	12	2025	06	10	2025	00:00	08	12	2030	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CARLOT SAS ZOMAC	NIT: 901.379.301-8	3142811822

DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 10 - 36 BRR SAN NICOLAS — CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	NIT: 891.200.461-3	0

DIRECCIÓN: CENTRO — CIUDAD: PUERTO ASIS, PUTUMAYO

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO No. 386-2025, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 26 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 26 ENTRE CARRERA 26 Y 27, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/10/2025	07/06/2026	$2,178,594.90	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/10/2025	08/12/2028	$1,089,297.45	
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	05/12/2030	$2,178,594.90	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 05/12/2025.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ********5,446,487.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE SEG	83052	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

11-44-101265178

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

B&R 0568-25

LA OFICINA DE BIENES Y RENTAS DE
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS

C E R T I F I C A

Que, el establecimiento **CARLOT S.A.S ZOMAC** **NIT**: 901.379.301-8 Representación Legal del señor **ROMO BERNAL JAZMIN ROCIO** identificado (a) con **C.C. No 1.123.209.227** presentó la declaración privada de Industria y Comercio y canceló el Impuesto de Industria y Comercio del periodo gravable Año, **2024**

Se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de **INDUSTRIA Y COMERCIO** del periodo gravable Año , **2024**

El contribuyente está sujeto a revisión por parte de las autoridades de control fiscal.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado (a), a los veintinueve (29) días del mes de diciembre 2025.

ESTA CERTIFICACIÓN TIENE UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.

YARLADY RAMIREZ MEZA
TESORERA MUNICIPAL

Proyectó:	**Revisó:**	**Revisó:**	**Aprobó:**
Leidy Laura Angulo Hernandez Inspector Fiscal V	Víctor Wilmer Perenguez Narváez Jefe de Bienes y Rentas	Jackeline Alvarez Apoyo a la Gestión	José Fabian Flórez Hoyos Secretario De Hacienda

Los de arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo hemos encontrado ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presento para firmas

Scanned with CamScanner
