CVS	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SIG	Código: GJ-FO-30
		Versión: 09
	FORMATO SUPERVISIÓN CONVENIO O CONTRATO	Fecha:02/10/2024

CONTRATO ■ CONVENIO ☐ No. 047 - 2025

Proyecto (S): RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

LOCALIZACIÓN: Municipio: Planeta Rica Vereda: N/A

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025.

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral, de acuerdo con la información suministrada por la interventoría CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe periódico N°5 y N°6 correspondientes a los períodos 16 al 30 de noviembre y 1 al 15 de diciembre de 2025.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL

DATOS DEL CONTRATO:

CONTRATO N°:	047 DE 2025
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	26 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARROYO CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA
OBJETO:	RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DE ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	OCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS MCTE ($8.111.095.014)
ANTICIPO (40%):	Si X No___ Valor: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CINCO PESOS MCTE ($3.244.438.005).
PLAZO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION 1:	15 DE ENERO DE 2026
MODIFICACIÓN No. 1	REDUCCIÓN DE 0.5 MESES DE PLAZO
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	30 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	N/A	N/A
	Reinicio No. 1	**N/A**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**N/A**		
PRÓRROGAS:	Prórroga No. 1	*N/A*	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	N/A		

Póliza inicial firma de contrato

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	26/08/2025	26/06/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	26/08/2025	26/12/2028	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	26/08/2025	26/12/2025	$711.750.000

Póliza actualiza al acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	contactenos@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**11-44-101263402**			**ANEXO No**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$1.622.219.002,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	**SI**	15/09/2025	16/07/2026	$3.244.438.005,6
Estabilidad / Calidad / correcto funcionamiento	**SI**	5 años, 4 meses y 1 día		$1.622.219.002,80
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	**SI**	15/09/2025	15/01/2028	$811.109.501,40
POLIZA RCE No.	**11-40101082273**			
Responsabilidad civil extracontractual	**SI**	15/08\9/2025	15/01/2025	$711.750.000

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO :

MEDIO DE TRAMITE	RADICADO	ASUNTO	FECHA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS


De acuerdo con la información suministrada por la interventoría externa CONINARQ (Contrato N°051-2025) en su informe periódico N°5 y N°6 correspondientes a los periodos 16 al 30 de noviembre de 2025 y 1 al 15 de diciembre, las actividades ejecutadas hasta la fecha en el contrato N°047-2025 cuyo objeto es: "RECUPERACIÓN DE LA CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA CON ÉNFASIS ECOSISTÉMICO DE UN TRAMO DEL

ARROYO CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", son las siguientes:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA PERIODO	CANT EJECUTADA ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD
1	**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	8,220.00	0	8220.0	100%
2	**REALIZAR MOVIMIENTOS DE TIERRA**					
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra.	m3	146,804.43	57254.0	130656.0	89%
2.2	Conformación de diques y dentellones a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación	m3	103,553.56	40386.0	86985.0	84%
2.3	Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral.	m3	56,226.13	21929.0	50042.0	89%
3	**RECUPERACIÓN BOSQUE DE GALERÍA**					
3.1	Realizar establecimiento de árboles nativos para la conformación del bosque de galería	Unid	12,544.00	9283.00	12544.0	100%
3.2	Realizar Aislamiento del arreglo Forestal	km	15.8	6.16	15.80	100%
3.3	Realizar mantenimiento del arreglo forestal	Ha	15.8	0	0	0%
4	**REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION**					
4.1	Realizar talleres de sensibilización en el manejo de residuos solidos	Taller	10	6	6	60%
4.2	Realizar talleres de sensibilización en el cuidado de las obras	Taller	2	0	0	0%

De acuerdo con lo anteriormente descrito, según el informe N°5 y N°6 de la Interventoría externa, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051-2025 por parte de la firma CONINARQ, el avance acumulado del contrato de obra N°047-2025 es del 86.39% de ejecución con corte al día 15 de diciembre de 2025.

CONTROL DE PROGRAMACION DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES

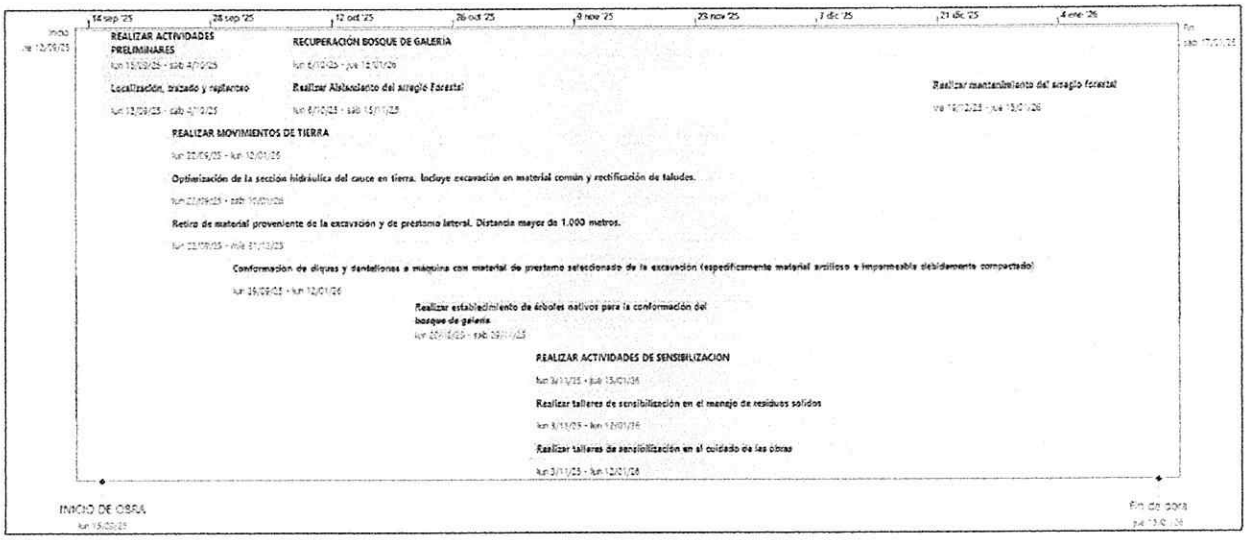

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO $ 8.111.095.014
VALOR ANTICIPO **$3.244.438.005**
% AVANCE FINANCIERO **CUARENTA PORCIENTO (40%)**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	29/10/2025	$3.244.438.005	$3.244.438.005	$0	$0	$3.244.438.005	$0	$3.244.438.005
ACTA 01	2/12/2025	$3.690.143.131	$3.690.143.131	$1.476.057.252	$1.476.057.252	$2.214.085.879	$0	$5.458.523.884
ACTA 02	16/12/2025	$3.316.844.622	$3.316.844.622	$1.326.737.849	$2.802.795.101	$0	$1.326.737.849	$6.785.261.733

42

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO

Eje de calidad

REQUISITOS DE CALIDAD CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1)Asegurar que el personal tenga la educación, formación y experiencia necesarias. 2)Socializar la documentación del Sistema de Gestión Integral de la CVS con el equipo. 3)Realizar un ejercicio muestral para evaluar la satisfacción de los beneficiarios y entregar los resultados a la CVS. 4)Documentar y gestionar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), informando a la CVS. 5)Asegurar que los equipos de medición tengan certificaciones de calibración iniciales y verificaciones intermedias, y entregar copias a la CVS.	Se continuaron visitas de concertación y solicitud de permisos a propietarios de predios aledaños al tramo a intervenir. Por otra parte, se incluyeron certificados de calibración de equipos de topografía y se notificó acerca de la elaboración de ensayos de calidad del material utilizado en la construcción de bordas hidrológicas.	La información suministrada ha sido reportada y avalada por la interventoría externa CONINARQ mediante el infome N°6 correspondiente al periodo 1 al 15 de diciembre de 2025.

Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1)Designar un representante de seguridad y salud en el trabajo. 2)Entregar una autoevaluación anual aprobada por la ARL. 3)Presentar la matriz de riesgos y controles a la CVS. 4)Realizar inducción en seguridad y salud al equipo de trabajo. 5)Proveer y asegurar el uso correcto de elementos de protección personal.	En el documento INFORME DE PGIO del CONSORCIO ARROYO CAROLINA anexo al informe de interventoría N°4, se indica lo siguiente: Anexan los formatos de seguimiento al sistema de gestión SST	La información suministrada ha sido reportada y avalada por la interventoría externa CONINARQ mediante el infome N°6 correspondiente al periodo 1 al 15 de diciembre de 2025

6)Asegurar afiliación al Sistema de Seguridad Social y contar con concepto médico favorable. 7)Tener un plan de prevención y respuesta ante emergencias.		
8)Presentar certificados de revisión técnica y programa de seguridad vial para el uso de transporte.	Anexan cronograma de capacitaciones SST: Inducción en SST y MA, Riesgos, Uso de EPP, Autocuidado, entre otros. Anexan formato de registro de entrega de *entrega de EPP al personal calificado* vinculado a la obra El personal vinculado a la obra se encuentra afiliado a la seguridad social integral (ARL, AFP, EPS Y CCF). Anexan certificados de afiliación y exámenes médicos ocupacionales del personal calificado.	

Eje ambiental

REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1)Identificar y mitigar impactos ambientales de las actividades. 2)Ahorrar y usar eficientemente recursos (agua, energía, papel) y manejar adecuadamente los residuos. 3)Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos según la normativa. 4)Implementar un plan de saneamiento que incluya limpieza, manejo de residuos, control de plagas y suministro de agua potable.	En el documento INFORME DE PGIO del CONSORCIO ARROYO CAROLINA anexo al informe de interventoría N°1, se indica lo siguiente: Anexan el formato "Cronograma de inspecciones planeadas": sustancias químicas, entre otros.	La información suministrada ha sido reportada y avalada por la interventoría externa CONINARQ mediante el infome N°6 correspondiente al periodo 1 al 15 de diciembre de 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





Fotografía No.	01	**Fotografía No.**	02
Fecha:	4/12/2025	**Fecha:**	5/12/2025
Actividad:	Control topográfico	**Actividad:**	Control topográfico

Observaciones:





Fotografía No.	03	**Fotografía No.**	04
Fecha:	5/12/2025	**Fecha:**	5/12/2025
Actividad:	Control topográfico	**Lugar:**	Recuperación hidrológica y excavación de material común


Observaciones:





Fotografía No.	05	**Fotografía No.**	06
Fecha:	6/12/2025	**Fecha:**	9/12/2025
Actividad:	Recuperación hidrológica y excavación de material común	**Actividad:**	Recuperación hidrológica y construcción desarenador

Observaciones:

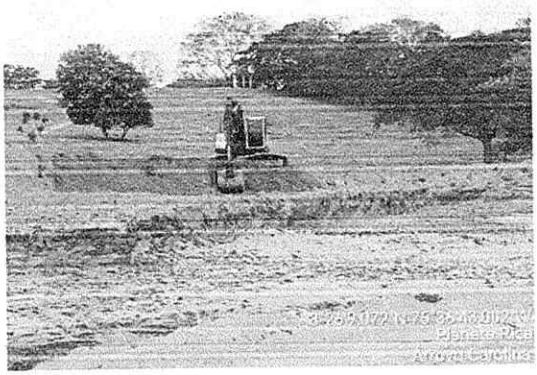



Fotografía No.	07	**Fotografía No.**	08
Fecha:	7/11/2025	**Fecha:**	8/11/2025
Actividad:	Recuperación hidrológica y excavación de material común	**Lugar:**	Rectificación de taludes.

Observaciones:





Fotografía No.	09	Fotografía No.	10
Fecha:	12/11/2025	Fecha:	13/11/2025
Actividad:	Siembra de árboles nativos.	Actividad:	Siembra de árboles nativos.

Observaciones:





Fotografía No.	11	Fotografía No.	12
Fecha:	14/11/2025	Fecha:	14/11/2025
Actividad:	Recuperación hidrológica y rectificación de taludes.	Lugar:	Recuperación hidrológica y rectificación de taludes..

Observaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el informe N°6 de la interventoría externa, ejecutada mediante contrato de interventoría N°051- 2025, la firma CONINARQ avala un avance del 86.39% de ejecución del contrato de obra N°047- 2025 corte al día 15 de diciembre de 2025.

Así mismo, la interventoría manifiesta que el CONSORCIO ARROYO CAROLINA, ha cumplido con los tiempos y actividades pactadas en la programación de obra y que, hasta la fecha, se han realizado actividades de localización y replanteo, Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra, conformación de bordas hidrológicas a máquina con material de préstamo seleccionado de la excavación, Retiro de material proveniente de la excavación y de préstamo lateral, Establecimiento de árboles nativos para conformación de bosque de galería y Aislamiento del arreglo forestal.

Para constancia se firma el día 16 de diciembre de 2025.

Supervisor CVS

Apoyo a la Supervisión CVS

Fecha corte informe: 15 de diciembre de 2025
