INFORME DE SUPERVISIÓN 01

(29 DE DICIEMBRE DE 2025)

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No. Y FECHA:	MC No. 044-2025 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN NIT: 890.206.058-1
CONTRATISTA:	PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS Nit. 901.045.685-7 R. L. DANIEL AMADO ROJAS C.C. No. 80.578.835 de Madrid
OBJETO:	"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER"
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 11130002
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 11240001 de fecha 24 de noviembre de 2025
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.3.2.02.02.005.21.02.011.01.02.54611 Redes de alumbrado público con mantenimiento / 1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO 2.3.2.02.02 005.21.02. 011.01.01.54242 Redes de alumbrado público con mantenimiento / 1.2.2.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales de conformidad previa entrega e instalación de los elementos objeto del presente proceso, previa presentación de Informe de actividades, con el recibido de conformidad y a satisfacción, por el supervisor o quien haga sus veces. El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales **Parágrafo 1:** Los pagos deberán realizarse a través de transferencia bancaria en la cuenta registrada por el contratista.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 36.709.293,00).
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO C.C. 1.099.282.542 Contratación. Secretario Planeación e Infraestructura.
FECHA DE INICIACIÓN	PRIMERO (01) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de suministros No. MC-044-2025, cuyo objeto es: **"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER"**, de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2025, suscrito con el contratista, **PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS** identificado con NIT 901.045.685-7 representada legalmente por **DANIEL AMADO ROJAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.578.835 de Madrid, es necesario presentar el informe de Supervisión 01 donde se constata el cumplimiento del objeto contractual.

En este sentido, y dando cumplimiento a mis funciones como supervisor contempladas en la Ley 1474 de 2011, se describe a continuación el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, ejercí como supervisor por cuanto no se requieren conocimientos especializados y a su vez las labores realizadas por el contratista y los problemas presentados en la ejecución del mismo.

Relación y Balance financiero del Contrato

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO	**$ 36.709.293,00**	
VALOR CANCELADO		$0,00
VALOR A CANCELAR POR LA PRESENTE ACTA		$ 36.709.293,00
SALDO POR EJECUTAR		$0,00.
SUMAS IGUALES	**$ 36.709.293,00**	**$ 36.709.293,00**

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA

En cumplimiento del objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO: "MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER", No. MC-044-2025**, el contratista cumplió con las actividades objeto de esta contratación, las cuales se encuentran adscritas en el informe de actividades 01 presentadas por el contratista de la siguiente manera:

PROYECTO:	"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER".				
PRESUPUESTO OFICIAL ALUMBRADO NAVIDEÑO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	Montaje e instalación de extensión led lin 300 Luces blanco 18 metros, incluye accesorios para su instalación.	und	10	$147.800,00	$ 1.478.000
2	Montaje e instalación de luces led lluvia blanco 10 x 0.6 metros 1776 EG44LBT, incluye accesorios para su instalación.	und	13	$65.000,00	$ 845.000
3	Suministro e instalación cortina en luz blanca tipo cascada de 2 metros de altura por 6 metros de ancho, incluye accesorio para su instalación en el parque principal.	und	15	$140.000,00	$ 2.100.000
4	Suministro e instalación secuencial manguera 100 m3 vias led para ser instaladas en la Alcaldía Municipal (incluye accesorio para su instalación)	und	5	$510.000,00	$ 2.550.000
5	Suministro e instalación a todo costo de figuras navideñas luminosas de 1 metro para ser ubicadas en el parque principal con elementos de fijación, incluye acceesorios para su instalación	und	10	$212.800,00	$ 2.128.000
6	Suministro e instalación reflector 50 w rgb irl 47, incluye accesorio para su instalación en el parque principal y el edificio de la Administarción Municipal.	und	11	$51.955,00	$ 571.505
VALOR TOTAL REDONDEADO A CERO					$ 9.672.505,00

PROYECTO:	"MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER".				
PRESUPUESTO OFICIAL ALUMBRADO PÚBLICO					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	V/R UNIT	V/R TOTAL
1	Suministro e instalación Lampara LED de alumbrado público con fotocelda azul, potencia 100 watts, 11000 lúmenes, voltaje AC 85-265 V, IRC 80, Angulo de Apertura 140°, Dimensiones 61.8 x 14.4 cm, Color de luz blanca 6500k, Temp.operación -20° a +50°C, Protección IP65, Factor de potencia 0.9, Protección IK 0.7, Vida útil 40.000 Horas.	und	75	$ 267.030	$ 20.027.250
					$ 20.027.250,00
ADMINISTRACION				29%	$ 5.807.902,50
IMPREVISTOS				1%	$ 200.272,50
UTILIDAD				5%	$ 1.001.362,50
VALOR TOTAL REDONDEADO A CERO					$ 27.036.788,00

De igual manera, es importante resaltar, el Contratista dio cumplimiento a la totalidad de lo solicitado descrito en el informe 01 en el contrato de suministro No. MC-044–2025.

NOTA: Forma parte integral del presente informe de supervisión, el correspondiente informe presentado por el Contratista con sus respectivos soportes, con lo cual se puede evidenciar concretamente la ejecución de todas las actividades contratadas de conformidad y a satisfacción.

ACTIVIDADES DESARROLLADOS POR EL SUPERVISOR DURANTE EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO

En la ejecución del presente contrato, el suscrito supervisor ejecutó las siguientes actividades:

- ✓ Apoyé el logro de los objetivos contractuales.
- ✓ Velé por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del mismo.
- ✓ Mantuve en contacto a las partes del contrato.
- ✓ Evité la generación de controversias y propendí por su rápida solución.
- ✓ Solicité el informe detallado por parte del contratista con el cual pude constatar y verificar la adecuada ejecución del contrato.
- ✓ Aprobé mediante el presente informe la entrega de los servicios, los cuales cumplieron a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades que se pactaron.
- ✓ Estuve atento para informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que pudieran constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; situación que no ha sucedido en la ejecución del presente contrato.
- ✓ Hice el seguimiento en cuanto al posible incumplimiento contractual; escenario que tampoco se ha presentado en lo corrido del contrato supervisado.
- ✓ Hice un seguimiento a los riesgos asignados a las partes en la matriz de riesgos que se realizó para el presente proceso de Contratación, no encontrando inconformidades.

CONCLUSIONES

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, se tiene **PROYECTOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS ELECTRICAS SAS** identificado con NIT 901.045.685-7 representada legalmente por **DANIEL AMADO ROJAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.578.835 de Madrid, cumplió con las ordenes de suministro, conforme a los requerimientos efectuados por la entidad territorial.

Igualmente, el contratista presenta constancias de pago de seguridad social, así mismo, anexa factura No. **54 Y 55** por valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 36.709.293,00)** m/cte.

RECOMENDACIONES

Dentro de la ejecución del contrato no se hace necesario efectuar recomendaciones, por cuanto el contratista cumplió con el alcance del objeto contractual de acuerdo a lo pactado.

En constancia,

DIEGO FERNANDO MORENO CARREÑO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor.

Elaboró: Diana Marcela Carreño Peñaloza CPS- Planeación

REGISTRO FOTOGRÁFICO ALUMBRADO NAVIDEÑO





























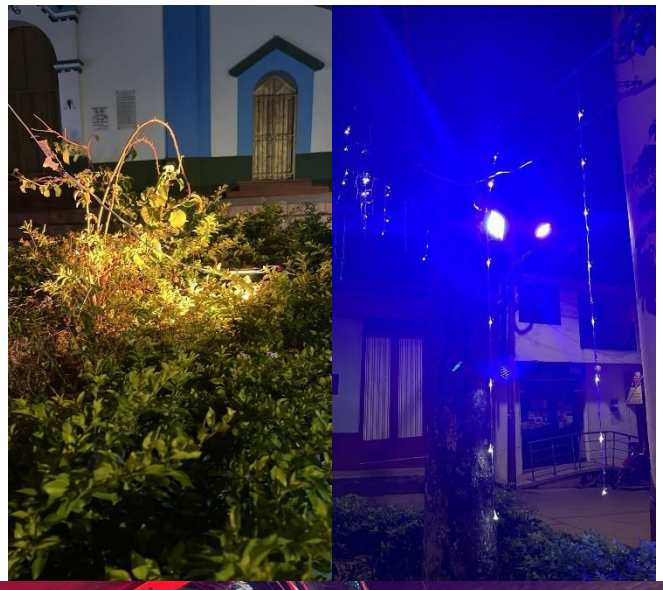





CONTRATACIÓN



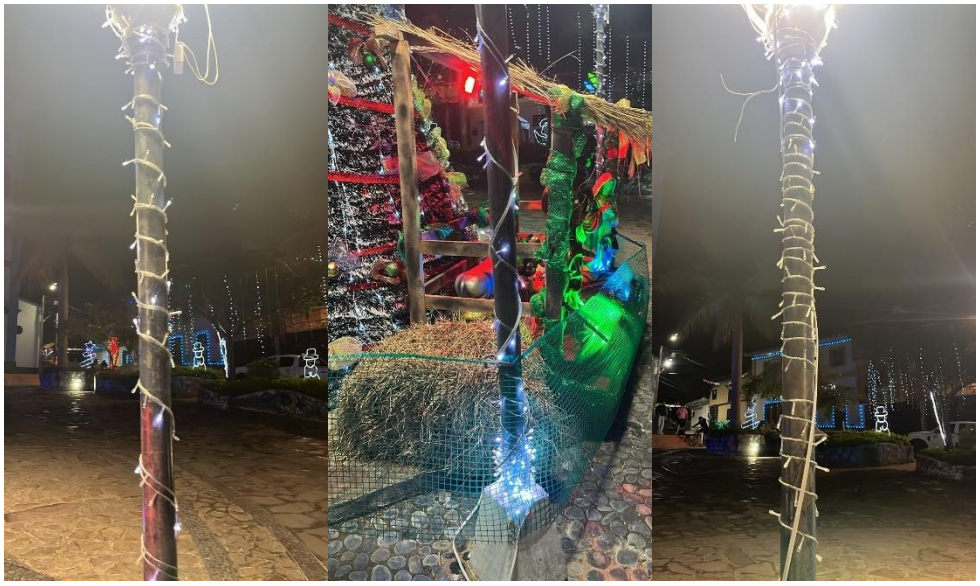

CONTRATACION







3




YO
CONTR
YO
CONTR





ALUMBRADO PÚBLICO





































