INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO ÚNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS		
IDENTIFICACIÓN:	800.107.521-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9499	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X__	
	DECLARA:	SI __X__ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSÉ BLANCO RANGEL – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO		
NÚMERO DE CONTRATO	CDRE – SOC – 2025 – 017	**FECHA:** 06/10/2025	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo del convenio solidario será UN (01) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio.		
VALOR:	Para efectos de la celebración del Convenio Solidario, el presupuesto oficial estimado asciende a la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($39.820.017,06)**. Para efecto de aportes conjuntos, se tendrá en cuenta lo siguiente: - Por el Municipio de El Socorro se aportará la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($38.467.517,06).** - Por parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Reinas del Municipio del Socorro, se aportará la mano de obra no calificada para la realización de la obra por un valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($1.352.500,00)** y un ingeniero Civil.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8422286		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00649	**FECHA:** 07/10/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-01331	**FECHA:** 07/07/2025	

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSIÓN – OTROS SECTORES 2: Total gastos administración central 2.3: INVERSIÓN 2.3.2: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.01: MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003: OTROS BIENES TRANSPORTABLES 2.3.2.02.01.003.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRASFORMACIÓN E INNOVACIÓN 2.3.2.02.01.003.02.24: TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.02.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.02.01.003.02.24.2402.2402041: vía terciaria mejorada		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100019046 / B-100069002	
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA EXPEDICIÓN:	16/10/2025	
	FECHA DE APROBACIÓN:	16/10/2025	
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaría de Hacienda y del Tesoro Municipal. Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un único pago una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra conforme a las condiciones establecidas, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS**. El valor del valor del aporte del Municipio contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución del mismo, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, la asociación no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el Municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	04/11/2025		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	03/12/2025		
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE	ENERO
	NUMERO PLANILLA:	35600956	35600968
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35600956	35600968
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35600956	35600968

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	**EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL**	**OBSERVACIONES**	**VERIFICACIÓN**
1.1 Suministro e instalación de sub-base granular.	Se evidencia el suministro e instalación de 27,60 m3 de sub-base granular. Se verifica mediante visita al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexa	NINGUNA	CUMPLE
1.2 suministro e instalación de concreto de 2.000 psi para solado de estructuras	Se evidencia suministro e instalación de concreto de 2.000 psi de 1,55 m3 para solado de estructuras. Se verifica mediante visita al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexa	NINGUNA	CUMPLE
1.3 suministro e instalación de concreto de 3.000 psi para estructura	Se evidencia el suministro e instalación de concreto de 3.000 PSI de 27,95 M3 para estructura. Se verifica mediante visita al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexa	NINGUNA	CUMPLE
1.4 suministro de acero de refuerzo con varilla corrugada	Se evidencia el suministro de acero de refuerzo con varilla corrugada de 1.535,67 KG. Se verifica mediante visita al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexa	NINGUNA	CUMPLE
1.5 concreto tipo ciclópeo de 3.000 psi, porcentaje de piedra pegada de 40% de concreto 60%.	Se evidencia el suministro de concreto tipo ciclópeo de 3.000 psi, porcentaje de piedra pegada de 40% de concreto 60%. De 10,80 M3. Se verifica mediante visita al lugar de ejecución de la obra y memoria de cantidades anexa	NINGUNA	CUMPLE

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	**$39.820.017,06**	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
APORTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL		$1.352.500,00
UNICO PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 29/12/2025		$38.467.517,06
VALOR POR COBRAR		$ 00,00
SUMAS IGUALES	**$39.820.017,06**	**$39.820.017,06**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	FE-1	FECHA: 03/12/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	ÚNICO PAGO	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	NO APLICA	NO APLICA

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 29 de diciembre 2025.

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER. 2025

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO



ITEM


1.1	Suministro e instalacion de Sub-base granular	UNIDAD	M3

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	VOLUMEN
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	1	40,00	3,60	144,00	0,15	21,60
2	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	2	40,00	0,50	20,00	0,15	6,00
						CANTIDAD	27,60

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

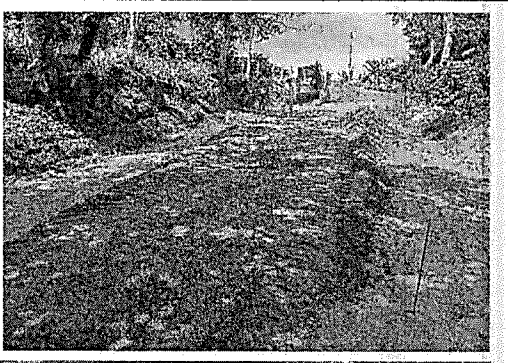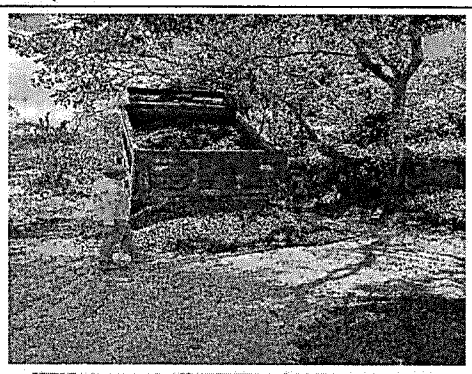

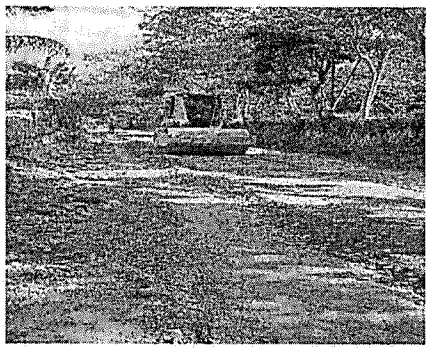Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura

Elabore: ING. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Ing Civil - MP 68202-266082 STD

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER. 2025


ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO


ITEM

1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2.000 PSI PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS	M3

MEMORIAS DE CALCULO — UNIDAD

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD				VOLUMEN
1	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	2	40,00				0,80
2	SUMINISTRO CONCRETO PARA RIOSTRAS	15	5,00	ANCHO	AREA	ALTO	0,75
CANTIDAD				0,20	8,00	0,05	1,55
OTOGRAFICO Y ESQUEMAS				0,20	1	0,05	

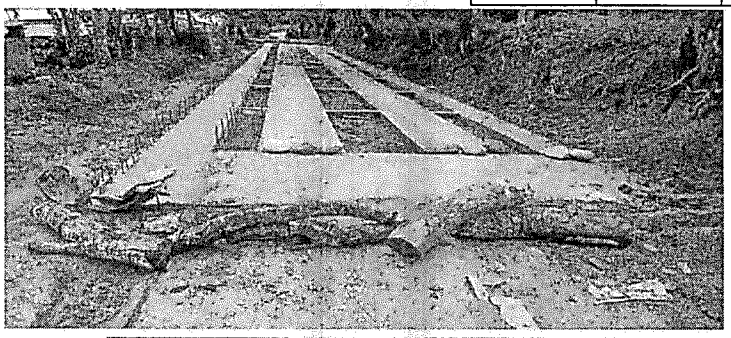

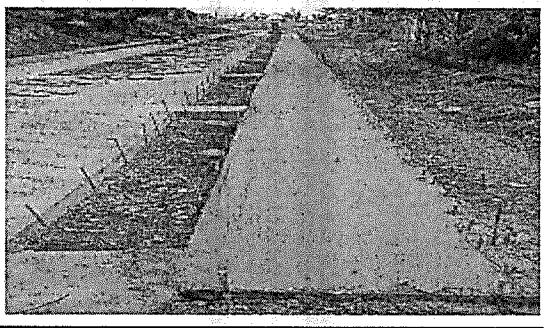

Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura

Elabore: ING. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Ing Civil - MP 68202-266082 STD

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES


AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AL TO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER. 2025

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM							
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS						M3

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD				VOLUMEN
1	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS HUELLAS	2	40,00				10,80
2	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS CUNETA	2	40,00			UNIDAD	6,60
3	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS bordillo	2	40,00				8,80
4	Resta de Area bordillo inclinacion (2 triangulos)	-1	40,00				-0,50
5	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS riostras vigas	15	5,00	ANCHO	AREA	ALTO	2,25
CANTIDAD				0,90	36,00	0,15	27,95
OTOGRAFICO Y ESQUEMAS				0,55	22,00	0,15	
				0,20	8,00	0,55	
				0,05	2,00	0,25	
				0,20	1	0,15	

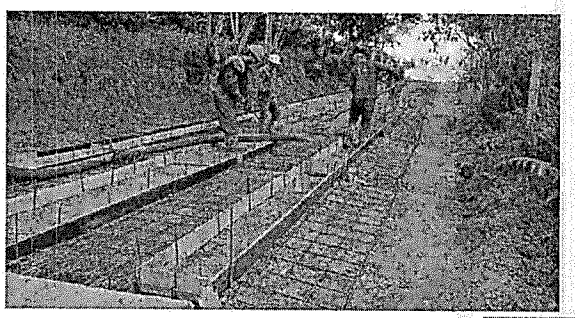



Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura

Elabore: ING. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Ing Civil - MP 68202-266082 STD

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AL TO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER. 2025


ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM

1.4	Suministro de Acero de refuerzo con varilla corrugada Fy=420 MPA						KG
ORIAS DE CALCULO							
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD				Kg
1	Acero de refuerzo longitudinal	22,00	40,00				876,48
2	Acero de ganchos	534,00	0,60			UNIDAD	179,42
3	Acero transversal	134	2,20				73,70
4	Acero riostra flejes viga	31	1,00				116,25
5	Acero riostra longitudinal viga	4	4,85		N. LOSAS	kgxml	289,81
CANTIDAD						0,996	1535,67
OTOGRAFICO Y ESQUEMAS				DIAMETRO		0,560	
				1/2" ó N.4		0,250	
				3/8" ó N.3	15	0,250	
				N.2	15	0,996	
				N.2			
				1/2" ó N.4			

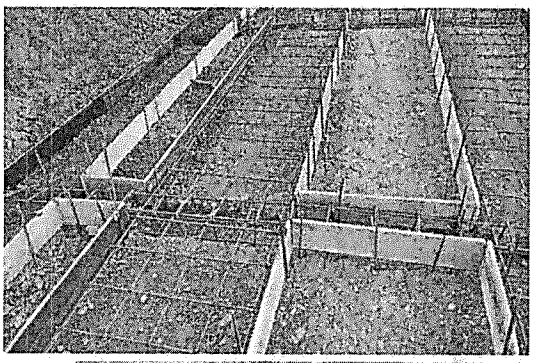



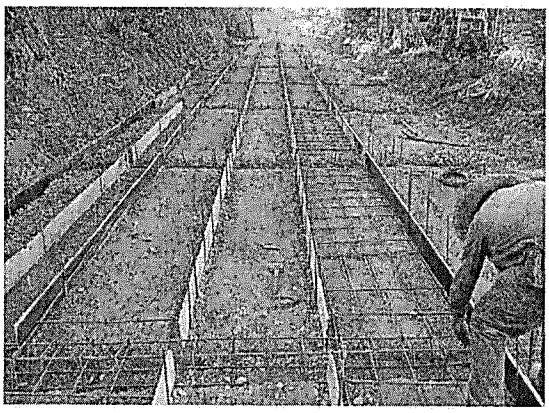

Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura

Elabore: ING. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Ing Civil - MP 68202-266082 STD

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO DE REINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER. 2025


ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO


ITEM

1.5	CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	M3

ORIAS DE CALCULO							
N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD				TOTAL
1	Concreto ciclopeo huellas	1	40,00				10,80
						UNIDAD	
CANTIDAD							10,80
OTOGRAFICO Y ESQUEMAS							

	AREA	ALTO
	72,00	0,15
ANCHO		
1,80		

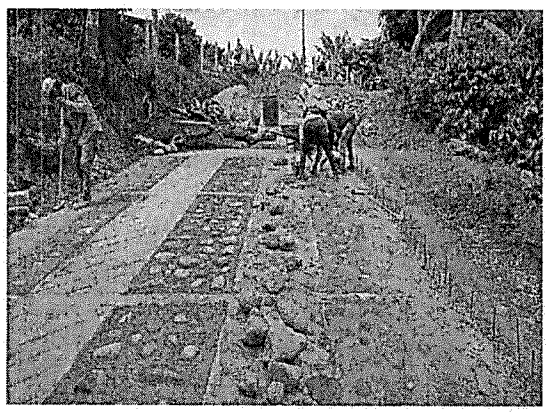

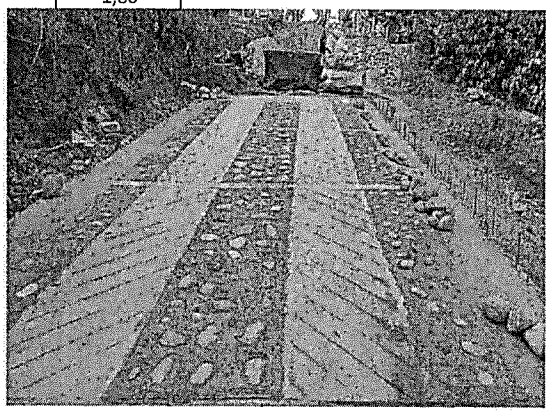

Ing. Camilo Jose Blanco Rangel
Secretario de Infraestructura

Elabore: ING. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Ing Civil - MP 68202-266082 STD
