SUPROCON S.A.S

NIT. 900.507.568-3

INFORME PARCIAL DE OBRA No.1



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:
No. 223 DE 2025

OBJETO:
PAVIMENTACION Y REHABILITACION VIAL EN LAS CALLES 23 A Y 23; EN EL BARRIO ALTOS DEL PIENTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ.

PRESENTADO A:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHARALÁ, SANTANDER

MUNICIPIO DE CHARALÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
JHONN ERICK FABIAN SACHICA SANATANA

PRESENTADO POR:

LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL SUPROCON S.A.S.
C.C. 1.098.673.284 DE BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PERIODO DE EJECUCION

DICIEMBRE 01 DE 2025 – DICIEMBRE 24 DE 2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....4
1. ESTADO DEL CONTRATO....5
1.1. Información básica del contrato....5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO....6
3. OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS....8
3.1. Estado del tramo de Pavimento....8
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES....8
4.1. Localizacion y replanteo 8
4.2. Excavacion con medios mecanicos en material comun, incluye retiro....8
4.3. Base Granular 8.
4.4. Losa de concreto MR-38 8.
4.5. Bordillo fundico en concreto de 3000 PSI 9
4.6. Muro en concreto reforzado 9.
4.7. Acero de refuerzo PDR-60 10
5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS....11
5.1. Localizacion y replanteo....11
5.2. Excavacion con medios mecanicos en material comun, incluye retiro....11
5.3. Base Granular. 12
5.4. Losa de concreto MR-38 13
5.5. Bordillo fundico en concreto de 3000 PSI....14
6. CONTROL DE CALIDAD....15
6.1. Información sobre pólizas del contrato....15
7. INFORMACIÓN DE PERSONAL....15
8. INFORME DE MAQUINARIA Y EQUPO....15
9. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE....16
10. CONCLUSIONES....17

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Ubicación del municipio de Charalá, Santander.....6
Ilustración 2. Localización general del proyecto.....6
Ilustración 3. Localización específica de lo tramos.. 7
Ilustración 4. Localizacion y replanteo.....11
Ilustración 5. Excavacion medios mecanicos en material comun. 11
Ilustración 6. BaseGranular espesor 0.20 m. 12
Ilustración 7. Losa de concreto MR-38 12
Ilustración 8. Bordillo en concreto de 3000 PSI.....13
Ilustración 9. Muro en concreto reforzado 13
Ilustración 10. Instalacion de Acero. 13

INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia a la ejecución de la obra construía durante el período de tiempo comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 al 24 de diciembre del 2025, teniendo como apoyo la supervisión realizada por la oficina de planeación y el cual contiene las actividades llevadas a cabo por el contratista SUPROCON S.A.S. para la ejecución del contrato cuyo objeto es **" PAVIMENTACION Y REHABILITACION VIAL EN LAS CALLES 23 A Y 23; EN EL BARRIO ALTOS DEL PIENTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ.",** donde se busca mejorar los accesos a las viviendas del sector y garantizar el funcionamiento de las vías para mantener la conectividad entre los barrios del Municipio.

1. ESTADO DEL CONTRATO

1.1. Información básica del contrato

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NUMERO DEL CONTRATO	223-2025
CONTRATISTA	SUPROCON S.A.S.
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA	LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT)	NIT. 900507568
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C. 79391416
SUPERVISOR	JHONN ERICK FABIAN SACHICA SANTANA
INTERVENTOR	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	**" PAVIMENTACION Y REHABILITACION VIAL EN LAS CALLES 23 A Y 23; EN EL BARRIO ALTOS DEL PIENTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ.",**
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($105.843.932,00)
VALOR DE ADICIONAL	N/A
PLAZO DEL CONTRATO	UN (1,0) MES
PLAZO ADICIONAL	N/A
ACTA DE INICIO	01 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE ANTICIPO	N/A
ACTA DE SUSPENSION NO.1	N/A
ACTA DE REINICIO No.1	N/A
PRORROGA No.1	N/A
ACTA DE PAGO PARCIAL No.1	N/A
ACTA DE ANTICIPO ADICIONAL	N/A
TERMINACIÓN INICIAL	N/A

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Charalá ubicado en el sur oriente de Colombia y es uno de los 87 municipios que integran el departamento de Santander, pertenece a la provincia Guanentá y este se ubica en la cordillera oriental de la gran región andina colombiana. Tiene una extensión total de 411 km2 y se halla en un lugar estratégico, a tan solo 35 km de San Gil, capital de la Provincia y capital turística de Santander y, a su vez a 135 km de Bucaramanga, capital del departamento.

El municipio limita al oriente con Encino y Coromoro, al Occidente con Oiba, Confines y Suaita, al Norte con Páramo, Ocamonte y Mogotes y al Sur con Gámbita y Duitama en el Departamento de Boyacá.

Ilustración 1. Ubicación del municipio de Charalá, Santander.



Ilustración 2. Localización general del proyecto



Ilustración 3. Localización específica de lo tramos.



El proyecto consta del siguiente tramo y características.

VÍA A CARACTERIZAR			COORDENADA GEOGRÁFICA DE INICIO		COORDENADA GEOGRÁFICA FINAL	
No.	Descripción	Longitud (m)	Norte	Este	Norte	Este
1	Pavimento calle 23 A	46.0	6°17'12.82"N	73° 8'37.33"O	6°17'13.08"N	73° 8'38.89"O
2	Pavimento calle 23	27.5	6°17'11.89"N	73° 8'38.19"O	6°17'11.75"N	73° 8'39.14"O

3. OBSERVACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS

3.1. Estado del tramo del Pavimento.

Se realizó visita de obra contando con la presencia del contratista y supervisión del contrato, durante la cual no se apreció ninguna variación significativa que genere variación, se manifista a la comunidad que debido a las pendientes es muy complejo dejar habilitados los parqueaderos se les deja claro que es por cuenta de cada una de las viviendas.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Durante el presente periodo, se desarrollaron las actividades de localización y replanteo, Excavacion con medios mecanicos en material comun, incluye retiro, Base granular, esp 0.2 m, Losa de concreto MR-38_esp 0.15 m, Bordillo fundido en concreto 3,000 psi, 0.15, Muro en concreto reforzado_esp 0.15m, Acero de Refuerzo PDR 60, seguridad industrial y seguridad ocupacional, llevando tiempos de entrega esperados y sin mayores complicaciones.

4.1. Localización y replanteo

La localización y replanteo consiste en identificar y marcar en el terreno la posición exacta donde se ejecutará una obra, de acuerdo con los planos, diseños y especificaciones técnicas del proyecto. Esta actividad permite trasladar las medidas, alineamientos, niveles, ejes y cotas del diseño al terreno real, garantizando que la construcción se realice en el lugar correcto y con las dimensiones previstas. En este periodo se realizaron ***419.10 m2*** de esta actividad.

4.2. Excavacion con medios mecanicos en material comun, incluye retiro.

La excavación mecánica es el proceso mediante el cual se remueve y desplaza material del terreno utilizando maquinaria pesada, con el fin de conformar zanjas, cortes, plataformas o cimentaciones, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Esta actividad se realiza mediante equipos como retroexcavadoras, excavadoras hidráulicas, cargadores frontales o bulldózer, dependiendo del tipo de suelo, la profundidad requerida y el volumen de material a excavar. La excavación mecánica permite una mayor rapidez y eficiencia en comparación con la excavación manual, asegurando uniformidad en los niveles, taludes y secciones definidas.En este periodo se realizaron ***147.62 m3*** de esta actividad.

4.3. Base granular, esp 0.2 m

La instalación de la base granular para pavimentos es una actividad constructiva que consiste en la colocación y conformación de una capa de material pétreo seleccionado sobre la subrasante o subbase, con el fin de proporcionar soporte estructural, estabilidad y adecuada distribución de cargas al pavimento.

El proceso incluye el suministro, extendido, nivelación y compactación del material granular, el cual debe cumplir con las especificaciones técnicas en cuanto a granulometría, resistencia y contenido de humedad. La colocación se realiza en espesores controlados, garantizando la uniformidad de la capa y el cumplimiento de las cotas y pendientes definidas en los planos del proyecto. En este periodo se isntalaron ***83.82 m3*** de esta actividad.

4.4. Losa de concreto MR-38_esp 0.15 m

El concreto MR-38 es un concreto hidráulico de alta resistencia, diseñado principalmente para pavimentos rígidos, losas y estructuras que requieren una elevada capacidad para soportar cargas y esfuerzos de flexión.

Este tipo de concreto se caracteriza por alcanzar una resistencia a la flexión de 38 kg/cm² (módulo de ruptura), determinada mediante ensayos normalizados. Está compuesto por cemento, agregados finos y gruesos de calidad controlada, agua y, cuando se requiere, aditivos que mejoran su trabajabilidad, durabilidad y tiempo de fraguado. En este se instalaron ***62.87 m3*** de esta actividad.

4.5. Bordillo fundido en concreto 3,000 psi, 0.15

El bordillo fundido en concreto es un elemento constructivo ejecutado in situ que sirve para delimitar calzadas, andenes, zonas verdes o áreas de circulación, además de cumplir funciones de confinamiento del pavimento y control del escurrimiento superficial de aguas.

La actividad comprende la localización y replanteo del trazado, la excavación y preparación de la base, la instalación de formaletas o moldes, y el vaciado del concreto con las especificaciones técnicas establecidas. El concreto se coloca, compacta y perfila cuidadosamente para garantizar la sección, alineación y acabado definidos en los planos. En este periodo se realizaron ***46 ml*** de esta actividad.

4.6. Muro en concreto reforzado_esp 0.15m

La construcción de muro en concreto consiste en la ejecución de un elemento estructural elaborado en concreto, destinado a cumplir funciones de contención, cerramiento, soporte o división, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto.

La actividad incluye la localización y replanteo del muro, la excavación necesaria, el armado del acero de refuerzo conforme a los planos estructurales, la instalación de formaletas, el vaciado del concreto y su posterior vibrado

para garantizar la adecuada compactación y eliminación de vacíos. Posteriormente, se realiza el desencofrado y el curado del concreto para asegurar el desarrollo de la resistencia y durabilidad del elemento. En este periodo se realizaron ***4.2 m3*** de esta actividad.

4.7. Acero de Refuerzo PDR 60


El acero de refuerzo es un material estructural utilizado en elementos de concreto para resistir los esfuerzos de tracción y mejorar la capacidad portante y la ductilidad de la estructura.

La actividad de suministro e instalación del acero de refuerzo comprende el corte, doblado, armado y colocación de las barras de acero conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto. El acero se dispone en la posición, separación y recubrimiento adecuados, utilizando amarres, separadores y apoyos que garanticen su correcta ubicación durante el vaciado del concreto, para el presente periodo de ejecución se emplearon un total de ***217.95 kilogramos*** de acero.

5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

5.1. Localización y replanteo

Ilustración 4. Localizacion y replanteo.

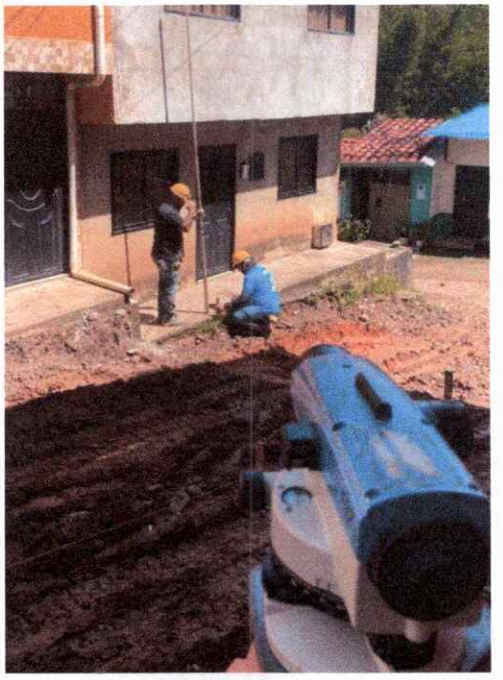

5.2. Excavacion medios mecanicos en material comun, incluye retiro

Ilustración 5. Excavacion medios mecanicos en material comun.



5.3. Base granular, esp 0.2 m

Ilustración 6. BaseGranular espesor 0.20 m.




5.4. Losa de concreto MR-38_esp 0.15 m

Ilustración 7. Losa de concreto MR-38 de espesor 0.15 metros



5.5. Bordillo fundido en concreto 3,000 psi, 0.15

Ilustración 8. Bordillo en concreto de 3000 PSI

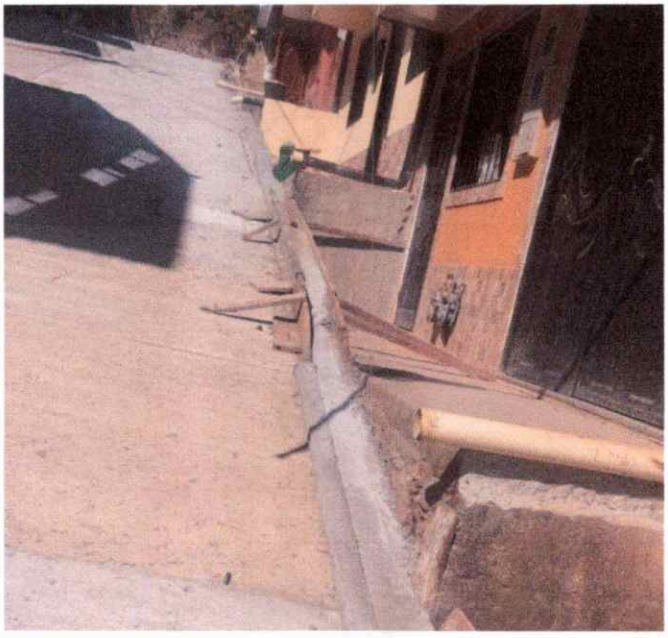


5.6. Muro en concreto reforzado_esp 0.15m

Ilustración 9. Muro en concreto reforzado



5.7. Acero de Refuerzo PDR 60

Ilustración 10. Instalacion de Acero

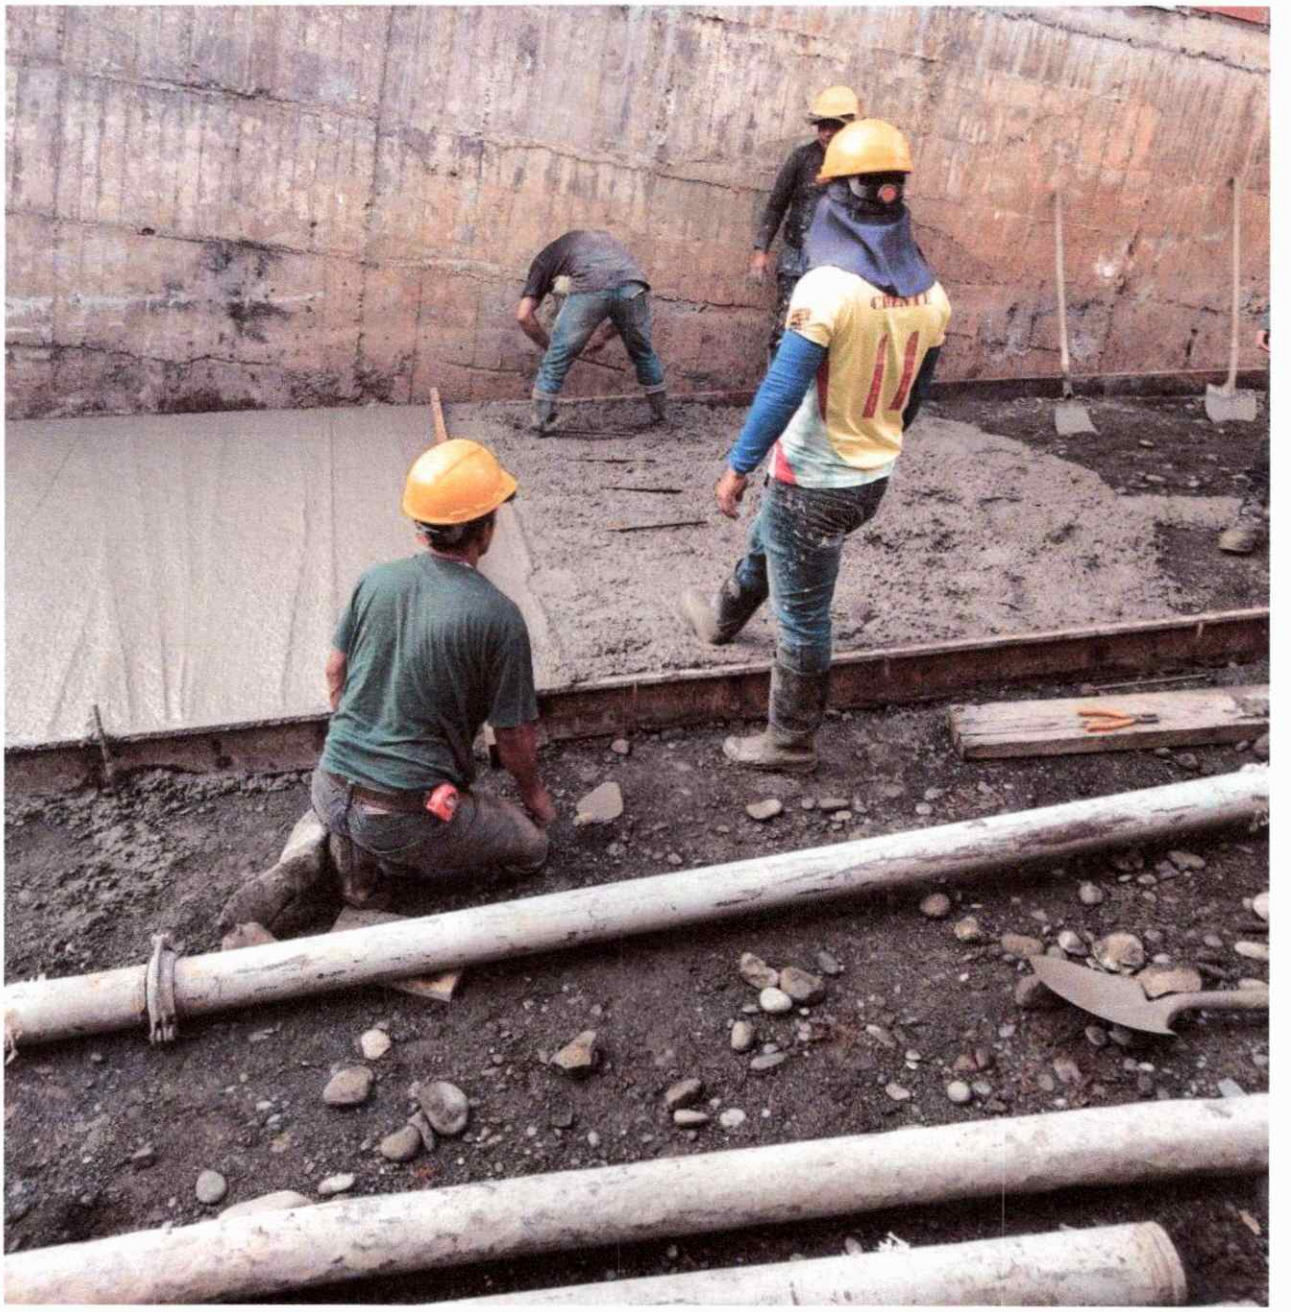

6. CONTROL DE CALIDAD.

6.1. Información sobre pólizas del contrato.

AMPAROS	PÓLIZA No	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	400-47-994000111570	N.A	N.A	N.A
Cumplimiento del Contrato.		$ 21.168.786,40	01/12/2025	01/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales		$ 10.584.393,20	01/12/2025	01/01/2029
Estabilidad y Calidad de la Obra.		$ 21.168.786,40	5 años contados a partir de la fecha de suscripción de acta de recibo	
AMPAROS	**PÓLIZA No**	**VALOR ASEGURADO**	**DESDE**	**HASTA**
Responsabilidad Civil Extracontractual.	400-74-994000028550	$ 284.700.000,00	01/12/2025	01/01/2026

7. INFORMACIÓN DE PERSONAL

.A continuación se relaciona todo el personal que laboró entre el 01 de diciembre del 2025 y el 30 de diciembre de 2025.

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
Orlando Anibal Baez Acero	80.095.017	Director
Julian Leonardo Sandoval Acero	74.081.592	Residente
Elkint Yair Fajardo Sanabria	1.053.586.613	Topógrafo
Andrea Viviana Bueno Albino	1.095.930.586	SST
Jose Vicente Baez Suarez	1.098408.676	Oficial
Juan Manuel Martinez Zarate	91.180.312	Ayudante
Wilmer Blanco Hernandez	1.097.303.659	Ayudante
Elkin Joel Santos Bautista	1.103.365.082	Ayudante
Jesus David Valderrama Guaitero	91.475.083	Ayudante

8. INFORME DE MAQUINARIA Y EQUPO.

Para la ejecución de este proyecto se implementó de la siguiente maquinaria.

MAQUINARIA	CANTIDAD
RETROCARGADORES SOBRE LLANTAS	01
MOTONIVELADORA	01
VIBROCOMPACTADORES DE TANDEM LISO AUTOPROPULSADO	01
COMPACTADORES MANUAL VIBRATORIO (RANA).	02
VIBROCOMPACTADORES DE CONCRETO	02
VOLQUETAS DE 7 M3	02

9. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

A la fecha de corte del presente informe se realiza un avance de obra del 81.76 %.

ACTA PARCIAL DE OBRA No,1

CONTRATO 223 DE 2025 **FECHA DE INICIO:** 1/12/2025

OBJETO	PAVIMENTACION Y REHABILITACION VIAL EN LAS CALLES 23 A Y 23; EN EL BARRIO ALTOS DEL PIENTA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

CONDICIONES INICIALES									ACTA PARCIAL 1		CANTIDADES POR EJECUTAR	
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GRAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR ACTA
1				CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA TRAMO 1								
	1,1			Localización y replanteo	M2	427,60	$ 3.464,00	$ 1.481.206,00	419,10	$ 1.451.762,00	8,50	$ 29.444,00
	1,2			Excavacion con medios mecanicos en material comun, incluye retiro	M3	150,74	$ 21.377,00	$ 3.222.369,00	147,62	$ 3.155.726,00	3,12	$ 66.643,00
	1,3			Base granular, esp 0.2 m	M3	85,52	$ 166.463,00	$ 14.235.916,00	83,82	$ 13.952.929,00	1,70	$ 282.987,00
	1,4			Losa de concreto MR-38_esp 0.15 m	M3	64,14	$ 1.093.195,00	$ 70.117.527,00	62,87	$ 68.723.704,00	1,28	$ 1.393.824,00
	1,5			Bordillo fundido en concreto 3,000 psi, 0.15	ML	46,00	$ 73.414,00	$ 3.377.044,00	46,00	$ 3.377.044,00	0,00	$ 0,00
	1,6			Muro en concreto reforzado_esp 0.15m	M3	4,20	$ 1.104.185,00	$ 4.637.577,00	4,20	$ 4.637.577,00	0,00	$ 0,00
	1,7			Acero de Refuerzo PDR 60	KG	225,00	$ 7.695,00	$ 1.731.375,00	217,95	$ 1.677.141,00	7,05	$ 54.234,00
							SUB TOTAL OBRAS INCLUYE IVA	$ 98.803.014,00		$ 96.975.883,00		$ 1.827.132,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 4.700.500,00				$ 4.700.500,00
				PLAN DE MANEJO TRANSITO				$ 2.340.418,00				$ 2.340.418,00
							VALOR TOTAL	$ 105.843.932,00		$ 96.975.883,00		$ 8.868.050,00

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	A=	29,00%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número	IMPREVISTO	I=	1,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	5,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35,00%

Acta FINAL	$ 96.975.883,00
CANTIDADES POR EJECUTAR	$ 8.868.050,00
Saldo a Favor del Municpio	$ 0,00
Valor Total	$ 105.843.932,00

DETALLE	VALOR ORDEN	PAGOS
Valor del contrato	$ 105.843.932,00	
Presente Acta de Cobro Parcial No1.		$ 96.975.883.00
Saldo por ejecutar		$ 8.868.050.00
SUMAS IGUALES	**$ 105.843.932,00**	**$ 105.843.932,00**

10. CONCLUSIONES

Se realizaron todas las actividades descritas cumpliendo los lineamientos establecidos y las especificaciones técnicas entregando obras y estructuras totalmente funcionales y adecuadas para las necesidades de la comunidad beneficiada.

LUIS ALEXIS CORREA SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL SUPROCON S.A.S.
C.C. 1.098.673.284 DE BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500882396

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

PRO HOSPITAL	$1.939.500
PRO UIS	$1.939.500
Total	**$3.879.000**
Ordenanza 012	$387.900
Total a Pagar	**$4.266.900**

Fecha de Expedición 2025/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: **Alcaldia de Charalá - CHARALA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9005075683

Nombre SUPROCON SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio SABANA DE TORRES **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500882396(3900)00000004266900(96)20251231

VALOR TOTAL CONTRATO	105.843.93
FECHA CONTRATO	01/12/202
VALOR ORDEN DE PAGO	96.975.88
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE4
VALOR BASE	96.975.88
NRO. CONTRATO	22

DAVIVIENDA CAJERO No. 3 H.N. 51 0488 30 DIC 2025 PROCESADO

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500882396

Trámite CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Con destino a: Alcaldia de Charalá - CHARALA

Tipo de Doc. N.I. Número: 9005075683
Nombre: SUPROCON SAS

VALOR TOTAL CONTRATO	105.843.932
FECHA CONTRATO	01/12/2025
VALOR ORDEN DE PAGO	96.975.883
NUMERO ORDEN DE PAGO	FE47
VALOR BASE	96.975.883
NRO. CONTRATO	223

PRO HOSPITAL $1.939.50
PRO UIS $1.939.50

DAVIVIENDA CAJERO No. 3 H.N. 51 0488 30 DIC 2025 PROCESADO

Total $3.879.00
Ordenanza 012 $387.90
Total a Pagar $4.266.90

1239882



SUPROCON S.A.S.
900.507.568-3
CONDOMINIO MENSULY CAMPESTRE CA 13
Piedecuesta - Colombia
(037) 6913764
suproconsas@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 47

Cliente: MUNICIPIO CHARALA
Nit: 890.205.063-4
Teléfono: (607) 7258008
Dirección: CR 17 24 11
Correo: alcaldia@charala-santander.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	29/12/2025, 16:59
Expedición	29/12/2025, 16:59
Vencimiento	29/12/2025
Vendedor	SUPROCON S.A.S.
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Vr. Bruto	Vr. Total	Tercero
1	ACTA DE PAGO PARCIAL #1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 223 DE 2025	1.00	96,975,883.00	0 %	0.00	0.00	96,975,883.00	96,975,883.00	MUNICIPIO CHARALA

Total items: 1

Total Bruto	96,975,883.00
Total a Pagar	96,975,883.00

Valor en Letras:
Noventa y seis millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 96,975,883.00

Observaciones:
PAGO A TERCEROS APROBADO POR EL MUNICIPIO DE CHARALA MEDIANTE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090464715 aprobado en 20250313 prefijo FE desde el número 30 al 80 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900507568	3	SUPROCON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	CONDOMINIO MENZULY CAMPESTRE CASA 13	PIEDECUESTA-SANTANDER	6780318	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2044549647	9497036345	E	2026/01/19	2025/12/29	BANCOLOMBIA	0	$1,617,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CIVIL2 (5 Afiliados)																								$5,219,500	$835,500			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$363,500				$0	$0		$1,617,000
Centro de Trabajo: OBRA CIVIL2 (5 Afiliados)																								$5,219,500	$835,500			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$363,500				$0	$0		$1,617,000
Ciudad: CHARALA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																								$5,219,500	$835,500			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$363,500				$0	$0		$1,617,000
1	CC	1098408676	BAEZ JOSE	X	X																230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	SI	$323,400
2	CC	1097303659	BLANCO WILMER	X	X																230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	SI	$323,400
3	CC	91180312	MARTINEZ JUAN	X	X																230301	22	$1,043,900	$167,100	EPS005	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	SI	$323,400
4	CC	1103365082	SANTOS ELKIN	X	X																230301	22	$1,043,900	$167,100	ESSC24	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	SI	$323,400
5	CC	91475083	VALDERRAMA JESUS	X	X																230201	22	$1,043,900	$167,100	ESSC24	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	22	$1,043,900	$41,800	14-11	22	$1,043,900	6.960%	$72,700	22	$0	$0	SI	$323,400
Total			**Afiliados(5)**																					$5,219,500	$835,500			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$209,000			$5,219,500	$363,500				$0	$0		$1,617,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$835,500	$0	$0	$835,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$668,400	$0	$0	$668,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$167,100	$0	$0	$167,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$363,500	$0	$0	$363,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$363,500	$0	$0	$363,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$209,000	$0	$0	$209,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	5	$209,000	$0	$0	$209,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$209,000	$0	$0	$209,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$83,600	$0	$0	$83,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$83,600	$0	$0	$83,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$41,800	$0	$0	$41,800
TOTAL				5	$1,617,000	$0	$0	$1,617,000
