- Se realiza el barrido y soplado.
- Se realizan las nivelaciones y la construcción de ruanas en los pozos que lo requieren, de acuerdo con la geometria de la via.
- Se realiza la imprimación catiónica de rompimiento lento o rompimiento rápido, de acuedo a la necesidad, dejándola actuar hasta que rompa y cure adecuadamente.
- Se inicia la instalación de la mezcla densa en caliente MDC-19, con el espesor establecido en el diseño.
- Se instala geomalla de fibra de vidrio de acuerdo a las condiciones de la estructura de la via.
- Se realiza la compactación de la carpeta asfáltica mediante rodillo liso y rodillo neumático.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Imagen 67 Fresado



Imagen 68 Fresado



Imagen 69 Fresado



Imagen 70 Fresado



Imagen 71 Fresado



Imagen 72 Fresado



Imagen 73 Barrido y soplado



Imagen 74 Barrido y soplado



Imagen 75 Imprimación



Imagen 76 Imprimación



Imagen 77 Asfalto MDC-19



Imagen 78 Fresado



Imagen 79 Asfalto MDC-19



Imagen 80 Asfalto MDC-19



Imagen 81 Asfalto MDC-19



Imagen 82 Asfalto MDC-19



Imagen 83 Asfalto MDC-19



Imagen 84 Compactación



Imagen 85 Asfalto MDC-19



Imagen 86 Asfalto MDC-19

6.7 Parcheo de vias en pavimento flexible (Avenida Pedro Tafur entre la glorieta Mirlindo y el Exito en ambos sentidos, Villa Café entre Av Pedro Tafur y colegio Champagnat)

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

Las actividades realizadas durante el período evaluado fueron las siguientes:

- Se realiza el levantamiento topográfico y actas de vecindad previo al inicio de actividades de intervención de la vía.
- Se da inicio a las actividades en el frente de obra con la instalación de la señalización de acuerdo al PMT y la ejecución de apiques para la localización de las redes de acueducto, alcantarillado, gas y demás servicios existentes.
- Se realiza el corte y demolición del pavimento existente.
- Se realiza el barrido y soplado.
- Se realiza chequeo de niveles por parte de la interventoría de la base granular.
- Se realizan las nivelaciones y la construcción de ruanas en los pozos que lo requieren, de acuerdo con la geometría de la vía.
- Se realiza la imprimación catiónica de rompimiento lento o rompimiento rápido, de acuedo a la necesidad, dejándola actuar hasta que rompa y cure adecuadamente.
- Se instala geomalla de fibra de vidrio de acuerdo a las condiciones de la estructura de la via.
- Se inicia la instalación de la mezcla densa en caliente MDC-19, con el espesor de acuerdo a las condiciones viales.
- Se realiza la compactación de la carpeta asfáltica mediante rodillo liso y rodillo neumático.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE



Imagen 87 Barrido y soplado



Imagen 88 Demolición



Imagen 89 Demolición



Imagen 90 Demolición



Imagen 91 Demolición

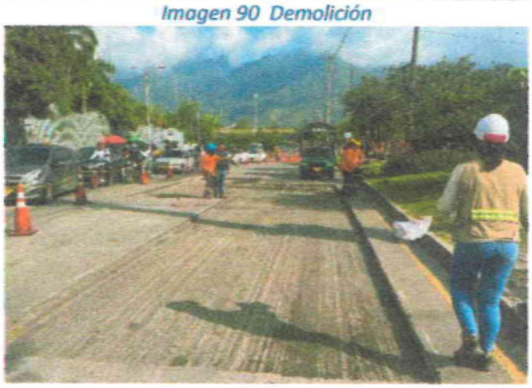


Imagen 92 Demolición



Imagen 93 Demolición



Imagen 94 Demolición



Imagen 95 Imprimación



Imagen 96 Imprimación



Imagen 97 Imprimación



Imagen 98 Imprimación



Imagen 99 Asfalto MDC-19



Imagen 100 Asfalto MDC-19



Imagen 101 Asfalto MDC-19



Imagen 102 Asfalto MDC-19



Imagen 103 Asfalto MDC-19



Imagen 104 Asfalto MDC-19



Imagen 105 Asfalto MDC-19



Imagen 106 Asfalto MDC-19



Imagen 107 Asfalto MDC-19



Imagen 108 Asfalto MDC-19



Imagen 109 Asfalto MDC-19



Imagen 110 Asfalto MDC-19



Imagen 111 Asfalto MDC-19



Imagen 112 Asfalto MDC-19

6.8 Otras actividades derivadas de la ejecución contractual

De la misma forma se incluyen otra serie de actividades que conllevan al cumplimiento de la meta fisica pactada contractualmente, entre las que se resaltan a continuación:

- Capacitaciones y controles llevados a cabo por el contratista y acompañamiento de la interventoria, como parte del Sistema de gestión de Seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente.
- Visitas técnicas de seguimiento y desarrollo de la obra, por parte del supervisor de la secretaria de infraestructura, el contratista de obra y la Interventoría.
- Comites de obra, como parte del seguimiento a las observaciones de cararter tecnico, y la unificacion de los alcances en el presente proyecto con el contrato suscrito por la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Ibague.
- Acompañamiento a las respuestas dadas a la comunidad ante peticiones y observaciones de la ejecucion de la obra, registradas por el contratista e interventoria.
- Controles de calidad tomados por parte del contratista y corroborados por parte de la interventoria, tales como verificación de CBR, ensayos de caracterización de la base granular, toma de densidades, control de mezcla asfáltica para estabilidad – flujo – contenido de asfalto en la mezcla asfaltica MDC-19.
- Visitas técnicas de seguimiento por parte de los especialistas en Pavimentos, , Director de obra de la Interventoria, dejando sus respectivas observaciones para la adecuada ejecucion de las obras contratadas.

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

- El cronograma de actividades fue ajustado y actualizado de acuerdo al acta de inicio.
- El contrato se ha ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas de la entidad e INVIAS.
- Se ha realizado seguimiento al material utilizado en obra, (material de mejoramiento tipo rajon y base granular) y demás materiales necesarios para dar continuidad a las obras, con el fin de garantizar la calidad de la misma.
- Conforme a las cantidades ejecutadas por el Contratista, la interventoria ha revisado las cantidades con base en los lineamientos fijados contractualmente (se realiza el control al cajeo realizado a maquina, retiro de fallos, espesores de estructuras en base).
- Se ha realizado seguimiento al personal de obra, maquinaria y equipos.
- Se han realizado recorridos diarios a los frentes de trabajo, con el fin de supervisar las actividades que desarrolla el contratista de obra.
- Se realiza estricta revisión de planillas de pago de seguridad social, de cada una de las personas que se encuentran en obra. De lo cual se recomienda contar con la planilla de pago en obra.
- Se verifica la señalización preventiva en seguridad vial instalada en cada frente de obra, con el fin de evitar accidentes cumpliendo con lo especificado en el plan de manejo de tránsito.
- Las actividades diarias son controladas y verificadas por parte de la interventoria, durante su ejecución.
- Se ha realizado seguimiento al avance de las obras y se reporta en el presente informe.

- Se verifica el estado de la maquinaria y vehículos (volquetas que ingresen a la obra).
- Se realiza control y seguimiento en obra del cumplimiento de los diseños aprobados por los especialistas de la Secretaria, contratista e interventor en campo en cuanto a la estructura y pavimentación (concreto MR-42 y MDC-19) de cada via.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 de Villavicencio
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

ANEXO 1
BITÁCORA

Se suscribe acta de Inicio el dia 20 de noviembre de 2025 ; de la interventoria del Consorcio VIAS IBAGUE ; segun objeto. " contratar la interventoria tecnica, administrativa, Financiera, juridica, contable y ambiental para los contratos de obra relacionados con. " Ejecutar a precios unitarios las obras de mejoramiento, rehabilitacion y mantenimiento de la Infraestructura Vial urbana y obras complementarias en el municipio de Ibagué Lote 1 y 2
Contrato No 3158 del 18 de noviembre de. 2025
RL. Liseth Maryori Nieves Herrera.

La Interventoria se realizara a los contratos de obra No 3049 del 07 de noviembre de 2025.
Contratista : Consorcio Ibagué vial Urbano 2025.
Nit. 901.999.914-2
Representante legal. Ing luis Ricardo Ortigoza Gonzalez
objeto del contrato : " Ejecutar a precios Unitarios las obras de mejoramiento, Rehabilitacion y mantenimiento de la infraestructura vial Urbana y obras complementarias en el municipio de Ibague Lote 2".
plazo. Diez (10) meses.

Scanned with CamScanner

21 de noviembre de 2025.
Clima: Soleado.
Personal de obra.
2 operadores de maquinaria
1 Profesional SST
1 Topografo
4 ayudantes

Maquinaria en obra:

(1) Vibrocompactador
(1) Retroexcavadora
(

Se inician actividades hacia las 7:00AM se inicia con cajeo una vez realizada la topografia (levantamiento topografico) el cajeo se realiza con retroexcavadora de oruga; con espesor de 0.39. estas actividades son ejecutadas en la via del barrio nueva castilla.
Estuvo el Jefe de alcantarillado del IBAL miro y dijo que en horas de la tarde enviaba la certificación. Se recomienda al contratista llevar la motoniveladora.
En horas de la tarde se encuentran protegiendo la subrasante con base y compactando

Scanned with CamScanner

21 de noviembre 2025

clima = soleado

Pedro Tafur

Personal de obra

2 Ingenieros

1 topografo

4 operadores de maquinaria

4 controladores viales

4 oficiales

4 ayudantes

1 profesional SST

1 auxiliar SST

4 conductores volquetas

2 conductores camioneta

Maquinaria en obra=

(1) Fresadora

(1) Finisher

(2) Vibro Compactador liso

(1) vibro compactador de neumaticos

Se inician actividades instalando la señalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores, se realizo la demarcación de áreas a intervenir, se inicio el fresado y retiro de material, se continuo con el barrido y soplado de cajeo, imprimación de emulsión de rompimiento rapide, se siguio con la aplicación de mezcla asfaltica con Finisher se Finaliza con la compactación con rodillo liso y rodillo de neumaticos. En horas de la tarde hubo precipitaciones intensas!

Scanned with CamScanner

22 de noviembre 2025
clima = soleado
Nueva castilla
Personal de obra =
1 profesional sst 2 operadores
1 topografo 4 ayudantes
1 Ingeniero

Se presentaron inconvenientes con la comunidad a causa de una escorrentia que se ingreso a las viviendas por el punto más bajo de la vía, esta situación ya se ha presentado varias veces, pero lo que nos informa la comunidad esta vez fue mayor.
Las causas aparentes son:
·Desbordamiento de una canal privada
·El nivel natural de la vía que conduce las aguas al punto donde se presento el inconveniente
Se le explicó a la comunidad la situación y se quedo en compromiso construir un suministro frente al acceso por donde ingresa el agua y gestión para que el presidente de la junta realice un cordón y canalizar las aguas.
por parte de interventoria se estan revisando planos para bajar la estructura a nivel de las viviendas con 20 cm libres de bordillo

Scanned with CamScanner

Clima = Soleado
Pedro Tafur
personal de obra =
1 Profesional sst
1 Topografo
4 operadores de maquinaria
1 controlador vial
1 oficial
8 ayudantes

maquinaria en obra
(1) Finisher
(1) Fresadora
(1) Vibro compactador liso
(1) vibro compactador de neumaticos

Se inician labores instalando la señalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores, se realizo la demarcación de areas a intervenir, se inicia con el fresado y retiro de material por el carril derecho sentido mirolindo - Homecenter, se continua con el barrido y soplado de cajeo, imprimación de emulsión de rompimiento rapido, se siguio con la aplicación de mezcla asfaltica con finisher, se finaliza con la compactación con rodillo liso y rodillo de neumaticos. Se realizo la nivelación para sacar el empozamiento de agua, se finalizaron labores y se habilito la via para el tránsito

Scanned with CamScanner

24 de noviembre 2025
clima soleado
Pedro tafur
Personal de obra
1 Ingeniero
1 Topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
5 ayudantes
1 SST
2 conductores (camioneta)
1 conductor (volqueta)

maquinaria en obra:
(1) Fresadora
(1) Finisher
(1) vibro compactador liso
(1) vibro compactador de neumaticos

Se inician actividades con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT, se realiza la demarcación de areas a intervenir sentido exito - mirolindo, se sigue con el fresado y retiro de material, barrido y soplado de cajeo, se pasa a realizar la imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finisher, por ultimo compactación con rodillo liso y de neumaticos

Scanned with CamScanner

hubo visita de la alcaldesa y el secretario de infraestructura

Clima = Soleado, tarde lluvias leves
Nueva castilla
No. 23 calle 21 entre carrera 4 sur y 1 sur

No se avanzo en la ejecución de la obra se verifico los puntos que aportan caudal de escorrentia a la vía.
se definió entre supervisor y C. de obra implementar un cárcamo longitudinal en frente al callejon de la abscisa Km 0+060 e implementar 2 sumideros mas, adicionalmente realizar un cárcamo transversal en el Km 0+100.
El C. de obra realizo el diseño del nivel de la carpeta de rodadura de la vía, Interventoria la revisó y realizo observaciones que no fueron muy bien atendidas, por lo cual se encuentra en trámite el diseño de la vía. Mañana se contempla reunión a las 7 AM en el frente de obra para verificar y definir el diseño en cuestión.
En la vía No. 30 dirección Cra 4H sur entre calles 119 y 121 se iniciaron apiques para confirmar que las redes esten actualizadas.
El supervisor quedo de entregar un concepto de un Ingeniero hidráulico que nos indiqué que las obras de manejo de agua a realizar supten la necesidad de la vía.

Scanned with CamScanner

Clima = soleado
villa marlen
Personal de obra
1 Topografo
1 SST
6 ayudantes
1 Ingeniero
2 operadores de maquinaria
1 conductor (volqueta)

maquinaria en obra
(1) vibro compactador liso
(1) Retro excavadora

Hubo visita por parte del IBAL, punto no.9 el c. de obra apoyara al IBAL en la excavación de la tubería de alcantarillado. Punto 13 El IBAL definio que se realizara el cambio de la red principal de acueducto, teniendo en cuenta que las domcilianas representan en alto costo punto 11 falta cambio de acueducto y un tramo de alcahtarillado en la zona final, punto 7. Falta un pequeño tramo de acueducto y alcantarillado para cambio.

Scanned with CamScanner

25 de noviembre 2025
Pedro Tafur
clima= soleado
personal de obra=
1 Ing
1 topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
10 ayudantes
1 sst
1 conductor (camioneta)
1 conductor (volqueta)
1 controlador vial

maquinaria en obra=
(1) vibro compactador liso
(1) vibro compactador de neumaticos
(1) Fresadora
(1) Finisher

Sentido Exito hacia el semaforo de barrio palermo, se esta a la espera de que llegue el asfalto para terminar la ultima cuva que quedo pendiente el día de ayer en el semaforo de palermo carril derecho. Se empieza con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores desde el exito hasta el semaforo de palermo, MI. Se realiza la demarcación de áreas a intervenir, se continua con el fresado y retiro de material, barrido y soplado del cajeo, Imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finisher, se finaliza con la compactación de rodillo liso y de neumaticos

Scanned with CamScanner

Se termina la caja que hizo falta del día de ayer, MD, en el semaforo de palermo. Queda una parte de la caja abierta debdo a que hizo falta asfalto, queda habilitado el carril derecho hasta antes del semaforo de palermo.

Clima= soleado
Villa marten
personal de obra=
1 topografo
8 ayudantes
1 Fontanero
1 Sst
2 operadores de maquinaria

maquinaria en obra
(2) Retro excavadora

El IBAL continua con la instalación de la tubería de agua potable, se han instalado 8 tubos para un total de 48 metros lineales, en cuanto a la vía no sea realizado mayor actividad.

Clima= soleado
Nueva castilla
Personal de obra=
1 topografo
4 Profesional SST
4 ayudantes.

Conciliada la nivelación de la rasante, queda pendiente el concepto hidraulico

Scanned with CamScanner

Calatayud
Calle 79BIS entre carrera 10A y 10C, entre MZS 3 y 4, entre MZS 5 y 6 y el parque se realiza la socalización, como novedad la vía termina en donde se encuentra un sumidero, La comunidad solicito que se amplie hasta empalmar con otra calle, pero esto ya esta cargo la secretaria de Inf.

26 de noviembre 2025
Pedro tafur
clima= Soleado
Personal de obra=
1 Ing
1 topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
10 ayudantes
1 sst profesional
3 controladores viales
2 controladores (camioneta)

maquinaria en obra
(1) Fresadora
(1) Finisher
(1) vibro compactador liso
(1) vibro compactador de neumaticos

Scanned with CamScanner

Se inicia con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT, para iniciar labores desde el semaforo de palermo, hasta la entrada de la ciudadela simón bolivar en el carril interior izquierdo, se realiza la demarcación de areas a intervenir, se inicia con el fresado y retiro de material, barrido y soplado del caveo, despues imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finchet, por ultimo compactación con rodillo liso y neumáticos. quedan habilitados los dos carriles sentido del semaforo de palermo hacia miradindo

Nueva castilla
clima = soleado
personal de obra=
1 ingeniero residente
1 topografo
1 cadenero
1 oficial
4 operadores de maquinaria
4 ayudantes
6 cuadrillas

maquinaria en obra=
2 retro excavadoras de oruga (1 varada)
1 motoniveladora
1 vibro compactador doble rodillo

En el punto 23 se ejecuta el caveo desde la abscisa K0+10 hasta la K0+060, el cual fue liberado por la topografia de la interventoria en cuanto a niveles, ademas llego la tuberia de 72"

Scanned with CamScanner

por lo que se proyecta iniciar mañana la excavación para la instalación de la tubería de los sumideros y el carcamo.

Villa marlen
clima = soleado
personal de obra=
3 operadores de maquinaria
5 ayudantes
maquinaria en obra
1 retro excavadora de oruga
1 retro excavadora de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso de 5 ton se cambiara por uno de 8 ton

Se encuentra personal del Ibal en el punto 9 y 13 trabajando, punto 13 se continua el caveo del kotogo a mayores dejando 10 cm antes de la subrasante requerida, en el punto 13 se verifico que durante la instalación de la tubería de acueducto no se estaba instalando arena el contratista de obra la suministro. se solicito a la ingeniera Valeria Verificar sobre el arbol existente en la vía. El Ingeniero Medina informa que ya llegaron todos los accesorios del acueducto y solicito que le informaran sobre los diametros de las acometidas del punto 11, el contratista le va a colaborar con esa información. En el punto 9 se gestiono sacar para el día de mañana un CBR sumergido, con el fin de que reajusten el diseño de la vía, lo anterior debido a evidenciar material contaminado y escombros durante la excavación de la red de alcantarillado. Se instalo un tubo

Scanned with CamScanner

27 de Noviembre de 2025
Pedro tafur
clima= soleado
personal de obra=
1 Ingeniero
1 topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
10 ayudantes
1 sst
3 controladores viales
2 conductores (camioneta)
2 conductores (cuadrilla).

maquinaria en obra=
1 fresadora
1 Finisher
1 vibro compactador de rodillo liso
1 vibro compactador de neumaticos

se inicia con la instalación de la senalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores desde el semaforo de palermo, hacia mirolindo en el carril interior izquierdo, se realiza la demarcación de areas a intervenir, se inicia con el fresado y retiro de material, barrido

Scanned with CamScanner

y soplado del cajeo, Imprimación de emulsión de rompimiento rapido, Instalación de mezcla asfaltica con finisher, se finaliza compactando con rodillo liso y de neumaticos, aseda una parte de la caja abierta debido a que hizo falta asfalto, en la entrada de ciudad luz.

Villa marlen
clima= soleado
personal de obra=
3 operadores de maquinaria
5 ayudantes
maquinaria en obra=
1 retro excavadora de oruga
1 retro excavadora de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso de 5 ton y se cambiara por uno de 8 ton

Continuan instalando tubería en el Km067, ayer se instalaron 17 metros de tubería de acueducto, en el punto q continuan labores de instalación de alcantarillado se finalizo el pozo, pendiente enboquillar

Nueva castilla
clima= soleado
personal en obra=
1 topografo
3 operadores de maquinaria
1 oficial
4 ayudantes

Scanned with CamScanner

maquinaria en obra=
2 retro excavadora de oruga.
1 vibro compactador dobe rodillo.

se retiro el fallo que habia y aplicaron base.

socializaciones programadas, barrio ricaurte y villa luces.

28 de noviembre de 2025
Pedro tafur
clima = soleado
personal en obra =
1 ingeniero
1 topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
10 ayudantes
1 sst
2 controladores viales
1 conductor (camioneta)
2 conductores (volquetas).

maquinaria en obra=
1 Finisher
1 Fresadora
1 vibro compactador de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso

Se empieza con la instalación de la senalizaci-ón vial de acuerdo al PMT para iniciar labores desde la entrada de ciudad luz hacia mirolindo, se realiza la demarcación de areas a intervenir

Scanned with CamScanner

se inicia con el fresado y retiro de material barrido y soplado del cajeo, imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con Finisher, se realiza la compactación con rodillo liso y de neumaticos, la retro excavadora empieza a intervenir en la entrada de villa cafe, se realiza la excavación para el sumidero y la instalación del tubo, solo se alcanza a instalar un tubo el otro queda programado para mañana, queda abierta una caja en el carril interior derecho, ya que hizo falta asfalto.

Nueva castilla
clima= soleado
personal de obra=
1 Ingeniero residente
1 topografo
1 cadenero
1 oficial
4 operadores de maquinaria
4 ayudantes
6 volquetas
maquinaria en obra=
1 retroexcavadora
1 motoniveladora
1 vibro compactador doble rodillo

Se continua con la excavación desde la abscisa K0+070 hasta la K0+130 el cual fue liberado por la topografia de la interventoria en cuanto a niveles, sin embargo se realiza la observación al contratista de no extender material de base granular ya que hay partes

Scanned with CamScanner

donde se evidencia mucha humedad y material organico el cual debe ser retirado pero en ese instante se presentan leves precipitaciones y el contratista decide extender base para proteger la subrasante, se continua con la excavación, instalación y recubrimiento de la tuberia de 72", del carcamo del Kotoso MI

Villa marten
clima= soleado
Personal en obra=
3 operadores de maquinaria
1 topografo
5 ayudantes
maquinaria en obra=
1 retro excavadora de oruga
1 retro excavadora de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso

El Ibal estuvo presente y realizo las acometidas de acueducto en el punto 73, se realizo excavación.

29 de noviembre de 2025
pedro tafur
clima= fresco con tendencia a lluvia
personal en obra=
2 Ingenieros
5 operadores de maquinaria
1 oficial
15 ayudantes
1 SST

Scanned with CamScanner

2 controladores viales
1 conductor camioneta
maquinaria en obra=
1 finisher
1 fresadora
1 vibro compactador de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso
1 retro excavadora

se empieza con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores desde la entrada de ciudad luz carril interior izquierdo, se realiza la demarcación de areas a intervenir, fresado y retiro de material, barrido y soplado del cajeo, se realiza la imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finisher, compactación con rodillo liso y de neumaticos. En villa cafe se instalo el tubo que hacia falta, se les hace la observación de mejorar la compactación del asfalto, evitando dejar lineas

Villa marlen
clima= soleado
personal en obra=
3 operadores de maquinaria
5 ayudantes
1 topografo
maquinaria en obra=
1 retro excavadora de oruga
1 retro excavadora de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso de 5 ton que se cambiara por uno de 8 ton

Scanned with CamScanner

en el punto 73 se continua el cajeo del Km+140 a mayores dejando 10 cm antes de la subrasante requerida. Se autorizo llegar al empalme de la otra vía para un total estimado de Km+204, se encuentra personal del IBAL en la instalación de tubería de acueducto desde el Km08 en adelante, sobre las raices del arbol se estableció que se cortarán y se aplicará cicatrizante Dejando una parte de la raiz en la vía. sobre el punto q no se evidencian labores por parte del Ibal

1 de diciembre de 2025
pedro tafur
clima= fresco, soleado
personal de obra=
1 Ingeniero
1 topografo
5 operadores de maquinaria
1 oficial
15 ayudantes
1 SST
2 controladores viales
1 conductor (camioneta)
maquinaria en obra=
1 fresadora
1 finisher
1 retro excavadora

Scanned with CamScanner

1 vibro compactador de rodillo liso
1 vibro compactador de neumaticos

Se empieza con la instalación de la senalizaci-
ón vial de acuerdo al PMT para iniciar
labores desde la bodega de colanta, se
realiza la demarcación de areas a intervenir,
Fresado y retiro de material, barrido y soplado
de cajeo, Imprimación de emulsión de rompimi-
ento rapido, Instalación de mezcla asfaltica
con Finisher, compactación con rodillo liso
y de neumaticos, en villa cafe se continua
con la excavación del sumidero, para
instalar la tapa y darle salida al tubo final a
la canal. El IBAL estuvo mirando el desborda-
miento de agua que se esta presentando en
la via, el cual praviene de un parqueadero,
enviaran el informe correspondiente para que
realicen la respectiva visita al parqueadero
y así poder dar solución a la situación

calatayud
El día de hoy se estuvieron dando las
instrucciones de arranque

villa marlen
clima= Fresco
personal de obra=
1 topografo
2 operadores de maquinaria
3 ayudantes
maquinaria en obra=
1 retro excavadora de oruga
1 vibro compactador de rodillo liso

Scanned with CamScanner

En el punto 73 personal del IBAL desocupo la red de acueducto para hacer el cambio hasta el kotogo, punto 9 personal del IBAL pendiente para instalar entubado y maquina de C. de obra realizando excavación.

Nueva castilla
clima = soleado
personal de obra =
1 topografo
2 operadores de maquinaria
4 ayudantes
maquinaria de obra =
1 vibro compactador de rodillo liso
1 retro excavadora

se realizo limpieza de pozos y se aplico rajon en fallos.

2 de diciembre de 2025
Pedro tafur
clima = soleado
personal en obra =
1 Ingeniero
1 topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
15 ayudantes
1 sst
2 controladores viales

Scanned with CamScanner

1 conductor camioneta
maquinaria en obra=
1 finisher
1 fresadora
1 vibro compactador de rodillo liso
1 vibro compactador de neumaticos

Se inicia con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores desde la bodega de cobanta, carril interior izquierdo, se realiza la demarcación de areas a intervenir, inicio de fresado y retiro de material, barrido y soplado de cajeo, imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finisher, compactación con rodillo liso y de neumaticos la fresadora presento una falla y se esta a la espera de que llegue otra maquina aproximadamente en una hora y media, se esta terminando de fundir el sumidero en villa care.

Nueva castilla
clima= fresco
personal en obra=
1 topografo
3 operadores de maquinaria
4 ayudantes
maquinaria en obra=
1 retro excavadora de oruga
1 moto niveladora
1 vibro compactador de rodillo liso

Se encuentran realizando una nivelación de la

Scanned with CamScanner

Vía de la cra 1 sur para darle un peralte a ver si reduce el ingreso de agua de escorrentia al punto 23. Se encuentran cavcando del Kotoo al Kototo para entregar rasante, se verificaron medidas en conjunto con la Ing valeria de acuerdo al abscisado existente

Villa marlen
clima= soleado
personal de obra=
1 topografo
2 operadores de maquinaria
4 ayudantes

En la mañana no se evidencio personal, al medio día llegaron con 2 tubos navafort para el punto 9 El punto 13 esta pendiente a que se desocupe la aruga para cavear a nivel de la subrasante, se verifico medidas de anchos en conjunto con la Ing valeria de acuerdo al abscisado existente

3 de diciembre de 2025
pedro tafur
clima = soleado
personal de obra=
1 Ingeniero
1 topografo
4 operadores de maquinaria

Scanned with CamScanner

1 oficial
12 ayudantes
1 sst
2 controladores viales
1 conductor camioneta
maquinaria en obra=
1 vibro compactador de rodillo liso
1 vibro compactador de neumaticos
1 Finisher
1 fresadora

se empieza con la instalación de la senalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores desde la glorieta de mirolindo, carril interior derecho, se realiza la demarcación de areas a intervenir, inicio de fresado y retiro de material, barrido y soplado de cajeo, imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica compactación con rodillo liso y de neumaticos, la fresadora continua presentando fallas, el mecanico encargado viene desde bogota, no se termina de fresar lo que se marco se deja para el día de mañana, los trabajadores a la limpieza de andenes

Cabatayud
clima mañana= soleado
personal de obra=
1 topografo
2 ayudantes
1 sst
2 operadores de maquinaria
maquinaria en obra=
1 retro excavadora de oruga

Scanned with CamScanner
170

1 vibro compactador de rodillo liso

se continua con el cajeo, avance actividad 30 metros lineales, se aplicaron 15 metros lineales de base granular para proteger la subrasante sin embargo comenzo a llover no alcanzaron a compactar bien y la base se encuentra húmeda

Nueva castilla
mañana tiempo seco
Personal en obra=
1 topografo
12 ayudantes
1 sst
3 operadores de maquinaria
maquinaria en obra=
1 motoniveladora
1 retro excavadora de oruga
1 vibro compactador de rodillo liso

se realiza cereo de base granular comprendido entre la abscisa k0+00 a la k0+060, instalación de formaleta para realizar fundida de carcamo ubicado en el k0+060 MI, retiro de fallos, (estos fallos se realizan el retiro una vez ya se habia aplicado mejoramiento sobre la subrasante), corte y armado de acero para el carcamo ubicado en la abscisa k0+060 MI

Bracurte
Clima = soleado
Personal de obra
1 Ingeniero 1 operador de maquinaria
4 ayudantes

Scanned with CamScanner

maquinaria en obra=
1 retro excavadora

se realiza excavación con un avance de 20 metros lineales del K0+740 al K0+720, se presenta daño de tubería de acueducto de 3" ya se reporto al IBAL, se esta a la espera de que realicen el arreglo.

Villa marlen,
clima: soleado
personal en obra=
6 ayudantes
1 topografo
1 operador de maquinaria
maquinaria en la obra=
1 retro excavadora

se realiza la instalación de la tubería que conecta al pozo

4 de diciembre 2025,
Pedro tafur
personal de obra=
1 Ingeniero
1 topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
12 ayudantes
1 sst
2 controladores viales

Scanned with CamScanner

maquinaria en obra=
1 vibro compactador de rodillo liso
1 vibro compactador de neumaticos
1 finisher
1 fresadora

se empieza con la instalacion de la senalizacion vial de acuerdo al PMT para iniciar labores sentido de mirolindo, hacia el parque deportivo, se inicia con el fresado y retiro de material, barrido y soplado del cajeo, imprimacion de emulsion de rompimiento rapido, instalacion de mezcla asfaltica, compactacion con rodillo liso y de neumaticos, se inicia con el fresado en la entrada de villa cafe

Picante
clima=soleado
Personal en obra=
1 Ingeniero
4 ayudantes
2 operadores de maquinaria
maquinaria en obra=
1 retro excavadora
1 vibro compactador liso

se ha realizado hasta el momento cajeo de 25 metros lineales. se evidencia tuberia de agua potable de 1/2" sobre la rasante y las domiciliarias de agua potable tambien se encuentran muy superficiales.

Scanned with CamScanner

Nueva castilla
Clima= soleado
personal en obra=
3 ingenieros
1 topografo
3 operadores de maquinaria
1 maestro
2 oficiales
10 ayudantes.
Maquinaria en obra=
1 motoniveladora
1 retro excavadora de oruga
1 compactador de rodillo liso de 7 ton

Se realizo cajeo de la Kot140 a la Kot180, extendido y compactación de base en Kot030 a mayores, encofrado para fundida del Kot00 a mayores, MD.

5 de diciembre de 2025
Clima= Fresco - Cra 5ta calle 96
Personal de obra=
1 topografo
1 operador de maquinaria
1 sst
1 oficial
12 ayudantes
2 controladores viales

Scanned with CamScanner

maquinaria en obra
1 Fresadora

Se realiza el fresado de los dos carriles hasta la calle 97 desde la calle 96

Ricaurte
clima= soleado
personal de obra
1 Ingeniero
4 ayudantes
2 operadores
de maquinaria
maquinaria en obra=
1 retro excavadora
1 vibro compactador de rodillo liso

El contratista realiza la prolongación de 18 metros lineales de tubería de acueducto de 2" para realizar conexión de domiciliarias que estaban muy superficiales.

Villa marlen
clima= leve precipitaciones.
Personal en obra=
1 topografo
6 ayudantes
2 operadores de maquinaria
maquinaria en obra=
1 vibro compactador de rodillo liso
1 retro excavadora

se realiza compactación de subrasante por parte del contratista del K0+00 al K0+090 punto 73

Scanned with CamScanner

Verificación de niveles de subrasante por parte de interventoria del Km025 al Km085 se realiza observación de corregir unos puntos entre la abscisa Km060 al Km070 que se encuentran altos. Sin embargo todavia no tienen material de base granular en campo para extender y proteger la subrasante.

Calatayud
clima= leve precipitaciones
personal de obra=
1 Ingeniero
3 ayudantes
1 sst

Se evalua si se puede hacer un sumidero que capte el agua de la vía y conecte con el pozo, se presenta un caudal alto de escorrentía que satura la base, se debe dar manejo a las aguas.

Nueva castilla
personal de obra=
1 oficial
7 ayudantes
1 Ingeniero

Se autoriza fundir solo el primer tramo, la base a partir del Km017 en adelante esta muy saturada y presenta colchones, se esta corrigiendo la base del Km018 en adelante para dejarla sellada

Scanned with CamScanner

6 de diciembre de 2025
Cra 5ta
clima= soleado
personal en dora
1 Ingeniero
1 topografo
1 operador de maquinaria
1 oficial
13 ayudantes
2 sst
2 controladores viales
1 conductor (camioneta)
maquinaria en dora=
1 fresadora

Sentido hacia homecenter, se empieza con la instalación de la senalizacion vial de acuerdo al PMT para iniciar labores desde la calle 95 hasta la calle 92, se realiza la demarcación de las areas a intervenir, fresado y retiro de material, barrido y soplado de calzo, imprimación de emulsión de rompimiento rapido.

Nueva castilla
clima: soleado
personal de dora
1 oficial
7 ayudantes
1 Ingeniero

se funde hasta la abscisa K0+410 y continua la excavación

Scanned with CamScanner

9 de diciembre 2025
Pedro Tafur - villa cafe
Clima= soleado
personal de obra=
8 ayudante
1 Topografo
1 oficial
3 operadores de maquinaria
maquinaria en obra
1 Finisher
1 vibro compactador liso
1 vibro compactador de neumaticos

Se realiza la instalación de la geomalla y se aplica el asfalto.

Cra 5ta
personal en obra=
1 ingeniero
4 topografo
4 operador de maquinaria
1 oficial
13 ayudantes
2 sst
2 contradores viales
1 conductor camioneta
maquinaria en obra=
1 Finisher
1 Fresadora
1 vibro de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso

Se empieza con la instalación de la senalizacion vial de acuerdo al PMT para iniciar labores

Scanned with CamScanner

Inicio de Fresado y retiro de material, barrido y soplado de cajeo, Imprimación de emulsión de rompimiento rapido, Instalación de mezcla asfaltica Compactación con rodillo liso y de neumaticos, queda habilitado un sdo carril MI

Calatayud
Clima = soleado
personal en obra
1 Ingeniero
3 ayudantes
1 sst
1 operador de maquinaria
maquinaria en obra
1 vibro compactador liso

Punto 20 la base se encuentra saturada se debe escarificar y debar secar, para volver a compactar y liberar, se solcito al IBAL revisar una infiltración del acueducto que llega a la vía

Villa marlen
clima = soleado
personal en obra =
1 topografo
6 ayudantes
2 operadores de maquinaria
maquinaria en obra
1 retro excavadora de oruga
1 vibro compactador liso

Punto 23 se encuentra extendiendo base, la programación es pavimentar entre viernes y

Scanned with CamScanner

viernes, se encuentra personal del IBAL realizando el cambio de acueducto e instalación de acometidas, desde el Kot100 a mayores, Punto 9 sin actividad

Ricaurte
clima=Fresco
personal en obra
1 Ingeniero
4 ayudantes
2 operadores de maquinaria
maquinaria en obra=
1 retro excavadora
1 vibro compactador liso

punto 50, se encuentran instalando rajon y revistiendo redes de acueducto y alcantarillado.

Nueva Castilla
clima=soleado
personal en obra
8 ayudantes
2 oficiales
1 maestro
3 operadores de maquinaria
maquinaria en obra
1 retro excavadora
1 motoniveladora
1 vibro compactador de rodillo liso

punto 23 se encuentran extendiendo base, armando el refuerzo de losas irregulares, sacando palo e instalando rajon, se tiene planeado fundir 300 ml entre Jueves y viernes

Scanned with CamScanner

10 de diciembre
Cra 5ta
personal en obra:=
1 Ingeniero
1 topografo
5 operadores de maquinaria
1 oficial
13 ayudantes
2 SST
4 controladores viales.
3 conductores
maquinaria en obra.
1 Fresadora
1 vibro compactado de rodillo liso de 11 ton
1 vibro compactador de neumaticos
1 Finisher
1 retro excavadora

Se empieza con la instalación de la senalizacion vial de acuerdo al PMT para iniciar labores, inicio de fresado y retiro de material, barrido y soplado, Imprimación de emulsión de rompimiento rapido, Instalación de mezcla asfaltica, compactación con rodillo liso y de neumáticos

calatayud
clima:= soleado
Personal en obra
1 Ingeniero
3 ayudantes
1 SST
1 operador de maquinaria
maquinaria en obra:
1 vibro compactador liso.

Scanned with CamScanner

continuan intentado solucionar la infiltración de agua, despues de que se soluciona lo de la infiltración se finaliza el cajeo hasta llegar al carcamo.

Ricaurte - clima= soleado
Personal en obra
1 Ingeniero
4 ayudantes
2 operadores de maquinaria
maquinaria en obra
1 retro excavadora
1 vibro compactador liso

se continua realizando cajeo y revistiendo redes.

Villa marlen=
clima= soleado
personal en obra
1 topografo, 6 ayudantes
Se evidencian algunos fallos puntuales se van a retirar y el dia de mañana el contratista va a tomar densidades. y el dia de mañana se inicia con la aplicación de asfalto

Nueva castilla
clima=soleado
personal de obra
8 ayudantes
3 oficiales
1 maestro
1 Ingeniero

Scanned with CamScanner

Se continua realizando Fundida y corte y armado de acero.

11 de diciembre
Villa marlen
clima = soleado
personal de obra
2 topografos
2 sst
13 ayudantes
1 oficial
3 operadores de maquinaria
maquinaria en obra=
1 finisher
1 vibro de neumaticos
1 vibro compactador de rodillo liso

Se empieza con la instalación de la senalizacion vial de acuerdo al PMT para iniciar labores, se aplica la imprimación de rompimiento rapido instalación de mezcla asfaltica con finisher y compactación con rodillo liso y de neumaticos. se termina de aplicar asfalto en toda la vía

catalayud
clima = soleado
Personal de obra
1 Ingeniero

Scanned with CamScanner

1 topografo
1 sst
13 ayudantes
3 operadores de maquinaria
maquinaria en obra=
1 Finisher
1 vibro compactador de rodillo liso
1 vibro compactador de neumaticos.

Se empieza con la instalación de la señalización vial, se aplica la instalacia de la imprimación de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finisher y compactación con rodillo liso y de neumaticos.

Ricaurte
clima= soleado
Personal de obra
1 (Ingero) Ingeniero.
3 ayudntes
2 operadores de maquinaria
maquinaria en obra
1 retro excavadora
1 vibro compactador liso

Se realizan unos arreglos de domiciliarias de alcantarillado y tuberia de acueducto, mañana se tiene planeado aplicar asfalto.

Nueva Castilla
clima= soleado
personal en obra
1 Ingeniero
1 Oficial

Scanned with CamScanner

8 ayudantes
1 maestro

Se continua realizando fundida de la vía, corte y armado de acero.

Cra 5ta.
clima: soleado
personal en obra
1 Ingeniero
1 topografo
5 operadores de maquinaria
1 oficial
13 ayudantes
2 sst
2 controladores viales
1 conductor camioneta
maquinaria en obra:
1 Fresadora
1 (topografo) Finisher
1 vibro compactador de rodillo liso de 11 ton
1 vibro compactador de neumaticos.
1 motoniveladora

Se empieza con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores, inicio de fresado y retiro de material, barrido y soplado de cajeo, imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finisher, compactación con rodillo liso y de neumaticos.

Scanned with CamScanner

12 de diciembre 2025.
Ga sta
Clima=soleado
Personal en obra=
1 Ingeniero
1 topografo
4 operadores de maquinaria
1 oficial
13 ayudantes
2 sst
2 controladores viales
1 conductor camioneta

Se empieza con la instalación de la señalización vial de acuerdo al PMT para iniciar labores, Inicio de fresado y retiro de material, barrido y soplado del coleo, Imprimación de emulsión de rompimiento rapido, instalación de mezcla asfaltica con finicher, compactación con rodillo liso y de neumaticos. Todo el tramo queda completamente listo con asfalto.

Nueva castilla
clima= soleado
personal de obra=
1 Ingeniero
1 oficial
8 ayudantes
1 maestro

Se terminan de fundir las lozas que hacian falta y queda la vía completamente lista.

Scanned with CamScanner

Ricaurte
clima = soleado
personal de obra
1 topografo
13 ayudantes
1 oficial
4 operadores de maquinaria
1 sst
maquinaria en obra=
1 finisher
1 ubro compactador de rodillo liso
1 ubio compactador de neumaticos.
1 retro-excavadora

barrido de cateo, despues se aplico la imprimación de emulsión de rompimiento rapido, aplicación de mezcla asfaltica ca finisher y compactación con rodillo liso y de neumaticos.

Scanned with CamScanner

ANEXO 2
ACTAS DE COMITÉ

ALCALDÍA DE IBAGUE

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

TEMA: Comite - Redes IBAL - Malla vial Acta N° 001

FECHA: 14/11/25 HORA: 9:00 am

LUGAR: Secretaria de Infraestructura

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Inicio de obras,
- logistica para labores y apoyo por parte del Ibal donde se requiera.
- observaciones de items no previstos.
- Solicitd de documentación inicial.

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Ricardo Ortegaza Carrillo	Ing residente	Contratista	
2	[illegible]	Coord Proyecto	IBAL	
3	Gina Reinoso	DIR Operativo	IBAL	
4	Alfonso del Campo	Líder Asistencial	IBAL	
5	Anderson Vivas	Ing Civil	Interv.	
6	Tomas Cardona	Ing Civil	Interventor	
7	Anderson Vilovia	Contratista	Contratista	
8	Valeria Palomino	Coord. de obras	Contratista	
9	Lucy Castro	Contratista SIM	Infraestructura	
10	Paula V. Vaquero S.	Contratistra	Infraestructura	
11	Freddy A. Pinzón	Director	Infraestructura	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

AUSENTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1				
2				
3				
4				

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	

TEMAS TRATADOS

El Ing Fredy manifiesta que esa información se entregara mas adelante. por el momento le comparte mediante una usb el Ing Anderson lleves la relación de vías, las prioridades a intervenir, los diseños que se encuentran en el Secop, quedando pendiente diseños de Sumideros, y cunetas, y memorias de cantidades.

Se continua la reunion evaluando con el personal directivo de cada via que se va a intervenir, verificación de las redes mediante apiques corroborando los certificados de las redes y si es el caso cambiar de una vez las redes que lo requieran.

Se concluye con la buena voluntad de las partes que brindaran apoyo y trabajaran de la mano para sacar adelante el proyecto y mejorar, rehabilitar la malla vial del municipio de Ibagué.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	

TEMAS TRATADOS

Siendo las 9 am en la secretaría de Inf. de la Alcaldía de Ibagué, se reune personal de la supervisión, contratista de obra, interventoría, y Directivos de Ibal.

Inicia el Ing Fredy presentando los presentes entre las partes, inicia dando una descripción del proyecto y las vías prioritarias a intervenir, solicitando apoyo del Ibal para atender cualquier novedad que se encuentre en el desarrollo del proyecto y buscar la manera de trabajar de la mano.

El Ibal por medio de la Ings Ginna, Alfonso, Carlos manifiestan estar de acuerdo en apoyar las labores y procurar tener celeridad en atender novedades en las vías a intervenir, solicitan una programación de los vías que se piensen intervenir para programar sus labores y prestar el apoyo requerido.

Entre cada contratista se manifiesta las vías a intervenir y se ponen en conocimiento al personal del Ibal para coordinar en conjunto las actividade.

El Ing Anderson Vilomia manifiesta que hay varios ítems no previstos que requerimos implementar para la ejecución del proyecto.

Por parte de interventoría apoyan dicha solicitud y se solicita documentación inicial que no se encuentra en el secop, como memorias de cantidades o diseños de sumideros, cárcamos, entre otros.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE / FIRMA**	**FECHA**
Presentar Cronograma de Frentes de obra correspondientes a UD y IX	Ing. Ricardo.	15/11/25

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	CONSORCIO VIAS IBAGUE NIT. 902.007.947-3

TEMA: Comite de obra — Acta N° 03

FECHA: 3/12/2025 — HORA: 3:50 pm

LUGAR: Oficina Interventoria. - Mz 74 Casa 8 Etapa 4B/V. Cafe.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Revision del diseño de la cuna 5ta entre 84 y 96.

RESPONSABLE:

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Samuel Usecche Arenas	Contratista	Infraestructura	
2	Paula Valentina Vaquiros	Contratista	Infraestructura	
3	Lucy Carolina Castro	Contratista	Infraestructura	
4	Juan Carlos Salazar	Interventoria	Coordinador	
5	Freddy A. Palacios	Director operativo	Infraestructura	
6	Cesar Sandoval P.	Director obra Lote 2	Contratista	
7	JOSE HERNAN RIOS R.	ESPECIALISTA	INFRAEST	
8				
9				
10				
11				
12				

AUSENTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1				
2				
3				
4				

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	

TEMAS TRATADOS

Siendo los 3:50 pm se reune personal de la secretaria de infraestructura, con los ing. diseñadores, el Ing Marco mateo director de Infraestructura mediante video llamada, contratista de obra e Interventoria.

En el comite el Ing Fredy manifiesta que los diseños se encuentran de acuerdo a las condiciones de la Vía y los ensayos que realizaron en el sector de la carrera 5ta entre calle 83 y calle 86.

El Ing Juan manifiesta que el periodo de diseño no es conguente con el periodo de construccion y ejecución del proyecto, el periodo de diseño debería ser 2032, teniendo en cuenta que se pone en servicio la vía mientras se finaliza y se liquida el contrato

El Ing Hernan manifiesta que el diseño esta cumpliendo con los requerimientos del transito de diseño y los ensayos de laboratorio que le entregaron.

Se Inicia a evaluar el diseño en conjunto con los Ing de la secretaria para validar si el espesor del diseño cumple con el transito del año 2032 y un espesor de base granular de 50 cm. (El espesor de 50 cm fue identificado mediante unos conos dinamicos realizados por el

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	CONSORCIO VIAS IBAGUE NIT. 902.007.947-3

TEMAS TRATADOS

c. de obra), despues de analizar en diferentes ocasiones, se concluye que el dia siguiente el diseñador consultor de interventoria revisara una zona o tramo del diseño para verificar si cumple o no el espesor estipulado en el diseño.
Se acuerda una vez se cuente con la información realizar una reunión con todas las partes y definir el diseño que cumpla las condiciones reales de la via y su transito.

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	

TEMA: Comite obra. Acta N° 04

FECHA: HORA: 10:20 am

LUGAR: Secretaria de Inf.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

RESPONSABLE:

PARTICIPANTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Oscar A. Sandoval T.	D. obra lote 2.	Contratista	
2	Samuel Useche Ayr Cabal	Contratista	Sec. Infraestructura	
3	JOSE HELMAN R.C.S R	CONTRATISTA	[illegible]	
4	Lucy Carolina Castro	contratista Infra	Infraestructura	
5	Juan Carlos Suárez	Coordinador	Interventoría	
6	Tomás Cardona A.	Ing. Residente	Interventoría	
7	Fredy Andrés Pinzon	Director operativo	Interventor	
8				
9				
10				
11				
12				

AUSENTES

	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1				
2				
3				
4				

Alcaldía Municipal Ibagué

ALCALDÍA DE IBAGUE

ACTA DE REUNIÓN GENERAL

TEMAS TRATADOS

En el presente comite tecnico hace presencia el contratista de Obra del Lote 1 y Lote 2, la interventoria del proyecto y los representantes de la secretaria de Infraestructura de la Alcaldia de Ibague, con acompañamiento de los profesionales especializados.

El presente comite tecnico se hace con el fin de establecer tecnicamente los procedimientos que se deben realizar en la ejecucion y tratamiento de a la subrasante, segun lo definido en los estudios y diseños y de acuerdo con lo encontrado durante los procesos de excavación en obra, definiendo lo siguiente y fijando los procesos descritos a continuacion, que permitan tener mejores rendimientos y reprocesos

1. En casos donde la subrasante tenga CBR menores e iguales a 3%, se debe aplicar la capa de rajon segun lo definido en los diseños.
2. En casos puntuales donde se registren zonas y areas con materiales organicos y presencia de fallos, se deben reemplazar con material tipo rajon, con espesores de 30 cm.
3. En suelos con CBR menores e iguales a 5%, se aprueba la instalacion de geotextil NT 2500. Donde se presenten CBR superiores a 5% no se debe colocar geotextil.
4. En tramos de rehabilitacion donde se presenten fallos puntuales, se debe resolver rapidamente con la instalación de mezcla asfaltica.

Se informa a la serretaria de infraestructura, que el contratista realizo apiques en la calle 144 tramo de rehabilitación. Se debe evaluar la nueva propuesta de intervencion con el fin de que sea evaluado por los diseñadores asignados por la Entidad.

Alcaldía Municipal Ibagué	ALCALDÍA DE IBAGUE ACTA DE REUNIÓN GENERAL	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	RESPONSABLE / FIRMA	FECHA

ANEXO 3
CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTES/ CALLES		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) ORIGEN	(B) ESTADO	DICIEMBRE 2025																																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAQUINARIA																																						
VARIOS	1	CAMIONETA	P	B	X	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x	x	
CEIBA NORTE	2	VOLQUETAS	A	B	x	x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x	
	3	COMPRESOR	A	B	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–		–	–			–	–		–	–	
	4	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B	X	x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x	
	5	MOTONIVELADORA	P	B													x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x	x	
	6	RETRO DE ORUGA	P	B															x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x	x	
	7	RETROEXCAVADORA	A	B	X	x	x	x	X	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x		x	x	
CALLE 36 ENTRE 5 Y 6	8	VOLQUETAS	A	B			x	X	X	X				x	x		x	x	x	x															
	9	CAMION CISTERNA	P	B			–	–	x	x				x	x		x	x	x	x															
	10	CORTADORA CONCRETO	P	B			–	–	–	–				–	–		–	–	–	–															
	11	COMPRESOR	P	B			X	X	X	x				x	x		x	x	x	x															
	12	MARTILLO DEMOLEDOR	P	B			X	X	X	X				X	X		X	X	X	X															
	13	MINICARGADOR	P	B					X	X				X	X		X	X	X	X															
	14	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B																															
	15	PULIDORA	P	B			–	–	–	–				–	–		X	X	X	X															
	16	EQUIPO DE COMPACTACION (RANA, CANGURO, VIBROCOMPACTADOR, ETC)	P	B			–	–	–	–				–	–	–	X	X	X	X															
ARKALA II	17	VOLQUETAS	A	B	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	
	18	TURBO	P	B	X	–	–	–	X	X		–	–	–	–	–	–	–	–	–	X	X	X	–		–	–			X	X		X	X	
	19	PULIDORA	P	B																															
	20	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	
	21	RETROEXCAVADORA	P	B	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X			X	X		X	X	
	22	CORTADORA CONCRETO PEQUEÑA	A	B																															

200

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1 Y 2

FRENTES/ CALLES		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) ORIGEN	(B) ESTADO	NOVIEMBRE 2025																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MAQUINARIA																																	
VARIOS	1	CAMIONETA	P	B																				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
CEIBA NORTE	2	VOLQUETAS	A	B																				_	_	_		X	X	X	X	X	X		
	3	COMPRESOR	A	B																				_	_	_		_	_	_	_	_			
	4	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B																				_	_	_		X	X	X	X	X	X		
	6	EQUIPO DE COMPACTACIÓN (RANA, CANGURO, VIBROCOMPACTADOR, ETC)	P	B																				_	_	_		_	_	_	_	_			
	7	MOTONIVELADORA	P	B																				_	_	_		_	_	_	_	_			
	8	RETRO DE ORUGA	P	B																				_	_	_		X	X	X	_	_			
	9	RETROEXCAVADORA	A	B																				_	_	_		_	_	_	X	X	X		
CALLE 36 ENTRE 5 Y 6	10	VOLQUETAS	A	B																				_	_	_	_	X	X						
	11	CAMION CISTERNA	P	B																				_	X	X	X	X	X						
	12	CORTADORA CONCRETO	P	B																				_	_	X	X	X	X						
	13	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B																				_	_	X	X	X	X						
	14	COMPRESOR	P	B																				_	_	X	X	X	_						
	15	ASFALTADORA (FINISHER)	P	B																						X	X	X	X						
	16	FRESADORA	P	B																				_	X	X	_	X	_						
	17	MINICARGADOR	P	B																				_	_	X	X	_	X						
	18	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B																				_	_	X	X	X	_						
	19	DOBLE TROQUES	P	B																				_	X	X	X	X	X						
	20	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B																						X	X	X	X						
	21	VIBRADOR DE CONCRETO	P	B																				_	_	_	_	_	_						
	22	PULIDORA	P	B																				_	_	_	_	_	_						
	23	EQUIPO DE COMPACTACIÓN (RANA, CANGURO, VIBROCOMPACTADOR, ETC)	P	B																				_	_	_	_	_	_						
	24	RETROEXCAVADORA	A	B																				_	_	_	_	_	_						
ARKALA II	25	VOLQUETAS	A	B																								_	_	_	X	X	X		
	26	TURBO	P	B																								_	X	X	X	_	_		
	27	COMPRESOR	P	B																								_	_	_	_	_	_		
	28	ASFALTADORA (FINISHER)	P	B																								_	_	_	_	_	_		
	29	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B																								_	_	_	_	_	X		
	30	PULIDORA	P	B																								_	_	_	_	_	_		
	31	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B																								_	_	_	_	_	_		
	32	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B																								_	_	_	_	_	_		
	33	RETROEXCAVADORA	P	B																								_	_	_	X	X	X		
	34	CORTADORA CONCRETO PEQUEÑA	A	B																								_	_	_	_	_	_		

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3049 NOV 2025

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO IABGUE VIAL URBANO 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESESTRUCTUTA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTES/ CALLES		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) ORIGEN	(B) ESTADO	NOVIEMBRE 2025																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MAQUINARIA																																	
VARIOS	1	CAMIONETA	P	B																				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
NUEVA CASTILLA	2	VOLQUETAS	A	B																				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	3	COMPRESOR	A	B																				–	–	–		–	–	–	–	X	X	X	
	4	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B																				–	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	5	PULIDORA	P	B																				–	–	–		–	–	X	–	–	–	–	
	6	EQUIPO DE COMPACTACIÓN (RANA, CANGURO, VIBROCOMPACTADOR, ETC)	P	B																				–	–	–		–	–	X	X	X	X	X	
	7	MOTONIVELADORA	P	B																				–	–	–		–	–	X	X	X	X	X	
	8	RETRO DE ORUGA	P	B																				X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	9	RETROEXCAVADORA	A	B																				–	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
VILLA MARLEN	10	VOLQUETAS	A	B																								X	X	X	X	X	X	X	
	11	COMPRESOR	P	B																								–	–	–	–	–	X	X	
	12	VIBRADOR DE CONCRETO	P	B																								–	–	–	–	–	–	–	
	13	PULIDORA	P	B																								–	–	–	–	–	–	–	
	14	EQUIPO DE COMPACTACIÓN (RANA, CANGURO, VIBROCOMPACTADOR, ETC)	P	B																								–	–	–	–	—	X	X	
	15	RETROEXCAVADORA	A	B																								X	X	X	X	X	X	X	
PEDRO TAFUR	16	FRESADORA	A	B																					X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	17	VOLQUETAS	A	B																					X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	18	COMPRESOR	P	B																					X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	19	ASFALTADORA (FINISHER)	P	B																					X	–		X	X	X	X	X	X	X	
	20	PULIDORA	P	B																					–	–		–	–	–	–	–	–	–	
	21	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B																					X	X		X	X	X	X	X	X	X	
	22	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B																					X	–		X	X	X	X	X	X	X	
	23	RETROEXCAVADORA	P	B																					–	–		–	–	–	–	–	–	–	
	24	CORTADORA CONCRETO PEQUEÑA	A	B																					X	X		X	X	X	X	X	X	X	

202

Ibague

CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3049 NOV 2025

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO IABGUE VIAL URBANO 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESESTRUCTUTA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTES/ CALLES		EQUIPO TIPO, MARCA, CAPACIDAD	(A) ORIGEN	(B) ESTADO	DICIEMBRE 2025																												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MAQUINARIA																																	
VARIOS	1	CAMIONETA	P	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											
NUEVA CASTILLA	2	VOLQUETAS	A	B	_	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	3	COMPRESOR	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	3	VIBROCOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B	_	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	4	MIXER	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	5	PULIDORA	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_											
	6	EQUIPO DE COMPACTACION (RANA, CANGURO, VIBROCOMPACTADOR, ETC)	P	B	_	_	_	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	7	MOTONIVELADORA	P	B	_	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	8	VIBRADOR DE CONCRETO	P	B	_	_	_	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	9	MEZCLADORA	P	B	_	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	10	RETRO DE ORUGA	P	B	_	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	11	RETROEXCAVADORA	P	B	_	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											
VILLA MARLEN	12	VOLQUETAS	A	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	13	COMPRESOR	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	X	X	X	_											
	14	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	_	X	X	_											
	15	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	_	X	X	_											
	16	ASFALTADORA (FINISHER)	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	_	X	X	_											
	17	VIBRACOMPACTADOR 1 RODILLO	P	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	18	MOTONIVELADORA	P	B			X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	20	RETRO DE ORUGA	P	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	_											
	21	RETROEXCAVADORA	A	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X											
PEDRO TAFUR	22	FRESADORA	P	B	X	X	X	X																											
	23	VOLQUETAS	P	B	X	X	X	X																											
	24	COMPRESOR	P	B	X	X	X	X																											
	25	ASFALTADORA (FINISHER)	P	B	X	X	X	X																											
	26	PULIDORA	P	B																															
	27	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B	X	X	X	X																											
	28	RETROEXCAVADORA	P	B	X	X	X	X																											
	29	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B	X	X	X	X																											
	30	CORTADORA CONCRETO PEQUEÑA	P	B	X	X	X	X																											
VILLA CAFÉ	31	FRESADORA	P	B		X	X	X																											
	32	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B		X	X	X																											
	33	ASFALTADORA (FINISHER)	P	B		X	X	X																											
	34	VIBROCOMPACTADOR DE NEUMATICOS	P	B		X	X	X																											
	35	VOLQUETAS	A	B		X	X	X																											
	36	COMPRESOR	P	B		X	X	X																											
	37	VIBRADOR DE CONCRETO	P	B		X	X	X																											
	38	PULIDORA	P	B																															
	39	EQUIPO DE COMPACTACIÓN (RANA, CANGURO, VIBROCOMPACTADOR, ETC)	P	B		X	X	X																											
CALATAYUD	40	RETRO DE ORUGA	P	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X												
	41	VIBROCOMPACTADOR	P	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X												
	42	ASFALTADORA (FINISHER)	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	X	X	_												
	43	VIBROCOMPACTADOR NEUMATICOS	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	X	X	_												
	44	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		_	_	X	X	_												
	45	RETROEXCAVADORA	A	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X												
	46	VOLQUETAS	A	B	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X												
	47	PULIDORA	P	B	_	_	_	_	_	_			_	_	_	_	_		X	X	X	X	_												
RICAURTE	48	VIBROCOMPACTADOR RODILLO LISO	P	B					X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X												
	49	RETRO DE ORUGA	P	B					X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X												
	50	RETROEXCAVADORA	A	B					X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X												
CRA 5 ENTRE 84 Y 96	51	FRESADORA							X	X			X	X	X	X				X															
	52	VIBROCOMPACTADOR DOBLE RODILLO LISO							X	X			X	X	X	X				X															
	53	ASFALTADORA (FINISHER)							X	X			X	X	X	X				X															
	54	VIBROCOMPACTADOR NEUMATICOS							X	X			X	X	X	X				X															
	55	VOLQUETAS							X	X			X	X	X	X				X															

ANEXO 4
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025**
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	NOVIEMBRE 2025																																
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
CEIBA NORTE	1	ING RESIDENTE DE OBRA																				0	0	0		1	1	1	1	1	1				
	2	INSPECTOR																				1	0	0		1	0	0	1	1	0				
	3	TOPOGRAFO																				1	1	1		1	1	1	1	1	1				
	4	PROFESIONAL SST																				0	0	0		1	1	1	1	1	1				
	5	PROFESIONAL SOCIAL																				1	1	1		1	0	0	0	0	0				
	6	OPERADOR DE MAQUINARIA																				0	0	0		2	2	2	2	2	2				
	7	AYUDANTE																				2	2	2		5	3	4	6	6	6				
	8	CONDUCTOR																				0	0	0		4	3	4	3	4	4				
CALLE 36 ENTRE 4 Y 6	9	PROFESIONAL SST																				0	1	1	1	1	1	0	0	0	0				
	10	PROFESIONAL SOCIAL																				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	11	CONTROLADOR VIAL																				0	2	2	2	2	2	0	0	0	0				
	12	ING RESIDENTE DE OBRA																				0	0	1	1	1	1	0	0	0	0				
	13	MAESTRO																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	14	TOPOGRAFO																				0	1	1	1	1	1	0	0	0	0				
	15	CONDUCTOR																				0	3	3	4	2	2	0	0	0	0				
	16	OFICIAL																				0	0	0	0	1	1	0	0	0	0				
	17	AYUDANTE																				0	2	3	3	6	6	0	0	0	0				
	18	OPERADOR DE MAQUINARIA																				0	1	3	4	3	4	0	0	0	0				
ARKALA II	19	ING RESIENTE																				0	0	0		0	1	1	1	1	1				
	20	PROFESIONAL SST																				0	0	0		0	0	0	1	1	1				
	21	INSPECTOR																				0	0	0		0	0	0	0	0	0				
	22	TOPOGRAFO																				0	0	0		0	1	1	1	1	1				
	23	OFICIAL																				0	0	0		0	0	0	0	0	1				
	24	PROFESIONAL SOCIAL																				0	0	1		1	0	0	0	0	0				
	25	AYUDANTE																				0	0	0		0	2	4	2	3	3				
	26	OPERADOR DE MAQUINARIA																				0	0	0		0	0	0	1	1	2				
	27	CONDUCTOR																				0	0	0		0	1	0	3	0	1				
CALLE 3 ENTRE 59 Y 60	28	ING RESIDENTE DE OBRA																				0	0	0		0	0	1	1	1	0				
	29	PROFESIONAL SST																				0	0	0		0	0	1	0	1	0				
	30	OPERADOR DE MAQUINARIA																				0	0	0		0	0	2	1	4	0				
	31	AYUDANTE																				0	0	0		0	0	2	4	4	0				
	32	CONTROLADOR VIAL																				0	0	0		0	0	2	2	2	0				
	33	CONDUCTOR																				0	0	0		0	0	1	1	1	0				
																						6	14	19	16	34	34	20	24	23	25				
TOTAL PERIODO			215																																

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

502

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	DICIEMBRE 2025																														
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CEIBA NORTE	1	ING RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1	
	2	INSPECTOR	0	0	0	0	0	0		0	1	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0			0	0		0		
	3	TOPOGRAFO	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1		
	4	PROFESIONAL SST	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	0	1	1	1			1	1		1		
	5	PROFESIONAL SOCIAL	0	1	0	0	0	0		0	1	1	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0			0	0		0		
	6	OPERADOR DE MAQUINARIA	2	2	2	2	2	2		3	2	2	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3	4			1	4		4		
	7	OFICIAL	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	1	1	0	1	0	0			1	1		1		
	8	AYUDANTE	7	7	7	5	7	5		5	7	6	5	5	5		4	5	4	3	3	4	4	5	5			4	6		6		
	9	CONDUCTOR	3	1	1	4	3	2		1	4	3	2	3	2		2	2	3	2	2	2	0	2	4			2	3		3		
CALLE 36 ENTRE 4 Y 6	10	PROFESIONAL SST			0	0	1	1			0	1		1	1	1	1																
	11	PROFESIONAL SOCIAL			0	0	0	0			0	0		0	0	0	0																
	12	CONTROLADOR VIAL			0	0	0	0			0	0		0	0	0	0																
	13	ING RESIDENTE DE OBRA			0	0	0	0			1	1		1	1	1	1																
	14	MAESTRO			1	1	0	0			0	0		1	1	1	1																
	15	TOPOGRAFO			0	0	0	1			0	0		0	0	0	0																
	16	CONDUCTOR			0	0	0	1			0	0		2	0	2	0																
	17	OFICIAL			1	1	0	0			0	0		0		0	0																
	18	AYUDANTE			2	2	2	6			3	3		2	1	1	2																
	19	OPERADOR DE MAQUINARIA			0	0	0	0			0	0		0		0	0																
ARKALA II	20	ING RESIENTE	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1			1	1		1		
	21	PROFESIONAL SST	1	1	1	1	1	0		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	1			1	1		1		
	22	INSPECTOR	1	1	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0			0	0		1		
	23	TOPOGRAFO	1	1	1	1	1	0		0	0	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1		
	24	OFICIAL	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1			1	1		1		
	25	PROFESIONAL SOCIAL	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0			0	0		0		
	26	AYUDANTE	4	4	4	4	4	3		3	4	4	4	4	4		4	4	4	5	3	3		0	3			3	3		4		
	27	OPERADOR DE MAQUINARIA	2	1	1	1	2	2		1	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2			3	3		3		
	28	CONDUCTOR	3	5	4	4	3	3		0	4	4	2	2	2		2	0	1	3	2	1		2	2			1	2		2		
ARKALA	29	TOPOGRAFO																							1								
	30	ING RESIDENTE DE OBRA																							1								
	31	OFICIAL																							1								
CALLE 77 ENTRE AVENIDA GUABINAL Y RIO CHIPALO	32	ING RESIDENTE DE OBRA																				2	2	1	0								
	33	INSPECTOR																				1	1	1	0								
	34	PROFESIONAL SST																				1	1	1	1								
	35	OPERADOR DE MAQUINARIA																				4	5	6	1								
	36	TOPOGRAFO																				1	1	1	1								
	37	OFICIAL																				0	1	1									
	38	MECANICO																				0	1	1	0								
	39	AYUDANTE																				3	14	8	0								
	40	RASTRILLERO																				0	2	2	0								
	41	CONTROLADOR VIAL																				2	1	2	2								
	42	CONDUCTOR																				3	4	4	1								
CARRERA 5 ENTRE CL 58 Y 64	43	ING RESIDENTE DE OBRA																										1	1	1	1		
	44	INSPECTOR																										1	1	2	2		
	45	PROFESIONAL SST																										1	1	1	1		
	46	TOPOGRAFO																										1	1	1	1		
	47	AYUDANTE																										4	4	6	10		
	48	TORNILLERO																										0	0	1	1		
	49	RASTRILLERO																										0	0	2	2		
	50	CONTROLADOR VIAL																										2	2	2	2		
	51	OPERADOR DE MAQUINARIA																										2	3	3	3		
	52	CONDUCTOR																										2	2	2	2		
SUBTOTAL																						21	11	19	27	0	0	22	29	0	31		
TOTAL PERIODO			160																														

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

Alcaldía Municipal
Ibagué

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3049 NOV 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025**
CONTRATISTA: CONSORCIO IABGUE VIAL URBANO 2025	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESESTRUCTUTA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	NOVIEMBRE 2025																														
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
NUEVA CASTILLA	1	ING RESIDENTE DE OBRA																				1	1	1		1	1	1	1	1	1		
	2	INSPECTOR																				1	1	1		1	1	1	1	1	1		
	3	TOPOGRAFO																				1	1	1		1	1	1	1	1	1		
	4	PROFESIONAL SST																				1	1	1		1	1	1	1	1	1		
	5	ING AMBIENTAL																				1	1	1		1	1	1	1	1	1		
	6	OPERADOR DE MAQUINARIA																				2	2	2		2	3	4	3	4	3		
	7	CADENERO																								1	1	1	1	1	1		
	8	AYUDANTE																				4	4	4		4	4	3	4	5	5		
	9	CONDUCTOR																				1	3	2		5	5	6	4	4	4		
VILLA MARLEN	10	MAESTRO																								0	0	0	0	0	0		
	11	TOPOGRAFO																								1	1	1	1	1	1		
	12	CONDUCTOR																								1	2	2	2	2	2		
	13	OFICIAL																								1	1	1	1	1	1		
	14	AYUDANTE																								3	4	5	5	5	5		
	15	OPERADOR DE MAQUINARIA																								2	2	3	3	3	3		
PEDRO TAFUR	16	INSPECTOR																					1	1		1	1	1	1	1	1		
	17	ING RESIDENTE DE OBRA																					1	1		1	1	1	1	1	1		
	18	TOPOGRAFO																					1	1		1	1	1	1	1	1		
	19	OFICIAL																					1	1		1	1	1	1	1	1		
	20	RASTRILLERO																					2	2		2	2	2	2	2	2		
	21	PROFESIONAL SST																					1	1		1	1	1	1	1	1		
	22	AYUDANTE																					4	5		5	10	10	10	10	13		
	23	CONTROLADOR VIAL																					4	2		2	2	3	3	2	2		
	24	OPERADOR DE MAQUINARIA																					4	4		4	4	4	4	4	5		
	25	CONDUCTOR																					5	3		3	2	3	4	3	4		
SUBTOTAL																						12	38	34	0	46	53	58	57	57	61		
TOTAL PERIODO			416																														

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

207

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

Ibagué

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.847-3

CONTRATO OBRA: 3049 NOV 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO IABGUE VIAL URBANO 2025

OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESESTRUCTUTA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 2

CONTRATO INTERVENTORIA: 3158 del 18 de noviembre de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS IBAGUE

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/ CALLE		CARGO	DICIEMBRE 2025																												
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NUEVA CASTILLA	1	ING RESIDENTE DE OBRA	1	1	0	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
	2	INSPECTOR	0	1	1	2	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0											
	3	TOPOGRAFO	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0											
	4	PROFESIONAL SST	0	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0											
	5	ING AMBIENTAL	0	0	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	0	0											
	6	OPERADOR DE MAQUINARIA	0	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3											
	7	OFICIAL	0	1	0	0	1	1			2	1	1	1	2		2	2	2	2	0	0											
	8	AYUDANTE	2	10	12	10	10	10			8	6	10	10	10		10	10	10	10	10	3											
	9	CONDUCTOR	0	0	2	2	0	0			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	0											
VILLA MARLEN	10	TOPOGRAFO	1	1	0	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
	11	AUX SST	1	1	0	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0											
	12	OFICIAL	1	1	0	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0											
	13	AYUDANTE	3	3	0	3	3	3			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	2											
	14	OPERADOR DE MAQUINARIA	0	3	0	3	3	3			3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	1											
PEDRO TAFUR	15	INSPECTOR	1	1	1	1																											
	16	ING RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1																											
	17	TOPOGRAFO	1	1	1	1																											
	18	OFICIAL	1	1	1	1																											
	19	RASTRILLERO	2	2	2	2																											
	20	PROFESIONAL SST	1	1	1	1																											
	21	AYUDANTE	13	13	10	12																											
	22	CONTROLADOR VIAL	2	2	2	2																											
	23	OPERADOR DE MAQUINARIA	5	5	4	4																											
	24	CONDUCTOR	3	3	3	2																											
VILLA CAFE	25	MAESTRO		1	1	1																											
	26	OPERADOR DE MAQUINARIA		0	0	1																											
	27	AUX SST		1	1	1																											
	28	CONDUCTOR		0	0	2																											
	29	AYUDANTE		3	3	3																											
	30	OFICIAL		1	1	1																											
CALATAYUD	31	OFICIAL	0	0	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
	32	TOPOGRAFO	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
	33	AUX SST	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0											
	34	AYUDANTE	2	1	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2											
	35	OPERADOR DE MAQUINARIA	1	1	2	2	2	2			2	2	2	3	3		3	3	3	3	3	0											
RICAUTE	36	TOPOGRAFO				1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
	37	ING RESIDENTE DE OBRA				1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
	38	PROFESIONAL SST				1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	0											
	39	FONTANERO				0	0	0			0	0	1	1	1		1	1	1	1	1	0											
	40	OFICIAL				1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1											
	41	AYUDANTE				4	4	3			4	4	3	3	4		4	4	4	4	4	2											
	42	OPERADOR DE MAQUINARIA				2	2	2			2	2	2	2	2		3	3	3	3	2	0											
CRA 5 ENTRE 84 Y 86	43	ING RESIDENTE DE OBRA					1	1			1	1	1	1				1															
	44	INSPECTOR					1	1			1	1	1	1				1															
	45	RASTRILLERO					2	2			2	2	2	2				2															
	46	PROFESIONAL SST					1	1			1	1	1	1				1															
	47	CONTROLADOR VIAL					2	2			2	2	2	2				2															
	48	CONDUCTOR					3	3			2	2	2	2				2															
	49	OPERADOR DE MAQUINARIA					5	5			2	5	5	5				3															
	50	AYUDANTE					12	12			12	12	12	12				12															
	51	OFIACIAL					1	1			1	1	1	1				1															
PEDRO TAFUR- PARQUE DEPORTIVO	52	ING RESIDENTE DE OBRA																	1	1	1												
	53	INSPECTOR																	1	1	1												
	54	RASTRILLERO																	2	2	2												
	55	PROFESIONAL SST																	1	1	1												
	56	CONTROLADOR VIAL																	2	2	2												
	57	OFICIAL																	1	1	1												
	58	AYUDANTE																	12	12	12												
	59	OPERADOR DE MAQUINARIA																	5	5	5												
	60	CONDUCTOR																	3	3	3												
SUBTOTAL			45	67	60	86	45	44	0	0	46	45	47	75	50	0	51	51	51	51	46	20											
TOTAL PERIODO			680																												

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LUIS ALBERTO CONTRERAS HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902001822	4	UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Av Ambala 69 80 CC Plazas del Bosque	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2013650623	949652364 9	E	2025/12/05	2025/12/16	BANCOLOMBIA	11	$2,827,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (22 Afiliados)						$9,057,452	$1,450,200			$9,057,452	$362,700			$9,057,451	$362,700			$9,057,452		$632,000		$0	$0		$2,807,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (22 Afiliados)						$9,057,452	$1,450,200			$9,057,452	$362,700			$9,057,451	$362,700			$9,057,452		$632,000		$0	$0		$2,807,600
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (22 Afiliados)						$9,057,452	$1,450,200			$9,057,452	$362,700			$9,057,451	$362,700			$9,057,452		$632,000		$0	$0		$2,807,600
1	CC	1110484665	AGUIRRE RUBEN X	231001	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF50	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
2	CC	1003880848	ALVARADO CRISTIAN X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF50	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
3	CC	1110518821	BOCANEGRA DIANA X	230301	7	$746,667	$119,500	EPS002	7	$746,667	$29,900	CCF50	7	$746,667	$29,900	14-11	7	$746,667	6.960%	$52,000	7	$0	$0	SI	$231,300
4	CC	1110592853	BOLANOS CAMILO X	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
5	CC	38142489	CABEZAS DIANA X	25-14	3	$262,000	$42,000	EPS005	3	$262,000	$10,500	CCF50	3	$262,000	$10,500	14-11	3	$262,000	6.960%	$18,300	3	$0	$0	SI	$81,300
6	CC	1110565763	CAMPOS JHON X	230301	11	$916,667	$146,700	EPS005	11	$916,667	$36,700	CCF50	11	$916,667	$36,700	14-11	11	$916,667	6.960%	$63,900	11	$0	$0	SI	$284,000
7	CC	1005822372	CHIPATECUA SOFIA X	25-14	11	$960,667	$153,800	EPS005	11	$960,667	$38,500	CCF50	11	$960,667	$38,500	14-11	11	$960,667	6.960%	$66,900	11	$0	$0	SI	$297,700
8	CC	1105473971	CUBILLOS JUAN X	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
9	CC	1005716598	GONZALEZ JHON X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF50	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
10	CC	93410425	GONZALEZ VIDAL X	230301	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF50	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
11	CC	10234997	GUALTERO FRANCISCO X	230301	3	$300,000	$48,000	EPS037	3	$300,000	$12,000	CCF50	3	$300,000	$12,000	14-11	3	$300,000	6.960%	$20,900	3	$0	$0	SI	$92,900
12	CC	1105692748	GUARNIZO EVER X	230201	10	$600,000	$96,000	EPSIC6	10	$600,000	$24,000	CCF50	10	$600,000	$24,000	14-11	10	$600,000	6.960%	$41,800	10	$0	$0	SI	$185,800
13	CC	1109265231	GUZMAN JONATHAN X	230201	7	$816,667	$130,700	EPS002	7	$816,667	$32,700	CCF50	7	$816,667	$32,700	14-11	7	$816,667	6.960%	$56,900	7	$0	$0	SI	$253,000
14	CC	1110454915	MEJIA YURY X	230201	7	$611,334	$97,900	EPS002	7	$611,334	$24,500	CCF50	7	$611,333	$24,500	14-11	7	$611,334	6.960%	$42,600	7	$0	$0	SI	$189,500
15	CC	1005839510	MORALES JUAN X	230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF50	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
16	CC	1121862849	OSORIO JAIR X	230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF50	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
17	CC	1007287708	OTAVO ALDAIR X	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
18	CC	1007289718	OTAVO EDWAR X	230301	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF50	5	$237,250	$9,500	14-11	5	$237,250	6.960%	$16,600	5	$0	$0	SI	$73,600
19	CC	1006127576	PEREZ DARWIN X	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$13,300	CCF50	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	SI	$103,000
20	CC	1110551210	SANCHEZ CARLOS X	230201	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
21	CC	1015995113	SANDOVAL DIDIER X	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF50	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	6.960%	$13,300	4	$0	$0	SI	$58,900
22	CC	14398695	VERGARA CARLOS X	231001	10	$474,500	$76,000	EPS002	10	$474,500	$19,000	CCF50	10	$474,500	$19,000	14-11	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
Total Afiliados(22)						$9,057,452	$1,450,200			$9,057,452	$362,700			$9,057,451	$362,700			$9,057,452		$632,000		$0	$0		$2,807,600

209

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$1,450,200	$10,200	$0	$1,460,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$114,000	$800	$0	$114,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$195,800	$1,400	$0	$197,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$785,400	$5,500	$0	$790,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$355,000	$2,500	$0	$357,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$632,000	$4,400	$0	$636,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	$632,000	$4,400	$0	$636,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$362,700	$2,600	$0	$365,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	22	$362,700	$2,600	$0	$365,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$362,700	$2,700	$0	$365,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$12,000	$100	$0	$12,100
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$24,000	$200	$0	$24,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$220,100	$1,600	$0	$221,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$106,600	$800	$0	$107,400
TOTAL				22	$2,807,600	$19,900	$0	$2,827,500

012

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRATIVO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7997399018**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1979299984

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.539.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.077.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.317.700
		SUBTOTAL:	16	**$ 5.934.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 284.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 68.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 1.111.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 85.700
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.549.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	17	$ 1.549.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.549.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	17	$ 2.593.500
		SUBTOTAL:	17	**$ 2.593.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 11.620.100**
VALOR MORA:	**$ 7.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 11.627.800**

211

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901999914
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO IBAGUE VIAL URBANO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N 270 OFICINA 405	TELÉFONO:	2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7997452008**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1979352536

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 602.500
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 521.700
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 53.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	25	$ 2.909.000
		SUBTOTAL:	36	**$ 4.086.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 172.000
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 162.200
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	5	$ 98.100
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	16	$ 420.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 253.300
		SUBTOTAL:	38	**$ 1.106.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	38	$ 1.106.200
		SUBTOTAL:	38	**$ 1.106.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	38	$ 1.925.400
		SUBTOTAL:	38	**$ 1.925.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 8.224.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 8.224.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 14225605
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICINA 406	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construccion de otras obras de ingenieria civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRATIVO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7997399018	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1979299984

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.538.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 1.538.300	$ 1.000	$ 1.539.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.076.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 2.076.200	$ 1.400	$ 2.077.600
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.316.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 2.316.200	$ 1.500	$ 2.317.700
SUBTOTALES:										$ 5.930.700	$ 3.900	$ 5.934.900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.111.200	$ 0	$ 700	$ 0	$ 1.111.200	$ 700	$ 0	$ 1.111.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 284.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 284.000	$ 200	$ 0	$ 284.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 85.600	$ 0	$ 100	$ 0	$ 85.600	$ 100	$ 0	$ 85.700
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 68.000	$ 100	$ 0	$ 68.100
SUBTOTALES:													$ 1.548.800	$ 1.100	$ 0	$ 1.549.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.591.800	$ 2.591.800	$ 1.700	$ 0	$ 2.593.500
SUBTOTALES:									$ 2.591.800	$ 1.700	$ 0	$ 2.593.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	17	$ 1.548.800	$ 1.000	$ 1.549.800
SUBTOTALES:			$ 1.548.800	$ 1.000	$ 1.549.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																												PENSIÓN							SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	APORTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110527000	ARROLEDA OLAYA CAMILO ANDRES	DEPEND		$ 1.638.000	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.638.000	$ 294.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.000	$ 73.600	$ 0	$ 73.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.638.000		$ 128.000	30	$ 1.638.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1110541563	YATE DIAZ HAROLD STEVEN	DEPEND		$ 1.638.000	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.638.000	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 262.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.638.000		$ 114.100	30	$ 1.638.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1110573493	OLMOS QUINTERO DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 160.100	30	$ 2.300.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1110579276	ROMERO GIRALDO JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	1	$ 8.400	30	$ 1.600.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 14224466	ARBOLEDA JUAN DE JESUS	DEPEND	NO OBLIG COT PENSIONES	$ 1.638.000	FIJO				SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.638.000	$ 65.600	$ 0	$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.638.000		$ 114.100	30	$ 1.638.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1427787	LEAL MORENO ENALBER	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 3736167	LAMAZA VEGA SIXTO MANUEL	DEPEND		$ 2.338.000	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 5619326	GAMBA BARRIOS VLADIMIR	DEPEND		$ 2.138.000	FIJO				SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.138.000	$ 342.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 342.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.138.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.138.000		$ 148.900	30	$ 2.138.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 85.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 5844030	MORA DRAGGO RENEL HUMBERTO	DEPEND		$ 2.338.000	FIJO				SI																		230201-PROTECCION	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		$ 162.800	30	$ 2.338.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 85753684	LOPEZ SANCHEZ GLORIA ARINO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000	1	$ 181.000	30	$ 2.600.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 7680819	VILLALOBOS GUTIERREZ MIGUEL ANTONIO	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000		$ 160.100	30	$ 2.300.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 79885526	MARIN JARAMILLO HENRY OTONIEL	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 181.000	30	$ 2.600.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

213

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14225605
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - ADMINISTRATIVO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7997399018	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/12/03	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1979299984

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 93374376	MARROQUIN DONATO OMAR	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO				SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.200.000		222.800	30	$ 3.200.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 93378778	GRANADA MONTOYA EDUCARDO	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.200.000		222.800	30	$ 3.200.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 93380415	MORENO PEDRAZA JUAN CARLOS	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		206.600	30	$ 3.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 93386584	CARENA SOTO GUSTAVO	DEPEND		$ 1.938.000	FIJO				SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.938.000	$ 310.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 310.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.938.000	$ 77.600	$ 0	$ 77.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.938.000		134.900	30	$ 1.938.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 93402894	ORTEGOZA LEAL GUILLERMO ALEXANDER	DEPEND		$ 2.338.000	FIJO				SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.338.000	$ 374.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.338.000	$ 93.600	$ 0	$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.338.000		162.800	30	$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 11.627.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

21 y

ANEXO 5
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Alcaldía Municipal
Ibagué

CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA:** 3158 del 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

POLIDEPORTIVO	JORNADA	PERIODO: NOVIEMBRE 2025																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
CEIBA NORTE	MAÑANA																				TS	TS	TS	_	N	TS	TS	TS	N	TS			
	TARDE																				TS	TS	TS	_	TS	TS	TS	N	N	TS			
CALLE 36 ENTRE 5 Y 6	MAÑANA																				TS	N	TS	PM	PM	TS								
	TARDE																				TS	PM	TS	PI	TS	TS								
ARKALA	MAÑANA																				_	_	TS	_	TS	N	TS	PM	N	TS			
	TARDE																				_	_	TS	_	N	N	TS	N	N	TS			
CALLE 3 ENTRE 59 Y 60	MAÑANA																										TS	TS	TS	_			
	TARDE																										TS	TS	TS	_			

(B) ESTADO
TS(TIEMPO SECO)
PI(PRECIPITACIONES INTENSAS)
PI(PRECIPITACIONES INTENSAS)
PI(PRECIPITACIONES INTENSAS)

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

Alcaldía Municipal
Ibagué

CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3048 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA:** 3158 del 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL URBANAS IBAGUE	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1.	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE / CALLE	JORNADA	PERIODO: NOVIEMBRE 2025																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CEIBA NORTE	MAÑANA	PM	PI	TS	TS	TS	TS	_	TS	TS	TS	TS	TS	TS	_	TS	TS	N	TS	PM	TS	TS	TS	TS	_	_	TS	TS	N	TS	TS	
	TARDE	PI	N	PI	TS	TS	TS	_	PI	TS	PM	TS	TS	TS	_	N	TS	TS	TS	N	N	N	TS	TS	_	_	N	N	N	TS	TS	
CALLE 36 ENTRE 5 Y 6	MAÑANA			TS	TS	N	TS	_	_	_	TS	TS	_	TS	TS	TS	TS															
	TARDE			TS	TS	N	_	_	_	_	TS	TS	_	TS	TS	N	TS															
ARKALA	MAÑANA	PM	PM	TS	TS	PM	TS		TS	TS	TS	TS	TS	TS	_	TS	TS	PM	TS	PM	N		TS	N	_	_	TS	TS		N	PM	
	TARDE	PI	PM	PI	PM	TS	TS		PI	PM	PM	TS	TS	TS	_	TS	TS	N	TS	PM	N		PM	TS	_	_	TS	TS		TS	N	
CALLE 77 ENTRE GUABINAL Y RIO CHIPALO	MAÑANA																				N	N	N	N								
	TARDE																				PM	TS	PM	TS								
CRA 5 ENTRE CL 58 Y 64	MAÑANA																										TS	TS	TS	TS	PM	
	TARDE																										TS	TS	TS	TS	N	

(B) ESTADO
TS(TIEMPO SECO)
PI(PRECIPITACIONES INTENSAS)
PM(PRECIPITACIONES MODERADAS)
N (NUBADO)

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

Alcaldía Municipal
Ibagué

CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3049 NOV 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA:** 3158 del 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO IABGUE VIAL URBANO 2025	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESESTRUCTUTA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE / CALLE	JORNADA	PERIODO: NOVIEMBRE 2025																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
NUEVA CASTILLA	MAÑANA																				PM	PM	TS		PM	PM	PM	TS	N	N		
	TARDE																				TS	PI	N		PI	TM	PM	TS	N	TS		
PEDRO TAFUR	MAÑANA																					TS	TS		N	TS	PM	TS	N	N		
	TARDE																					N	N		PM	PI	PM	TS	PM	TS		
VILLA MARLEN	MAÑANA																								TS	PM	TS	PI	N	N		
	TARDE																								PM	PM	TS	PM	PM	TS		

(B) ESTADO
TS(TIEMPO SECO)
PI(PRECIPITACIONES INTENSAS)
PM(PRECIPITACIONES MODERADAS)
N (NUBADO)

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

Alcaldía Municipal Ibagué

CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CONSORCIO VIAS IBAGUE
NIT. 902.007.947-3

CONTRATO OBRA: 3049 NOV 2025	**CONTRATO INTERVENTORIA:** 3158 del 18 de noviembre de 2025
CONTRATISTA: CONSORCIO IABGUE VIAL URBANO 2025	**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAS IBAGUE
OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRESESTRUCTUTA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2	**OBJETO:** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: " EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHANILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COOMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2

FRENTE/CALLE	JORNADA	PERIODO: DICIEMBRE 2025																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
NUEVA CASTILLA	MAÑANA	TS	PI	TS	TS	TS	TS			TS	PM	TS	TS	TS		PM	PM	TS	PM	PM	N											
	TARDE	TS	PM	TS	TS	TS	TS			TS	PM	TS	PM	PM		TS	TS	TS	PM	TS	_											
PEDRO TAFUR	MAÑANA	TS	TS	TS	TS																											
	TARDE	PM	PI	TS	TS																											
VILLA CAFÉ	MAÑANA		TS	TS	PM																											
	TARDE		PI	PM	PM																											
CALATAYUD	MAÑANA	TS	PM	TS	TS	PM	TS			TS	TS	TS	TS	TS		PM	PM	TS	PM	PM	N											
	TARDE	TS	PM	TS	TS	TS	TS			TS	TS	TS	PM	PM		TS	TS	TS	PM	TS	_											
VILLA MARLEN	MAÑANA	TS	PM	TS	TS	PM	TS			TS	TS	TS	PM	PM		TS	N	TS	N	PM	TS											
	TARDE	TS	PM	TS	TS	PM	TS			TS	TS	TS	TS	N		N	TS	TS	TS	TS	_											
RICAUTE	MAÑANA				TS	PM	TS			TS	TS	TS	PM	PM		N	N	N	N	N	TS											
	TARDE				TS	PM	TS			TS	TS	TS	TS	N		TS	TS	TS	TS	TS	_											
CRA 5 ENTRE 84 Y 96	MAÑANA					TS	TS			TS	TS	TS	TS				TS															
	TARDE					TS	TS			TS	TS	TS	TS				TS															
PEDRO TAFUR-PARQUE DEPORTIVO	MAÑANA																	TS	PM	TS												
	TARDE																	TS	TS	TS												

(B) ESTADO

TS(TIEMPO SECO)
PI(PRECIPITACIONES INTENSAS)
PM(PRECIPITACIONES MODERADAS)
N (NUBADO)

OBSERVACIONES

Vo.Bo.

LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
CC. No. 1.121.906.294 DE VILLAVICENCIO
Representante legal

219

ANEXO 6
VERIFICACION DE PAGO DE APORTESA LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902007947	3	CONSORCIO VIAS IBAGUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS IBAGUE	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495783868	9495783868	E	2025/12/11	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$8,362,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10303800	CARDONA ALVAREZ TOMAS ALBERTO	X																	25-14	11	$1,650,000	$264,000	EPS002	11	$1,650,000	$206,300	CCF50	11	$1,650,000	$66,000	14-11	11	$1,650,000	$114,900	11	$1,650,000	$82,500	No	$733,700
2	CC	93238343	CHAMORRO ROJAS CAMILO ALEJANDRO	X																	25-14	11	$751,667	$120,300	EPS002	11	$751,667	$94,000	CCF50	11	$751,667	$30,100	14-11	11	$751,667	$52,400	11	$751,667	$37,700	No	$334,500
3	CC	1110451305	CIFUENTES TORRES LIZETH MARCELA	X																	25-14	11	$1,650,000	$264,000	EPS002	11	$1,650,000	$206,300	CCF50	11	$1,650,000	$66,000	14-11	11	$1,650,000	$114,900	11	$1,650,000	$82,500	No	$733,700
4	CC	1005692157	CORREDOR REYES NICOLLE CAMILA	X																	25-14	12	$600,000	$96,000	EPS002	12	$600,000	$75,000	CCF50	12	$600,000	$24,000	14-11	12	$600,000	$41,800	12	$600,000	$30,000	No	$266,800
5	CC	65768009	CUBILLOS HERNANDEZ DIANA LUCIA	X																	25-14	11	$953,334	$152,600	EPS005	11	$953,334	$119,200	CCF50	11	$953,334	$38,200	14-11	11	$953,334	$66,400	11	$953,334	$47,800	No	$424,200
6	CC	93372186	CUELLAR DIAZ CESAR AUGUSTO	X																	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS037	11	$521,950	$65,300	CCF50	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$36,400	11	$521,950	$26,200	No	$232,400
7	CC	65696913	GUTIERREZ ROJAS HERMINDA	X																	25-14	11	$1,466,667	$234,700	EPS002	11	$1,466,667	$183,400	CCF50	11	$1,466,667	$58,700	14-11	11	$1,466,667	$102,100	11	$1,466,667	$73,500	No	$652,400
8	CC	1007411197	HERNANDEZ REYES DANIEL FELIPE	X																	230301	11	$953,334	$152,600	EPS005	11	$953,334	$119,200	CCF50	11	$953,334	$38,200	14-11	11	$953,334	$66,400	11	$953,334	$47,800	No	$424,200
9	CC	1234643194	MARIN GUZMAN HEYDY CATERINE	X																	25-14	11	$1,466,667	$234,700	EPS005	11	$1,466,667	$183,400	CCF50	11	$1,466,667	$58,700	14-11	11	$1,466,667	$102,100	11	$1,466,667	$73,500	No	$652,400
10	CC	1110089423	MUNOZ ROJAS MARIAN KATERINE	X																	230301	13	$1,083,334	$173,400	ESSC62	13	$1,083,334	$138,500	CCF50	13	$1,083,334	$43,400	14-11	13	$1,083,334	$75,500	13	$1,083,334	$54,300	No	$482,100
11	CC	1121938437	NIEVES HERRERA ANDERSON JAVIER	X																	230301	11	$953,334	$152,600	EPS037	11	$953,334	$119,200	CCF50	11	$953,334	$38,200	14-11	11	$953,334	$66,400	11	$953,334	$47,800	No	$424,200
12	CC	1121906294	NIEVES HERRERA LISETH MARYORI	X																	25-14	11	$953,334	$152,600	EPS002	11	$953,334	$119,200	CCF50	11	$953,334	$38,200	14-11	11	$953,334	$66,400	11	$953,334	$47,800	No	$424,200
13	CC	1121842452	ORTEGA CAMPO MARIBEL	X																	230201	11	$1,466,667	$234,700	EPS005	11	$1,466,667	$183,400	CCF50	11	$1,466,667	$58,700	14-11	11	$1,466,667	$102,100	11	$1,466,667	$73,500	No	$652,400
14	CC	1234643903	OTALORA MURILLO ANGIE TATIANA	X																	25-14	11	$953,334	$152,600	EPS005	11	$953,334	$119,200	CCF50	11	$953,334	$38,200	14-11	11	$953,334	$66,400	11	$953,334	$47,800	No	$424,200
15	CC	93370724	SANDOVAL MORALES FREDY	X																	25-14	11	$751,667	$120,300	EPS005	11	$751,667	$94,000	CCF50	11	$751,667	$30,100	14-11	11	$751,667	$52,400	11	$751,667	$37,700	No	$334,500
16	CC	1110534157	TOBAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL	X																	25-14	11	$953,334	$152,600	EPS002	11	$953,334	$119,200	CCF50	11	$953,334	$38,200	14-11	11	$953,334	$66,400	11	$953,334	$47,800	No	$424,200
17	CC	93403029	URUEÑA ZARTHA JAIME	X																	25-14	11	$715,000	$114,400	EPS002	11	$715,000	$89,400	CCF50	11	$715,000	$28,600	14-11	11	$715,000	$49,800	11	$715,000	$35,800	No	$318,000
18	CC	1110546744	ZARTA ERIKA LEONELA	X																	25-14	11	$953,334	$152,600	EPS005	11	$953,334	$119,200	CCF50	11	$953,334	$38,200	14-11	11	$953,334	$66,400	11	$953,334	$47,800	No	$424,200
Total	Afiliados(18)																						$18,796,957	$3,008,300			$18,796,957	$2,350,400			$18,796,957	$752,600			$18,796,957	$1,309,200		$18,796,957	$941,800		$8,362,300

221

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 902007947	3	CONSORCIO VIAS IBAGUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO VIAS IBAGUE	MZ 14 CA 8 ETA 4 VILLA CAFE	IBAGUE-TOLIMA	3118521634	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9495783868	9495783868	E	2025/12/11	2025/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$8,362,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,008,300	$0	$0	$3,008,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,295,000	$0	$0	$2,295,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$478,600	$0	$0	$478,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$234,700	$0	$0	$234,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,309,200	$0	$0	$1,309,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$1,309,200	$0	$0	$1,309,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$752,600	$0	$0	$752,600
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	18	$752,600	$0	$0	$752,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$2,350,400	$0	$0	$2,350,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$135,500	$0	$0	$135,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,500	$0	$0	$184,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$1,092,800	$0	$0	$1,092,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$937,600	$0	$0	$937,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$565,200	$0	$0	$565,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$565,200	$0	$0	$565,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$376,600	$0	$0	$376,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$376,600	$0	$0	$376,600
TOTAL				18	$8,362,300	$0	$0	$8,362,300

2025/12/02 11:51 AM

2.21

ANEXO 7
INFORME SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD INSDUSTRIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Alcaldía de
IBAGUÉ

CONTRATO 3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONSORCIO VÍAS IBAGUE

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA/ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ LOTE 1 Y 2"

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1

COMPONENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
COMPONENTE SOCIAL



PERIODO 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DE 2025

Dirección: Mz 14 casa 8 etapa 4 Villa café
Ciudad: Ibagué – Tolima

Contenido

INTRODUCCIÓN 4
JUSTIFICACIÓN 5
OBJETIVOS 6
DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6
ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA: 6
ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA SST Y SOCIAL 7
1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 7
2. ASPECTOS TÉCNICOS 8
2.1 CONTROL DEL PERSONAL 8
3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL 14
3.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 14
3.3 VERIFICACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES: 15
3.4 ATS ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 15
3.5 PROGRAMA DE CAPACITACIONES 16
3.6 PROGRAMAS DE INSPECCIONES 17
3.7 ENTREGA DE EPI Y DOTACIÓN 18
3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 18
3.9 ACCIDENTES E INCIDENTES 19
3.10 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 19
3.11 GESTIÓN DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 19
3.12 CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 20
4. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIARIA: 20
5. PLAN DE EMERGENCIA 21
6. SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN 21
7. CONDICIONES DE HIGIENE 21
8. Programa de orden y aseo 21
9. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES 21
COMPONENTE SOCIAL 22
Lote 1 UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ 22

LOTE 2 CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 23

10. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 26

INTRODUCCIÓN

Las construcciones representan uno de los ambientes más peligrosos estando clasificados en el nivel de riesgo V, debido a los procesos, tareas y actividades que se ejecutan, así como la magnitud de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y que pueden materializarse generando graves consecuencias tanto para el trabajador como para la organización. Es por ello por lo que juega un papel muy importante la seguridad y salud en el trabajo como estrategia de prevención, cuyo propósito y finalidad es tener un ambiente de trabajo seguro y agradable para los colaboradores.

El seguimiento al SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que viene desarrollando el contratista, es importante ya que permite identificar los riesgos en los trabajos críticos realizados, e implementar estrategias para mitigar y controlar los mismos.

JUSTIFICACIÓN

La realización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es de vital importancia según el Decreto 1072 del 2015 el cual establece lineamientos para la inspección, vigilancia y control de todas las empresas legalmente constituidas con el fin de unificar la normativa laboral, estableciendo obligaciones para empleadores a través de inspección, vigilancia y control.

Desde interventoría se verifica, analiza y se acompaña al contratista lote 1 UNIÓN TEMPORAL URBANAS Ibagué, lote 2 CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO 2025 en el cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. (SST), además de Resolución 0312 de 2019 que establece los estándares mínimos del SG-SST.

De esta manera se hace seguimiento a cualquier tipo de incidente, accidente y/o enfermedad laboral que pueda generar un índice de ausentismo o pérdida para la compañía. A su vez permite incrementar la productividad de la empresa generando beneficios Y estableciendo reglas claras sobre relaciones laborales y de seguridad y salud en el trabajo.

OBJETIVOS

Objetivo de la interventoría: El objetivo de este informe para el periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre es reportar a la ALCALDÍA DE IBAGUÉ, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, el estado actual de la obra con a los aspectos en seguridad y salud en el trabajo (SST) y de la gestión social, verificando el cumplimiento de la normatividad legal vigente, RESOLUCIÓN 0312 del 13 de febrero de 2019, por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST, y demás normas que apliquen en la actividad.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ALCANCE DE LA INTERVENTORÍA: Evaluar la planificación, desarrollo y y aplicación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG – SST), además del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL, de los contratistas, realizar intervención cuando se amerite con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores y el bienestar de la organización.

Criterios de la interventoría:

- Resolución 0312 de 2019
- Decreto 1072 de 2015.
- Plan de trabajo.
- Plan de capacitación.
- Matriz de identificación de peligros y riesgos.
- Plan de respuesta ante emergencias.
- Programa de orden y aseo.
- Plan de manejo de tránsito
- Documentación maquinaria y vehículos utilizados en la ejecución de las obras.

ASESOR SST DE LA INTERVENTORÍA: Maribel Ortega Campos

Periodo de revisión por parte de la interventoría: 20 de noviembre al 20 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA SST Y SOCIAL

Las siguientes son las actividades desarrolladas por la interventoría, en la supervisión al contratista en la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN SOCIAL, se hace el acompañamiento permanente al contratista velando por el cumplimiento de la normatividad legal vigente colombiana con respecto al personal vinculado incluyendo a subcontratistas durante el periodo.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- Se solicita a los contratistas el cumplimiento de lo establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) entregado a la interventoría por parte de ellos (Contratistas).
- Se solicita documentación requerida para ingreso a obra del contratista y subcontratista.
- Se solicita el pago de la seguridad social del personal en general, contratista y subcontratistas para verificación del cumplimiento de las obligaciones.
- De igual modo se solicita y orienta al contratista hacer implementación del SG-SST según lo contempla este con respecto al manejo de los subcontratistas vinculados en el proceso de ejecución del objeto del contrato (inducciones, verificación de seguridad social vigente, pre operacionales de maquinaria, verificación de la documentación de la maquinaria y personal, charlas de seguridad, inspecciones de las áreas y equipos a utilizar) cada actividad va soportada con registro fotográfico de parte del contratista, con el fin de dar cumplimiento al SG-SST.
- Se verifica y solicita la entrega y reposición de dotación y elementos de protección individual firmada por los trabajadores, requerida según actividad realizada.
- Revisión del plan de gestión social, y acompañamiento en la ejecución de este
- Se generan observaciones sobre hallazgos en obra tras la debida visita y supervisión del profesional en SST a los frentes de trabajo, dándolos a conocer a contratista por medio de oficio.

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 CONTROL DEL PERSONAL

INTERVENTORÍA CONSORCIO VÍAS IBAGUÉ, cuenta con personal capacitado y apto para la ejecución de las actividades objeto de contrato.

Personal

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO
1	CARDONA ÁLVAREZ TOMAS ALBERTO	10303800	Ingeniero Residente N°1
2	CHAMORRO ROJAS CAMILO ALEJANDRO	93238343	Cadenero
3	CIFUENTES TORRES LIZETH MARCELA	1110451305	Ingeniero Residente N°2
4	CORREDOR REYES NICOLLE CAMILA	1005692157	Inspectora
5	CUBILLOS HERNÁNDEZ DIANA LUCIA	65768009	Ingeniero Residente N°3
6	CUELLAR DIAZ CESAR AUGUSTO	93372186	Especialista Ambiental
7	GUTIÉRREZ ROJAS HERMINDA	65696913	Profesional SST N°2
8	HERNÁNDEZ REYES DANIEL FELIPE	1007411197	Ingeniero Residente N°5
9	MARÍN GUZMÁN HEYDY CATERINE	1234643194	Profesional SST N°1
10	MUÑOZ ROJAS MARIAN KATERINE	1110089423	Aux SST
11	NIEVES HERRERA ANDERSON JAVIER	1121938437	Ingeniero Aux N°1
12	NIEVES HERRERA LISETH MARYORI	1121906294	Ingeniero Residente N°4
13	ORTEGA CAMPO MARIBEL	1121842452	Profesional SST N°3
14	OTALORA MURILLO ANGIE TATIANA	1234643903	Ingeniero Aux N°2
16	TOBAR MARTÍNEZ MIGUEL ÁNGEL	1110534157	Topografo N°2
17	URUEÑA ZARTHA JAIME	93403029	Conductor

18	ZARTA ERIKA LEONELA	1110546744	Topografo N°1

Cada empleador cuenta en su grupo de trabajo personal capacitado y apto para la ejecución de las distintas actividades, para este periodo (20 nov – 20 dic), cuentan con el siguiente personal

LOTE 1 - UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ

- 24 colaboradores directos UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ
- 2 ingresos directos Unión TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ
- 2 colaboradores asfaltemos SAS
- 1 conductor camioneta

UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ				
No	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**
1	Sofia Chipatecua Cubillos	1.005.822.372	Ingeniera Administrativa	Administrativa
2	Jhon Henry Campos López	1.110.565. 763	Topógrafo	Operativo
3	Vidal González Romero	93.410.425	Ayudante de Obra	Operativo
4	Ever Julián Guarnizo Triana	1.105.692.748	Aux administrativo	Administrativa
5	Carlos Eduardo Vergara Vidal	14.398.695	Ayudante de Obra	Operativo
6	Diana Katherine Bocanegra Rodríguez	1.110.518.821	Ingeniera Residente	Operativo
7	Yury Patricia Mejía Prada	1.110.454.915	Profesional SST	Operativo
8	Jhonatan Guzmán Bravo	1.109.265.231	Ingeniero Residente	Operativo
9	Juan David Morales Morales	1.005.839.510	Ayudante de Obra	Operativo
10	Jair Osorio Herrera	1.121.862.849	Ayudante de Obra	Operativo
11	Darwin Sleider Pérez Lezama	1.006.127.576	Ayudante de Obra	Operativo
12	Rubén Dario Aguirre Cifuentes	1.110.484.665	Ayudante de Obra	Operativo
13	Cristian Felipe Alvarado Martínez	1.003.880.848	Ayudante de Obra	Operativo
14	Jhon Fredy González Sánchez	1.005.716.598	Ayudante de Obra	Operativo

15	Edwar Andrés Otavo Parra	1.007.289.718	Ayudante de Obra	Operativo
16	Camilo Andrés Bolaños Pinzón	1.110.592.853	Ayudante de Obra	Operativo
17	Juan Esteban Cubillos Yara	1.105.473.971	Ayudante de Obra	Operativo
18	Aldair Otavo Parra	1.007.287.708	Ayudante de Obra	Operativo
19	Carlos Eduardo Sánchez Montoya	1.110.551.210	Ayudante de Obra	Operativo
20	Didier Andrés Sandoval	1.015.995.113	Ayudante de Obra	Operativo
21	Francisco José Gualtero Pérez	10.234.997	Inspector de Obra	Operativo
22	Diana Patricia Cabezas Hormiga	38.142.489	Profesional SST	Operativo
23	Esdedier Armando Capera Mahecha	1.110.482.357	Oficial de Obra	Operativo
24	Leidy Liliana Vieda Celis	1.110.442.850	Topógrafa	Operativo
25	Mauricio Hernán Cespedes Robledo	5.820.172	Topógrafo	Operativo
26	Lady Ávila	83.234.477	Oficial de Obra	Operativo

LOTE 2 – CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO

- 64 colaboradores directamente CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO
- 6 colaboradores vinculados por subcontratista PAVETOL SAS

CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO				
No	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**
1	Jaime Alexander Ortigoza Giraldo	1.110.539.630	Ingeniero Director	Administrativa
2	Luis Ricardo Ortigoza Gonzales	14.225.605	Ingeniero Residente	Administrativa
3	Cesar Sandoval Páez	5.829.690	Ingeniero Residente	Administrativa
4	Jorge Alberto Ramos Salazar	79.893.182	Profesional Ambiental	Administrativa

5	Juan Daniel Moya Robayo	3.192.972	Especialista en Geotecnia	Administrativa
6	Diego Andrés Diaz Diaz	5.824.544	Especialista en Pavimentos	Administrativa
7	Diana Patricia Giraldo Moreno	51.724.999	Profesional Social	Administrativa
8	Gloria Astrid López Sánchez	65.753.684	Profesional SST	Administrativa
9	Yenifer Katherine Somoyar Riveros	1.110.589.809	Aux SST	Operativo
10	María Fernanda Valdés Celis	1.006.128.005	Aux SST	Operativo
11	Luis Esteven Téllez López	1.005.814.348	Aux SST	Operativo
12	Daniel Ricardo Guzmán Guzmán	1.110.495.186	Inspector de Obra	Operativo
13	Juan Camilo Álvarez	1.110.564.539	Inspector de Obra	Operativo
14	Valeria Palomino	1.007.411.077	Inspector de Obra	Operativo
15	Luis Enrique Banguero Tafur	14.227.199	Cadenero	Operativo
16	Orlando Mora Mora	1.110.446.536	Topógrafo	Operativo
17	Luis Fernando Villamil Grisales	14.218.381	Topógrafo	Operativo
18	Luis Enrique Garay Moreno	14.241.018	Topógrafo	Operativo
19	German Reyes Cardozo	10.272.086	Cadenero	Operativo
20	Harold Steven Yate Diaz	1.110.541.563	Operario Maquinaria	Operativo
21	Camilo Andrés Arboleda Olaya	1.110.527.000	Operario Maquinaria	Operativo
22	Sixto Lamaza Vega	2.736.167	Operario Maquinaria	Operativo
23	Henry Otoniel Marín Jaramillo	79.865.528	Operario de Maquinaria	Operativo
24	Juan de Jesús Arboleda	14.224.468	Operario de Maquinaria	Operativo
25	Juan Camilo Sánchez	1.005.718.608	Operario de Maquinaria	Operativo
26	Vladimir Gamba	5.819.326	Operario de Maquinaria	Operativo
27	Jhon Edison Suarez Acosta	93.237.235	Tornillero	Operativo
28	Jairo Alonso Corredor Ríos	5.821.057	Conductor de Volqueta	Operativo
29	Yovani Leal Pérez	93.393.335	Conductor de Volqueta	Operativo

30	Gustavo Capera Soto	93.386.584	Conductor de Volqueta	Operativo
31	Jesús Alberto Laiseca Silva	1.110.543.427	Ayudante de Obra	Operativo
32	Eduar Fabial Leal Tapiero	1.110.544.887	Ayudante de Obra	Operativo
33	Eider Andrés Palacios Mena	1.077.472.616	Ayudante de Obra	Operativo
34	Oscar Fernando Patiño	1.005.690.488	Rastrillero	Operativo
35	José Ferney Franco	93.362.388	Rastrillero	Operativo
36	Enalber Leal Moreno	14.277.878	Rastrillero	Operativo
37	Rogelio Alberto Laverde	93.413.284	Ayudante de Obra	Operativo
38	Ángel Alberto Cantor Valencia	93.386.277	Ayudante de Obra	Operativo
39	Hernando Viedman Hurtado	76.341.553	Ayudante de Obra	Operativo
40	Ancizar Álzate Gallego	93.409.469	Ayudante de Obra	Operativo
41	Luis Fernando Álzate Gallego	9.809.631	Ayudante de Obra	Operativo
42	Carlos Julio Amórtegui Ruiz	93.366.350	Ayudante de Obra	Operativo
43	Jaime Bernal Pérez	93.381.630	Ayudante de Obra	Operativo
44	Robinson Briñez Dias	14.136.568	oficial de obra	Operativo
45	Jhon Jairo Gil Álcali	93.238.644	Oficial de Obra	Operativo
46	Junior Rafael Perdomo Aguilar	5.189.493	Oficial de Obra	operativo
47	Carlos Eduard Castaño Carmona	71.192.906	Ayudante de Obra	Operativo
48	Brian Steven Coronado Angarita	1.110.569.880	Ayudante de Obra	Operativo
49	German Félix Franco Ospina	93.395.019	Ayudante de Obra	Operativo
50	Kedwin Alejandro Castellanos Mora	1.005.839.770	Ayudante de Obra	Operativo
51	Carlos Iván García Rocha	1.005.717.002	Operario de Maquinaria	Operativo
52	María Fernanda López Vergara	1.088.284.311	Ayudante de Obra	Operativo

53	Jhon Stiven Lozano Soto	1.233.506.108	Ayudante de Obra	Operativo
54	Reinaldo Pérez Rodríguez	93.698.735	Ayudante de Obra	Operativo
55	Wilmar Mauricio Zambrano	1.110.487.824	Ayudante de Obra	Operativo
56	Jhon Steven Méndez Marulanda	1.110.577.370	Ayudante de Obra	Operativo
57	Huberley Bocanegra Capera	1.006.150.123	Ayudante de Obra	Operativo
58	Luis David Álzate Devia	1.104.937.973	Ayudante de Obra	Operativo
59	Brayan Andrés Arango Arias	1.006.128.610	Ayudante de Obra	Operativo
60	Ronald Stick Marulanda Vaquero	1.006.128.610	Ayudante de Obra	Operativo
61	Jonathan Fabian Moreno Villanueva	1.006.121.612	Ayudante de Obra	Operativo
62	Franz de Jesús Parra Guillen	1.063.142.354	Ayudante de Obra	Operativo
63	Fabian Guillermo Ruiz Vaquiro	1.110.472.436	Ayudante de Obra	Operativo
64	Luis Esteven Téllez López	1.005.814.348	Ayudante de Obra	Operativo

PAVETOL SAS.				
No	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**	**CUADRILLA**
1	Juan Carlos Cárdenas Herazo	1.127.949.376	Maestro de Obra	Operativa
2	Jhon Jairo Tovar Barrios	93.456.878	Oficial	Operativa
3	Jordán Manuel Cárdenas Herazo	1.002.194.404	Ayudantes	Operativa
4	José Erney Arenas Enciso	1.038.818.316	Ayudantes	Operativa
5	Jeferson Argumedo Tapia	1.063.161.277	Ayudantes	Operativa
6	Leonel de Jesús Jaramillo Restrepo	93.388.662	Ayudantes	Operativa

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL

3.1 VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

Se verifica afiliaciones a seguridad social del personal (ARL, AFP, EPS,CCF) para el personal en general, además de los nuevos ingresos

Se verifica que la planilla de seguridad social se encuentre vigente con su respectivo pago para el periodo en curso de los trabajadores vinculados directamente a los consorcios de los contratistas de lote 1 y lote 2 además de los subcontratistas personal de obra y del encargado del transporte y uso de vehículos volquetas

3.2 VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Se solicita demostrar que el personal ha realizado el proceso de inducción, dando cumplimiento a el requisito de obligatorio para cada colaborador / trabajador que ingresa por primera vez y la reinducción para aquellos que regresan a la organización, dicho programa es un requisito para el inicio de las labores , esto se hace mediante un formato que debe cumplir con unas características, entre ellas dar a conocer al personal las políticas y generalidades de la empresa, reglamentos internos y en SST, riesgos a los que se encuentra expuesto entre otros aspectos.

Los contratistas evidencian el proceso a través de registro fotográfico y formatos de inducción al personal.

INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN	
N° de personas nuevas	**Empresas**
64	CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO
6	PAVETOL
24	UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUE
2	ASFALTEMOS

3.3 VERIFICACIÓN DE EXÁMENES OCUPACIONALES:

Se solicita dentro de la documentación inicial, y pagos de seguridad social, la evidencia que nos permita identificar y corroborar que el personal vinculado se le ha practicado los debidos exámenes ocupacionales en este caos los de ingreso que tienen como objetivo dar a conocer el estado de salud de los trabajadores al momento de iniciar las labores, como interventoría se hace seguimiento a las recomendaciones médicas ocupacionales otorgadas para la verificación del estado de salud y la aptitud del personal vinculado, además de intervenir con acciones encaminadas a mejorar el estado de salud de los colaboradores

3.4 ATS ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

El análisis de trabajo seguro es un proceso sistemático que consiste en la identificación peligro y evaluación de riesgos, previo al inicio de la ejecución de la labor y en la cual se establecen los controles que permitan mitigar los riesgos en la elaboración del ATS participan todos los trabajadores que ejecuten las tareas generando unas condiciones de trabajo adecuadas y un conocimiento de los riesgos a los que se puede estar expuesto para realizar las actividades de forma segura

Contratistas remite la evidencia de la divulgación y diligenciamiento del ATS en las distintas actividades realizadas en la ejecución de la obra

Para el periodo se realizaron los siguientes ATS:

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO	NUMERO
Topógrafo y cadenero	5
Operadores de Maquinaria	5
Controlador de Trafico	5
Excavación Manual	2
Excavación con Maquinaria	2
Excavación para Instalación de Tubería	5
Cajeo de Pavimento existente	6
Instalación de Base Granular y Céreo	2
Instalación de filtros	2
Instalación de cerca de poli sombra	2
Fundida de Placa	2
Demolición	4

3.5 PROGRAMA DE CAPACITACIONES

Se solicita al contratista la implementación del programa que evidencie la capacitación al personal con capacitaciones y charlas de 5 minutos diarias. Capacitaciones por parte de ARL y demás entes según sea el requerimiento del trabajo. Recalcando que las capacitaciones tienen como propósito el desarrollo de actividades habilidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano más competente y hábil además de promocionar la salud, el autocuidado y la prevención de enfermedades y riesgos siendo base fundamental del sistema d gestión las capacitaciones concluyen en mejorar el clima laboral, el autocuidado del personal por tanto la productividad de la organización y de las personas involucradas.

En este periodo se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones y charlas:

FECHA	TEMA	PERSONAL	TIEMPO DE CAPACITACIÓN
25/11/25	Importancia del controlador vial en actividad de entrada y salida de volquetas	48	40 MIN
01/12/25	Higiene postural en el puesto de trabajo	28	40 MIN

CHARLAS DE SEGURIDAD

FECHA	TEMA DE CHARLA
20/11/25	Rutas de Evacuación y Puntos de Encuentro
21/11/25	Primeros Auxilios Básicos
22/11/25	Riesgo Eléctrico
24/11/25	Trabajo Seguro en Alturas
25/11/25	Espacios Confinados
26/11/25	Manipulación Manual de Cargas
27/11/25	Uso seguro de Herramientas Manuales
28/11/25	Fatiga Laboral
29/11/25	Rutas de Evacuación y Puntos de Encuentro
1/12/25	Introducción a los Peligros en Obras Viales
2/12/25	Peligros por Maquinaria Pesada
3/12/25	Riesgo por Tránsito Vehicular Externo
4/12/25	Terrenos Inestables y Socavaciones
5/12/25	Riesgo por Trabajos en Caliente
6/12/25	Ruido y Vibración
9/12/25	Riesgo Químico

10/12/25	Exposición al Polvo y Material Particulado
FECHA	**TEMA DE CHARLA**
9/12/25	Importancia de la Calistenia y Pausas Activas
10/12/25	Manejo de Residuos Solidos en Obra
11/11/25	Cargue y Transporte de Bordillos de Manera Segura
12/11/25	Importancia de Orden y Aseo
13/11/25	Socialización Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes Laborales
15/12/25	Uso Funciones y Limitación de los EPP
16/12/25	Riesgo Biomecánico
17/12/25	Que es Peligro, Que es Riesgo
18/12/25	Orden y Aseo
19/12/25	Manejo de Extintores
20/12/25	Rutas de Evacuación y Puntos de Encuentro

3.6 PROGRAMAS DE INSPECCIONES

En obra interventoría realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de inspecciones para el periodo (periódicos, no planeadas, continuas y especiales), según lo amerite la actividad; seguimiento a:

- Supervisión y seguimiento a inspección de dotación y EPP, verificando estado para su debido reemplazo.
- Supervisión y seguimiento a inspecciones de área de trabajo, con el fin de evidenciar si existen los controles pertinentes y adecuados propuestos por el contratista para la prevención de la aparición de accidentes y enfermedades laborales.
- Supervisión y seguimiento a inspección de equipos y herramientas: mediante la solicitud de los registros preoperacionales e inspecciones diligenciadas de acuerdo con el cronograma de inspecciones dentro del SG-SST y así mismo evidenciar el cumplimiento de este.
- Supervisión y seguimiento a inspección del estado de maquinaria: mediante la solicitud de los registros preoperacionales diarios e inspecciones diligenciadas por parte del personal encargado en SST, de acuerdo con el cronograma de inspecciones dentro del SG-SST SST y así mismo evidenciar el cumplimiento de este.
- Supervisión y seguimiento a equipo de primeros auxilios.
- Supervisión y seguimiento a unidades sanitarias.

A continuación, se indican las inspecciones ejecutadas y la periodicidad de estas.

TIPO DE INSPECCIÓN	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
Inspección pre-operacional herramientas	Trabajador	Semanal
Inspección pre-operacional de vehículo y maquinas	SST	Semanal
Inspección de orden y aseo	SST	Mensuales
Inspección de EPP	SST	Mensuales
Inspección de equipos de emergencia	SST	Mensuales

3.7 ENTREGA DE EPI Y DOTACIÓN

- Se exige el suministro de dotación industrial a todo el personal en obra (Camisa, pantalón y botas de seguridad).
- Se exige el suministro de los elementos de protección individual (EPI), según lo demande la matriz de EPI relacionada en el SG-SST de cada contratista y lo amerite la tarea que se está ejerciendo por pare del trabajador.

3.8 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN

Se expresa la importancia de tener señalización en buen estado y disponible para la instalación en los diferentes frentes de trabajo entendiendo que son el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se requieren resaltar hay unas características básicas que se deben tener presente para que esta señalización en las áreas sea realmente efectiva deben

- Atraer la atención de quien la observe
- Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad
- Informar sobre una conducta a seguir
- Ser clara y de interpretación única
- Debe ser fácil de recordar

La señalización nunca elimina un riesgo, pero si es una medida de control que debe ser implementada correctamente para no eliminar su eficacia.

Nota: Se exige a los contratistas la implementación del programa o plan de manejo de tránsito y requerimientos del contrato, donde se deben de instalar en cada frente de obra elementos de seguridad vial con el fin de garantizar la seguridad en las vías, tales como:

conos, reductores de velocidad, pasa vías y señalización preventiva e informativa; señalización de peligro de áreas de riesgo como sumideros, excavaciones, alcantarillados, etc. Y el personal de control vial requerido

Demarcación: Se exige cerramiento en obra que delimite los espacios a intervenir evitando el ingreso de personal ajeno a esta, se debe de realizar en de tela verde, también se exige en cerramiento y/o demarcación de zonas que generen un alto riesgo a la comunidad y al personal dentro de obra, y la debida demarcación de vías de acceso peatonal.

3.9 ACCIDENTES E INCIDENTES

Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión organiza, una perturbación funcional o psiquiátrica una invalidez o la muerte

Incidente: suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes; solo que por cuestiones del azar no desencadenan lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o ambiente.

En caso de presentarse un accidente de trabajo debe darse cumplimiento a lo estableció en la resolución 1401 de 2007 y la resolución 2851 del 2015

En el periodo del informe los contratitas no presentan accidentes de trabajo por tanto no aplica la investigación.

3.10 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

Son aquellas que tienen como objetivo promover la actividad física, como habito de vida saludable, adaptación física cardiovasculares, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad buscando reducir problemas de salud cardiovasculares musculares por sobre uso asociados al desempeño laboral de los colaboradores del proyecto

Por tanto, se recomienda a los contratistas la realización de jornadas de pausas activas e incentivar a la incorporación de hábitos saludables.

Contratistas ejecutan pausas activas durante la jornada laboral.

3.11 GESTIÓN DEL COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se evidencia que el personal tiene el comprobante de conformación de los grupos del comité se recalca la importancia del cumplimiento en lo establecido en la Resolución 2013 del 86, Res 1016 de 89, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, que enmarcan las

actividades que se deben cumplir para la conformación y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST;

EL cumplimiento de la Ley 1010 de 2006, Ley 1562 de 2012 y la Resolución 612 de 2013 y la Resolución 1356 de 2012 para la conformación del comité de convivencia laboral

3.12 CONTROL DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Los contratistas contemplan los siguientes equipos durante el periodo:

- Herramienta menor (Palas, machetes, picas, etc)
- Ayudas mecánicas para transporte de material (carretillas) que deben estar en Optimas condiciones
- Cortadores
- Saltarín rana
- Compresor
- Motobombas
- Minicargador
- Retro excavadora
- Retro oruga
- Motoniveladora
- Fresadora
- Asfaltadora
- Vibro compactador, rodillo liso, doble rodillo, de neumáticos
- Volquetas
- camión irrigador.

Con respecto a la maquinaria se solicita la documentación de cada una con los soportes de propiedad, mantenimiento y certificación de idoneidad de los operadores y de los conductores su licencia de conducción vigente; con el fin de corroborar el buen estado de la maquinaria y las competencias del personal a cargo de esta.
De igual modo se verifica que cada uno cuente con extintor y botiquín dentro de la maquinaria en caso de que se presente una emergencia.

4. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DIARIA:

Durante el proceso de ejecución de obra se solicita los soportes documentales (Formatos) diligenciados que evidencien la implementación de los programas ques e encuentran em el SG-SST y de los cuales se encuentran obligados a dar cumplimiento en campo, para

verificación de que se está llevando a cabo durante la ejecución de las actividades relacionadas con cada subprograma.

- Análisis de trabajo seguro.
- Permisos de trabajo.
- Control de personal.
- Preoperacional de maquinaria y equipos.
- Notificación de riesgo e inducción al personal nuevo.
- Preoperacional de vehículos (volquetas).

5. PLAN DE EMERGENCIA

Se solicita el debido cumplimiento del plan de emergencia contemplado dentro del SG-SST de cada contratista; bajo la conformación de brigadas de emergencia (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), y contar con los elementos de atención para primeros auxilios.
Se exige la señalización requerida según plan de emergencia (rutas de evacuación, puntos de encuentro, etc.)

6. SUMINISTRO DE HIDRATACIÓN

Se busca que todo el personal activo en obra, en los diferentes frentes de trabajo cuenten con hidratación teniendo en cuenta que las actividades se realizan a campo abierto y están expuestos a las altas temperaturas que presenta la ciudad de Ibagué.

7. CONDICIONES DE HIGIENE

Se exige condiciones de higiene aptas en campamentos y unidades sanitarias adecuadas para el uso del personal.

8. Programa de orden y aseo

Se solicita el registro sea fotográfico o documental de la implementación del programa en las áreas de trabajo (vías intervenidas), campamentos; bien sea de manera periódica y por medio de brigadas de orden y aseo.

9. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

- Hasta el momento el contratista ha implementado o seguido las recomendaciones dadas por la interventoría

- Se prohíbe entrar a la obra bajo el estado de alicoramiento y sustancias psicoactivas
- Se reitera al contratista la empresa y reposición de los EPP de manera oportuna
- Se solicita en reiteradas ocasiones el no uso de vestimenta de otros consorcios o contratos
- Se solicita el no uso de pulidoras sin guardas de seguridad
- Se reitera al contratista jornadas de orden y aseo, acomodación del punto ecológico.
- Se solicita él envió del PMT radicado y valido, listo para la implementación e instalación en los distintos frentes de trabajo se solicita con anticipación la entrega para poder revisar e identificar si se cuenta con la señalización y personal necesario además de evitar inconvenientes con tránsito.

COMPONENTE SOCIAL

El plan de gestión está dirigido a los beneficiarios del proyecto, estableciendo los requisitos mínimos para que a través de un conjunto de mecanismos expuestos por el contratista en compañía de la interventoría se logre prevenir minimizar y compensar de manera oportuna y eficiente los impactos que generan las obras relacionadas con el mejoramiento de la malla vial del municipio de Ibagué

Lote 1 UNIÓN TEMPORAL URBANAS IBAGUÉ

FASE PRE- CONSTRUCTIVA

Levantamiento de actas de vecindad

Durante el levantamiento de actas de vecindad, la gestión social del contratista ha recibido menciones por parte de los residentes el sector, indicando que

- *"el inicio de las actividades constructivas debería ser replanteadas debido a que, en fin, de año los establecimientos comerciales de bienes y servicios requieren espacios en la vía para dar manejo a sus entregas".*

Estos casos se puntualizan de la siguiente forma
TRAMO CEIBA NORTE 138 -8ª– 8B – CALLE 140
Este tramo vial, además de ser una zona residencial tiene un crecimiento exponencial de actividades de tipo industrial como lo son.

- Fábricas de ornamentación

- Fábrica de vidrios
- Tiendas.
- Parqueaderos
- Compra y venta de productos agrícolas
- *Economías informales*

TRAMO ÁNGELES

- Presencia de actividades comerciales mixtas (misceláneas tiendas cacharrerías, papelerías), Parqueadero, Ferreterías, Restaurantes

Del mismo modo, durante el diligenciamiento de actas de vecindad, se presentan dificultades referentes a la contactación de los residentes y /o encargados para el levantamiento de este documento en campo. Esto genera una afectación notoria en la efectividad de la actividad y, por ende, en los tiempos de entrega de estos documentos.

FASE CONSTRUCTIVA

Durante las labores de excavación e intervención vial se han presentado situaciones que influyen en la ejecución, especialmente en lo que respecta al aumento de las precipitaciones climáticas en los tramos viales beneficiarios del proyecto. En ese sentido, se puede notar que, las comunidades del sector presentan la necesidad de ingresar o salir de sus residencias permanentemente especialmente en esta época del año, en la cual reciben huéspedes y coordinan actividades para organizar sus fachadas.

Tramos o barrios

- Ceiba norte calle 138 entre 8 y 8ª
- Ceiba norte calle 140 entre 8 y 8ª
- La floresta- carrera 3 entre calle 59 y 60
- Calle 36 entre 5 y 6

LOTE 2 CONSORCIO IBAGUÉ VIAL URBANO

Desarrollo local

Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de genero y derechos diferenciales. Consorcio Ibagué vial urbano contrato para la ejecución del proyecto 87 empleos, para el periodo del presente informe 72 colaboradores directos y 15 indirectos de los cuales el:

- 44 % (32 personas), corresponde a mano de obra calificada.
- 56 % (40 personas), mano de obra no calificada.

Infraestructura De Predios Y Servicios Públicos

Levantamiento De Actas De Vecindad.

INICIO. En el periodo del presente informe se realizó levantamiento de actas de vecindad del sector objeto de intervención, estas se levantaron antes de iniciar las actividades constructivas.

Lote 2

FECHA	CALLE	BARRIO	No. DE ACTAS DE VECINDAD
19/11/2025	Carrera 4h Sur Entre Calles 119 Y 121	Nueva Castilla	27
19/11/2025	Carrera 6b O 6ª Entre Cale 44 Y 47	Villa Marlen	39
24/11/2025	Calle 65ª Entre Carreras 9b Y 10ª (Mz M Y N)	Jordán 9Etp	27
25/11/2025	Calle 79bis Entre Carrera 10ª Y 10c Y Entre Mzs 3 Y 4 Y Entre Mzs 5-6 Y El Parque Calatayud	Calatayud	26
29/11/2025	Calle 23 Entre Carreras 12 Y 14	Ricaurte	28
5/12/2025	Calle 23b Entre Carreras 12 Sur- 12ª Sur-13 Sur Y 14 Sur	Villa Luces	26
TOTAL, ACTAS			**173**

CIERRE. En el periodo del presente informe no se realizó levantamiento de actas de vecindad del sector objeto de intervención, estas actas se levantarán una vez se finalice el proceso constructivo.

Los contratistas tienen diferentes sistemas de participación con la comunidad para la recepción de manifestaciones PQRS hasta el día no se ha generado ninguna manifestación formal.

Realización de reuniones informativas. Con el objetivo de tener una mayor comunicación con la comunidad en general y tengan pleno conocimiento de los procesos que se ejecutan en cada una de las vías a intervenir, se llevan reuniones de socialización donde

se ha contado con la asistencia de funcionarios de la Alcaldía Municipal, Comunidad, Interventoría y contratista.


SOCIALIZACIÓN INICIO DE OBRA			
N°	FECHA	CALLE	N° ASISTENTES
1	19/11/2025	Carrera 4h Sur Entre Calles 119 Y 121 – Nueva Castilla	40
2	19/11/2025	Carrera 6b O 6ª Entre Cale 44 Y 47 – Villa Marlen	20
3	21/11/2025	Calle 49 Entre Carreras 6 Y 7 – Rincón De Piedra Pintada Y Limonar 5 Sector	15
4	24/11/2025	Calle 65ª Entre Carreras 9b Y 10ª (Mz M Y N) – Jordán 9Etp	22
5	25/11/2026	Calle 79bis Entre Carrera 10ª Y 10c Y Entre Mzs 3 Y 4 Y Entre Mzs 5-6 Y El Parque Calatayud	20
6	27/11/2025	Calle 23 Entre Carreras 12 Y 14 – Ricaurte	30
7	27/11/2025	Calle 23b Entre Carreras 12 Sur- 12ª Sur-13 Sur Y 14 Sur – Villa Luces	18

10. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ORDEN Y ASEO





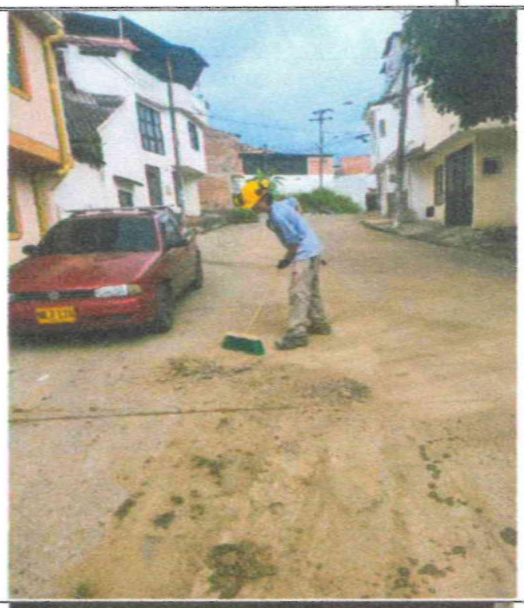









INSPECCIONES (EPP, BOTIQUINES, KIT ANTIDERRAMES, MAQUINARIA)















EXTINTOR

















ATS ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO








DOTACIÓN Y EPP













INDUCCIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES Y REUNIONES DEL COPASST
















SEÑALIZACIÓN

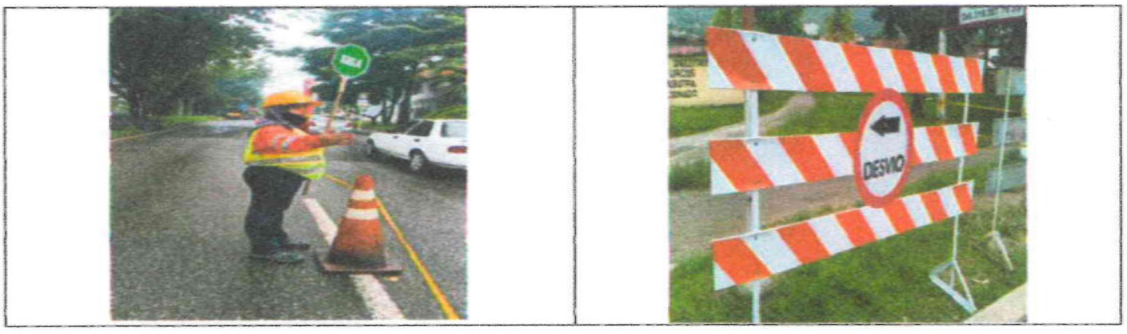














Disculpe las molestias,
estamos recuperando
la malla vial de este barrio











PAUSAS ACTIVAS














ANEXOS

MARIBEL ORTEGA CAMPOS

CC. 1.121.842.452

PROFESIONAL SST

ANEXO 8
INFORME AMBIENTAL

Alcaldía Municipal Ibagué

ibagué capital musical

ALCALDIA DE IBAGUE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA No 01

20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO 3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025



CONSORCIO VIAS IBAGUE
R.L LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
NIT 902.007.794-3

IBAGUÉ, TOLIMA

Mz. 14 CASA 8 ETAPA 4 – BARRIO VILLA CAFE

264

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

Versión 1.0

CONTRATO 3158 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE IBAGUÉ, TOLIMA

DICIEMBRE DE 2025

REVISÓ:	**APROBÓ:**
Nombre: Ing. DIEGO FERNADO BOHORQUEZ.	Nombre: Ing. LISETH MARYORI NIEVES.
Director de Interventoría	R/L CONSORCIO VIAS IBAGUE
	Interventoría
Firma:	Firma:
Fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha: 20 DE DICIEMBRE DE 2025

"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2"

1. INTRODUCCION

El presente documento presenta las acciones realizadas por parte del contratista de obra para dar cumplimiento al PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, dentro del desarrollo de los siguientes Contratos de Obra descritos a continuación:

Contrato de obra N° 3048 del 07 de noviembre de 2025, cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1"

Contrato de obra N° 3049 del 07 de noviembre de 2025, cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 2"

En el mismo sentido, se suscribió el Contrato de Interventoría 3158 del 18 de noviembre de 2025, con el CONSORCIO VIAS IBAGUE, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RELACIONADOS CON "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE LOTE 1 Y 2".
