

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 776-2025**	**279 días**	**vie 19/09/25**	**mar 18/08/26**	**$8.159.887.777**
2	Inicio de obra	0 días	vie 19/09/25	vie 19/09/25	$0
3	**ETAPA PRELIMINAR - REVISIÓN Y AJUSTES AL DISEÑO**	**76 días**	**vie 19/09/25**	**jue 18/12/25**	**$474.506.370**
15	**PRELIMINARES**	**10 días**	**jue 18/12/25**	**mié 31/12/25**	**$9.610.704**
16	REPLANTEO GENERAL	10 días	jue 18/12/25	mié 31/12/25	$9.610.704
17	**EXPLANACIONES**	**20 días**	**mié 31/12/25**	**vie 23/01/26**	**$521.901.501**
18	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGU	20 días	mié 31/12/25	vie 23/01/26	$39.646.021
19	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	20 días	mié 31/12/25	vie 23/01/26	$482.255.480
20	**PAVIMENTOS FLEXIBLES**	**31 días**	**jue 4/06/26**	**sáb 11/07/26**	**$465.384.259**
21	GEOCELDA HDPE PERFORADA, ALTURA 15 CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	5 días	jue 4/06/26	jue 11/06/26	$343.556.507
22	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	5 días	lun 6/07/26	sáb 11/07/26	$120.372.872
23	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO).	1 día	lun 29/06/26	mar 30/06/26	$723.660
24	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	1 día	mié 1/07/26	jue 2/07/26	$731.220
25	**URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO**	**36 días**	**lun 15/06/26**	**mar 28/07/26**	**$1.165.179.637**
26	CARCAMO SISTEMA A-127 RP DRAIN SYSTEM 50X32X25 DRENAJE) Suministro e instalación	3 días	mar 14/07/26	vie 17/07/26	$46.346.294
27	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA BORDE DE VIA (Incluye dados de concreto 3000psi grava común de 0.20 x 0.20m y recubrimiento en epóxico y esmalte uretano). Suministro e Instalación	1 día	mié 22/07/26	jue 23/07/26	$15.007.742
28	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA 3.70 M DE ALTO. INCL. SUMINISTRO E INSTALACION. GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 1.0 M, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MORTERO, RECEBO	6 días	mar 23/06/26	mar 30/06/26	$323.020.961
29	PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y RIEGO DE TIERRA FÉRTIL DE 10CM DE ESPESOR E INSTALACIÓN Y SIEMBRA DE PASTO Y SALADO Y NIVELACIÓN. SUMINISTRO Y PLANTACION	2 días	vie 24/07/26	mar 28/07/26	$6.053.221
30	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X40X6 CM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE 4CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO).	4 días	sáb 11/07/26	jue 16/07/26	$59.383.544
31	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM MORTERO 2000 Y ARENA DE SELLO)	5 días	sáb 11/07/26	vie 17/07/26	$163.422.561
32	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN. INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUBBASE GRANULAR CLASE B, ACERO DE REFUERZO Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.	4 días	vie 17/07/26	mié 22/07/26	$127.448.467
33	CONSTRUCCION DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO INCLUYE	5 días	mar 23/06/26	lun 29/06/26	$156.041.111
34	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	5 días	sáb 11/07/26	vie 17/07/26	$187.894.264
35	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO)	3 días	mié 22/07/26	lun 27/07/26	$10.683.666
36	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	10 días	mar 23/06/26	sáb 4/07/26	$39.431.690
37	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HASTA 0.10 M. INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES.	2 días	mié 17/06/26	vie 19/06/26	$10.788.101
38	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES	2 días	lun 15/06/26	mié 17/06/26	$1.829.664
39	CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBEADO Y FUNDIDO EN SITIO E= 0,10 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	4 días	sáb 11/07/26	jue 16/07/26	$17.828.351
40	**REDES DE ACUEDUCTO**	**15 días**	**mié 6/05/26**	**sáb 23/05/26**	**$217.435.461**
41	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALAC	1 día	sáb 9/05/26	lun 11/05/26	$9.469.770
42	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACI	3 días	mié 6/05/26	sáb 9/05/26	$84.778.520
43	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	vie 22/05/26	sáb 23/05/26	$47.456.912
44	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACI	3 días	mar 19/05/26	vie 22/05/26	$31.065.540
45	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	1 día	lun 11/05/26	mar 12/05/26	$7.261.929
46	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	mar 12/05/26	mié 13/05/26	$37.402.790
47	**REDES ALCANTARILLADO SANITARIO**	**49 días**	**vie 23/01/26**	**lun 23/03/26**	**$1.175.668.170**
48	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTA	1 día	jue 19/03/26	vie 20/03/26	$1.141.659
49	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	1 día	mié 18/03/26	jue 19/03/26	$26.362.710
50	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	3 días	mié 28/01/26	sáb 31/01/26	$278.043.958
51	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTA	1 día	mar 24/02/26	mié 25/02/26	$3.492.045
52	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	2 días	jue 5/02/26	lun 9/02/26	$60.037.673
53	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	4 días	vie 23/01/26	mié 28/01/26	$554.704.000
54	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1,2M, H=0.25M, E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC. ARO DE AJUSTE)	2 días	sáb 14/03/26	mar 17/03/26	$20.686.140
55	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	vie 20/03/26	lun 23/03/26	$55.734.840
56	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	1 día	lun 2/03/26	mar 3/03/26	$2.613.463
57	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	2 días	mar 3/03/26	jue 5/03/26	$172.851.682
58	**REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**17 días**	**jue 16/04/26**	**mié 6/05/26**	**$388.408.817**
59	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	2 días	vie 1/05/26	lun 4/05/26	$10.204.920
60	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁLICOS Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	3 días	lun 20/04/26	jue 23/04/26	$153.555.908
61	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE RIO (RELACIÓN 1:1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN).	2 días	jue 23/04/26	sáb 25/04/26	$43.268.167
62	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 3.5M (INCLUYE CARGUE)	3 días	jue 16/04/26	lun 20/04/26	$6.859.360
63	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1,2M, H=0.25M, E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC. ARO DE AJUSTE)	2 días	mié 29/04/26	vie 1/05/26	$14.480.298
64	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	2 días	lun 4/05/26	mié 6/05/26	$39.014.388
65	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	1 día	mar 28/04/26	mié 29/04/26	$5.837.337
66	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	2 días	sáb 25/04/26	mar 28/04/26	$115.188.439
67	**REDES SECAS**	**30 días**	**mié 3/06/26**	**mié 8/07/26**	**$157.041.255**
68	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	2 días	vie 19/06/26	lun 22/06/26	$21.291.255
69	INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA (RED MATRIZ) (GLOBAL)	30 días	mié 3/06/26	mié 8/07/26	$135.750.000
70	**NO PREVISTOS - PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES**	**55 días**	**mié 3/06/26**	**jue 6/08/26**	**$2.524.827.940**
71	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14 (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	2 días	vie 3/07/26	lun 6/07/26	$18.472.608
72	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	3 días	jue 11/06/26	lun 15/06/26	$288.920.490
73	BASE GRANULAR BG-A ESTABILIZADA CON CEMENTO AL 5% (INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN)	3 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26	$242.992.964
74	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TIRA ANCHA SENTIDO LONGITUDINAL: ENTRE 40 KN/M Y 43 KN/M. PARA ESTABILIZACION SUBRASANTE/CAPAS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	2 días	mié 3/06/26	jue 4/06/26	$138.191.802
75	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCO2rS-A CON CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA)	2 días	lun 29/06/26	mié 1/07/26	$73.738.663

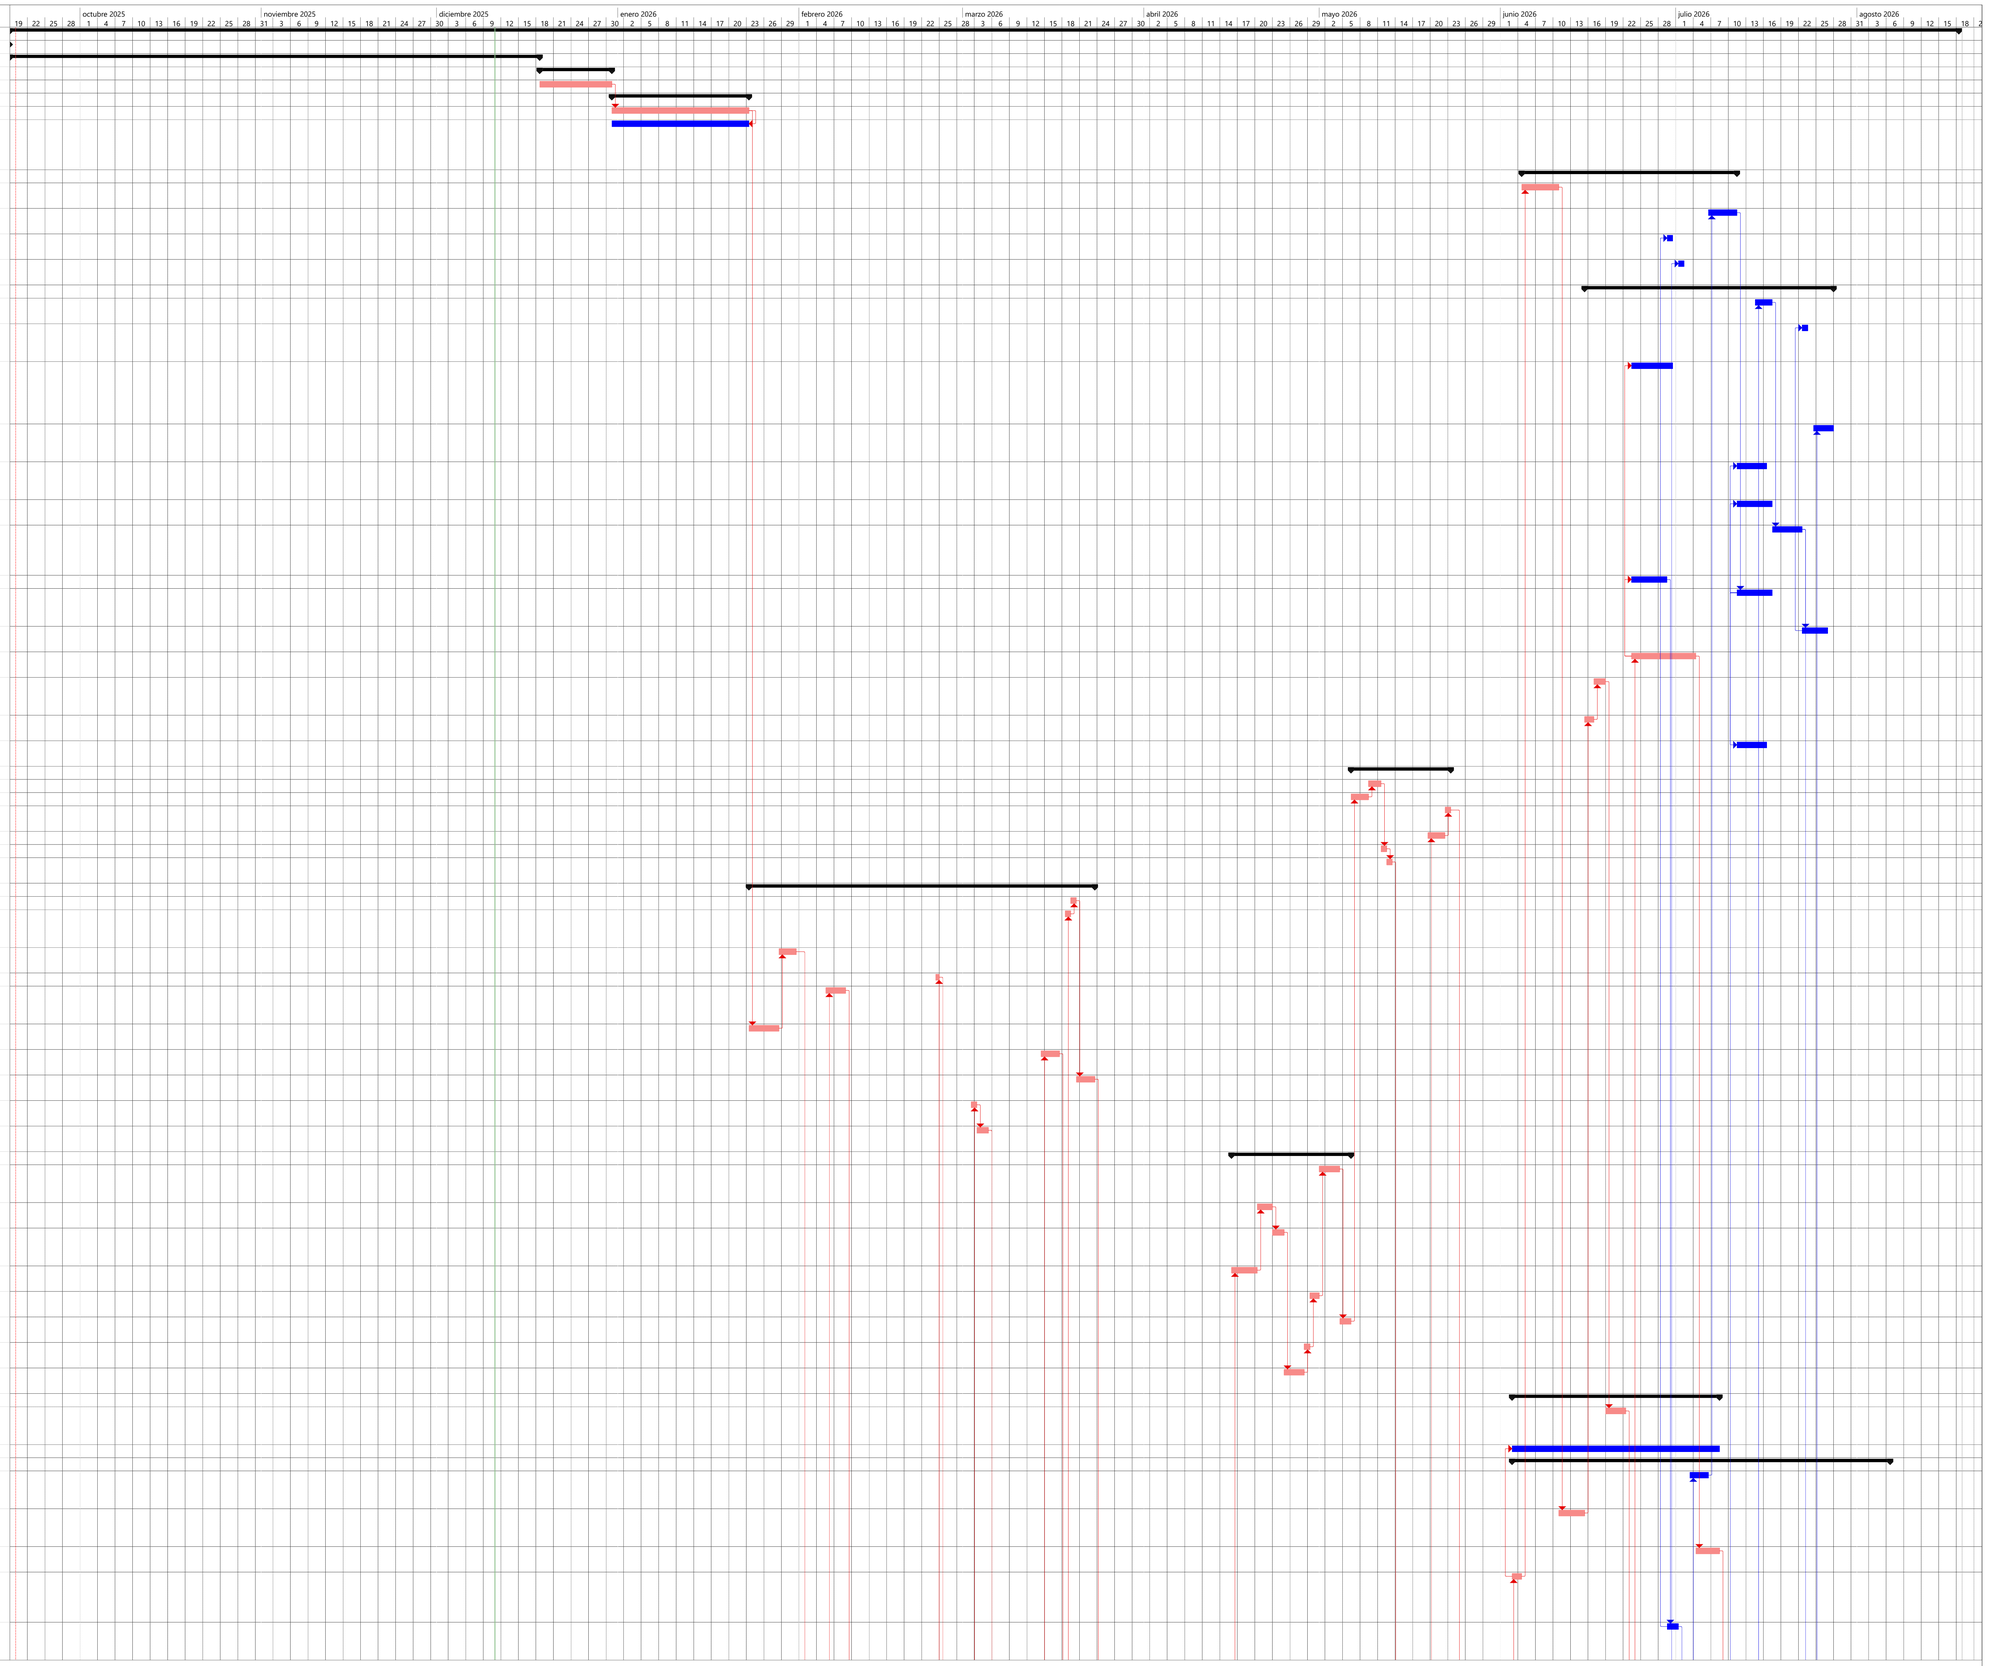

Proyecto: Contrato de obra No.776-2025
Fecha de inicio: 19/09/2025
Fecha de terminación: 18/08/2026

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Tarea resumida · Hito resumido · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Tarea crítica · División crítica
División · Resumen · Agrupar por síntesis · Tarea crítica resumida · Progreso resumido · Hito externo · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Fecha límite · Tareas críticas · Progreso


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
76	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN, CURADO, JUNTAS Y ACABADO. INCLUYE CANASTILLA PASA JUNTA.	20 días	vie 10/07/26	mar 4/08/26	$1.343.723.955
77	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/2" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	3 días	vie 10/07/26	mar 14/07/26	$68.246.994
78	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	2 días	mié 8/07/26	vie 10/07/26	$145.118.153
79	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO 80-100. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN MANUAL Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE, FACTOR DE COMPACTACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL A 21 KMS	2 días	mié 1/07/26	vie 3/07/26	$40.558.610
80	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	1 día	lun 22/06/26	mar 23/06/26	$6.127.306
81	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 KG/CM2) GRAVA COMÚN ACELERADO A 7 DÍAS, ESTAMPADO PARA POMPEYANOS Y VIAS A DESNIVEL, COLOR OCRE (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, CORTE Y SELLADO DE JUNT	3 días	mar 4/08/26	jue 6/08/26	$55.761.480
82	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706. ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL A	3 días	vie 10/07/26	mar 14/07/26	$102.974.915
83	**NO PREVISTOS - URBANISMO Y ESPACIO PUBLICO**	**11 días**	**sáb 11/07/26**	**vie 24/07/26**	**$11.249.899**
84	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCHO ENTRE 12-20CM	2 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26	$4.732.839
85	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO)	2 días	mié 22/07/26	vie 24/07/26	$5.097.077
86	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM2) PREMEZCLADO E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO)	3 días	sáb 11/07/26	mié 15/07/26	$1.419.983
87	**NO PREVISTOS - REDES DE ACUEDUCTO**	**17 días**	**mié 13/05/26**	**mar 2/06/26**	**$217.233.968**
88	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	2 días	mié 13/05/26	vie 15/05/26	$20.076.345
89	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT. INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR).	2 días	lun 25/05/26	mar 26/05/26	$46.355.856
90	RELOCALIZACIÓN DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (INCLUYE 1.0M TUBERÍA GALVANIZADA D= 1/2", SOLDADURA, CINTA DE TEFLON, Y CAJILLA PLASTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL, DE MEDIDAS 34CM X50.5CM X 3.5CM DE ALTO, Y CAJILLA D	2 días	mar 26/05/26	jue 28/05/26	$23.168.523
91	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	2 días	lun 1/06/26	mar 2/06/26	$19.761.936
92	REPARACIÓN DE ACOMETIDA HIDRÁULICA DE LA CAJILLA HACIA EL PREDIO (INCLUYE EL RETIRO DE LA TUBERÍA EXISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NUEVA).	2 días	jue 28/05/26	lun 1/06/26	$1.409.100
93	TEE PVC U.M. 8" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	vie 15/05/26	sáb 16/05/26	$85.929.532
94	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	1 día	sáb 16/05/26	lun 18/05/26	$1.322.436
95	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS)	1 día	lun 18/05/26	mar 19/05/26	$19.210.240
96	**NO PREVISTOS - REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL**	**62 días**	**lun 2/02/26**	**jue 16/04/26**	**$630.770.343**
97	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTOBOMBA CON COMBUSTIBLE Y OPERADOR)	2 días	mar 3/02/26	jue 5/02/26	$8.869.380
98	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	mié 25/02/26	sáb 28/02/26	$46.960.368
99	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	lun 9/02/26	mié 11/02/26	$61.176.993
100	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	mié 11/02/26	lun 16/02/26	$21.624.805
101	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	3 días	lun 16/02/26	jue 19/02/26	$119.749.725
102	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 160 PVC. SUMINISTRO E INSTA	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	$18.504.024
103	CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	2 días	vie 20/02/26	mar 24/02/26	$7.854.028
104	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN. FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	2 días	jue 5/03/26	sáb 7/03/26	$878.341
105	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCL. SUMIN, INST.)	2 días	sáb 7/03/26	mar 10/03/26	$55.260.730
106	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1M, E=0.10M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INC. AÑO DE A BISTE)	2 días	mar 10/03/26	jue 12/03/26	$101.258.220
107	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	2 días	jue 12/03/26	sáb 14/03/26	$10.687.488
108	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, H=0.15M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN)	2 días	lun 23/03/26	mié 25/03/26	$1.105.880
109	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	8 días	vie 27/03/26	mar 7/04/26	$48.396.712
110	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 600 N Y 700 N. PARA SUBDRENES/FILTROS. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	1 día	mar 17/03/26	mié 18/03/26	$965.843
111	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB Y CARGUE).	2 días	lun 2/02/26	mar 3/02/26	$16.950.744
112	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	2 días	mié 25/03/26	vie 27/03/26	$5.085.775
113	CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y triturado de 3/4") (Suministro y Colocación)	1 día	sáb 28/02/26	lun 2/03/26	$317.431
114	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE SOBRETAPA Y TAPA)	4 días	vie 10/04/26	jue 16/04/26	$96.486.712
115	BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE UNIÓN PROPORCIONAL CADA 6MT, INCLUYE SOPORTE Y DOS TORNILLOS INOXIDABLES PROPORCIONALES CADA 3MT, SOLDADURA Y CITA TEFLON).	2 días	mié 8/04/26	vie 10/04/26	$3.306.000
116	TUBERIA PVC SANITARIA D=3`` TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	2 días	mar 7/04/26	mié 8/04/26	$5.331.144
117	**NO PREVISTOS - SEÑALIZACION**	**12 días**	**mar 4/08/26**	**mar 18/08/26**	**$200.669.453**
118	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	mié 5/08/26	jue 6/08/26	$3.290.084
119	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D= 60CM). INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	1 día	jue 6/08/26	jue 6/08/26	$3.626.970
120	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLAQUETA (ALTO MÍNIMO DE 23 CM) EN REFLECTIVO DE ALTA INTENSIDAD TIPO VI, O SUPERIOR Y LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16. INCLUYE PEDESTAL EN ÁNGULO Y DADO DE CIMENTACIÓN. (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORT	1 día	vie 7/08/26	vie 7/08/26	$1.276.166
121	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ANGULO SP/SR/SI. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	vie 7/08/26	lun 10/08/26	$4.031.482
122	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	1 día	lun 10/08/26	mar 11/08/26	$505.368
123	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09CM X 82.50CM REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, PEDESTAL EN ÁNGULO DE 2"X2"X1/4" H= 2.60M EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	mar 11/08/26	mié 12/08/26	$5.759.664
124	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SP/SR CON LÁMINA RETRORREFLECTIVA PARA CICLORUTA DE 0.45 M X 0.45 M, INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	1 día	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$5.473.260
125	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45CMX45CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	1 día	jue 13/08/26	vie 14/08/26	$1.352.000
126	SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO SR CON LÁMINA REFLECTIVA PARA CICLORUTA D=0.45M. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	vie 14/08/26	sáb 15/08/26	$1.528.860
127	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) CON PLAQUETA. INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	1 día	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	$20.063.045
128	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION.	1 día	lun 17/08/26	mar 18/08/26	$16.391.520
129	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	lun 17/08/26	mar 18/08/26	$7.404.354
130	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	1 día	lun 17/08/26	mar 18/08/26	$5.033.406

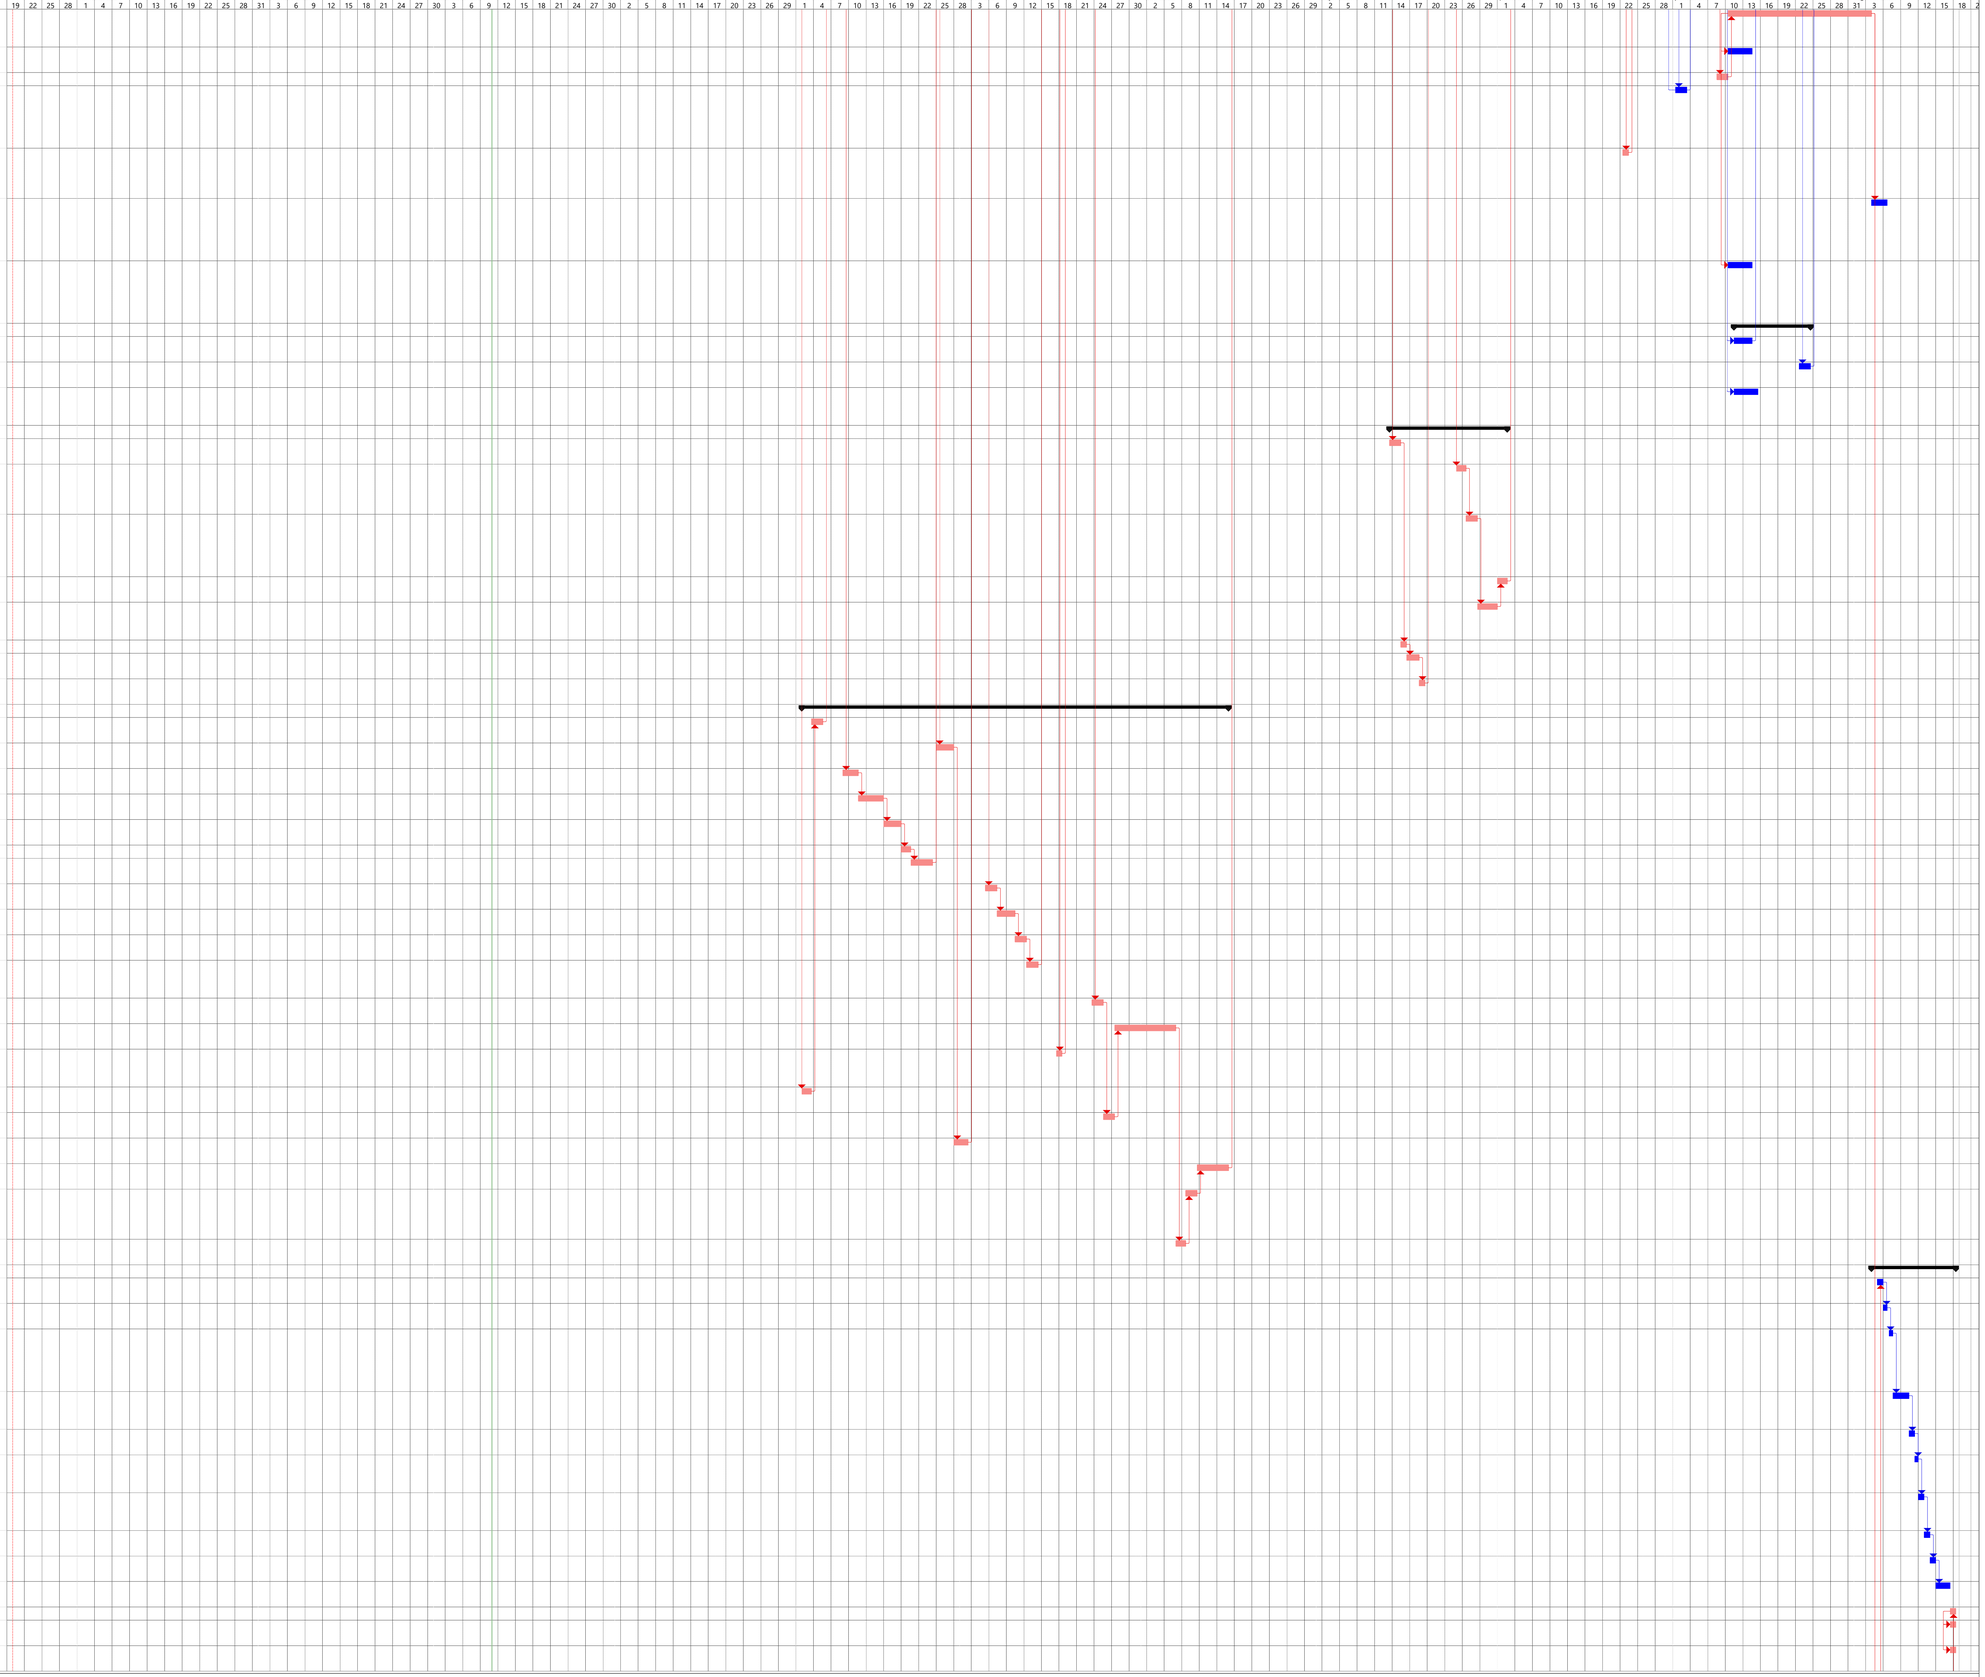

Proyecto: Contrato de obra No.776-2025
Fecha de inicio: 19/09/2025
Fecha de terminación: 18/08/2026

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Agrupar por síntesis · Tarea resumida · Tarea crítica resumida · Hito resumido · Progreso resumido · Tareas externas · Hito externo · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Fecha límite · Tarea crítica · Tareas críticas · División crítica · Progreso

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
131	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLI	1 día	mar 4/08/26	mié 5/08/26	$7.765.239
132	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	mié 5/08/26	jue 6/08/26	$7.999.513
133	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A=12CM PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	1 día	jue 6/08/26	jue 6/08/26	$33.283.844
134	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (CEBRAS, FLECHAS, PICTOGRAMAS, LINEAS DE PARE, SENDEROS PEATONALES, ACHURADOS, ETC).	1 día	vie 7/08/26	vie 7/08/26	$30.058.255
135	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INC MICROESFERAS)	1 día	vie 7/08/26	lun 10/08/26	$6.754.003
136	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1 día	lun 10/08/26	mar 11/08/26	$7.751.220
137	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS((A= 1.434M2). INCLUYE PICTOGRAMA.	1 día	mar 11/08/26	mié 12/08/26	$2.196.200
138	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS. AREA =2MT2).	1 día	mié 12/08/26	jue 13/08/26	$8.270.208
139	DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= 2.3MM EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS..	1 día	jue 13/08/26	vie 14/08/26	$13.141.128
140	DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L= 1.20MT E= 2.3MM EN PINTURA TERMOPLÁSTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS..	1 día	vie 14/08/26	sáb 15/08/26	$6.570.564
141	PINTURA ACRILICA DE TRAFICO COLOR BLANCA PARA CUADROS CRUCE CICLORRUTA DE 0.4MT X 0.4MT. SUMINISTRO Y APLICACION	1 día	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	$1.143.100

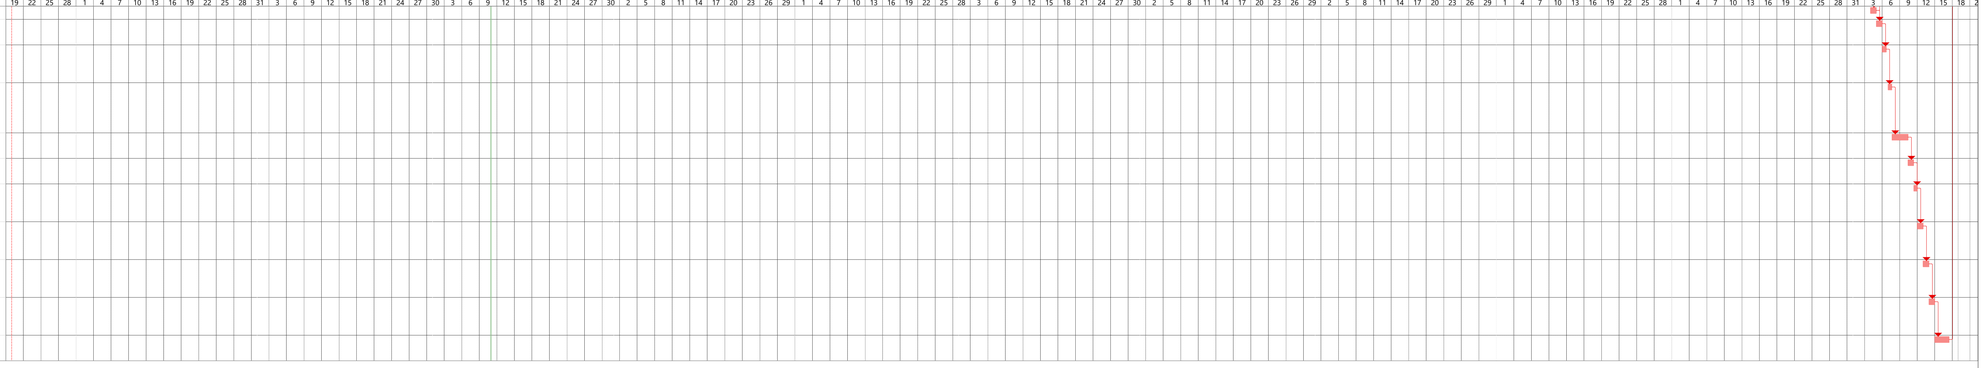

Proyecto: Contrato de obra No.776-2025
Fecha de inicio: 19/09/2025
Fecha de terminación: 18/08/2026

Tarea, División, Hito, Resumen, Resumen del proyecto, Agrupar por síntesis, Tarea resumida, Tarea crítica resumida, Hito resumido, Progreso resumido, Tareas externas, Hito externo, Tarea inactiva, Hito inactivo, Resumen inactivo, Tarea manual, solo duración, Informe de resumen manual, Resumen manual, solo el comienzo, solo fin, Fecha límite, Tarea crítica, Tareas críticas, División crítica, Progreso
