N° 01

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	**1010-12-004-502-2025**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA**
PROCESO N°	**SAMC-006-2025**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MIRANDA**
ALCALDE MUNICIPAL	**WALTER ZÚÑIGA BARONA**
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 expedida en MIRANDA CAUCA
CONTRATISTA	**MINA INGENIERA S.A.S. ZOMAC**
IDENTIFICACIÓN NIT. N°	**901509369-7**
REPRESENTANTE LEGAL	HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA
IDENTIFICACIÓN C.C N°	1.114.893.541 Expedida De Florida Valle
DIRECCIÓN	Calle 6 N° 9b -15 Miranda Cauca
TELÉFONO	3166953847
CORREO ELECTRÓNICO	ingenieriamina23@gmail.com
OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
VALOR	**CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($163.147.764) M/CTE**
VALOR ADICIONAL N°01:	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($74.948.874)
VALOR TOTAL	**DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($238.096.638).**
PLAZO	DOS (2) MESES
CDP N°	1233 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025
COMPROMISO PRESUPUESTAL N°	2068 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICIONAL N°01:	1856 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025
C.P ADICIONAL N°01:	2433 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	41-44-101298723
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	41-40-101057906

En el Municipio de Miranda (Cauca), se reunieron: la ingeniera **VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA** Secretaria de Infraestructura, en calidad de supervisora, y la empresa CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y TECNOLOGÍA (CONSTRUCTENO) S.A.S representado legalmente por el señor **LUIS MIGUEL GRANJA BERMÚDEZ** en calidad de contratista de obra, con el fin de firmar el **ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01,** previa presentación de los siguientes documentos:

Por parte del supervisor:

- Informe de supervisión y seguimiento contractual Nº 01.
- Actas de reunión.
- Oficios.

Por parte del contratista:

- Acta de cobro Parcial N°1
- Memoria de cantidades acta de cobro Parcial N° 1.
- Factura electrónica de venta Nacional N° MM254
- Informe de avance de obra Nº1– Periodo de ejecución del 31 de octubre al 26 de diciembre de 2025.
- Bitácora de obra
- Certificado acreditación pago seguridad social del mes de noviembre- diciembre de 2025.
- Certificación Bancaria.
- Constancia de paz y salvo de trabajadores.

Después de verificar el objeto contractual y el avance de cumplimiento se realizó el siguiente balance:

BALANCE DEL CONTRATO

Valor del Contrato	**$163.147.764**	
Valor Adicional	$74.948.874	
Valor a Pagar Presente Acta		$ 97.226.333
Saldo por ejecutar		$140.870.305
Sumas Iguales	**$238.096.638**	**$238.096.638**

VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($97.226.333).

Para constancia de lo anterior, se firma a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
Secretaria de infraestructura
Supervisora

HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA
Rep.Legal **MINA INGENIERA S.A.S. ZOMAC**
Contratista

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró-Proyectó-Revisó: Victoria Andrea Pizarro Pedroza - secretaria de Infraestructura
Revisión Jurídica: Oficina Asesora Jurídica y Contratación
Original: Carpeta Contrato N°**1010-12-004-502-2025**

CONTRATO OBRA PÚBLICA N°	**1010-12-004-502-2025**
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
CONTRATISTA:	**MINA INGENIERA S.A.S. ZOMAC**
IDENTIFICACIÓN NIT:	**901509369-7**
REPRESENTANTE LEGAL:	**HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA**
IDENTIFICACIÓN N°	1.114.893.541 Expedida De Florida Valle
SUPERVISOR:	**VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA**
FECHA SUSCRIPCIÓN:	21 de octubre de 2025
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO:	31 de octubre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	41-44-101298723
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	41-40-101057906
PERIODO DE SEGUIMIENTO ACTUAL:	Del treinta y uno (31) de octubre de 2025 al veintiséis (26) de diciembre de 2025

En mi calidad de supervisora del Contrato de Obra Pública N°**1010-12-004-502-2025**, me permito a continuación presentar informe parcial de supervisión a la ejecución contractual durante el periodo comprendido entre el treinta y uno (31) de octubre de 2025 al veintiséis (26) de diciembre de 2025. Teniendo en cuenta el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011:

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO.

Las actividades ejecutadas por el contratista durante el periodo que es objeto de supervisión cumplieron con lo requerido técnicamente conforme a lo solicitado por la supervisión y en cumplimiento de las disposiciones normativas correspondientes.

1.1. Cumplimiento de obligaciones contractuales:

El contratista en cumplimiento del contrato, durante el periodo que es objeto de cobro desarrolló las actividades de conformidad con lo pactado contractualmente, lo cual se soporta adicionalmente en el informe de actividades del contratista, cumpliendo con lo siguiente:

OBLIGACIONES GENERALES	SOPORTES
a) Cumplir con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas.	El contratista cumplió con las condiciones, calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas.

b) El contratista se obliga a estar bajo la inspección del supervisor del contrato, quien velará por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas.	Estuvo bajo la inspección del supervisor del contrato.
c) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato	Programó las actividades desarrollando el contrato dentro del plazo establecido
d) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)	Se abstuvo de adelantar intervenciones sin autorizaciones pertinentes.
e) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo de la ejecución que se le impartan por parte del Municipio de MIRANDA, a través del supervisor.	Acató las instrucciones y recomendaciones durante la ejecución del contrato.
f) Atender las observaciones del supervisor en el menor tiempo posible.	Atendió las observaciones realizadas por parte de la supervisión.
g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.	Obró con lealtad en las distintas etapas contractuales.
h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.	No accedió a peticiones o amenazas.
i) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.	Hasta el momento no han ocurridos hechos que cause perjuicios a la administración o a terceros.
j) Cumplir con las afiliaciones y aportes a Seguridad Social.	Cumplió como se evidencias en las planillas de pago.

k) Informar al municipio por intermedio de la supervisión del contrato. De cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del contrato	Informó de manera inmediata la situación presentada durante la ejecución del contrato, como resultado de lo cual se suscribió el día 16 de diciembre de 2025 el Acta de Adición en Valor N°01."
l) Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia	Sufragó los gastos necesarios para la legalización y ejecución del contrato.
m) Presentar informes, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor y adicionalmente deberán contener: 1. Avance de cada una de las actividades programadas. 2. Registros fotográficos. 3. Fotocopia de la bitácora. 4. Resumen de las actividades realizadas. 5. Relación del personal empleado en la ejecución de las obras. 6. Actualización del programa de ejecución del contrato. 7. Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 mediante la cual se señale que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar cuando corresponda.	Presentó Informe Acta Parcial N°01 con fecha del 26 de diciembre de 2025 con sus respectivos anexos.
n) Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del contrato	Tramitó de manera oportunas todas las actas para el desarrollo del contrato.
o) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor, las actas de entrega de obra, de	Elaboró conjunto con el supervisor el acta de cantidades N°01 para el presente pago.

entrega final de obra y de liquidación	
p) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad	Cumplió

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	SOPORTES
A. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
a) Entregar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el estudio previo cumpliendo con el cronograma establecido y aprobado por el supervisor.	Hasta la fecha la obra tiene un avance de ejecución del 40.8% y ha cumplido con las especificaciones técnicas previstas en el estudio previo.
b) Cumplir el objeto del contrato, ejecutado y entregado la obra contratada y de acuerdo con los criterios de calidad exigible, los anexos respectivos, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.	Hasta la fecha la obra tiene un avance de ejecución del 40.8% y ha cumplido con el objeto contractual, ejecutando y entregando la obra de acuerdo a los criterios y dentro del plazo establecido.
c) Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el supervisor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que se consideren necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de la obra.	El contratista acató las sugerencias y recomendaciones dadas por parte de la supervisión
d) Garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la obra prevista en la invitación y demás documentos del proceso.	Cumplió
e) El Contratista deberá garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato.	Cumplió
f) Realizar el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance de esta, en medio físico y magnético.	Realizó el debido registro fotográfico de las actividades de obra ejecutadas como se evidencia en el informe de obra.
B. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	
a). Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Cumplió

de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, y en todo caso siempre mantener indemne a la entidad estatal contratante.	
b). Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la obra.	El contratista cumplió con los pagos frente a Sistema de Seguridad Social Integral como se evidencia en la planilla.
c). Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: 1. El uso de los Equipo de Protección Individual, el cual está conformado por casco, lentes de seguridad, uniforme de trabajo, guantes y calzado con punta de acero. 2. Las áreas de trabajo deben estar ordenadas y limpias. 3. Deberá haber un adecuado manejo de los residuos de construcción. 4. Las herramientas y equipos portátiles que se usen deben ser de marcas certificadas. 5. Tener mayor cuidado cuando se realice trabajos en espacios reducidos y trabajo en alturas superior a 2 mts para lo cual el personal deberá contar con el curso de trabajo en alturas debidamente actualizado de acuerdo a la normatividad vigente (Se considera trabajo en alturas a toda actividad que sobrepase los 2 metros de altura) 6. La obra debe contar con un área destinada para bodegaje. 7. Los materiales comunes deben estar separados de los materiales peligrosos. 8. Todos los productos químicos deben contar con hoja de seguridad.	Cumplió

9. Cualquier trabajo que se realice por un trabajador sobre 2 metros de altura debe contar con un sistema de detección de caídas. 10. Solo se pueden usar andamios que cumplan con las condiciones de seguridad. 11. Cualquier trabajo que implique el movimiento de carga solo debe ser hecho por personal entrenado y autorizado. 12. Cuando se realicen trabajos de excavaciones con equipos pesados, se deberá contar con especialistas, equipo de protección, señalizaciones, cercos y documentación necesaria. 13 Los trabajos de demolición deben contar con pautas técnicas.	
C. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
1. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.	Ejecutó la obra con todos los equipos, herramientas y materiales necesarios para la ejecución del contrato.
2. Garantizar la buena calidad de los elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	Cumplió
3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.	Retiró los materiales sobrantes dejando las áreas intervenidas en perfecto estado y limpias.

Todo lo anterior, conforme a informe de actividades del contratista, que hace parte integral del contrato y reposa en el expediente contractual.

2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

- ✓ Hasta la fecha se ha realizado la siguiente actuación administrativa; Que a los dieciseises (16) días del mes de diciembre de 2025 se suscribió el Acta de Adición N°01 por valor de SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($74.948.874).
- ✓ Durante el periodo de seguimiento, si se materializaron riesgos de acuerdo a la matriz de riesgos estipulada en el estudio previo **Riesgo No.16 Variación de cantidades**. Igualmente se resalta que el contrato se encuentra amparado por la Póliza de Cumplimiento N.º 41-44-

101298723 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual N°. 41-40-101057906 las cuales se encuentran debidamente aprobada en la plataforma SECOP II el día treinta (30) de octubre de 2025.

- ✓ De conformidad con las obligaciones del contrato y el informe entregado por el contratista se establece que el cumplimiento ha sido conforme con las especificaciones estipuladas en el contrato.

- ✓ Al realizar una evaluación al contratista en razón del cumplimiento de las obligaciones, ha tenido buena conducta, ha cumplido con las directrices en el manejo de documentos y expedientes, ha cumplido con los tiempos de ejecución y ha cumplido con los procedimientos y protocolos implementados en la administración municipal.

- ✓ Hasta el momento el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control, ni por la oficina de control interno del municipio.

2.1. Aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, en el Decreto 1273 de 2018 y demás normas concordantes y vigentes en materia de seguridad social, el contratista presenta la planilla de seguridad social, las cuales se relacionan:

PLANILLA N°	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN
9494745603	Diciembre 2025	Noviembre 2025

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE.

En cumplimiento en lo dispuesto en la cláusula octava– forma de pago estipulada en el contrato, se realiza la siguiente relación financiera:

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
1	PABELLON DE CARNES				$ 106,423,835		$ 83,447,827		$ 32,549,138		$ 50,898,689
1.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	114.1	$ 21,809	$ 2,487,535	115.41	$ 2,516,977	115.41	$ 2,516,977	0.00	$ 0
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	56.12	$ 47,388	$ 2,659,415	25.82	$ 1,223,558	25.82	$ 1,223,558	0.00	$ 0
1.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	562.6	$ 4,123	$ 2,319,435	462.58	$ 1,907,217	462.58	$ 1,907,217	0.00	$ 0
1.4	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	375	$ 11,652	$ 4,369,966	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.5	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]	M2	187.5	$ 25,591	$ 4,798,824	31.52	$ 806,628	31.52	$ 806,628	0.00	$ 0
1.6	ESMALTE REJAS- VENTANAS	M2	10.21	$ 26,699	$ 272,597	53.32	$ 1,423,591	53.32	$ 1,423,591	0.00	$ 0
1.7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	31.71	$ 15,029	$ 476,570	12.02	$ 180,649	12.02	$ 180,649	0.00	$ 0
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA CABLE COBRE THW #1/0	ML	7	$ 97,217	$ 680,519	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE 24 MEDIDORES	UND	1	$ 7,035,262	$ 7,035,262	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.10	SALIDA TOMA TUBERIA EMT 3/4"	PTO	24	$ 160,511	$ 3,852,264	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE BREAKERS	UND	12	$ 144,890	$ 1,738,680	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8	ML	674	$ 8,616	$ 5,807,184	260.40	$ 2,243,606		$ 0	260.40	$ 2,243,606
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10	ML	210	$ 6,516	$ 1,368,360	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA (20X0.5X3MTS)	UND	30	$ 150,768	$ 4,523,040	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.15	DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE	M2	380.2	$ 8,958	$ 3,405,921	381.95	$ 3,421,508	381.95	$ 3,421,508	0.00	$ 0
1.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	50.02	$ 69,427	$ 3,472,739	114.59	$ 7,955,640	114.59	$ 7,955,640	0.00	$ 0
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO	M2	380.2	$ 127,386	$ 48,433,431	381.95	$ 48,655,083		$ 0	381.95	$ 48,655,083

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
	SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS.										
1.18	LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)	M2	39	$ 13,150	$ 512,850	26	$ 341,900	26.00	$ 341,900	0.00	$ 0
1.19	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML	5	$ 72,207	$ 361,035	8.00	$ 577,656	8.00	$ 577,656	0.00	$ 0
1.20	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	12	$ 37,758	$ 453,096	32.07	$ 1,210,899	32.07	$ 1,210,899	0.00	$ 0
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80)	UND	2	$ 344,912	$ 689,824	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE	PTO	8	$ 129,465	$ 1,035,720	8	$ 1,035,720	8.00	$ 1,035,720	0.00	$ 0
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"	ML	60	$ 32,104	$ 1,926,240	47.22	$ 1,515,951	47.22	$ 1,515,951	0.00	$ 0
1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UND	1	$ 331,578	$ 331,578	1	$ 331,578	1.00	$ 331,578	0.00	$ 0
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UND	2	$ 597,254	$ 1,194,508	2	$ 1,194,508	2.00	$ 1,194,508	0.00	$ 0
1.26	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM	M3	69.03	$ 32,120	$ 2,217,244	214.98	$ 6,905,158	214.98	$ 6,905,158	0.00	$ 0
2	**PABELLON 2**				**$ 5,777,649**		**$ 3,746,958**		**$ 3,310,948**		**$ 436,010**
2.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	96.5	$ 21,809	$ 2,104,569	96.5	$ 2,104,569	96.50	$ 2,104,569	0.00	$ 0
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	56.12	$ 47,388.00	$ 2,659,415	22.41	$ 1,061,965	22.41	$ 1,061,965	0.00	$ 0
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2.00	$ 218,005.00	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
2.4	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML	8	$ 72,207.00	$ 577,656	2	$ 144,414	2.00	$ 144,414	0.00	$ 0
3	**PABELLON 3**				**$ 8,212,701**		**$ 6,828,025**		**$ 6,321,972**		**$ 506,053**
3.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	96.28	$ 21,809	$ 2,099,771	96.28	$ 2,099,771	96.28	$ 2,099,771	0.00	$ 0
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	33.67	$ 47,388.00	$ 1,595,554	4.45	$ 210,877	4.45	$ 210,877	0.00	$ 0

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UND	2	$ 331,578.00	$ 663,156	2	$ 663,156	2.00	$ 663,156	0.00	$ 0
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UND	2	$ 597,254.00	$ 1,194,508	2	$ 1,194,508	2.00	$ 1,194,508	0.00	$ 0
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UND	5	$ 430,732.00	$ 2,153,660	5	$ 2,153,660	5.00	$ 2,153,660	0.00	$ 0
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2	$ 218,005.00	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W	UND	1	$ 70,043.00	$ 70,043	1	$ 70,043		$ 0	1.00	$ 70,043
4	**PABELLON 4**				**$ 436,010**		**$ 436,010**		**$ 0**		**$ 436,010**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2	$ 218,005	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
5	**ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)**				**$ 0**		**$ 81,909,060**		**$ 29,837,449**		**$ 52,071,612**
5.1	DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO	UND		$ 60,842.00	$ 0	63.53	$ 3,865,292	63.53	$ 3,865,292	0.00	$ 0
5.2	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO	M2		$ 12,883	$ 0	10.55	$ 135,916	10.55	$ 135,916	0.00	$ 0
5.3	DEMOLICIÓN REPELLO MURO	M2		$ 9,360	$ 0	46.31	$ 433,462	46.31	$ 433,462	0.00	$ 0
5.4	REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 50,817	$ 0	46.31	$ 2,353,335	46.31	$ 2,353,335	0.00	$ 0
5.5	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2		$ 15,567	$ 0	452.26	$ 7,040,331	211.06	$ 3,285,571	241.20	$ 3,754,760
5.6	ACRILICA MURO [3M]	M2		$ 15,540	$ 0	573.50	$ 8,912,190	332.30	$ 5,163,942	241.20	$ 3,748,248
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO CEMENTO # 6	UND		$ 115,455	$ 0	7.00	$ 808,185	7.00	$ 808,185	0.00	$ 0
5.8	CORTE DE TUBO EN ACERO 2"	ML		$ 13,587	$ 0	66.00	$ 896,742	66.00	$ 896,742	0.00	$ 0
5.9	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 1,684,652	$ 0	0.32	$ 539,089		$ 0	0.32	$ 539,089
5.10	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3		$ 1,399,049	$ 0	0.45	$ 629,572		$ 0	0.45	$ 629,572
5.11	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.	KLS		$ 7,832	$ 0	172.95	$ 1,354,544		$ 0	172.95	$ 1,354,544
5.12	MURO LADRILLO COMUN	M2		$ 104,714	$ 0	116.43	$ 12,191,851		$ 0	116.43	$ 12,191,851
5.13	REPELLO MURO 1:3	M2		$ 32,225	$ 0	241.20	$ 7,772,670		$ 0	241.20	$ 7,772,670
5.14	REPELLO MURO 1:3	ML		$ 22,010	$ 0	143.46	$ 3,157,555	21.21	$ 466,832	122.25	$ 2,690,723

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
5.15	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO)	ML		$ 7,699	$ 0	265.68	$ 2,045,470	143.40	$ 1,104,037	122.28	$ 941,434
5.16	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO		$ 51,322	$ 0	22.00	$ 1,129,084	22.00	$ 1,129,084	0.00	$ 0
5.17	PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2"	PTO		$ 48,691	$ 0	22.00	$ 1,071,202	22.00	$ 1,071,202	0.00	$ 0
5.18	TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 10,930	$ 0	85.75	$ 937,248	85.75	$ 937,248	0.00	$ 0
5.19	TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 32,439	$ 0	67.02	$ 2,174,062	67.00	$ 2,173,413	0.02	$ 649
5.20	CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)	UND		$ 573,591	$ 0	4.00	$ 2,294,364	4.00	$ 2,294,364	0.00	$ 0
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLLO,BANDEROLA,RIEL,ANTI CORROSIVO Y ESMALTE (2.32*3M)	UND		$ 3,000,000	$ 0	1.00	$ 3,000,000		$ 0	1.00	$ 3,000,000
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLLO,BANDEROLA,RIEL,ANTI CORROSIVO Y ESMALTE (1.52*3M)	UND		$ 2,000,000	$ 0	2.00	$ 4,000,000		$ 0	2.00	$ 4,000,000
5.23	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)	M2		$ 21,314	$ 0	120.60	$ 2,570,468	120.60	$ 2,570,468	0.00	$ 0
5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND		$ 218,005	$ 0	4.00	$ 872,020		$ 0	4.00	$ 872,020
5.25	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND		$ 286,746	$ 0	22.00	$ 6,308,412		$ 0	22.00	$ 6,308,412
5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT	ML		$ 31,687	$ 0	91.60	$ 2,902,529		$ 0	91.60	$ 2,902,529
5.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS	UND		$ 855,706	$ 0	1.00	$ 855,706		$ 0	1.00	$ 855,706

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"	ML		$ 73,969	$ 0	3.14	$ 232,263		$ 0	3.14	$ 232,263
5.29	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND		$ 39,868	$ 0	18.00	$ 717,624	18.00	$ 717,624	0.00	$ 0
5.30	SALIDA S2 EMT	UND		$ 277,142	$ 0	1.00	$ 277,142		$ 0	1.00	$ 277,142
5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UND		$ 430,732	$ 0	1.00	$ 430,732	1.00	$ 430,732	0.00	$ 0
					TOTAL COSTOS DIRECTOS						
					$ 120,850,196		**$ 176,367,880**		**$ 72,019,507**		**$ 104,348,374**
	ADIMINSTRACIÓN			29.00%	$ 35,046,557		$ 51,146,685		$ 20,885,657.00		$ 30,261,028.00
	IMPREVISTOS			1.00%	$ 1,208,502		$ 1,763,679		$ 720,195.00		$ 1,043,484.00
	UTILIDAD			5%	$ 6,042,510		$ 8,818,394		$ 3,600,975.00		$ 5,217,419.00
	AIU			35%	$ 42,297,568		$ 61,728,758		$ 25,206,827.00		$ 36,521,931.00
					VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS						
					$ 163,147,764.00		**$ 238,096,638.00**		**$ 97,226,333.00**		**$ 140,870,305.00**

Valor del Contrato	**$163.147.764**	
Valor Adicional	$74.948.874	
Valor a Pagar Presente Acta		$ 97.226.333
Saldo por ejecutar		$140.870.305
Sumas Iguales	**$238.096.638**	**$238.096.638**

En consideración a lo anterior, se certifica que las obligaciones asignadas al Contratista durante el periodo objeto de seguimiento contractual, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato de obra pública N°**1010-12-004-502-2025,** por esta razón se procede a autorizar el pago correspondiente a la suma **NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($97.226.333)**, acorde a la factura electrónica N°MM254, presentada por el contratista.

4. SEGUIMIENTO JURÍDICO.

La ejecución del contrato se ha realizado dentro de los parámetros legales y cumpliendo las obligaciones pactadas en el mismo por las partes, ejecutándose las mismas de acuerdo con lo pactado y requerido por el supervisor del contrato.

Durante el periodo de seguimiento contractual no se presentó ningún hecho de incumplimiento, ni problemas en la ejecución atribuibles al contratista.

Para finalizar, se advierte que los informes presentados por el contratista hacen parte integral del expediente contractual y podrá ser consultado por quien lo solicite.

Se firma el presente informe, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

ING. VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

GESTIÓN DOCUMENTAL
Elaboró: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza -Secretaria de Infraestructura.
Proyecto y Reviso: Ing. Victoria Andrea Pizarro Pedroza -Secretaria de Infraestructura.
Original: Carpeta Contrato de Obra Pública N° 1010-12-004-502-2025

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891.500.841-6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	1010-12-004-502-2025			ACTA DE PAGO PARCIAL NO.01
	OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA			
	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC			
	REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR MANUEL MINA ZAPATA			
	SUPERVISIÓN:	VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
	VALOR CONTRATO	$163,147,764	VALOR ADICIONAL	$ 74,948,874.00	FECHA: 26/12/2025
	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	41-44-101298723	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 238,096,638.00	
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	41-40-101057906			

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
1	**PABELLON DE CARNES**				**$ 106,423,835**		**$ 83,447,827**		**$ 32,549,138**		**$ 50,898,689**
1.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	114.06	$ 21,809	$ 2,487,535	115.41	$ 2,516,977	115.41	$ 2,516,977	0.00	$ 0
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	56.12	$ 47,388	$ 2,659,415	25.82	$ 1,223,558	25.82	$ 1,223,558	0.00	$ 0
1.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	562.56	$ 4,123	$ 2,319,435	462.58	$ 1,907,217	462.58	$ 1,907,217	0.00	$ 0
1.4	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	375.04	$ 11,652	$ 4,369,966	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.5	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]	M2	187.52	$ 25,591	$ 4,798,824	31.52	$ 806,628	31.52	$ 806,628	0.00	$ 0
1.6	ESMALTE REJAS- VENTANAS	M2	10.21	$ 26,699	$ 272,597	53.32	$ 1,423,591	53.32	$ 1,423,591	0.00	$ 0
1.7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	31.71	$ 15,029	$ 476,570	12.02	$ 180,649	12.02	$ 180,649	0.00	$ 0
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA CABLE COBRE THW #1/0	ML	7	$ 97,217	$ 680,519	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE 24 MEDIDORES	UND	1	$ 7,035,262	$ 7,035,262	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.10	SALIDA TOMA TUBERIA EMT 3/4"	PTO	24	$ 160,511	$ 3,852,264	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE BREAKERS	UND	12	$ 144,890	$ 1,738,680	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8	ML	674	$ 8,616	$ 5,807,184	260.40	$ 2,243,606		$ 0	260.40	$ 2,243,606
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10	ML	210	$ 6,516	$ 1,368,360	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA (20X0.5X3MTS)	UND	30	$ 150,768	$ 4,523,040	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.15	DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE	M2	380.21	$ 8,958	$ 3,405,921	381.95	$ 3,421,508	381.95	$ 3,421,508	0.00	$ 0
1.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	50.02	$ 69,427	$ 3,472,739	114.59	$ 7,955,640	114.59	$ 7,955,640	0.00	$ 0
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS.	M2	380.21	$ 127,386	$ 48,433,431	381.95	$ 48,655,083		$ 0	381.95	$ 48,655,083

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891.500.841-6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	1010-12-004-502-2025		ACTA DE PAGO PARCIAL NO.01
	OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA		
	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC		
	REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR MANUEL MINA ZAPATA		
	SUPERVISIÓN:	VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	VALOR CONTRATO	$163,147,764	VALOR ADICIONAL	$ 74,948,874.00
	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	41-44-101298723	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 238,096,638.00
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	41-40-101057906		

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
1.18	LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)	M2	39	$ 13,150	$ 512,850	26	$ 341,900	26.00	$ 341,900	0.00	$ 0
1.19	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML	5	$ 72,207	$ 361,035	8.00	$ 577,656	8.00	$ 577,656	0.00	$ 0
1.20	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	12	$ 37,758	$ 453,096	32.07	$ 1,210,899	32.07	$ 1,210,899	0.00	$ 0
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80)	UND	2	$ 344,912	$ 689,824	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE	PTO	8	$ 129,465	$ 1,035,720	8	$ 1,035,720	8.00	$ 1,035,720	0.00	$ 0
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"	ML	60	$ 32,104	$ 1,926,240	47.22	$ 1,515,951	47.22	$ 1,515,951	0.00	$ 0
1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UND	1	$ 331,578	$ 331,578	1	$ 331,578	1.00	$ 331,578	0.00	$ 0
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UND	2	$ 597,254	$ 1,194,508	2	$ 1,194,508	2.00	$ 1,194,508	0.00	$ 0
1.26	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM	M3	69.03	$ 32,120	$ 2,217,244	214.98	$ 6,905,158	214.98	$ 6,905,158	0.00	$ 0
2	**PABELLON 2**				**$ 5,777,649**		**$ 3,746,958**		**$ 3,310,948**		**$ 436,010**
2.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	96.5	$ 21,809	$ 2,104,569	96.5	$ 2,104,569	96.50	$ 2,104,569	0.00	$ 0
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	56.12	$ 47,388.00	$ 2,659,415	22.41	$ 1,061,965	22.41	$ 1,061,965	0.00	$ 0
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2.00	$ 218,005.00	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
2.4	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML	8	$ 72,207.00	$ 577,656	2	$ 144,414	2.00	$ 144,414	0.00	$ 0
3	**PABELLON 3**				**$ 8,212,701**		**$ 6,828,025**		**$ 6,321,972**		**$ 506,053**
3.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	96.28	$ 21,809	$ 2,099,771	96.28	$ 2,099,771	96.28	$ 2,099,771	0.00	$ 0
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	33.67	$ 47,388.00	$ 1,595,554	4.45	$ 210,877	4.45	$ 210,877	0.00	$ 0
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UND	2	$ 331,578.00	$ 663,156	2	$ 663,156	2.00	$ 663,156	0.00	$ 0

FECHA: 26/12/2025

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA NIT: 891.500.841-6 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	1010-12-004-502-2025			ACTA DE PAGO PARCIAL NO.01
	OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA			
	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC			
	REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR MANUEL MINA ZAPATA			
	SUPERVISIÓN:	VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
	VALOR CONTRATO	$163,147,764	VALOR ADICIONAL	$ 74,948,874.00	FECHA: 26/12/2025
	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	41-44-101298723	VALOR TOTAL CONTRATO	$ 238,096,638.00	
	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	41-40-101057906			

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UND	2	$ 597,254.00	$ 1,194,508	2	$ 1,194,508	2.00	$ 1,194,508	0.00	$ 0
3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UND	5	$ 430,732.00	$ 2,153,660	5	$ 2,153,660	5.00	$ 2,153,660	0.00	$ 0
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2	$ 218,005.00	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W	UND	1	$ 70,043.00	$ 70,043	1	$ 70,043		$ 0	1.00	$ 70,043
4	**PABELLON 4**				**$ 436,010**		**$ 436,010**		**$ 0**		**$ 436,010**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2	$ 218,005	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
5	**ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)**				**$ 0**		**$ 81,909,060**		**$ 29,837,449**		**$ 52,071,612**
5.1	DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO	UND		$ 60,842.00	$ 0	63.53	$ 3,865,292	63.53	$ 3,865,292	0.00	$ 0
5.2	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO	M2		$ 12,883	$ 0	10.55	$ 135,916	10.55	$ 135,916	0.00	$ 0
5.3	DEMOLICIÓN REPELLO MURO	M2		$ 9,360	$ 0	46.31	$ 433,462	46.31	$ 433,462	0.00	$ 0
5.4	REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 50,817	$ 0	46.31	$ 2,353,335	46.31	$ 2,353,335	0.00	$ 0
5.5	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2		$ 15,567	$ 0	452.26	$ 7,040,331	211.06	$ 3,285,571	241.20	$ 3,754,760
5.6	ACRILICA MURO [3M]	M2		$ 15,540	$ 0	573.50	$ 8,912,190	332.30	$ 5,163,942	241.20	$ 3,748,248
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO CEMENTO # 6	UND		$ 115,455	$ 0	7.00	$ 808,185	7.00	$ 808,185	0.00	$ 0
5.8	CORTE DE TUBO EN ACERO 2"	ML		$ 13,587	$ 0	66.00	$ 896,742	66.00	$ 896,742	0.00	$ 0
5.9	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 1,684,652	$ 0	0.32	$ 539,089		$ 0	0.32	$ 539,089
5.10	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3		$ 1,399,049	$ 0	0.45	$ 629,572		$ 0	0.45	$ 629,572
5.11	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.	KLS		$ 7,832	$ 0	172.95	$ 1,354,544		$ 0	172.95	$ 1,354,544
5.12	MURO LADRILLO COMUN	M2		$ 104,714	$ 0	116.43	$ 12,191,851		$ 0	116.43	$ 12,191,851
5.13	REPELLO MURO 1:3	M2		$ 32,225	$ 0	241.20	$ 7,772,670		$ 0	241.20	$ 7,772,670

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891.500.841-6
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	1010-12-004-502-2025		**ACTA DE PAGO PARCIAL NO.01**
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA		
CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC		
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR MANUEL MINA ZAPATA		
SUPERVISIÓN:	VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR CONTRATO	$163,147,764	**VALOR ADICIONAL**	$ 74,948,874.00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	41-44-101298723	**VALOR TOTAL CONTRATO**	$ 238,096,638.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	41-40-101057906		**FECHA: 26/12/2025**

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
5.14	REPELLO MURO 1:3	ML		$ 22,010	$ 0	143.46	$ 3,157,555	21.21	$ 466,832	122.25	$ 2,690,723
5.15	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO)	ML		$ 7,699	$ 0	265.68	$ 2,045,470	143.40	$ 1,104,037	122.28	$ 941,434
5.16	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO		$ 51,322	$ 0	22.00	$ 1,129,084	22.00	$ 1,129,084	0.00	$ 0
5.17	PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2"	PTO		$ 48,691	$ 0	22.00	$ 1,071,202	22.00	$ 1,071,202	0.00	$ 0
5.18	TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 10,930	$ 0	85.75	$ 937,248	85.75	$ 937,248	0.00	$ 0
5.19	TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 32,439	$ 0	67.02	$ 2,174,062	67.00	$ 2,173,413	0.02	$ 649
5.20	CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)	UND		$ 573,591	$ 0	4.00	$ 2,294,364	4.00	$ 2,294,364	0.00	$ 0
5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLLO,BANDE ROLA,RIEL,ANTICORROSIVO Y ESMALTE (2.32*3M)	UND		$ 3,000,000	$ 0	1.00	$ 3,000,000		$ 0	1.00	$ 3,000,000
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLLO,BANDE ROLA,RIEL,ANTICORROSIVO Y ESMALTE (1.52*3M)	UND		$ 2,000,000	$ 0	2.00	$ 4,000,000		$ 0	2.00	$ 4,000,000
5.23	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)	M2		$ 21,314	$ 0	120.60	$ 2,570,468	120.60	$ 2,570,468	0.00	$ 0
5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND		$ 218,005	$ 0	4.00	$ 872,020		$ 0	4.00	$ 872,020
5.25	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND		$ 286,746	$ 0	22.00	$ 6,308,412		$ 0	22.00	$ 6,308,412
5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT	ML		$ 31,687	$ 0	91.60	$ 2,902,529		$ 0	91.60	$ 2,902,529

MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT: 891.500.841-6
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	1010-12-004-502-2025
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR MANUEL MINA ZAPATA
SUPERVISIÓN:	VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE PAGO PARCIAL NO.01

VALOR CONTRATO	$163,147,764	**VALOR ADICIONAL**	$ 74,948,874.00
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	41-44-101298723	**VALOR TOTAL CONTRATO**	$ 238,096,638.00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	41-40-101057906		

FECHA: 26/12/2025

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIÓN NO.01		PRESENTE ACTA		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
5.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS	UND		$ 855,706	$ 0	1.00	$ 855,706		$ 0	1.00	$ 855,706
5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"	ML		$ 73,969	$ 0	3.14	$ 232,263		$ 0	3.14	$ 232,263
5.29	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND		$ 39,868	$ 0	18.00	$ 717,624	18.00	$ 717,624	0.00	$ 0
5.30	SALIDA S2 EMT	UND		$ 277,142	$ 0	1.00	$ 277,142		$ 0	1.00	$ 277,142
5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UND		$ 430,732	$ 0	1.00	$ 430,732	1.00	$ 430,732	0.00	$ 0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 120,850,196**		**$ 176,367,880**		**$ 72,019,507**		**$ 104,348,374**
	ADIMINSTRACIÓN			29.00%	$ 35,046,557		$ 51,146,685		$ 20,885,657.00		$ 30,261,028.00
	IMPREVISTOS			1.00%	$ 1,208,502		$ 1,763,679		$ 720,195.00		$ 1,043,484.00
	UTILIDAD			5%	$ 6,042,510		$ 8,818,394		$ 3,600,975.00		$ 5,217,419.00
	AIU			35%	$ 42,297,568		$ 61,728,758		$ 25,206,827.00		$ 36,521,931.00
	VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 163,147,764.00**		**$ 238,096,638.00**		**$ 97,226,333.00**		**$ 140,870,305.00**

SUPERVISIÓN:
ING.VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA:
HECTOR MANUEL MINA ZAPATA
REP.LEGAL MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MINA
INGENIERÍA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901509369-7
Régimen Responsable de iva
Resolución DIAN N° 18764069602789
Fecha 25/04/2024 - 25/04/2026
Autorización de Facturación Electrónica del MM201 al MM300
Email: ingenieriamina23@gmail.com
Teléfono: 3166953847

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° MM254
Cauca	29	12	2025		

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MIRANDA
NIT: 891500841
Fecha de firmado: 29/12/2025 17:42:27
Dirección: CALLE 6 521
Departamento: Cauca
Teléfono: 8476013
Email: tesoreria@miranda-cauca.gov.co
Forma de Pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito
Vencimiento: del
Hora emisión: 17:42:25-05:00
Moneda: COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 4

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MM162	1,00	CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1010-12-004-502-2025 OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA	EA				$72.019.505,92	$72.019.505,92
2	AIU114	1,00	Administracion 29%	EA				$20.885.656,72	$20.885.656,72
3	AIU115	1,00	Imprevistos 1%	EA				$720.195,06	$720.195,06
4	AIU116	1,00	Utilidad 5%	EA				$3.600.975,30	$3.600.975,30

Notas:
ACTA DE PAGO PARCIAL NO.01

Subtotal:	$97.226.333,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$97.226.333,00

SON: (noventa y siete millones doscientos veintiseis mil trescientos treinta y tres pesos)
CUFE: d7091984d13bbe71b2ef7978e96682e2cb4d1623335062fa1fc12f817e84fe7d5b3e46ee9f6317b9dea0772d2ccebea2

Firma Digital: I7sguSZ8OB2v7Yfql/MZHHJc+T0PwhO3JVg+qMT0y0hZwRnrF/6PSfx7IMx9U+RO XwaXn8/65DDaHAweBR7Kzmm0U4xHvhDSMjY3DvaJRfhfhaO3oK q7namlxDzyS1LU L72mEVOqTezz0B9JGZ5/ev/zKaCI76D7S/eePwbx5qaeV5Vg802KspgsXtakSXy/ Dsz8jsOKC0rvhYWzgBvjKQajCzhoHmmpqZP huBA+8O1tRWChEoWcGBQm3tyHBvDZ L3YEZMNTAhaH+c0ZXKkckYJLNY4Akq1IhhwCJQkK/pvdy6kOewVEeicPvifxycjO unI77a3Br7w5iUYH2SoP ZQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Certificado
Bancario

Martes, 16 de diciembre de 2025

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MINA INGENIERIA SAS ZOMAC identificado(a) con NIT 901509369, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	80900000623	2021/11/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

INFORME ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 1010-12-004-502-2025, CUYO OBJETO ES: "OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA".

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATISTA: MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

26 DICIEMBRE DE 2025

INFORME DE EJECUCION DE OBRA. ACTA PARCIAL No 1

MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATO DE OBRA:	1010-12-004-502-2025
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	31 OCTUBRE DE 2025
CONTRATISTA:	MINA INGENIERÍA SAS ZOMAC
REPRESENTANTE LEGAL:	HÉCTOR MANUEL ZAPATA IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 1.114.893.541
NIT:	901.509.369-7
CORREO:	ingenieriamina@gmail.com
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
NIT	90150969-7
REPRESENTANTE LEGAL:	WALTER ZUÑIGA BARONA
OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
VALOR:	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($163.147.764) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025
C.D.P N°	1233 DEL 08 DE AGOSTO AÑO 2025
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DECUMPLIMIENTO:	41-40-101057906 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR:	41-45-101298723 ANEXO 3 SEGUROS DEL ESTADO

TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES 4
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO 4
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
4. UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
5. SEGUIMIENTO TÉCNICO 6

Recorrido cubierto en teja fibrocemento, ajuste, limpieza y sellamiento 6
Suministro e instalación teja fibro-cemento 7
Rasqueteada-lijada-resane 7
Koraza dob vida superf.lisa [2m] 8
ESMALTE REJAS- VENTANAS 8
Demolición contrapiso existente 9
Relleno roca muerta compact-rana 10
Excavación en conglomerado (manual) 11
Suministro e instalación de pto sifon 4" incluye codo y tee 11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4" 12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS 12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS 13
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM 13
Demolición mesón en concreto + muro 14
Demolición enchape cerámico+ mortero 14
Demolición repello muro 15
Repello muro 1:3 impermeabilizado 15
Estuco plástico muro (pasta) 16
Acrílica muro [3m] 17
Suministro e instalación teja claraboya fibro cemento # 6 17
Corte de tubo en acero 2" 18
Tubería sanitaria pvc 2" incluye accesorios. 18
Punto sanitario pvc 2" 18
Caja de inspección 80x80 cm (concreto) 19

Esmalte sintético sobre muros (2m) 21
6. AVANCE DE OBRA 22

1. GENERALIDADES

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°	1010-12-004-502-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA
PROCESO N°	SAMC-006-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MIRANDA
ALCALDE MUNICIPAL	WALTER ZÚÑIGA BARONA
IDENTIFICACIÓN C.C. N°	4.712.018 expedida en MIRANDA CAUCA
CONTRATISTA	MINA INGENIERA S.A.S. ZOMAC
IDENTIFICACIÓN NIT. N°	901509369-7
REPRESENTANTE LEGAL	HÉCTOR MANUEL MINA ZAPATA
IDENTIFICACIÓN C.C N°	1.114.893.541 Expedida De Florida Valle
DIRECCIÓN	Calle 6 N° 9b -15 Miranda Cauca
TELÉFONO	3166953847
CORREO ELECTRÓNICO	ingenieriamina23@gmail.com
OBJETO	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA
VALOR	CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL

	SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($163.147.764) M/CTE
VALOR ADICIONAL N°01:	SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($74.948.874)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($238.096.638).
PLAZO	DOS (2) MESES
CDP N°	1233 DEL 08 DE AGOSTO DE 2025
COMPROMISO PRESUPUESTAL N°	2068 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2025
CDP ADICIONAL N°01:	1856 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025
C.P ADICIONAL N°01:	2433 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	41-44-101298723
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	41-40-101057906

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El alcance del proyecto comprende el mantenimiento de fachadas y muros internos, la demolición y reposición de pisos, el mantenimiento de la cubierta, así como otras actividades complementarias que hacen parte del proceso de embellecimiento de la galería, principalmente en el pabellón 3.

4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

CARRERA 8 CON CALLE 9

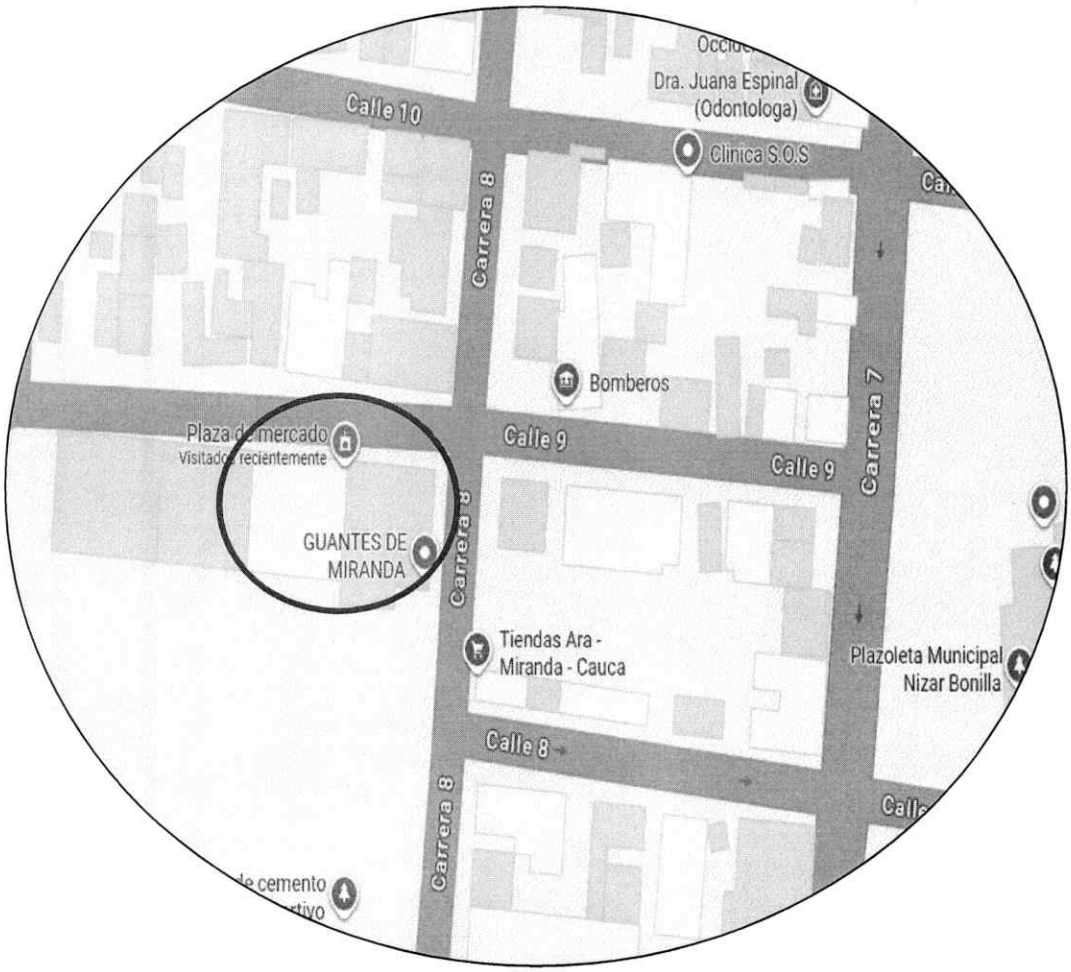


Ilustración 1 Ubicación Galería municipal

5. SEGUIMIENTO TÉCNICO

Se realizaron las siguientes actividades.

Recorrido cubierto en teja fibrocemento, ajuste, limpieza y sellamiento
Actividad correspondiente a la instalación de cinta de señalización para delimitar y advertir las zonas de trabajo. Incluye soporte, fijación y distancia de instalación según especificaciones del contratista.

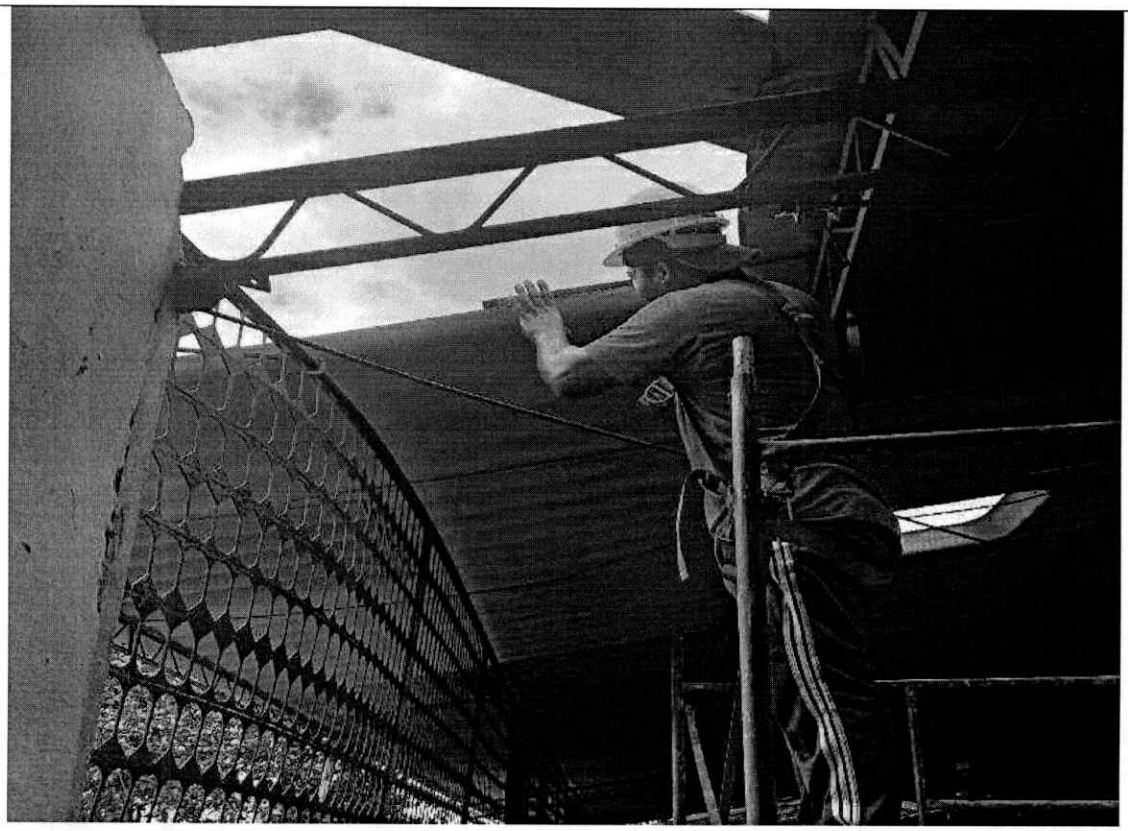


Ilustración 2 Recorrido cubierta en teja fibrocemento, ajuste, limpieza y sellamiento.

Suministro e instalación teja fibro-cemento

Se realiza la instalación de teja de fibrocemento para el reemplazo de tejas deterioradas y la cobertura de áreas donde no existía teja, garantizando la adecuada protección de la cubierta.

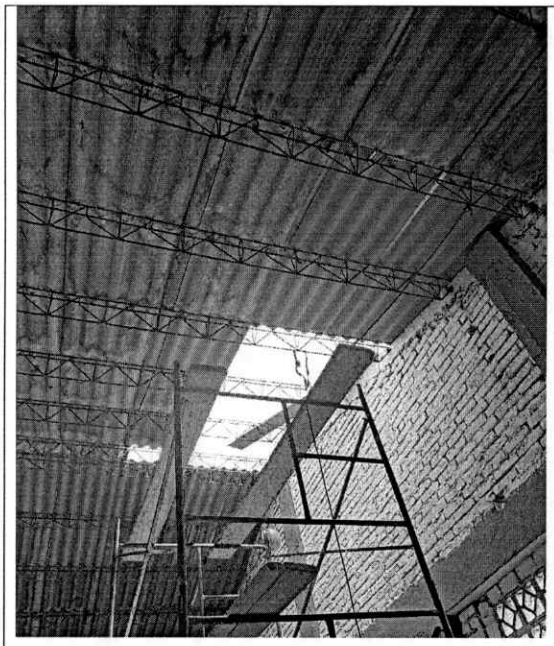


Ilustración 3 Suministro e instalación teja fibro-cemento.

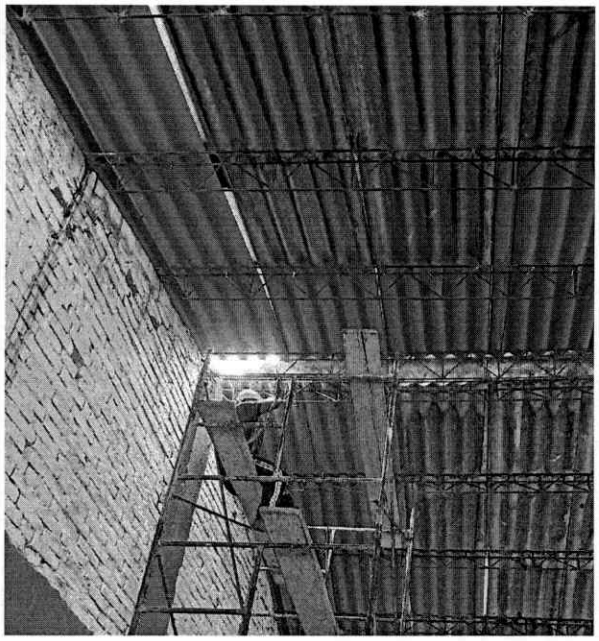


Ilustración 4 Suministro e instalación teja fibro-cemento.

Rasqueteada-lijada-resane

Se realiza raqueteada debido al mal estado de la pintura existente.



Ilustración 5 Rasqueteada-lijada-resane.



Ilustración 6 Rasqueteada-lijada-resane.

Koraza dob vida superf.lisa [2m]

Se realiza la aplicación de pintura en fachada exterior, utilizando Koraza DOB Vida Superficie Lisa, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

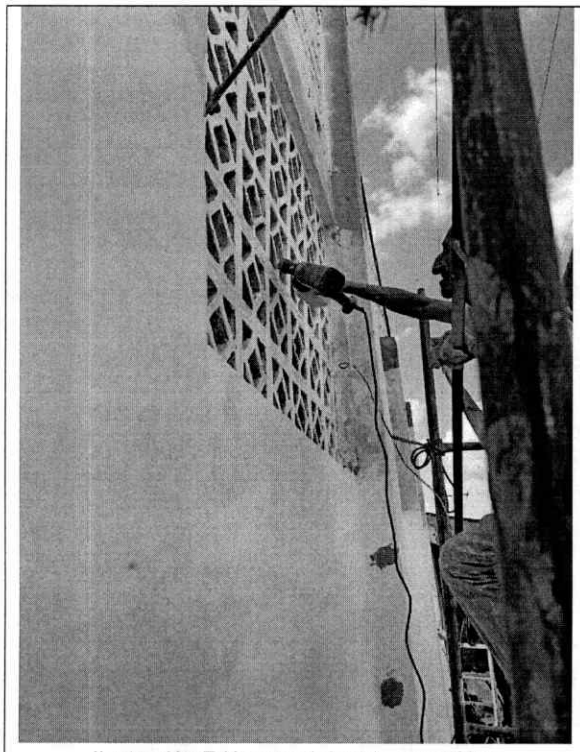


Ilustración 7 Koraza dob vida superf.lisa

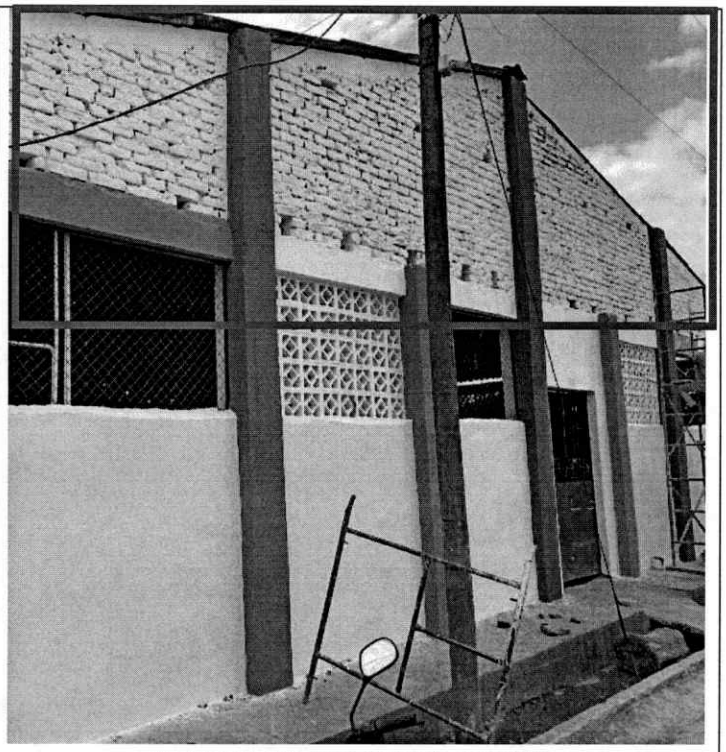


Ilustración 8 Koraza dob vida superf.lisa

ESMALTE REJAS- VENTANAS

Se realizó la aplicación de pintura sobre mallas en las fachadas, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

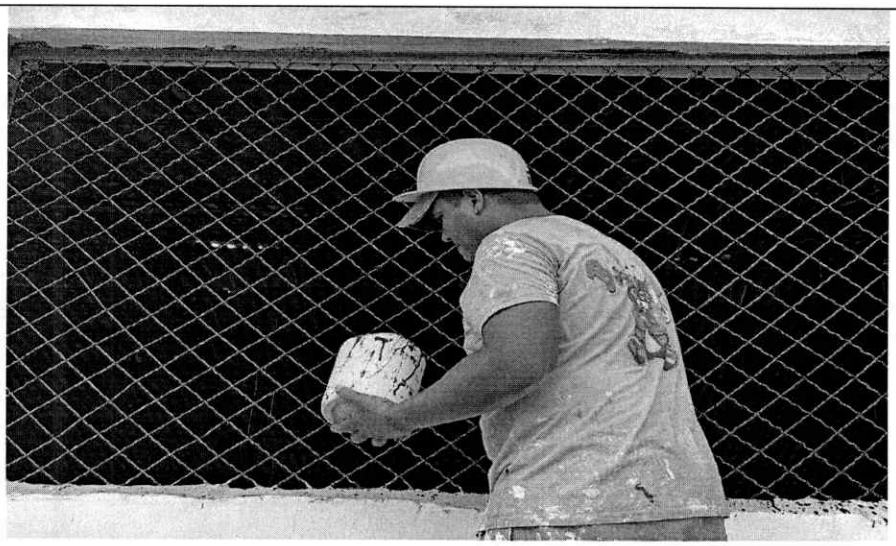


Ilustración 9 Esmalte rejas- ventanas

Demolición contrapiso existente

Se realizó la demolición de los pisos existentes en concreto, debido a su mal estado, con el fin de proceder posteriormente a su reposición conforme a lo establecido en el proyecto.



Ilustración 10 Demolición contrapiso existente.

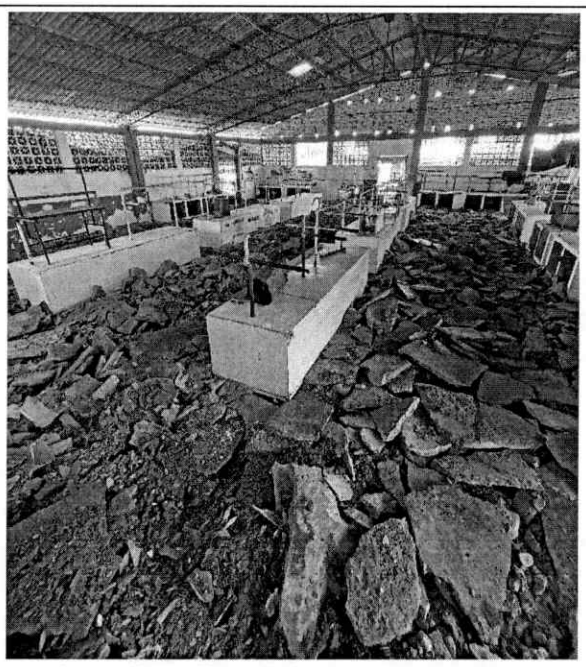


Ilustración 11 Demolición contrapiso existente.

Relleno roca muerta compact-rana

Aplicación de material tipo roca muerta en la zanja, compactado con equipo, con el fin de garantizar la estabilidad del relleno y soporte de la tubería instalada.



Ilustración 12 Relleno roca muerta compact.

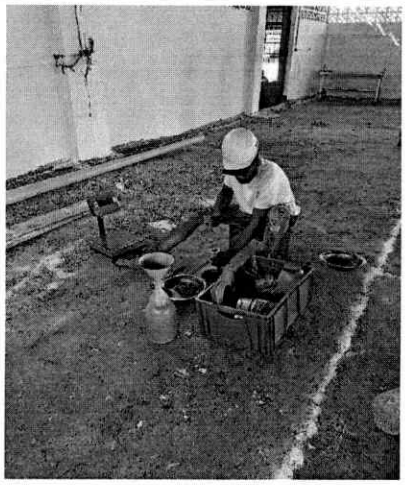


Ilustración 13 toma de densidades.

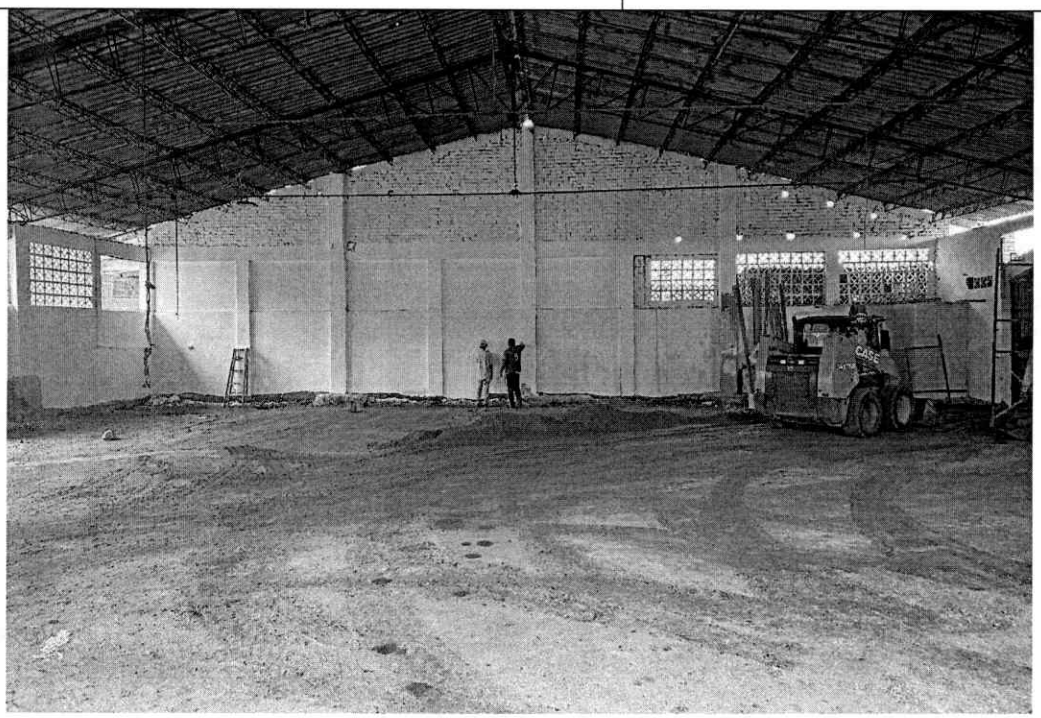


Ilustración 14 Relleno roca muerta compact.

Excavación en conglomerado (manual)

Se realiza excavación manual para la instalación de las tuberías sanitarias

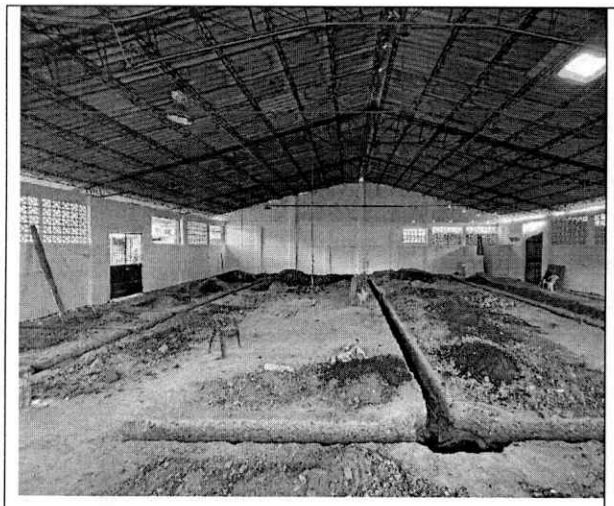


Ilustración 15 Excavación en conglomerado.



Ilustración 16 Excavación en conglomerado.

Suministro e instalación de pto sifon 4" incluye codo y tee

Se realiza la instalación de puntos de sifón para la evacuación de aguas generadas durante las labores de aseo y lavado de los puestos, garantizando el adecuado funcionamiento del sistema sanitario.



Ilustración 17 sifón 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"

Instalación de tubería de 4" para red principal, incluyendo alineación, nivelación, acomodo en zanja, unión de accesorios y rellenos parciales.



Ilustración 18 suministro e instalación de tubería pvc 4".

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS

Se realiza la reposición de sanitarios en mal estado



Ilustración 19 Instalación de sanitario



Ilustración 20 Instalación de sanitario

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS

Se realiza la reposición de lavamanos en mal estado.



Ilustración 21 Suministro e instalación de lavamanos

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM

Cargue mecánico y transporte de material producto de excavaciones y demolición.



Ilustración 22 Retiro de material sobrante <= 10 km



Ilustración 23 Retiro de material sobrante <= 10 km

Demolición mesón en concreto + muro

Demolición de mesón en concreto + muro debido a su mal estado

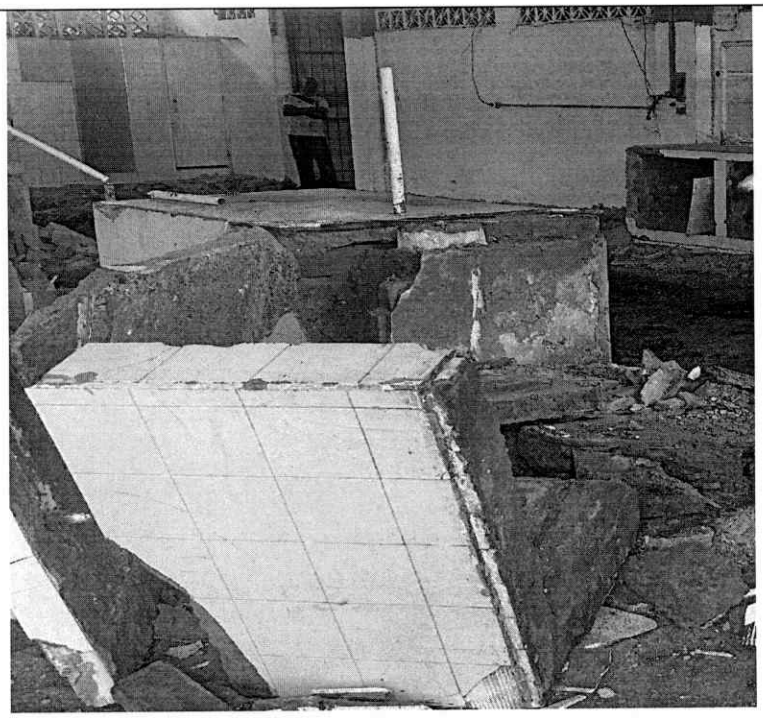


Ilustración 24 Demolición mesón en concreto + muro

Demolición enchape cerámico+ mortero

Al demoler los puestos se realiza la demolición del enchape de la parte superior para realizar posteriormente su resane y pintura



Ilustración 25 Demolición enchape cerámico+ mortero.

Demolición repello muro

Se realiza demolición repello en mal estado.

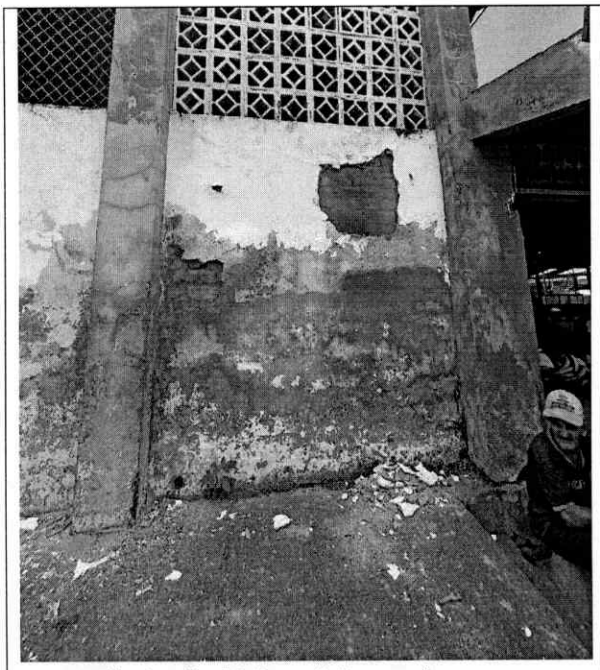


Ilustración 26 Demolición repello muro.

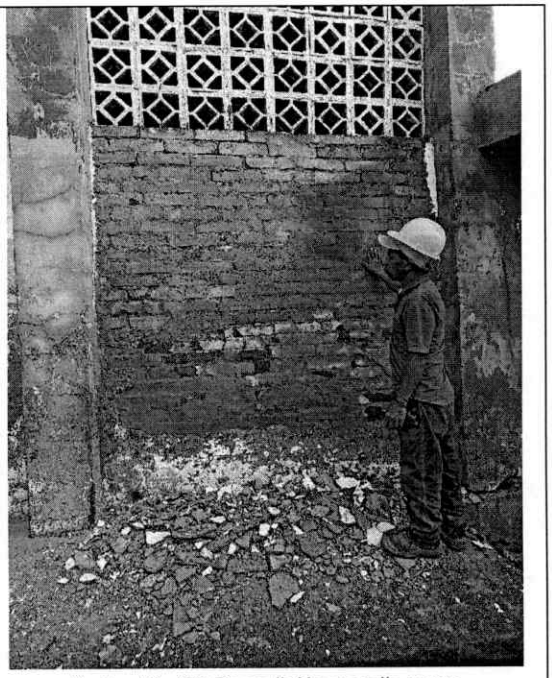


Ilustración 27 Demolición repello muro.

Repello muro 1:3 impermeabilizado

Se realiza repello en las áreas donde previamente se efectuó la demolición del mismo, así como en los sectores donde se demolió el enchape y en las zonas donde se encontraban puestos adosados a las paredes perimetrales

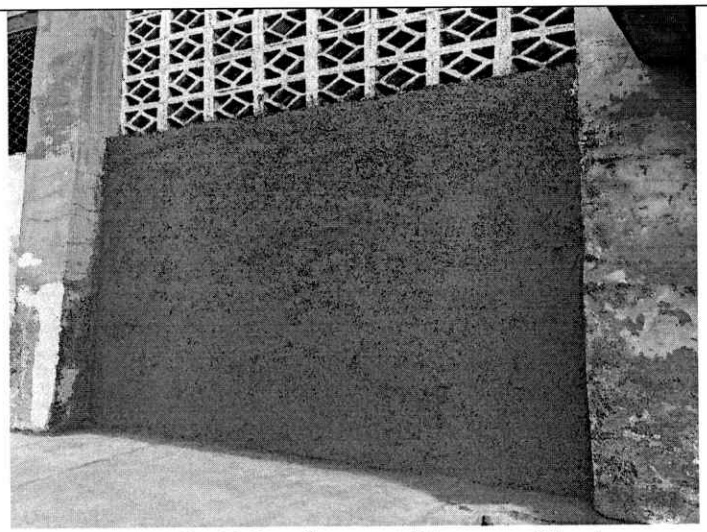


Ilustración 28 Repello muro 1:3 impermeabilizado

Estuco plástico muro (pasta)

Se realiza la aplicación de estuco sobre los muros, con el fin de mejorar el acabado superficial, conforme a las especificaciones del proyecto.

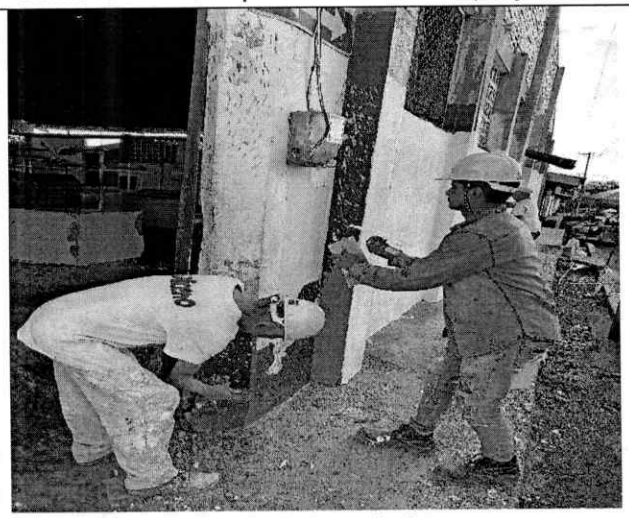


Ilustración 29 Estuco plástico muro.

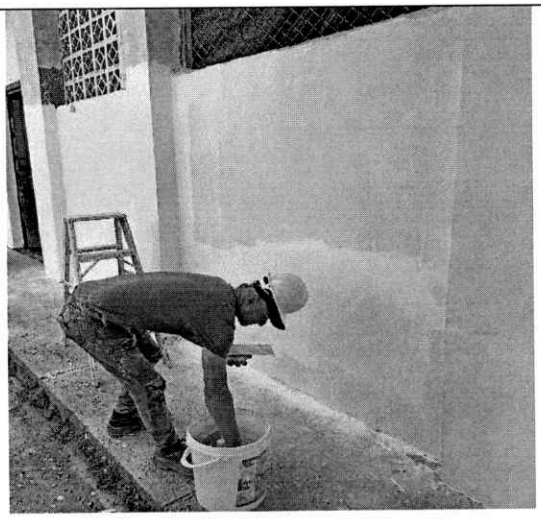


Ilustración 30 Estuco plástico muro.

Acrílica muro [3m]

Se realiza aplicación pintura acrílica muros internos

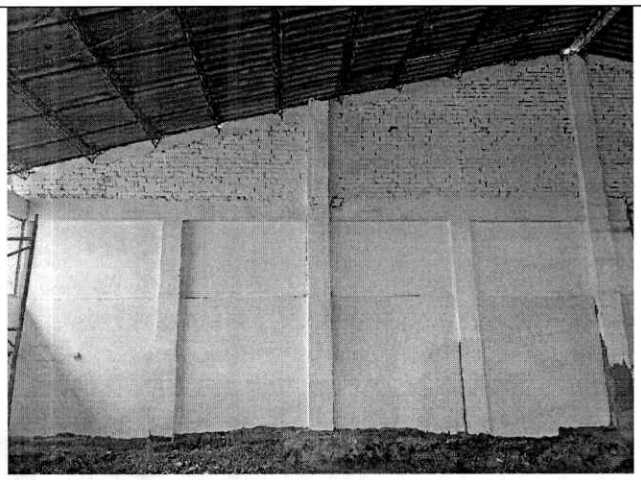


Ilustración 31 Acrílica muro.

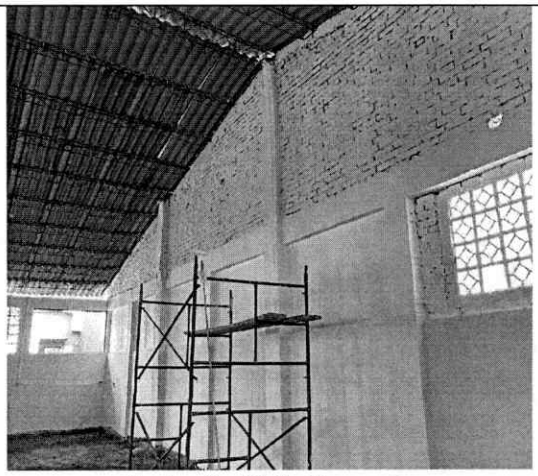


Ilustración 32 Acrílica muro.

Suministro e instalación teja claraboya fibro cemento # 6

Se realiza la instalación de teja tipo claraboya, con el fin de mejorar la iluminación natural en los pabellones.



Ilustración 33 Suministro e instalación teja claraboya

Corte de tubo en acero 2"

Se realiza el corte y retiro de tuberías metálicas existentes utilizadas para colgar carne, con el fin de facilitar las actividades de demolición y adecuación de las áreas.

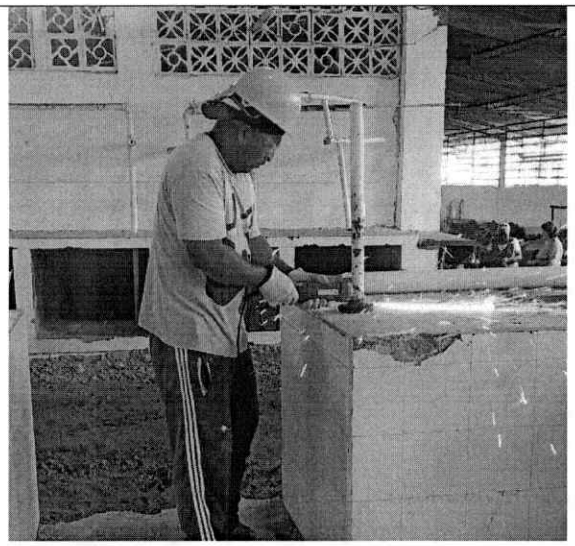


Ilustración 34 Corte de tubo en acero 2"


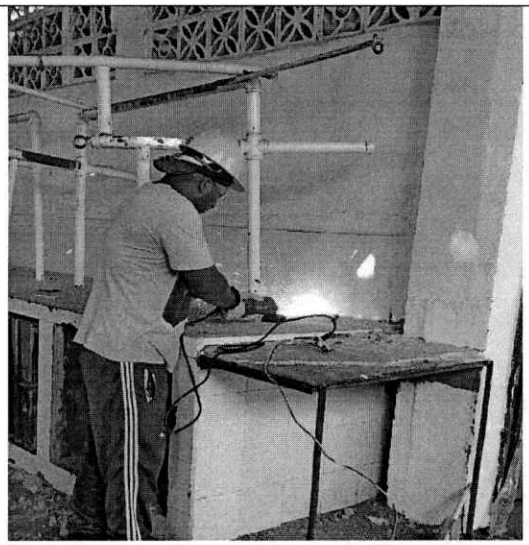


Ilustración 35 Corte de tubo en acero 2"


Tubería sanitaria pvc 2" incluye accesorios.

Se realiza la instalación de tubería de 2" para los puntos de desagüe de los puestos, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

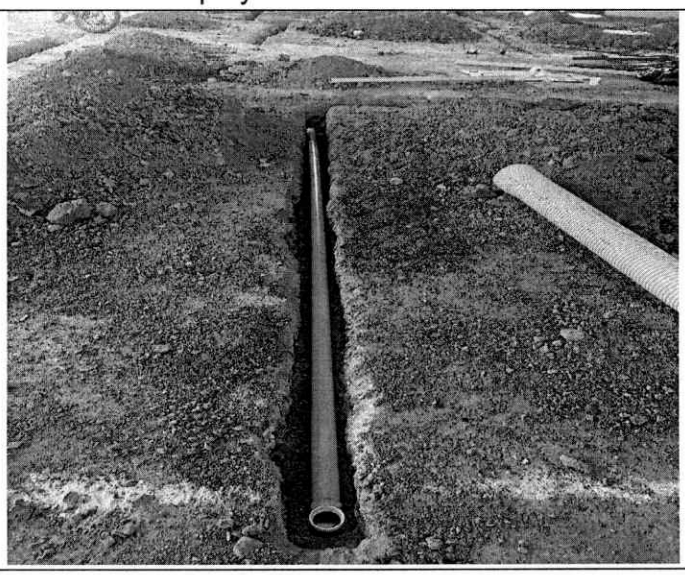

Punto sanitario pvc 2"

se instala punto sanitario de 2" en cada puesto.

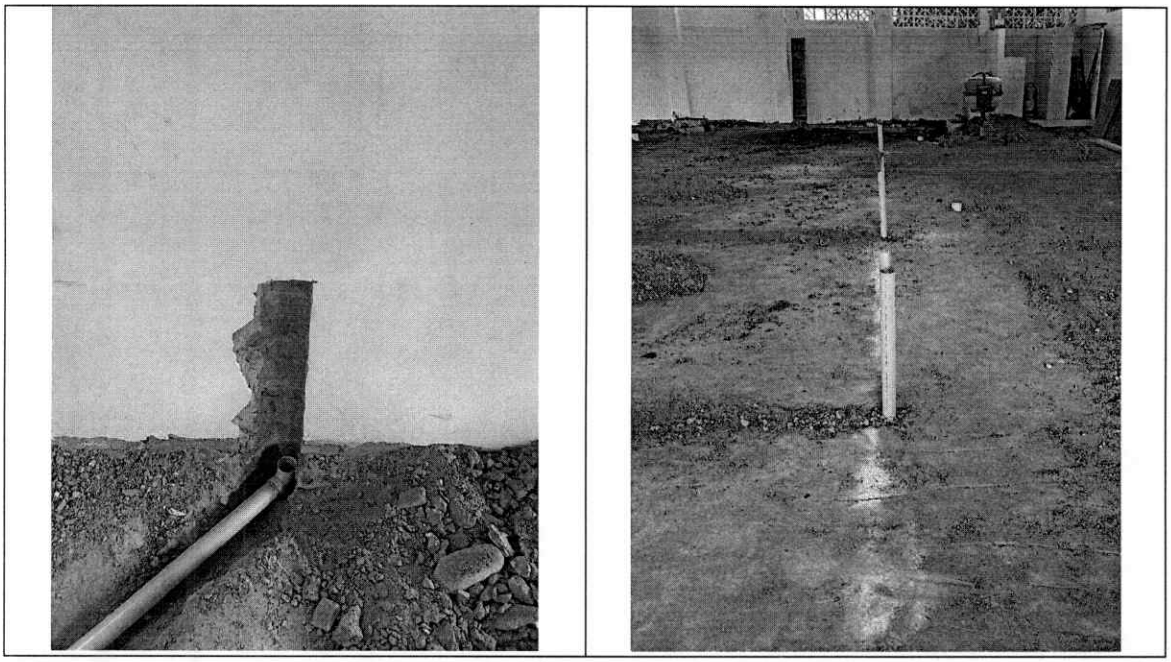

Caja de inspección 80x80 cm (concreto)

Se realiza la fundición de caja de inspección para el sistema de alcantarillado sanitario del Pabellón 3, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, garantizando el adecuado control, mantenimiento y funcionamiento del sistema de evacuación de aguas residuales.

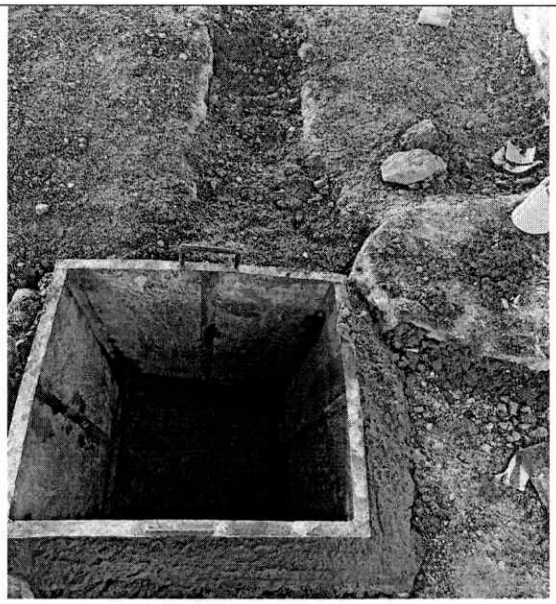


Ilustración 36 Caja de inspección.

Esmalte sintético sobre muros (2m)

Aplicación pintura esmalte muro exterior.

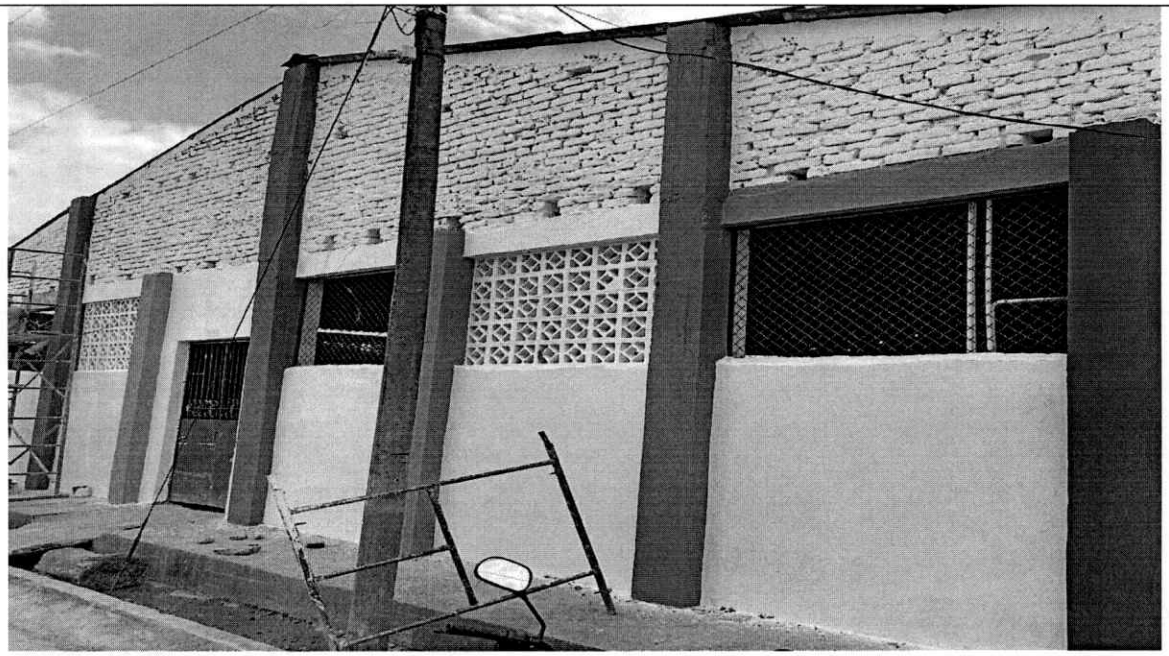


Ilustración 37 Esmalte sintético sobre muros.

6. AVANCE DE OBRA

	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	1010-12-004-502-2025			**ACTA DE PAGO PARCIAL NO.01**
	OBJETO:	OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA			
	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC			
	REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR MANUEL MINA ZAPATA			
	SUPERVISIÓN:	VICTORIA ANDREA PIZARRO PEDROZA- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA	**VALOR CONTRATO**	$163,147,764	**VALOR ADICIONAL**	$ 74,948,874.00	
NIT: 891.500.841-6	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO**	41-44-101298723	**VALOR TOTAL CONTRATO**	$ 238,096,638.00	**FECHA: 26/12/2025**
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	41-40-101057906			

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES	MODIFICACIÓN NO.01	PRESENTE ACTA	CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR

		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES CANT.FINALES	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT	VR.TOTAL
1	**PABELLON DE CARNES**				**$ 106,423,835**		**$ 83,447,827**		**$ 32,549,138**		**$ 50,898,689**
1.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	114.06	$ 21,809	$ 2,487,535	115.41	$ 2,516,977	115.41	$ 2,516,977	0.00	$ 0
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	56.12	$ 47,388	$ 2,659,415	25.82	$ 1,223,558	25.82	$ 1,223,558	0.00	$ 0
1.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	562.56	$ 4,123	$ 2,319,435	462.58	$ 1,907,217	462.58	$ 1,907,217	0.00	$ 0
1.4	VINILO MURO TIPO 1 [2M]	M2	375.04	$ 11,652	$ 4,369,966	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.5	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]	M2	187.52	$ 25,591	$ 4,798,824	31.52	$ 806,628	31.52	$ 806,628	0.00	$ 0
1.6	ESMALTE REJAS-VENTANAS	M2	10.21	$ 26,699	$ 272,597	53.32	$ 1,423,591	53.32	$ 1,423,591	0.00	$ 0
1.7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	31.71	$ 15,029	$ 476,570	12.02	$ 180,649	12.02	$ 180,649	0.00	$ 0
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION ACOMETIDA CABLE COBRE THW #1/0	ML	7	$ 97,217	$ 680,519	0	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0

1.9	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE 24 MEDIDORES	UND	1	$ 7,035,262	$ 7,035,262	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.10	SALIDA TOMA TUBERIA EMT 3/4"	PTO	24	$ 160,511	$ 3,852,264	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 3 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE BREAKERS	UND	12	$ 144,890	$ 1,738,680	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #8	ML	674	$ 8,616	$ 5,807,184	260.40	$ 2,243,606		$ 0	260.40	$ 2,243,606
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #10	ML	210	$ 6,516	$ 1,368,360	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA (20X0.5X3MTS)	UND	30	$ 150,768	$ 4,523,040	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.15	DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE	M2	380.21	$ 8,958	$ 3,405,921	381.95	$ 3,421,508	381.95	$ 3,421,508	0.00	$ 0
1.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	50.02	$ 69,427	$ 3,472,739	114.59	$ 7,955,640	114.59	$ 7,955,640	0.00	$ 0
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CONCRETO PULIDO DE 10 CM REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, ACABADO SEMIBRILLANTE Y SELLAMIENTO DE JUNTAS.	M2	380.21	$ 127,386	$ 48,433,431	381.95	$ 48,655,083	0.00	$ 0	381.95	$ 48,655,083

1.18	LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)	M2	39	$ 13,150	$ 512,850	26	$ 341,900	26.00	$ 341,900	0.00	$ 0
1.19	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML	5	$ 72,207	$ 361,035	8.00	$ 577,656	8.00	$ 577,656	0.00	$ 0
1.20	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	12	$ 37,758	$ 453,096	32.07	$ 1,210,899	32.07	$ 1,210,899	0.00	$ 0
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO (0.60*0.80)	UND	2	$ 344,912	$ 689,824	0	$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE	PTO	8	$ 129,465	$ 1,035,720	8	$ 1,035,720	8.00	$ 1,035,720	0.00	$ 0
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"	ML	60	$ 32,104	$ 1,926,240	47.22	$ 1,515,951	47.22	$ 1,515,951	0.00	$ 0
1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UND	1	$ 331,578	$ 331,578	1	$ 331,578	1.00	$ 331,578	0.00	$ 0
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UND	2	$ 597,254	$ 1,194,508	2	$ 1,194,508	2.00	$ 1,194,508	0.00	$ 0
1.26	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM	M3	69.03	$ 32,120	$ 2,217,244	214.98	$ 6,905,158	214.98	$ 6,905,158	0.00	$ 0
2	**PABELLON 2**				**$ 5,777,649**		**$ 3,746,958**		**$ 3,310,948**		**$ 436,010**

2.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	96.5	$ 21,809	$ 2,104,569	96.5	$ 2,104,569	96.50	$ 2,104,569	0.00	$ 0
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	56.12	$ 47,388.00	$ 2,659,415	22.41	$ 1,061,965	22.41	$ 1,061,965	0.00	$ 0
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2.00	$ 218,005.00	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
2.4	CABALLETE FIBROCEMENTO	ML	8	$ 72,207.00	$ 577,656	2	$ 144,414	2.00	$ 144,414	0.00	$ 0
3	**PABELLON 3**				**$ 8,212,701**		**$ 6,828,025**		**$ 6,321,972**		**$ 506,053**
3.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	M2	96.28	$ 21,809	$ 2,099,771	96.28	$ 2,099,771	96.28	$ 2,099,771	0.00	$ 0
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	M2	33.67	$ 47,388.00	$ 1,595,554	4.45	$ 210,877	4.45	$ 210,877	0.00	$ 0
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UND	2	$ 331,578.00	$ 663,156	2	$ 663,156	2.00	$ 663,156	0.00	$ 0
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UND	2	$ 597,254.00	$ 1,194,508	2	$ 1,194,508	2.00	$ 1,194,508	0.00	$ 0

3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UND	5	$ 430,732.00	$ 2,153,660	5	$ 2,153,660	5.00	$ 2,153,660	0.00	$ 0
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2	$ 218,005.00	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24W	UND	1	$ 70,043.00	$ 70,043	1	$ 70,043		$ 0	1.00	$ 70,043
4	**PABELLON 4**				**$ 436,010**		**$ 436,010**		**$ 0**		**$ 436,010**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND	2	$ 218,005	$ 436,010	2	$ 436,010		$ 0	2.00	$ 436,010
5	**ITEMS NO PREVISTOS (PABELLON CARNES)**				**$ 0**		**$ 81,909,060**		**$ 29,837,449**		**$ 52,071,612**
5.1	DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO	UND		$ 60,842.00	$ 0	63.53	$ 3,865,292	63.53	$ 3,865,292	0.00	$ 0
5.2	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO	M2		$ 12,883	$ 0	10.55	$ 135,916	10.55	$ 135,916	0.00	$ 0
5.3	DEMOLICIÓN REPELLO MURO	M2		$ 9,360	$ 0	46.31	$ 433,462	46.31	$ 433,462	0.00	$ 0
5.4	REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 50,817	$ 0	46.31	$ 2,353,335	46.31	$ 2,353,335	0.00	$ 0
5.5	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	M2		$ 15,567	$ 0	452.26	$ 7,040,331	211.06	$ 3,285,571	241.20	$ 3,754,760
5.6	ACRILICA MURO [3M]	M2		$ 15,540	$ 0	573.50	$ 8,912,190	332.30	$ 5,163,942	241.20	$ 3,748,248

5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO CEMENTO # 6	UND		$ 115,455	$ 0	7.00	$ 808,185	7.00	$ 808,185	0.00	$ 0
5.8	CORTE DE TUBO EN ACERO 2"	ML		$ 13,587	$ 0	66.00	$ 896,742	66.00	$ 896,742	0.00	$ 0
5.9	COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3		$ 1,684,652	$ 0	0.32	$ 539,089		$ 0	0.32	$ 539,089
5.10	VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3		$ 1,399,049	$ 0	0.45	$ 629,572		$ 0	0.45	$ 629,572
5.11	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI.	KLS		$ 7,832	$ 0	172.95	$ 1,354,544		$ 0	172.95	$ 1,354,544
5.12	MURO LADRILLO COMUN	M2		$ 104,714	$ 0	116.43	$ 12,191,851		$ 0	116.43	$ 12,191,851
5.13	REPELLO MURO 1:3	M2		$ 32,225	$ 0	241.20	$ 7,772,670		$ 0	241.20	$ 7,772,670
5.14	REPELLO MURO 1:3	ML		$ 22,010	$ 0	143.46	$ 3,157,555	21.21	$ 466,832	122.25	$ 2,690,723
5.15	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO)	ML		$ 7,699	$ 0	265.68	$ 2,045,470	143.40	$ 1,104,037	122.28	$ 941,434
5.16	PUNTO SANITARIO PVC 2"	PTO		$ 51,322	$ 0	22.00	$ 1,129,084	22.00	$ 1,129,084	0.00	$ 0
5.17	PUNTO AGUA FRIA HIDRAULICO PVC 1/2"	PTO		$ 48,691	$ 0	22.00	$ 1,071,202	22.00	$ 1,071,202	0.00	$ 0
5.18	TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 10,930	$ 0	85.75	$ 937,248	85.75	$ 937,248	0.00	$ 0
5.19	TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		$ 32,439	$ 0	67.02	$ 2,174,062	67.00	$ 2,173,413	0.02	$ 649
5.20	CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)	UND		$ 573,591	$ 0	4.00	$ 2,294,364	4.00	$ 2,294,364	0.00	$ 0

5.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLLO,BANDEROLA,RIEL,ANTICORROSIVO Y ESMALTE (2.32*3M)	UND		$ 3,000,000	$ 0	1.00	$ 3,000,000		$ 0	1.00	$ 3,000,000
5.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA METALICA ENROLLABLE INCLUYE POLEA, EJE CENTRAL,SANDALO,PASADOR,TAPAROLLO,BANDEROLA,RIEL,ANTICORROSIVO Y ESMALTE (1.52*3M)	UND		$ 2,000,000	$ 0	2.00	$ 4,000,000		$ 0	2.00	$ 4,000,000
5.23	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)	M2		$ 21,314	$ 0	120.60	$ 2,570,468	120.60	$ 2,570,468	0.00	$ 0
5.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTOR LED 20000 LUMENES 200W BLANCA IP65	UND		$ 218,005	$ 0	4.00	$ 872,020		$ 0	4.00	$ 872,020
5.25	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND		$ 286,746	$ 0	22.00	$ 6,308,412		$ 0	22.00	$ 6,308,412
5.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO 3/4" EMT	ML		$ 31,687	$ 0	91.60	$ 2,902,529		$ 0	91.60	$ 2,902,529

5.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO CON PUERTA 12 CIRCUITOS INCLUYE 3 BREAKERS	UND		$ 855,706	$ 0	1.00	$ 855,706		$ 0	1.00	$ 855,706
5.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT 6"	ML		$ 73,969	$ 0	3.14	$ 232,263		$ 0	3.14	$ 232,263
5.29	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND		$ 39,868	$ 0	18.00	$ 717,624	18.00	$ 717,624	0.00	$ 0
5.30	SALIDA S2 EMT	UND		$ 277,142	$ 0	1.00	$ 277,142		$ 0	1.00	$ 277,142
5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UND		$ 430,732	$ 0	1.00	$ 430,732	1.00	$ 430,732	0.00	$ 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 120,850,196**		**$176,367,880**		**$ 72,019,507**		**$ 104,348,374**
ADIMINSTRACIÓN			29.00%		$ 35,046,557		$ 51,146,685		$ 20,885,657		$ 30,261,028.0
IMPREVISTOS			1.00%		$ 1,208,502		$ 1,763,679		$ 720,195		$ 1,043,484.00
UTILIDAD			5%		$ 6,042,510		$ 8,818,394		$ 3,600,975		$ 5,217,419.00
AIU			35%		$ 42,297,568		$ 61,728,758		$ 25,206,827		$ 36,521,931.0
VALOR COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					**$163,147,764.0**		**$238,096,638**		**$ 97,226,333**		**$ 140,870,305**

CUADRO RESUMEN AVANCE DE OBRA	
VALOR CONTRATO INICIAL	$163,147,764
VALOR CONTRATO + ADICION	$ 238,096,638.00
VALOR A PAGAR ACTA 01	$ 97,226,333
% AVANCE OBRA	40.8%

Héctor Mina

HÉCTOR MANUEL ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL MINA INGENIERIA SAS ZOMAC
CONTRATISTA

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA


CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

1. PABELLON DE CARNES

ITEM	1.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
AREA CUBIERTA	19.42	19.81		30%	115.41	115.41

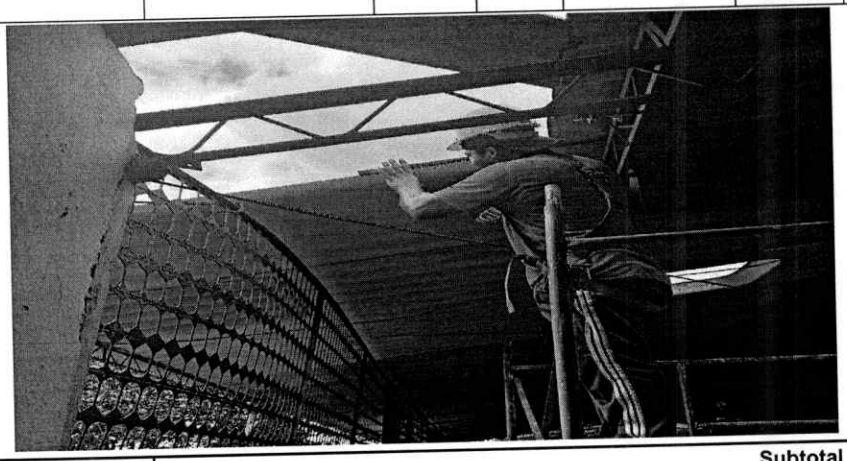

OBSERVACIONES:	Subtotal	115.41
	TOTAL	115.41


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	1.22	0.92		23.00	25.82	25.82

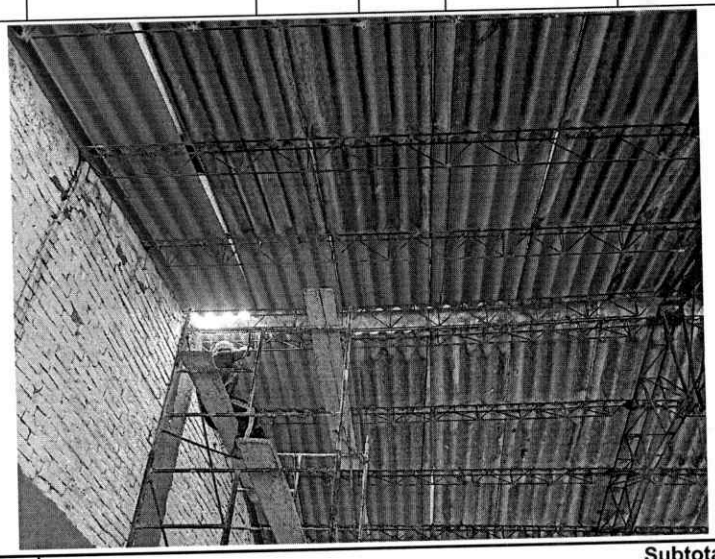

OBSERVACIONES:	Subtotal	25.82
	TOTAL	**25.82**


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA


CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.3	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
CARA CRA8	20.54		4.00	2.00	164.32	462.58
CARA PABELLON 2	19.81		4.00	1.00	79.24	
CARA COSTADO ESTADIO	19.41		4.00	1.00	77.64	
CARA CALLE 9 INTERNA	17.78		3.00	1.00	53.34	
CARA CALLE 9 EXTERNA	18.29		4.00	1.00	73.16	
AREA TRIANGULO	31.52			3.00	94.56	
AREA DE REJAS Y PUERTAS		-1.90	2.50		-4.75	
		-2.10	2.60		-5.46	
		-1.55	2.60	4.00	-16.12	
		-2.28	2.55	2.00	-11.63	
		-2.10	2.10	2.00	-8.82	
		-2.08	1.30	2.00	-5.41	
		-2.12	1.30	2.00	-5.51	
		-2.13	1.30	2.00	-5.54	
		-2.16	1.28	2.00	-5.53	
		-2.10	1.28	2.00	-5.38	
		-2.16	1.28	2.00	-5.53	

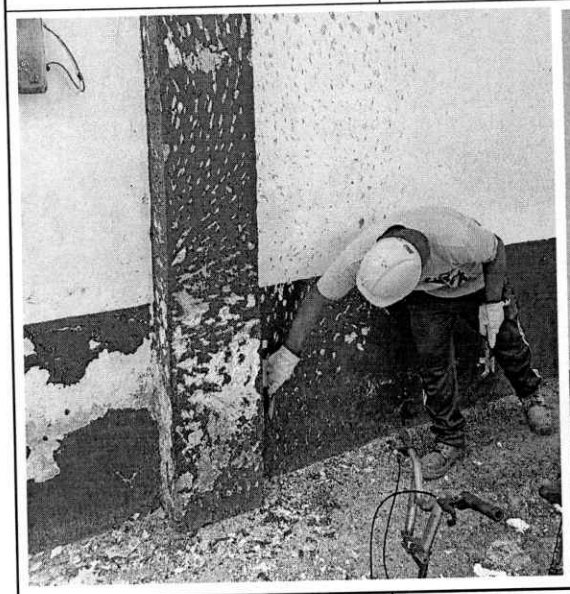

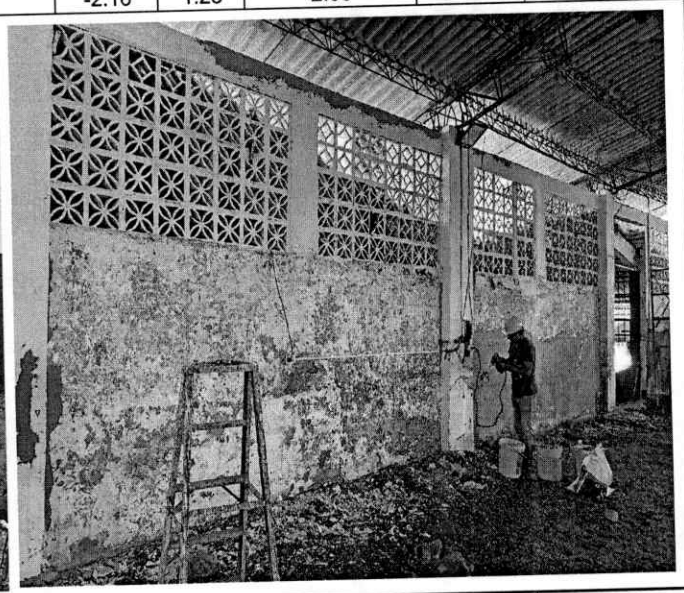

OBSERVACIONES:	Subtotal	462.58
	TOTAL	462.58


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.5	KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M]	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
AREA TRIANGULO	31.52			1.00	31.52	31.52

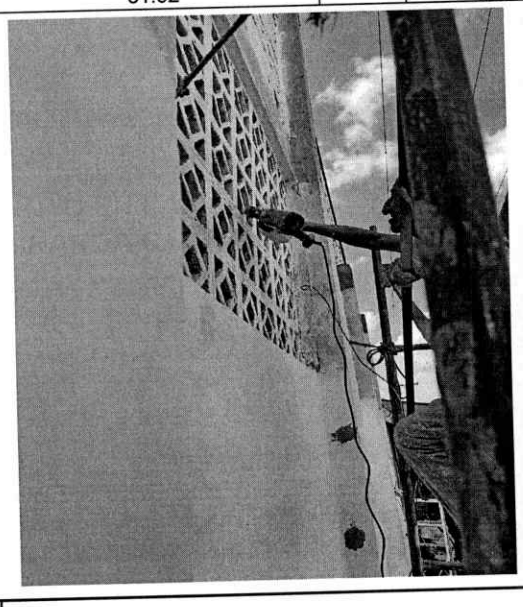

OBSERVACIONES:	Subtotal	31.52
	TOTAL	31.52


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.6	ESMALTE REJAS- VENTANAS	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
REJAS EN MALLA CALLE 9		2.08	1.30	2.00	5.41	53.32
		2.12	1.30	2.00	5.51	
		2.13	1.30	2.00	5.54	
REJAS EN MALLA CRA 8		2.16	1.28	2.00	5.53	
		2.10	1.28	2.00	5.38	
		2.16	1.28	2.00	5.53	
REJAS PABELLON 2		1.90	2.50	2.00	9.50	
		2.10	2.60	2.00	10.92	

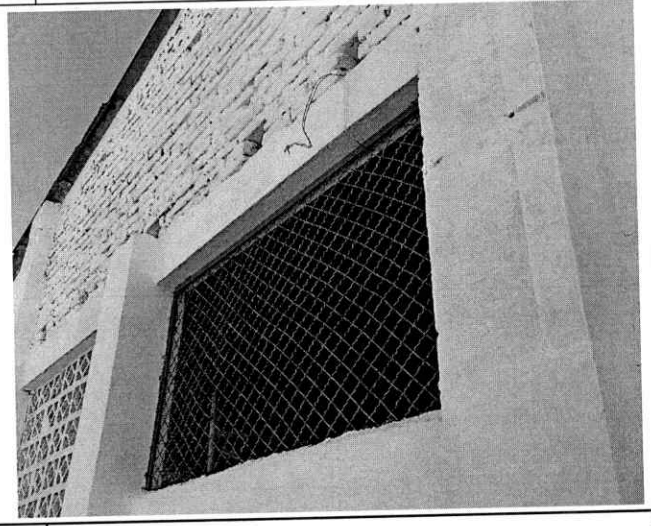

OBSERVACIONES:	Subtotal	53.32
	TOTAL	53.32

ITEM	1.7	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
CORTINA EXISTENTE		2.10	2.10	2.00	8.82	12.02
PUERTA BAÑOS		0.80	2.00	2.00	3.20	

OBSERVACIONES:	Subtotal	12.02
	TOTAL	12.02

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.15	DEMOLICIÓN CONTRAPISO EXISTENTE	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
AREA TOTAL	19.7	19.58			385.73	381.95
AREA BAÑOS	-2.36	1.60			-3.78	



OBSERVACIONES:	Subtotal	381.95
	TOTAL	**381.95**

ITEM	1.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
AREA A INTERVENIR	381.95		0.30		114.59	114.59



OBSERVACIONES:	Subtotal	114.59
	TOTAL	**114.59**

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO


ITEM	1.18	LAVADO DE SUPERFICIE INCLUYE ACIDO MURIATICO (MUROS EXTERIORES)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
BAÑOS INTERNOS		1.60	2.04	5.00	16.32	26.00
		2.36	2.05	2.00	9.68	

OBSERVACIONES:	Subtotal	26.00
	TOTAL	**26.00**

ITEM	1.19	CABALLETE FIBROCEMENTO	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	8				8.00	8.00

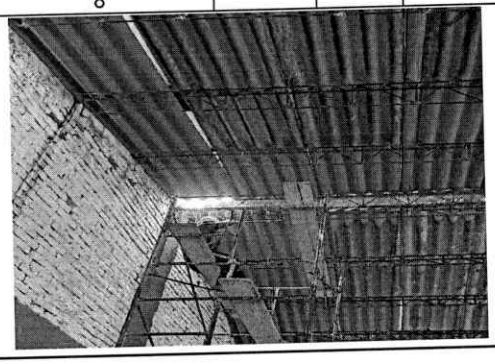

OBSERVACIONES:	Subtotal	8.00
	TOTAL	**8.00**

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.20	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
TUBERIA SANITARIA 2"	85.75	0.40	0.50		17.15	32.07
CAJAS INSPECCION	0.8	0.80	0.80	4.00	2.05	
TUBERIA SANITARIA 4"	47.22	0.40	0.50		9.44	
TUBERIA PVC 1/2"	85.75	0.2	0.20		3.43	



OBSERVACIONES:	Subtotal	32.07
	TOTAL	**32.07**

ITEM	1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PTO SIFON 4" INCLUYE CODO Y TEE	UNIDAD	PTO	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				8.00	8.00	8.00

OBSERVACIONES:	Subtotal	8.00
	TOTAL	**8.00**

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 4"	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	47.22				47.22	47.22



OBSERVACIONES:	Subtotal	47.22
	TOTAL	47.22

ITEM	1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				1.00	1.00	1.00



OBSERVACIONES:	Subtotal	1.00
	TOTAL	1.00

ITEM	1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				2.00	2.00	2.00

OBSERVACIONES:	Subtotal	2.00
	TOTAL	2.00


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	1.26	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 10 KM	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA	

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
EXCAVACIÓN	381.95		0.30		114.59	214.98
MESONES				43.10	43.10	
CONCRETO PISO	381.95		0.15		57.29	

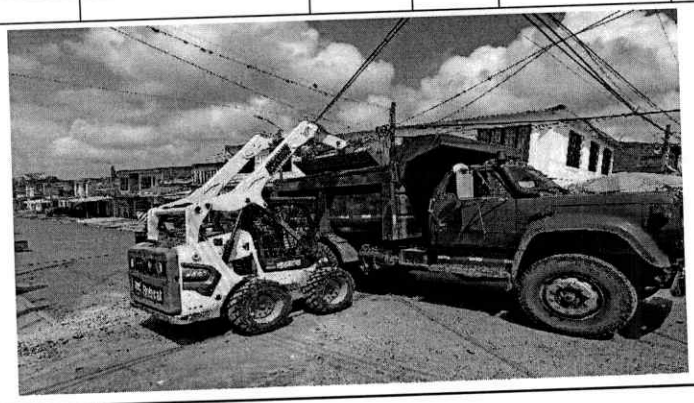


OBSERVACIONES:	Subtotal	214.98
	TOTAL	214.98

2. PABELLON 2

ITEM	2.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA	

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	25	19.30		20%	96.50	96.50

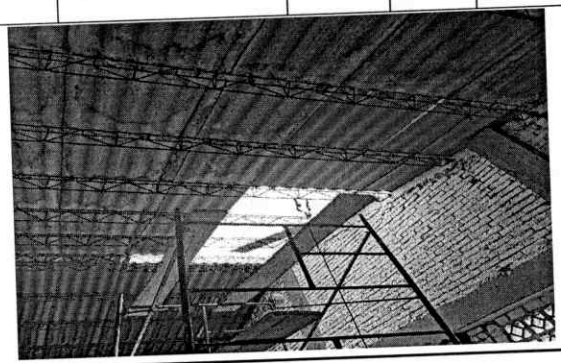

OBSERVACIONES:	Subtotal	96.50
	TOTAL	96.50


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA


Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	1.2	0.92		2.00	2.21	22.41
	2.44	0.92		9.00	20.20	

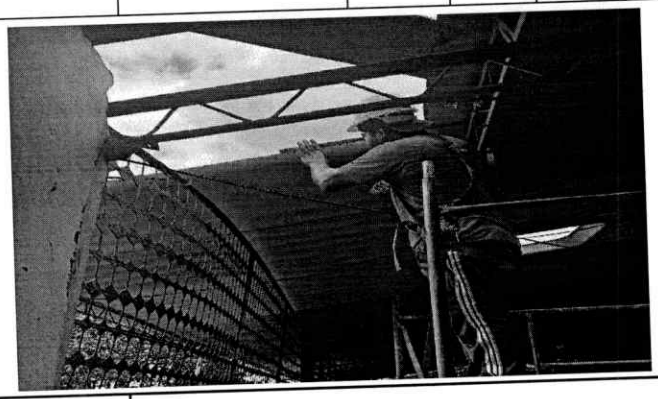

OBSERVACIONES:	Subtotal	22.41
	TOTAL	22.41

ITEM	2.4	CABALLETE FIBROCEMENTO	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	2				2.00	2.00

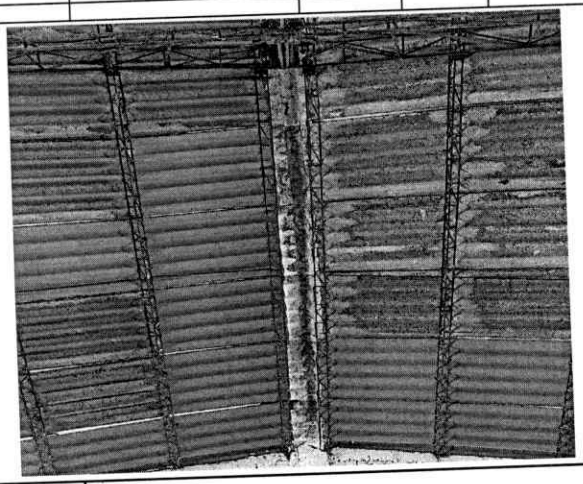

OBSERVACIONES:	Subtotal	2.00
	TOTAL	2.00

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

3. PABELLON 3

ITEM	3.1	RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO, AJUSTE, LIMPIEZA Y SELLAMIENTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
PABELLON 3	25	19.30		20%	96.28	96.28
					Subtotal	96.28
					TOTAL	**96.28**

OBSERVACIONES:

ITEM	3.2	SUMINISTRO E INSTALACION TEJA FIBRO-CEMENTO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
PABELLON 3	1.2	0.92		2.00	2.21	4.45
	2.44	0.92		1.00	2.24	
					Subtotal	4.45
					TOTAL	**4.45**

OBSERVACIONES:

ITEM	3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS + ACCESORIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				2.00	2.00	2.00
					0.00	



	Subtotal	2.00
	TOTAL	**2.00**

OBSERVACIONES:

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL + ACCESORIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				2.00	2.00	2.00
					0.00	

OBSERVACIONES:	Subtotal	2.00
	TOTAL	**2.00**

ITEM	3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				5.00	5.00	5.00
					0.00	



OBSERVACIONES:	Subtotal	5.00
	TOTAL	**5.00**

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA


CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

5. ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	5.1	DEMOLICIÓN MESON EN CONCRETO + MURO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	1.05	1.05		1.00	1.10	63.53
	1.81	1.05		6.00	11.40	
	3.8	1.06		9.00	36.25	
	4.18	1.01		1.00	4.22	
	4.05	1.00		1.00	4.05	
	1	1.05		1.00	1.05	
	5.2	1.05		1.00	5.46	

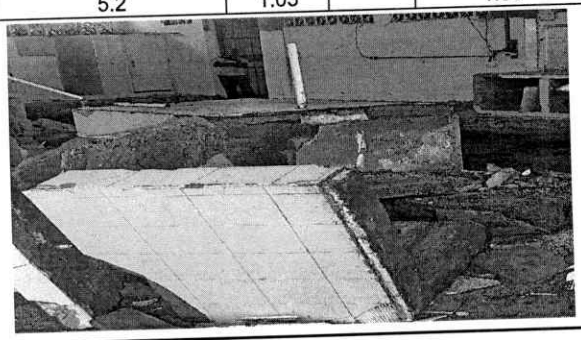

OBSERVACIONES:	Subtotal	63.53
	TOTAL	63.53

ITEM	5.2	DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO+ MORTERO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	N°ELEMENTOS	Ancho	Alto	Cantidad		
		1.05	0.40	1.00	0.42	10.55
		1.81	0.40	6.00	4.34	
		4.18	0.40	1.00	1.67	
		4.05	0.40	1.00	1.62	
		1.05	0.40	1.00	0.42	
		5.20	0.40	1.00	2.08	



OBSERVACIONES:	Subtotal	10.55
	TOTAL	10.55


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.3	DEMOLICIÓN REPELLO MURO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA	
	Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
			1.05	0.40	1.00	0.42	46.31
			1.81	0.40	6.00	4.34	
			4.18	0.40	1.00	1.67	
			4.05	0.40	1.00	1.62	
			1.05	0.40	1.00	0.42	
			5.20	0.40	1.00	2.08	
			2.18	2.32	2.00	10.12	
			2.60	1.32	1.00	3.43	
			1.05	1.00	1.00	1.05	
			1.81	1.00	6.00	10.86	
			4.05	1.00	1.00	4.05	
			1.05	1.00	1.00	1.05	
			5.20	1.00	1.00	5.20	



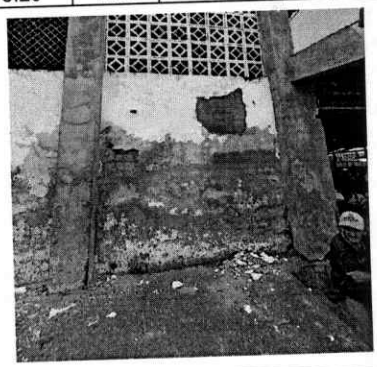

OBSERVACIONES:	Subtotal	46.31
	TOTAL	46.31


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.4	REPELLO MURO 1:3 IMPERMEABILIZADO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Caras	Ancho	Alto	Cantidad		
		1.05	0.40	1.00	0.42	46.31
		1.81	0.40	6.00	4.34	
		4.18	0.40	1.00	1.67	
		4.05	0.40	1.00	1.62	
		1.05	0.40	1.00	0.42	
		5.20	0.40	1.00	2.08	
		2.18	2.32	2.00	10.12	
		2.60	1.32	1.00	3.43	
		1.05	1.00	1.00	1.05	
		1.81	1.00	6.00	10.86	
		4.05	1.00	1.00	4.05	
		1.05	1.00	1.00	1.05	
		5.20	1.00	1.00	5.20	

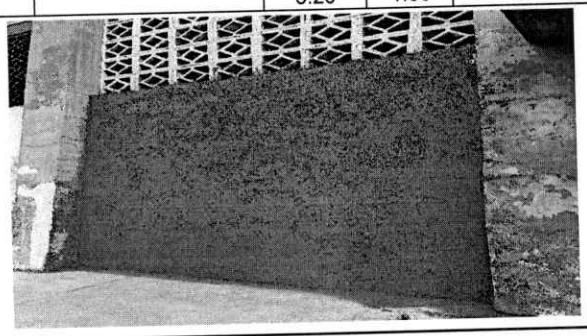

OBSERVACIONES:	Subtotal	46.31
	TOTAL	46.31


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.5	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA	

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
CARA CRA8	20.54		2.20	2.00	90.38	211.06
CARA PABELLON 2	19.81		2.20	1.00	43.58	
CARA COSTADO ESTADIO	19.41		2.20	1.00	42.70	
CARA CALLE 9 INTERNA	17.78		2.20	1.00	39.12	
CARA CALLE 9 EXTERNA	17.78		2.20	1.00	39.12	
AREA DE REJAS Y PUERTAS		-1.90	2.50		-4.75	
		-2.10	2.60		-5.46	
		-1.55	2.60	4.00	-16.12	
		-2.28	2.55	2.00	-11.63	
		-2.10	1.40	2.00	-5.88	

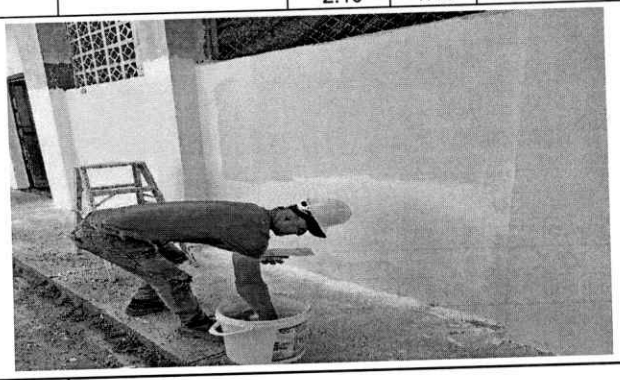


OBSERVACIONES:	Subtotal	211.06
	TOTAL	211.06

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.6	ACRILICA MURO [3M]	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA		
	Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	CARA CRA8	20.54		4.00	1.00	82.16	332.30
	CARA PABELLON 2	19.81		4.00	1.00	79.24	
	CARA COSTADO ESTADIO	19.41		4.00	1.00	77.64	
	CARA CALLE 9 INTERNA	17.78		4.00	1.00	71.12	
	AREA TRIANGULO	31.52			2.00	63.04	
	AREA DE REJAS Y PUERTAS		-1.90	2.50		-4.75	
			-2.10	2.60		-5.46	
			-1.55	2.60	1.00	-4.03	
			-2.28	2.55	1.00	-5.81	
			-2.10	2.10	1.00	-4.41	
			-2.08	1.30	1.00	-2.70	
			-2.12	1.30	1.00	-2.76	
			-2.13	1.30	1.00	-2.77	
			-2.16	1.28	1.00	-2.76	
			-2.10	1.28	1.00	-2.69	
			-2.16	1.28	1.00	-2.76	

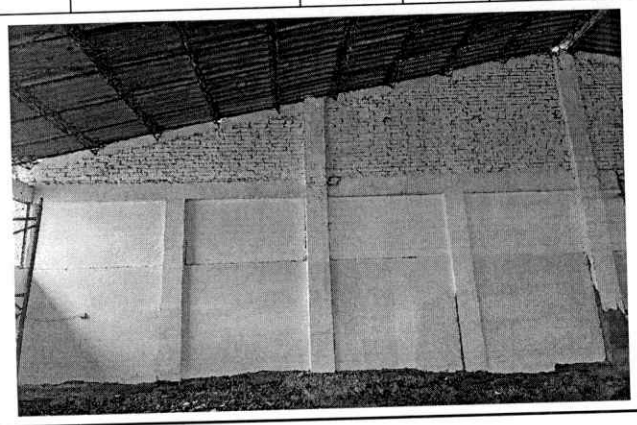

OBSERVACIONES:	Subtotal	332.30
	TOTAL	332.30


OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA FIBRO CEMENTO # 6	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA


Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
PABELLON 1 CARNES				1.00	1.00	7.00
PABELLON 2				5.00	5.00	
PABELLON 3				1.00	1.00	

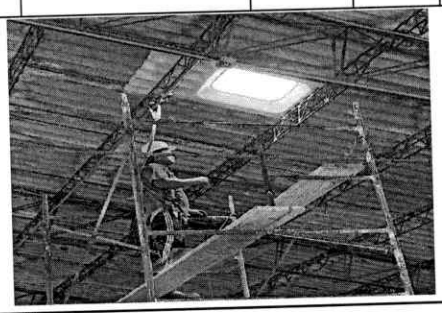

OBSERVACIONES:	Subtotal	7.00
	TOTAL	7.00

ITEM	5.80	CORTE DE TUBO EN ACERO 2"	UNIDAD	PTO	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				66.00	66.00	66.00

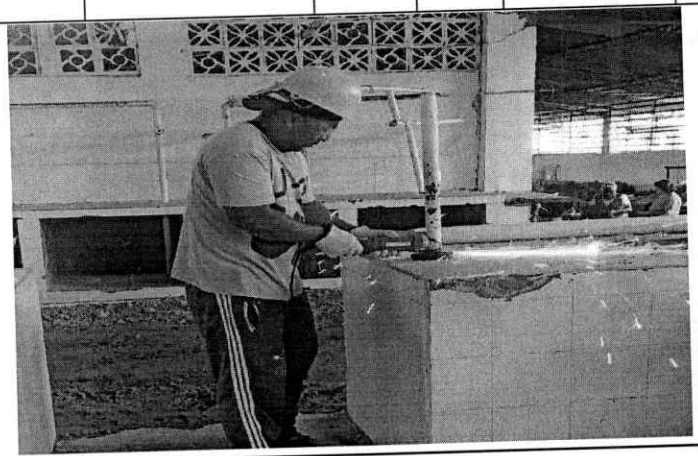

OBSERVACIONES:	Subtotal	66.00
	TOTAL	66.00

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.14	REPELLO MURO 1:3	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
					0.00	21.21
INGRESO PRINCIPAL	2.3			1.00	2.30	
INGRESO PRINCIPAL	2.67			2.00	5.34	
INGRESO CARRERA 8	2.62			2.00	5.24	
INGRESO CARRERA 8	1.52			1.00	1.52	
INGRESO CALLE 9	2.65			2.00	5.30	
INGRESO CALLE 9	1.51			1.00	1.51	



OBSERVACIONES:	Subtotal	21.21
	TOTAL	21.21

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.15	ESTUCO PLASTICO MURO (PASTA) (FILO)	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
INGRESO PRINCIPAL	2.3			1.00	2.30	143.4
INGRESO PRINCIPAL	2.67			2.00	5.34	
INGRESO CARRERA 8	2.62			2.00	5.24	
INGRESO CARRERA 8	1.52			1.00	1.52	
INGRESO CALLE 9	2.65			2.00	5.30	
INGRESO CALLE 9	1.51			1.00	1.51	
COLUMNAS CRA 8 INT Y EXT	2.2			12.00	26.40	
FILO SUPERIOR COSTADO K8	13.35			1.00	13.35	
COLUMNAS CALLE 9 INT Y EXT	2.2			12.00	26.40	
FILO SUPERIOR COSTADO CALLE 9	14.97			1.00	14.97	
FILO SUPERIOR COSTADO ESTADIO	2.1			7.00	14.70	
COLUMNAS COSTADO ESTADIO	2.2			12.00	26.40	




	Subtotal	143.40
	TOTAL	**143.40**

OBSERVACIONES:

ITEM	5.16	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UNIDAD	PTO	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				22.00	22.00	22.00

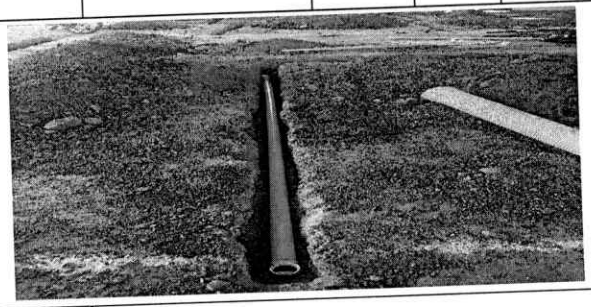


	Subtotal	22.00
	TOTAL	**22.00**


OBSERVACIONES:

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC


MEMORIAS DE CALCULO

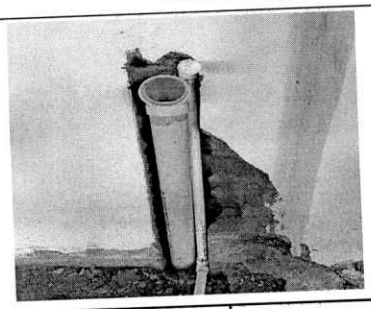

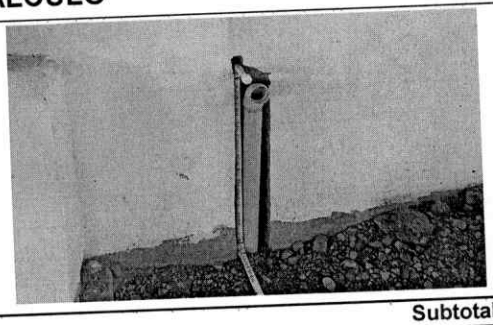

	Subtotal	22.00
OBSERVACIONES:	TOTAL	**22.00**

ITEM	5.18	TUBERIA PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA	
Descripción	Dimensiones					SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad			
	85.75					85.75	85.75
						0.00	

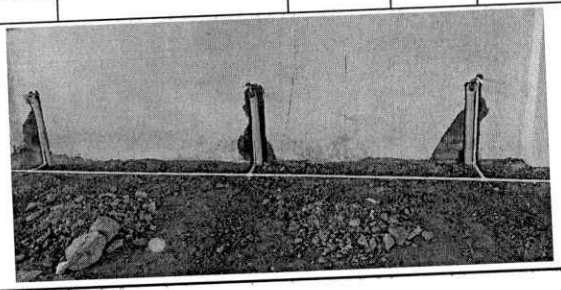

	Subtotal	85.75
OBSERVACIONES:	TOTAL	**85.75**

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.19	TUBERIA SANITARIA PVC 2" INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	ML	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA


Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
	3.72			2.00	7.44	67.0
	3.8			3.00	11.40	
	3.3			4.00	13.20	
	3.44			4.00	13.76	
	5.29			1.00	5.29	
	3.73			3.00	11.19	
	4.74			1.00	4.74	



OBSERVACIONES:	Subtotal	67.00
	TOTAL	**67.00**

ITEM	5.20	CAJA DE INSPECCION 80X80 CM (CONCRETO)	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				4.00	4.00	4.00

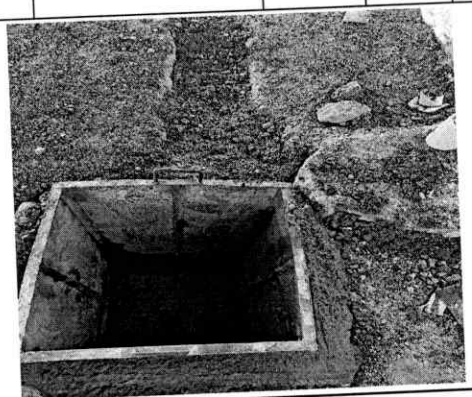

OBSERVACIONES:	Subtotal	4.00
	TOTAL	**4.00**


ITEM	5.23	ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS (2M)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
CARA CRA8	20.54		4.00	1.00	82.16	120.60
CARA CALLE 9 EXTERNA	18.29		4.00	1.00	73.16	
REJAS COSTADO EXTERNO		-1.55	2.60	2.00	-8.06	
PUERTA ENTRADA PRINCIPAL		-2.28	2.55	1.00	-5.81	
CORTINA		-2.10	2.10	1.00	-4.41	
REJAS EN MALLA CALLE 9		-2.08	1.30	1.00	-2.70	
		-2.12	1.30	1.00	-2.76	
		-2.13	1.30	1.00	-2.77	
REJAS EN MALLA CRA 8		-2.16	1.28	1.00	-2.76	
		-2.10	1.28	1.00	-2.69	
		-2.16	1.28	1.00	-2.76	

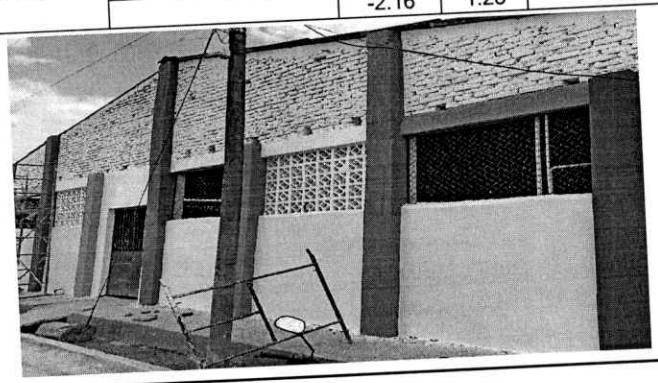

	Subtotal	120.60
	TOTAL	120.60

OBSERVACIONES:

ITEM	5.29	REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA	
	Descripción		Dimensiones			SUB-TOTAL	Cant. Total
		Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
					18.00	18.00	18.00
						Subtotal	18.00
						TOTAL	18.00

OBSERVACIONES:

OBRAS DE ADECUACIÓN Y ENLUCIMIENTO EN LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA

CONTRATO DE OBRA	1010-12-004-502-2025	CONTRATISTA:	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MEMORIAS DE CALCULO

ITEM	5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO + ACCESORIOS	UNIDAD	UND	UBICACIÓN	MIRANDA CAUCA

Descripción	Dimensiones				SUB-TOTAL	Cant. Total
	Largo	Ancho	Alto	Cantidad		
				1.00	1.00	1.00



	Subtotal	1.00
OBSERVACIONES:	TOTAL	1.00

Vo,
Bo.
SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: VICTORIA ANDREA PIZARRO
Cargo: Secretaria de infraestructura

Vo, Bo.
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: HECTOR MANUEL MINA ZAPATA
Cargo: Rep.Legal MINA INGENIERIA SAS ZOMAC

MINA
INGENIERÍA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Luzmileidy Vásquez Orozco, identificado con cédula de ciudadanía No. 48.679.097, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Luzmileidy Vásquez O

Luzmileidy Vásquez Orozco

CC. 48.679.097

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERÍA S.A.S.
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Julián Vázquez Orozco, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.107.045.687, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Julian Vasquez

Julián Vázquez Orozco

CC. 1.107.045.687

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Camilo Marcos Montaña Salina, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.347.359, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Camilo Montaña

Camilo Marcos Montaña Salina

CC. 10.347.359

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Andrés Felipe palacios muñoz, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.059.062.635, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Andres Palacios

Andrés Felipe palacios muñoz

CC. 1.059.062.635

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERÍA S.A.S.
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Dairo Valencia Baicue, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.002.993.955, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Dairo Valencia

Dairo Valencia Baicue

CC. 1.002.993.955

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERÍA S.A.S.
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Javier Estiver ipia poscue, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.114.872.192, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Javier E. Ipia

Javier Estiver ipia poscue

CC. 1.114.872.192

Trabajador

Héctor Mina

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERÍA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Justiniano oca largo, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.300.965, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Justiniano oca largo

Justiniano oca largo

CC. 94.300.965

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERÍA S.A.S
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Sebastián Alejandro Burbano Martínez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.058.667.101, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Sebastian Burbano

Sebastián Alejandro Burbano Martínez

CC. 1.058.667.101

Trabajador

Nestor Mina

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERÍA S.A.S.
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Jhon Jairo palacios Cataño, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.113.515.779, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Jhon J. Palacios

Jhon Jairo palacios Cataño

CC. 1.113.515.779

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERÍA S.A.S.
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Misael Vásquez Viscue, identificado con cédula de ciudadanía No.6.298.731, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Misael Vásquez

Misael Vásquez Viscue

CC. 6.298.731

Trabajador

Héctor Mina

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

MINA
INGENIERIA S.A.S.
ZOMAC
NIT 901.509.369-7

NIT 901.509.369-7
MIRANDA – CAUCA

PAZ Y SALVO

La empresa MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC, identificada con NIT 901.509.369-7, con domicilio en el municipio de Miranda, hace constar que:

El señor Carlos Eduardo Vicuña Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.347.248, quien ha prestado sus servicios a esta empresa en calidad de trabajador, se encuentra a paz y salvo con MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC a la fecha de expedición del presente documento.

Lo anterior en razón a que se han cancelado en su totalidad los valores correspondientes a salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y demás conceptos laborales derivados de la relación contractual, sin que exista obligación pendiente alguna a favor del trabajador.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines que estime convenientes, en el municipio de Miranda, al 22 de diciembre de 2025.

Carlos Eduardo Vicuña

Carlos Eduardo Vicuña Ramírez

CC. 10.347.248

Trabajador

MINA INGENIERÍA S.A.S. ZOMAC

NIT 901.509.369-7

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1929013188	9494745603	E	2025/12/16	2025/11/14	BANCOLOMBIA	0	$3,486,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$1,731,600	$0	$0	$1,731,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$144,300	$0	$0	$144,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,298,700	$0	$0	$1,298,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$288,600	$0	$0	$288,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$816,400	$0	$0	$816,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	13	$816,400	$0	$0	$816,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$469,300	$0	$0	$469,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	13	$469,300	$0	$0	$469,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$469,300	$0	$0	$469,300
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$72,200	$0	$0	$72,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$180,500	$0	$0	$180,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$108,300	$0	$0	$108,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$36,100	$0	$0	$36,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$36,100	$0	$0	$36,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$36,100	$0	$0	$36,100
TOTAL				13	$3,486,600	$0	$0	$3,486,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901509369	7	MINA INGENIERIA SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 6 No 9b-15	MIRANDA-CAUCA	8626385	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MIGUEL GRANJA (13 Afiliados)						$10,818,600	$1,731,600			$11,720,150	$469,300			$11,720,150	$469,300			$11,720,150	$816,400		$0	$0
Centro de Trabajo: MIGUEL GRANJA (13 Afiliados)						**$10,818,600**	**$1,731,600**			**$11,720,150**	**$469,300**			**$11,720,150**	**$469,300**			**$11,720,150**	**$816,400**		$0	$0
Ciudad: MIRANDA Depto: CAUCA (13 Afiliados)						**$10,818,600**	**$1,731,600**			**$11,720,150**	**$469,300**			**$11,720,150**	**$469,300**			**$11,720,150**	**$816,400**		$0	$0
1	CC	1114872192	IPIA JAVIER	230201	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
2	CC	1059845672	LIS LIDIA	230301	19	$901,550	$144,300	EPSIC3	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
3	CC	10347359	MONTAÑA CAMILO	230201	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
4	CC	1062283580	MUÑOZ KEINER	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC62	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
5	CC	94300965	OCA JUSTINIANO	230301	19	$901,550	$144,300	EPSIC3	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
6	CC	1114876241	ORDOÑEZ JADER	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC62	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
7	CC	1059062635	PALACIOS ANDRES	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC62	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
8	CC	10345939	VACCA HECTOR	230301	19	$901,550	$144,300	EPS018	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
9	CC	1002993955	VALENCIA DAIRO	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
10	CC	1107045687	VASQUEZ JULIAN	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
11	CC	48679097	VASQUEZ LUZMILEIDY	230301	19	$901,550	$144,300	ESSC62	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
12	CC	6298731	VASQUEZ MISAEL		0	$0	$0	ESSC62	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
13	CC	10347248	VICUÑA CARLOS	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF14	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
Total			**Afiliados(13)**			**$10,818,600**	**$1,731,600**			**$11,720,150**	**$469,300**			**$11,720,150**	**$469,300**			**$11,720,150**	**$816,400**		$0	$0
