2286

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

INFORME FINAL DE OBRA DEL CONTRATISTA

Mz A Casa 10 Urb. El Paraíso (Barrio La Granja) Celular: 3214892572
E-mail: consorcioarauca2425@gmail.com; Telefax: 607-885 2015
Arauca - Arauca

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

INFORME FINAL DE OBRA

ALCALDÍA DE ARAUCA

Contrato de Obra No. 000-001 de 2025

CONTRATISTA

CONSORCIO ARAUCA 2024
R/ LEIDY PATRICIA DIAZ BARRIENTOS
N.I.T. 901.902.630-1

OBJETO

"RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

Arauca, Arauca
DICIEMBRE 2025

Mz A Casa 10 Urb. El Paraíso (Barrio La Granja) Celular: 3214892572
E-mail: consorcioarauca2425@gmail.com; Telefax: 607-885 2015
Arauca - Arauca

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

Contenido

INTRODUCCION 4

1.0 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5

2.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO 7

3.0 ALCANCE 8

4.0 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 8

4.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS 8

4.2 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES 9

4.3 POLIZAS 9

- POLIZAS INICIALES 9
- POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO 9
- POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO. 01 Y PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION NO. 01 10
- POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN CORRECION DE NUMERO DE ACTA DE REINICIO No. 1 10
- POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO NO. 01 10

4.4 VINCULACIÓN DEL PERSONAL 11

5.0 ASPECTOS TECNICOS 13

5.1 CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES 13

5.2 CANTIDADES DE OBRA ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No. 01 14

5.3 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 14

5.4 AVANCE DE LA OBRA 15

5.5 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS 16

5.6 ACTIVIDADES SG-SST 21

5.7 COMPONENTE AMBIENTAL 21

6.0 ASPECTOS FINANCIEROS 21

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 21

6.2 RELACIÓN DE GASTOS DE ANTICIPO 22

7.0 CONCLUSIONES 23

8.0 ANEXOS 24

Tabla 1. Ficha técnica 5
Tabla 2. ACTOS ADMINISTRATIVOS 8
Tabla 3. LISTADO DEL PERSONAL MES AGOSTO 2025 11
Tabla 4. LISTADO DEL PERSONAL MES SEPTIEMBRE DE 2025 12
Tabla 5. LISTADO DEL PERSONAL MES OCTUBRE DE 2025 12
Tabla 6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 13

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

INTRODUCCION

El mal estado de las vías urbanas en el municipio de Arauca afecta directamente la movilidad y calidad de vida de sus ciudadanos. Un análisis detallado de la infraestructura vial revela un alto índice de deterioro, de los pavimentos flexibles que presentan diversas patologías. Entre las más comunes se encuentran grietas longitudinales, huecos, baches, y el deterioro conocido como "piel de cocodrilo", "ojo de pescado" y "descascaramiento". Este deterioro constante, causado por la inadecuada utilización y la falta de mantenimiento, compromete significativamente la seguridad y funcionalidad de la red vial del municipio.

Ante esta situación, el municipio de Arauca celebró el contrato de Obra No. 000-001 de 2025, con el CONSORCIO ARAUCA 2024, con el fin de realizar la recuperación de la malla vial urbana en los sectores críticos del municipio.

Teniendo en cuenta las actividades de obra realizadas por el CONSORCIO ARAUCA 2024, relacionadas con el contrato de Obra No. 000-001 de 2025, suscrito con la alcaldía de Arauca, cuyo objeto es "RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", se presenta el siguiente informe final de obra a corte del 17 de octubre del 2025.

Para el desarrollo del contrato, la alcaldía de Arauca, designó una Interventoría Externa mediante Contrato de Interventoría No. 181 de 2025, a nombre del CONSORCIO INTERVENTORÍA REPARCHEO 2024, cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO "RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

El presente informe contempla los aspectos administrativos, técnicos y financieros, condiciones contractuales, relación del personal empleado entre, así como las actividades ejecutadas por el contratista de obra, para el cobro final del contrato de obra.

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

1.0 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la adjudicación del contrato, se procedió a la suscripción del contrato de obra No. 001 de 2025 el día VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025 entre el señor Alcalde del Municipio de Arauca y la firma contratista **CONSORCIO ARAUCA 2024** representado legalmente por **LEIDY PATRICIA DIAZ BARRIENTOS**, el cual tiene por objeto "**RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**", con un plazo de ejecución de tres (03) meses y un valor de **NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE $ (962,859,651.82) M/CTE.**

El contrato de Obra No. 000-001 de 2025, presenta la siguiente información contractual:

Tabla 1. Ficha técnica

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ARAUCA
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
NÚMERO:	001 DE 2025
OBJETO:	"RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL MEDIANTE REPARCHEO EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARAUCA 2024 – R/ LEIDY PATRICIA DIAZ BARRIENTOS
NIT/NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901.902.630-1
INTERVENTORIA EXTERNA:	CONSORCIO INTERVENTORIA REPARCHEO 2024 R/ KAREN BEATRIZ ARENIZ MONTEALEGRE
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE $ (962,859,651.82).
VALOR DEL ANTICIPO:	40% - TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (385.143.860,73).
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE 2025

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	TRES (03) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO:	TRES (03) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TRES (03) DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION No. 1:	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE ACTA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1:	VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
FECHA DE ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1:	VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No. 1:	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2025
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 1:	VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	DOS (02) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION N° 2:	VEINTICINCO DE (25) DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 2:	DIEZ DE (10) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No.1:	VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE 2025
VALOR ADICIONAL No.1:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($481.429.376,83) M/CTE.
VALOR INICIAL + VALOR ADICIONAL No. 1:	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO ($1.444.289.028,65)
PLAZO SEGÚN ADICIONAL No.1	UN (01) MES
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	DIECISIETE (17) DE OCTUBRE DE 2025

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

2.0 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El contrato se lleva a cabo, en los sectores críticos de las vías urbanas del Municipio de Arauca.

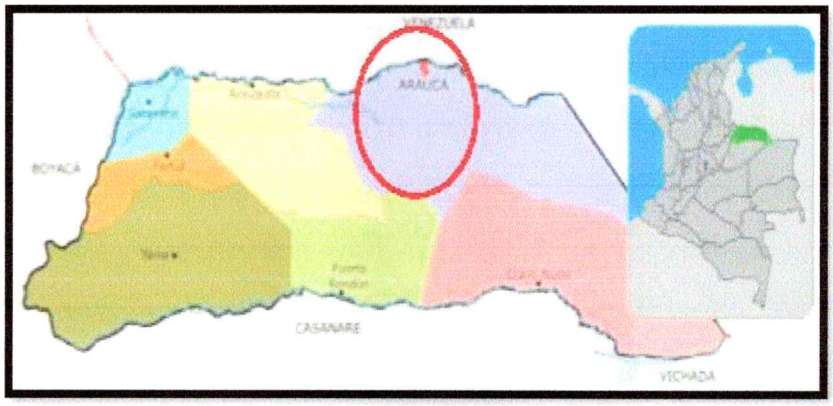


Figura 1. Localización del municipio de Arauca en el departamento de Arauca

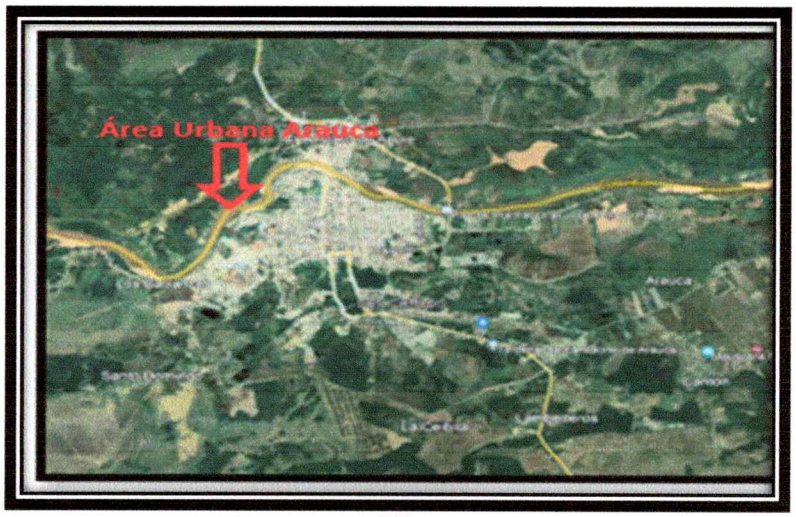


Figura 2. Localización del proyecto en el municipio de Arauca

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

3.0 ALCANCE

Se contempla inicialmente la recuperación mediante Reparcheo de sectores críticos del Municipio de Arauca con un alcance de 2.578 m2 de pavimento flexible.

Asi mismo, a la cantidad anteriormente mencionada de acuerdo con el acta de adicional en valor y plazo No. 1 se adiciono, un área de 1.323 m2 de reparcheo con pavimento flexible, en puntos críticos ubicados en zonas de constante flujo vehicular del municipio de Arauca para un total de 3.901 m2 de reparcheo, permitiendo la movilidad de las zonas a intervenir.

4.0 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2025, con corte al 17 de octubre de 2025, se han realizado los siguientes actos administrativos:

Tabla 2. ACTOS ADMINISTRATIVOS

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO
03/02/2025	ACTA DE INICIO	INICIO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATCTUALES
22/04/2025	SUSPENSION No. 1	NO DISPONIBLIDAD DE MATERIAL DE ASFALTO
22/05/2025	PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	AUN NO HA SIDO SUPERADA LAS CAUSAS QUE GENERARON LAS SUSPENSION.
20/06/2025	PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1	CONDICIONES METEOROLOGICAS AFECTAN LA EJECUCION DE ACATIVIDADES
22/07/2025	PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No. 1	CONDICIONES METEOROLOGICAS AFECTAN LA EJECUCION DE ACATIVIDADES
22/08/2025	REINICIO No. 1	SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA SUSPENSION No. 1
25/08/2025	ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No.1	ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO PERMITIRÁ ABARCAR UN MAYOR NÚMERO DE HUECOS IDENTIFICADOS Y PLASMADO INICIALMENTE EN LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROYECTO, ASEGURANDO QUE LOS RECURSOS INVERTIDOS LOGREN UN IMPACTO MÁS SOSTENIBLE EN EL TIEMPO.

25/09/2025	FECHA DE ACTA DE SUSPENSION N° 2:	NO DISPONIBLIDAD DE MATERIAL DE ASFALTO
10/10/2025	FECHA DE ACTA DE REINICIO No. 2:	SE HAN SUPERADO LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA SUSPENSION No. 2

4.2 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto multas o sanciones al contratista.

4.3 POLIZAS

- **POLIZAS INICIALES**

Pólizas iniciales que amparan el contrato de Obra No. 001 de 2025, expedidas el 28 de enero de 2025.

AMPARO	PÓLIZA Nº	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	475 47 994000069479	28/01/2025 – 28/10/2025	$ 96.285.966,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANTICIPO		28/01/2025 – 28/10/2025	$ 385.143.861,00	
PRESTACIONES SOCIALES		28/01/2025 – 28/04/2028	$ 48.142.983,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		28/04/2025 – 28/04/2028	$ 96.285.966,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	475 74 994000012092	28/01/2025 – 29/04/2025	$ 284.700.000,00	

- **POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO**

Pólizas iniciales que amparan el contrato de Obra No. 001 de 2025, fueron actualizadas según acta de inicio y se expidieron el día 03 de febrero de 2025.

AMPARO	PÓLIZA Nº	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	475 47 994000069479	03/02/2025 – 03/11/2025	$ 96.285.966,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANTICIPO		03/02/2025 – 03/11/2025	$ 385.143.861,00	
PRESTACIONES SOCIALES		03/02/2025 – 04/05/2028	$ 48.142.983,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		29/04/2025 – 28/04/2028	$ 96.285.966,00	

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	475 74 994000012092	03/02/2025 – 05/05/2025	$ 284.700.000,00	

- **POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE SUSPENSION NO. 01 Y PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSION NO. 01**

Pólizas iniciales que amparan el contrato de Obra No. 001 de 2025, fueron actualizadas según acta de suspensión no. 01 y prorroga no. 01 a la suspensión no. 01 y se expidieron el día 23 de mayo de 2025.

AMPARO	PÓLIZA Nº	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	475 47 994000069479	03/02/2025 – 04/01/2026	$ 96.285.966,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANTICIPO		03/02/2025 – 04/01/2026	$ 385.143.861,00	
PRESTACIONES SOCIALES		03/02/2025 – 04/07/2028	$ 48.142.983,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		03/07/2025 – 03/07/2028	$ 96.285.966,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	475 74 994000012092	05/05/2025 – 05/07/2025	$ 284.700.000,00	

- **POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN CORRECION DE NUMERO DE ACTA DE REINICIO No. 1**

Pólizas iniciales que amparan el contrato de Obra No. 001 de 2025, fueron actualizadas según acta de prorroga No. 02, prorroga No. 03 a la suspensión No. 01 y acta de reinicio No. 1 con la cual se corrige el número del acta de reinicio, corresponde a acta de reinicio no. 01 se expidieron el día 03 de septiembre de 2025.

AMPARO	PÓLIZA Nº	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	475 47 994000069479	03/02/2025 – 10/04/2026	$ 96.285.966,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANTICIPO		03/02/2025 – 10/04/2026	$ 385.143.861,00	
PRESTACIONES SOCIALES		03/02/2025 – 10/10/2028	$ 48.142.983,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		02/09/2025 – 02/09/2028	$ 96.285.966,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	475 74 994000012092	06/09/2025 – 10/10/2025	$ 284.700.000,00	

- **POLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO NO. 01**

Pólizas iniciales que amparan el contrato de Obra No. 001 de 2025, fueron actualizadas según adicional de valor y plazo no. 01 y se expidieron el día 02 de septiembre de 2025.

AMPARO	PÓLIZA Nº	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA

CUMPLIMIENTO	475 47 994000069479	03/02/2025 – 10/04/2026	$ 144.428.903,00	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ANTICIPO		03/02/2025 – 10/04/2026	$ 577.715.612,00	
PRESTACIONES SOCIALES		03/02/2025 – 10/10/2028	$ 72.214.452,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA		09/10/2025 – 09/10/2028	$ 96.285.966,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	475 74 994000012092	06/09/2025 – 10/10/2025	$ 284.700.000,00	

- **PÓLIZA SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL.**

La póliza N° 475-47-994000069479 de la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.** según acta de recibo final del contrato de servicios no. 000-001 de 2025, tiene fecha de expedición del (03) de diciembre de 2025 y aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica Municipal,

PÓLIZA N° 475-47-994000069479	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$144,428,903,00	03/02/2025	25/04/2026
ANTICIPO	$577,715,612,00	03/02/2025	25/04/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$72,214,452,00	03/02/2025	25/10/2028
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$144,428,903,00	09/10/2025	09/10/2028

4.4 VINCULACIÓN DEL PERSONAL

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo con el alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos.

Tabla 3. LISTADO DEL PERSONAL MES AGOSTO 2025

N°	NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS	NOMBRRES	CARGO	FECHA	
					INGRESO	RETIRO
1	96.191.543	DIAZ	NELSON ARLEY	ING. RESIDENTE	22-ago-25	ACTIVO
2	1.116.798.021	DIAZ BARRIENTOS	LEIDY PATRICIA	AUX ADTIVO / RL	03-feb-25	ACTIVO
3	88.033.392	MOLIN MOJICA	JOSE RODOLFO	DIRECTOR DE OBRA	22-ago-25	ACTIVO
4	10.742.514	MINA BOLAÑOS	WILMAR	OBRERO	22-ago-25	ACTIVO
5	1.116.811.157	EREU AREVALO	YESICA MARITZA	SEÑALIZADORA VIAL	25-ago-25	ACTIVO
6	13.841.717	HOYOS CAMPOS	FREDYS	OBRERO	25-ago-25	ACTIVO

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

Tabla 4. LISTADO DEL PERSONAL MES SEPTIEMBRE DE 2025

N°	NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS	NOMBRRES	CARGO	FECHA	
					INGRESO	RETIRO
1	96.191.543	DIAZ	NELSON ARLEY	ING. RESIDENTE	22-ago-25	ACTIVO
2	1.116.798.021	DIAZ BARRIENTOS	LEIDY PATRICIA	AUX ADTIVO / RL	03-feb-25	ACTIVO
3	88.033.392	MOLIN MOJICA	JOSE RODOLFO	DIRECTOR DE OBRA	22-ago-25	ACTIVO
4	10.742.514	MINA BOLAÑOS	WILMAR	OBRERO	22-ago-25	ACTIVO
5	1.116.811.157	EREU AREVALO	YESICA MARITZA	SEÑALIZADORA VIAL	25-ago-25	ACTIVO
6	13.841.717	HOYOS CAMPOS	FREDYS	SEÑALIZADOR VIAL	25-ago-25	ACTIVO
7	1.108.763.468	CAMPOS BECERRA	LUIS ALEXANDER	OBRERO	09-sep-25	ACTIVO
8	17.596.866	ESPINOSA RESTREPO	OSCAR CAMILO	OBRERO	09-sep-25	ACTIVO
9	17.596.654	GARCIA PEREZ	ALVARO JOSE	OBRERO	10-sep-25	14-sep-25
10	96.192.224	GUALDRON TRUJILLO	ERNESTO	OFICIAL DE OBRA	10-sep-25	ACTIVO
11	1.203.400	RODRIGUEZ GALINDEZ	JOSE MANUEL	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
12	1.151.205.299	CAILE	ELQUIN ALFONSO	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
13	1.117.132.646	PARALES BERNAL	JOSE SEBASTIAN	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
14	1.116.500.026	GALVIS CASADIEGOS	DEINER	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
15	1.116.798.838	BUSTAMANTE FLOREZ	WILLIAM ELIECER	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
16	1.007.167.518	RAMIREZ TORREALBA	LUIS ALBERTO	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
17	5.839.473	SANTAMARIA ALTUVE	EDUIM LEONARDO	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
18	1.116.801.563	BALTA COHETE	GUSTAVO ALBERTO	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
19	1.116.788.160	CAILE	YORDAN	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
20	1.116.785.980	ALVAREZ CATIMAY	DIMAS ENRIQUE	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO
21	1.116.776.164	GUALDRON FUENTES	JULIO ALBERTO	OBRERO	10-sep-25	ACTIVO

Tabla 5. LISTADO DEL PERSONAL MES OCTUBRE DE 2025

RELACION DEL PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025						
N°	NUMERO DE CEDULA	APELLIDOS	NOMBRRES	CARGO	FECHA	
					INGRESO	RETIRO
1	96.191.543	DIAZ	NELSON ARLEY	ING. RESIDENTE	22-ago-25	17-oct-25
2	1.116.798.021	DIAZ BARRIENTOS	LEIDY PATRICIA	AUX ADTIVO / RL	03-feb-25	17-oct-25
3	88.033.392	MOLIN MOJICA	JOSE RODOLFO	DIRECTOR DE OBRA	22-ago-25	17-oct-25
4	10.742.514	MINA BOLAÑOS	WILMAR	OBRERO	22-ago-25	17-oct-25
5	1.116.811.157	EREU AREVALO	YESICA MARITZA	SEÑALIZADORA VIAL	25-ago-25	17-oct-25
6	13.841.717	HOYOS CAMPOS	FREDYS	SEÑALIZADOR VIAL	25-ago-25	07-oct-25
7	1.108.763.468	CAMPOS BECERRA	LUIS ALEXANDER	OBRERO	09-sep-25	08-oct-25
8	17.596.866	ESPINOSA RESTREPO	OSCAR CAMILO	OBRERO	09-sep-25	04-oct-25
9	96.192.224	GUALDRON TRUJILLO	ERNESTO	OFICIAL DE OBRA	10-sep-25	17-oct-25
10	1.203.400	RODRIGUEZ GALINDEZ	JOSE MANUEL	OBRERO	10-sep-25	08-oct-25

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

5.0 ASPECTOS TECNICOS

5.1 CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre el Municipio de Arauca y la firma contratista CONSORCIO ARAUCA 2024 representado legalmente por LEIDY PATRICIA DIAZ BARRIENTOS contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual.

Tabla 6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES			
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTIVIDAD 1. PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	2.578,00	$ 1.564,00	$ 4.031.992,00
1.2	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M	2.733,00	$ 15.424,00	$ 42.153.792,00
1.3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M2	2.578,00	$ 23.569,00	$ 60.760.882,00
1.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	577,00	$ 48.734,00	$ 28.119.518,00
1.5	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	1.188,21	$ 35.081,00	$ 41.683.595,01
				SUBTOTAL	**$ 176.749.779,01**
	ACTIVIDAD 2. REPARCHEO				
2.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRN-0OCRL-1	M2	2.578,00	$ 8.068,00	$ 20.799.304,00
2.2	CARPETA ASFALTICA E=0.07 M (REPARCHEO)	M2	2.578,00	$ 207.257,00	$ 534.308.546,00
2.3	BASE GRANULAR BG-1 INSTALADA Y COMPACTADA PARA REPARCHEO DE VIAS	M3	542,90	$ 380.311,00	$ 206.470.841,90
				SUBTOTAL	**$ 761.578.691,90**
	ACTIVIDAD No.3 CONTROL AMBIENTAL				
3.1	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1,00	$ 10.474.835,63	$ 10.474.835,63
				SUBTOTAL	**$ 10.474.835,63**
	ACTIVIDAD No.4 PERMISOS Y LICENCIAS				
4.1	LICENCIA DE CONSTRUCIÓN	GL	2%	$ 702.817.264,10	$ 14.056.345,28
				SUBTOTAL	**$ 14.056.345,28**
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA					**$ 962.859.651,82**

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

5.2 CANTIDADES DE OBRA ACTUALIZADAS SEGÚN ADICIONAL DE VALOR Y PLAZO No. 01

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDA No.1 PRELIMINARES**					**$ 260.963.795,75**
1.1	Subactividad 1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	3901,00	$ 1.564,00	$ 6.101.164,00
1.2	Subactividad 2	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M	4025,00	$ 15.424,00	$ 62.081.600,00
1.3	Subactividad 3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M2	3901,00	$ 23.569,00	$ 91.942.669,00
1.4	Subactividad 4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	842,00	$ 48.734,00	$ 41.034.028,00
1.5	Subactividad 5	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	1704,75	$ 35.081,00	$ 59.804.334,75
2	**ACTIVIDAD No.2 REPARCHEO**					**$ 1.147.236.081,90**
2,1	Subactividad 1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRN-0OCRL-1	M2	3901,00	$ 8.068,00	$ 31.473.268,00
2,2	Subactividad 2	CARPETA ASFALTICA E=0.07 M.(REPARCHEO)	M2	3901,00	$ 207.257,00	$ 808.509.557,00
2,3	Subactividad 3	BASE GRANULAR BG-1 INSTALADA Y COMPACTADA PARA REPARCHEO DE VIAS	M3	807,90	$ 380.311,00	$ 307.253.256,90
3	**ACTIVIDAD No.3 CONTROL AMBIENTAL**					**$ 15.004.639,63**
3.1	Subactividad 1	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1	$ 15.004.639,63	$ 15.004.639,63
			VALOR TOTAL OBRA FISICA + (AIU)			**$ 1.423.204.517,28**
4	**ACTIVIDAD No.4 PERMISOS Y LICENCIAS**					**$ 21.084.511,37**
4.1	Subactividad 1	LICENCIA DE CONSTRUCIÓN	GLO	2%		$ 21.084.511,37
					SUBTOTAL	**$ 1.444.289.028,65**

5.3 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL


Para el periodo de corte del presente informe, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**ACTIVIDA No.1 PRELIMINARES**					**$ 63.298.273,62**
1.1	Subactividad 1	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	1.029,00	$ 1.564,00	$ 1.609.356,00
1.2	Subactividad 2	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M	950,76	$ 15.424,00	$ 14.664.522,24

1.3	Subactividad 3	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M2	1.029,00	$ 23.569,00	$ 24.252.501,00
1.4	Subactividad 4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD	M3	194,98	$ 48.734,00	$ 9.502.155,32
1.5	Subactividad 5	CARGUE MANUAL TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M3	378,26	$ 35.081,00	$ 13.269.739,06
2	**ACTIVIDAD No.2 REPARCHEO**					**$ 282.753.858,68**
2,1	Subactividad 1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRN-0OCRL-1	M2	1.029,00	$ 8.068,00	$ 8.301.972,00
2,2	Subactividad 2	CARPETA ASFALTICA E=0.07 M.(REPARCHEO)	M2	1.029,00	$ 207.257,00	$ 213.267.453,00
2,3	Subactividad 3	BASE GRANULAR BG-1 INSTALADA Y COMPACTADA PARA REPARCHEO DE VIAS	M3	160,88	$ 380.311,00	$ 61.184.433,68
3	**ACTIVIDAD No.3 CONTROL AMBIENTAL**					
3.1	Subactividad 1	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1		$ 15.004.639,63
			VALOR TOTAL OBRA FISICA + (AIU)			**$ 346.052.132,30**
4	**ACTIVIDAD No.4 PERMISOS Y LICENCIAS**					**$ 13.901.200,00**
4.1	Subactividad 1	LICENCIA DE CONSTRUCIÓN	GLO	2%	7.183.311,37	$ 7.183.311,37
			SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO			**$ 368.240.083,30**

5.4 AVANCE DE LA OBRA

De acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas en el periodo, se presenta un avance de ejecución financiero acumulado 100% faltando por ejecutar el 0,00%.

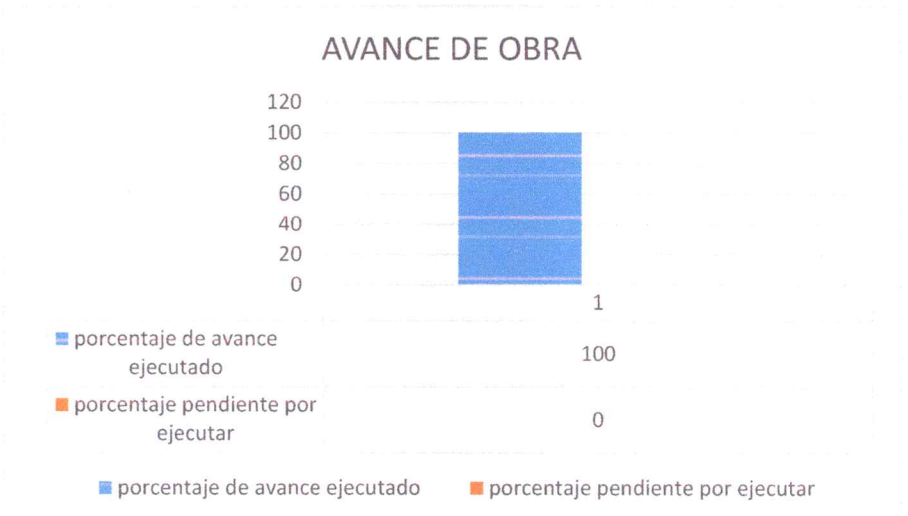


5.5 ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe la firma contratista bajo la supervisión y control de la Interventoría externa, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato:

ITEM 1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL

Esta actividad corresponde a la localización y replanteo de los huecos a reparchar estipulados dentro del diagnóstico del proyecto, para lo cual se utilizó herramienta menor y se demarcó con el fin de tener el área delimitada al momento de realizar los cortes.

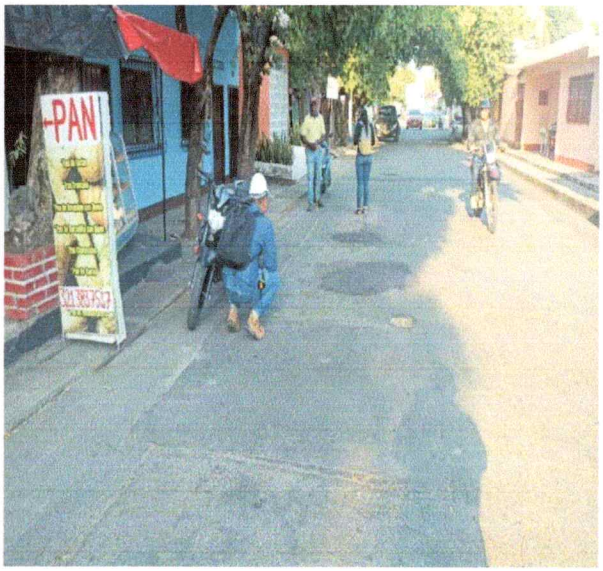ACTIVIDAD:	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL			
ITEM:	1.01		UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:		3.901,00	CANTIDAD ACUMULADA:	3.901,00
				

ITEM 1.2. CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Teniendo el área a reparchar delimitada se procedió a la ejecución del corte con cortadora de pavimento, siguiendo las indicaciones dadas por la interventoría y por la supervisión.

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

ACTIVIDAD:	CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE		
ITEM:	1.02	UNIDAD:	M
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	4.025,00	CANTIDAD ACUMULADA:	4.025,00






ITEM 1.03 DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO

Se realizó la demolición del pavimento asfaltico con equipo idóneo, teniendo precaución para que no se afectar un área mayor a la estipulada en el corte del pavimento, el contratista siguió las indicaciones estipuladas por la interventoría y la supervisión.

ACTIVIDAD:	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO		
ITEM:	1.03	UNIDAD:	M2
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	3.901,00	CANTIDAD ACUMULADA:	3.901,00



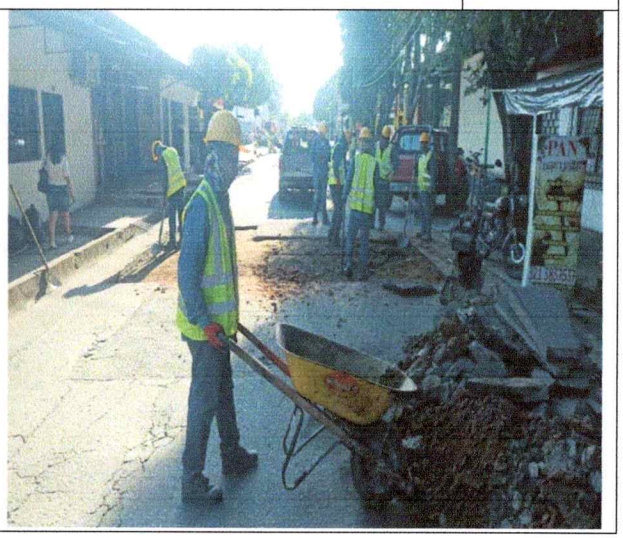

Mz A Casa 10 Urb. El Paraíso (Barrio La Granja) Celular: 3214892572
E-mail: consorcioarauca2425@gmail.com; Telefax: 607-885 2015
Arauca - Arauca

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

ITEM 1.04. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD

Se realizó la excavación de la zona a reparchar con el fin de mejorar la estructura y hacer la instalación de la base granular.

ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD		
ITEM:	1.04	UNIDAD:	M3
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	842,00	CANTIDAD ACUMULADA:	842,00





ITEM 1.05. CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE

Una vez demolido el material de asfalto se realizó el cargue manual y retiro de escombros del sitio intervenido.

ACTIVIDAD:	CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS MANUALMENTE		
ITEM:	1.05	UNIDAD:	M3
CANTIDAD CONTRACTUAL VIGENTE:	1.704,75	CANTIDAD ACUMULADA:	1.704,75





Mz A Casa 10 Urb. El Paraíso (Barrio La Granja) Celular: 3214892572
E-mail: consorcioarauca2425@gmail.com; Telefax: 607-885 2015
Arauca - Arauca

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

ITEM 2.01. IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRN-0OCRL-1

Se verificó que la superficie a imprimar estuviera firme y uniforme, luego se realizó la imprimación de la emulsión asfáltica sobre toda la superficie a reparchar. Una vez terminado se esperó que esta se secara para poder aplicar el asfalto. Durante los días de reparcheo se presentaron lluvias, por lo que fue necesario excavar un poco más hasta encontrar material seco y poder aplicar la emulsión.

ACTIVIDAD:	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRN-0OCRL-1			
ITEM:	2.01		UNIDAD:	M2
CANTIDAD VIGENTE:	CONTRACTUAL	3.901,00	CANTIDAD ACUMULADA:	3.901,00
				


ITEM 2.02. CARPETA ASFALTICA E=0.07 M. (REPARCHEO)

Para la ejecución de esta actividad se verifico que la superficie estuviera uniforme, luego se procedió con la instalación de la mezcla asfáltica la cual se distribuyó sobre toda el área de reparcheo, se nivelo y posteriormente se compactó con un vibro compactador. Durante todo el proceso se verificó que el material se encontrará con la temperatura adecuada.

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

ACTIVIDAD:	CARPETA ASFALTICA E=0.07 M. (REPARCHEO)			
ITEM:	2.02		UNIDAD:	M2
CANTIDAD VIGENTE:	CONTRACTUAL	3.901,00	CANTIDAD ACUMULADA:	3.901,00




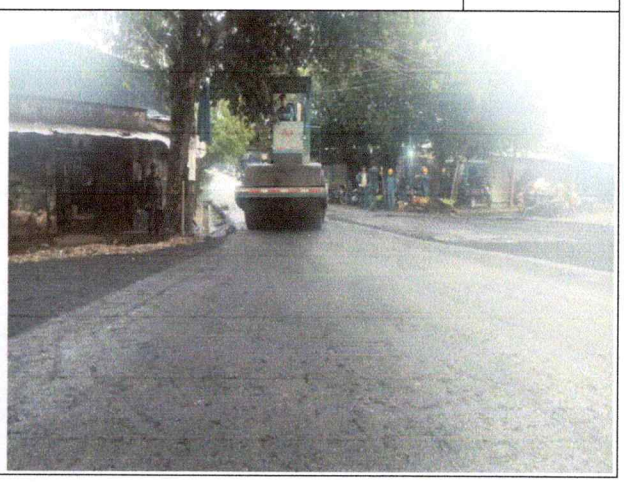

ITEM 2.03. BASE GRANULAR REPARCHEO COMPACTADA

Aplicación de base granular para mejoramiento de la estructura del pavimento.

ACTIVIDAD:	BASE GRANULAR REPARCHEO COMPACTADA			
ITEM:	2.03		UNIDAD:	M3
CANTIDAD VIGENTE:	CONTRACTUAL	807,90	CANTIDAD ACUMULADA:	807,90

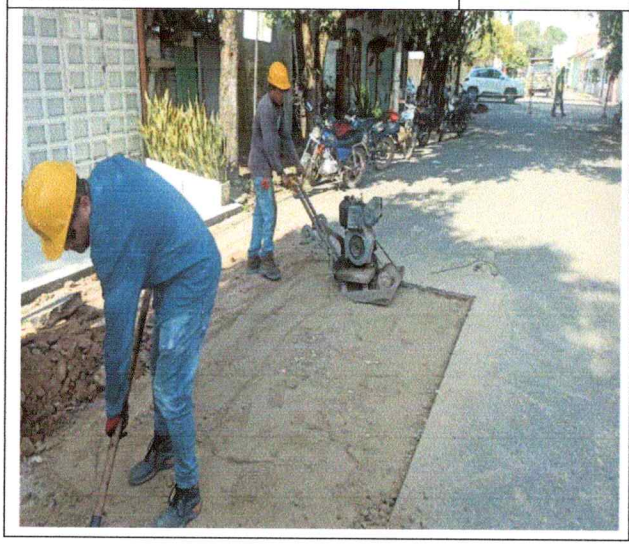



Mz A Casa 10 Urb. El Paraíso (Barrio La Granja) Celular: 3214892572
E-mail: consorcioarauca2425@gmail.com; Telefax: 607-885 2015
Arauca - Arauca

5.6 ACTIVIDADES SG-SST

Durante la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2025 se realizaron actividades de cumplimiento con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo cual se describe en el informe anexo. Ver Anexo 2. Informe de SG-SST.

5.7 COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el tiempo de ejecución del contrato, se llevó a cabo el cumplimiento de las fichas ambientales estipuladas dentro del plan de manejo ambiental, cabe resaltar que aun no se han realizado las actividades de mitigación ambiental contempladas dentro de este documento. Ver anexo 3: informe ambiental.

6.0 ASPECTOS FINANCIEROS

De acuerdo a la clausula 6 "ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO", del contrato de obra No. 000-001 de 2025, El Contratista tendrá por concepto de anticipo, hasta un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado el mismo, aprobado el plan de manejo del anticipo y se encuentre aprobada la garantía que lo ampare. Para efectos de cada pago, el contratista deberá adjuntar con la factura, la acreditación del pago al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales.

6.1 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

A continuación, se presenta el plan de inversión del anticipo presentado por el Consorcio Arauca 2024.

Item	Descripción	Porcentaje	Valor
1	Materiales	40%	$ 143.273.592,29
2	Equipos	10	$ 35.818.398,07
2	Mano de obra	15%	$ 53.727.597,11
3	Transporte de Materiales	35%	$ 125.364.393,25
Valor total del anticipo		**100,00%**	$ 358.183.980,73

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

6.2 RELACIÓN DE GASTOS DE ANTICIPO

FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
10/04/2025	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	MATERIALES	$ 23.200.000,00
10/04/2025	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	EQUIPOS	$ 12.000.000,00
10/04/2025	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	MANO DE OBRA	$ 4.800.000,00
10/04/2025	COOTRANSCARGA	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 28.743.570,00
10/04/2025	SUMINISTROS, CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS ZESE	MATERIALES	$ 104.743.510,29
10/04/2025	SUMINISTROS, CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS ZESE	EQUIPOS	$ 16.428.504,00
10/04/2025	SUMINISTROS, CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS ZESE	MANO DE OBRA	$ 12.243.037,12
10/04/2025	SUMINISTROS, CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS ZESE	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 57.692.861,25
11/04/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS O&M SAS ZESE	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 15.427.962,00
14/04/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS O&M SAS ZESE	MATERIALES	$ 15.330.082,00
14/04/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS O&M SAS ZESE	EQUIPOS	$ 7.389.894,07
14/04/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS O&M SAS ZESE	MANO DE OBRA	$ 36.684.560,00
14/04/2025	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS O&M SAS ZESE	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 23.500.000,00
		TOTAL	**$ 358.183.980,73**

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

7.0 CONCLUSIONES

- El contrato de obra No. 001 de 2025 presenta un avance financiero acumulado del 100% para cobro de acta de recibo final con corte al 17 de octubre de 2025, las principales actividades ejecutadas fueron localización y replanteo, excavación manual, corte de pavimento flexible, demolición de pavimento asfaltico, imprimación con emulsión asfáltica, carpeta asfáltica, base granular y cargue y retiro de escombros.

- El contrato de obra No. 001 de 2025 presenta un valor acumulado equivalente a MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. ($ 1.444.289.028,65)

- En la ejecución del contrato de obra No. 001 de 2025 se ha dado cumplimiento a las actividades de obra se dio estricto cumplimiento al componente de seguridad y salud en el trabajo, cuyas actividades son descrita detalladamente en el informe SG-SST, de la parcial. Es importante resaltar que NO se presentaron eventos significativos de accidentalidad, incidentes o enfermedades laborales, que generan alteraciones en el adecuado desarrollo de los trabajos, impactos sobre la comunidad o el medio ambiente, evidenciando el comportamiento seguro y las condiciones de seguridad adecuadas para la ejecución de las actividades.

LEIDY PATRICIA DIAZ BARRIENTOS
C.C. No. 1.116.798.021 de Arauca
R/L CONSORCIO ARAUCA 2024

Consorcio Arauca 2024
Nit: 901.902.630-1

8.0 ANEXOS

- Planillas de seguridad social.
- Informe SG-SST.
- Informe Ambiental.
- Bitácora de obra.
- Registro fotográfico

Mz A Casa 10 Urb. El Paraíso (Barrio La Granja) Celular: 3214892572
E-mail: consorcioarauca2425@gmail.com; Telefax: 607-885 2015
Arauca - Arauca
