



		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		**PROYECTO TERMINACIÓN FASE 1 - VILLA ADELAIDA - MIN CULTURA (GRUPO INARCO SAS)**	**56 days?**	**2/01/26 08:00 AM**	**20/03/26 05:00 PM**	
2		**ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**	**14 days**	**2/01/26 08:00 AM**	**21/01/26 05:00 PM**	
3		**Preliminares**	**5 days**	**2/01/26 08:00 AM**	**8/01/26 05:00 PM**	
4		LIMPIEZA Y LAVADO DE FACHADAS	5 days	2/01/26 08:00 AM	8/01/26 05:00 PM	
5		**Demoliciones**	**7 days**	**13/01/26 08:00 AM**	**21/01/26 05:00 PM**	
6		DEMOLICIÓN MANUAL DE PLACAS DE CONTRAPISO Y/O ANDENES h.<= 15 cm	7 days	13/01/26 08:00 AM	21/01/26 05:00 PM	
7		ESCARIFICACIÓN SUPERFICIAL (VERTICAL Y/O HORIZONTAL) DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO. INCLUYE CORTE A LADO Y LADO DEL ÁREA A IN...	5 days	13/01/26 08:00 AM	19/01/26 05:00 PM	
8		DEMOLICIÓN MECÁNICA CONTROLADA DE MUROS EN LADRILLO (arcilla y/o cemento).	3 days	14/01/26 08:00 AM	16/01/26 05:00 PM	
9		DEMOLICIÓN DE PAÑETES EXISTENTES indiferente su espesor, (para muros en ladrillo a la vista a conservar).	3 days	14/01/26 08:00 AM	16/01/26 05:00 PM	
10		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**8 days**	**19/01/26 08:00 AM**	**28/01/26 05:00 PM**	
11		DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30m,	4 days	19/01/26 08:00 AM	22/01/26 05:00 PM	
12		CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO	4 days	21/01/26 08:00 AM	26/01/26 05:00 PM	11FS-2 days
13		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	4 days	23/01/26 08:00 AM	28/01/26 05:00 PM	12FS-2 days
14		**REFUERZO**	**2 days**	**19/01/26 08:00 AM**	**20/01/26 05:00 PM**	
15		ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M	2 days	19/01/26 08:00 AM	20/01/26 05:00 PM	
16		**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN YRCI**	**45 days**	**13/01/26 08:00 AM**	**16/03/26 05:00 PM**	
17		**CAJAS, POZOS, CAICAMOS**	**5 days**	**26/01/26 08:00 AM**	**30/01/26 05:00 PM**	
18		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x60x150 cm (a x L x h)	5 days	26/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
19		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x60x80 cm (a x L x h)	5 days	26/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
20		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h)	5 days	26/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
21		CAICAMO en concreto 2000 psi de 30 cm x 15 cm.	5 days	26/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
22		**REDES SANITARIAS**	**7 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**10/02/26 05:00 PM**	
23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 3"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
26		PUNTO SANITARIO PVCS ø 4"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
27		PUNTO SANITARIO PVCS ø 3"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
28		PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 3"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2"	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA ALCANTARILLADO DE 6" o 160 mm	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA ALCANTARILLADO DE 4" o 110 mm	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior).	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior).	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
36		**REDES HIDRÁULICAS**	**11 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**11/02/26 05:00 PM**	
37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la re...	11 days	28/01/26 08:00 AM	11/02/26 05:00 PM	
38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2-1/2" RDE 21	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1-1/2" RDE 21	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
44		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
45		PUNTO DE AGUA FRÍA 1 1/2"	4 days	28/01/26 08:00 AM	2/02/26 05:00 PM	
46		PUNTO DE AGUA FRÍA 1"	4 days	28/01/26 08:00 AM	2/02/26 05:00 PM	
47		PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4"	4 days	28/01/26 08:00 AM	2/02/26 05:00 PM	
48		PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	4 days	28/01/26 08:00 AM	2/02/26 05:00 PM	
49		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA GREGISTRO R/W DE 3"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
50		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA GREGISTRO R/W DE 2-1/2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA GREGISTRO R/W DE 2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
52		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA GREGISTRO R/W DE 1-1/2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
53		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA GREGISTRO R/W DE 1"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA GREGISTRO R/W DE 3/4"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA GREGISTRO R/W DE 1/2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 3"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 2-1/2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 1 1/2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 1"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 3/4"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 1/2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
63		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA.	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
64		**REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS**	**3 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**30/01/26 05:00 PM**	
65		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC Le 3"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
66		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC Le 2"	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
67		PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS	3 days	28/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
68		**TANQUES Y EQUIPOS**	**20 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**24/02/26 05:00 PM**	
69		SUMINISTRO E INSTALACIÓN KIT FLOTADORA PESADA para tanque agua de reserva	10 days	28/01/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
70		SUMINISTRE INSTALACIÓN TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE (80X40X35) tipo industrial.	12 days	28/01/26 08:00 AM	12/02/26 05:00 PM	
71		EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DE 5 HP, DE ALTURA DINÁMICA DE 213.03 MCA Y Q= 4.2.2 LTS, INCLUYE BOMBA AUXILIAR DE 5 HP, CONTROLE...	20 days	28/01/26 08:00 AM	24/02/26 05:00 PM	
72		**TRÁMITES Y DERECHOS DE CONEXIÓN**	**45 days**	**13/01/26 08:00 AM**	**16/03/26 05:00 PM**	
73		TRÁMITE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS	45 days	13/01/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	
74		TRÁMITE DE TIPO	45 days	13/01/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	
75		TRÁMITE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	45 days	13/01/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	
76		TRÁMITE DE CONEXIONES DEFINITIVAS DE ACUEDUCTO	45 days	13/01/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	
77		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**	**49 days**	**13/01/26 08:00 AM**	**20/03/26 05:00 PM**	
78		**EQUIPO DE MEDIDA**	**45 days**	**13/01/26 08:00 AM**	**16/03/26 05:00 PM**	
79		GRUPO DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN	45 days	13/01/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	
80		Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de caja de inspección en anden de concreto CSZ76	45 days	13/01/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	
81		**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**	**10 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**10/02/26 05:00 PM**	
82		Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado	10 days	28/01/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
83		**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**	**10 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**10/02/26 05:00 PM**	
84		Suministro, instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico enchufable para 36 circuitos con espacio para totalizador,	10 days	28/01/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
85		**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN**	**10 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**13/02/26 05:00 PM**	
86		Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# 6+1N #6 + 1T #8AWG,	10 days	2/02/26 08:00 AM	13/02/26 05:00 PM	
87		Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 3F# /4/0+1N #4/0 + 1T #2AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y d...	10 days	2/02/26 08:00 AM	13/02/26 05:00 PM	
88		**RED NORMAL Y REGULADA**	**10 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**13/02/26 05:00 PM**	
89		Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-(amarillo, azul o rojo) LSZH HF, CT, 600V, 80ºC	10 days	2/02/26 08:00 AM	13/02/26 05:00 PM	
90		**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**	**3 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**4/02/26 05:00 PM**	
91		Instalación y Suministro de Canaleta plastica 100x45mm 2Mt,	3 days	2/02/26 08:00 AM	4/02/26 05:00 PM	
92		Instalación y Suministro de ducto cerrado de 200x50 mm	3 days	2/02/26 08:00 AM	4/02/26 05:00 PM	
93		**ILUMINACIÓN**	**8 days**	**9/03/26 08:00 AM**	**18/03/26 05:00 PM**	
94		Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W, 5...	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
95		Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo bala para montaje en cilindro 5w mínimo 90 minutos de autonía incluye guaya y soportes	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
96		Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led rectangular 120-130v , 2 años de garantia	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
97		Suministro e instalación de luminaria SpotLED, acabado con pintura electrostática en color negro, ángulo de distribución luminosa entre 15 a 40° d...	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
98		Suministro e instalación de luminaria tipo cilindro descolgar 22W, incluye guaya	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
99		Suministro e instalación de luminaria Solar Garden Poste 80cm 3000K	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
100		Suministro e instalación de LUMINARIA DE DESCOLGAR DECORATIVA y accesorios de fijación	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
101		Suministro e instalacion de luminaria lineal Square Stil Led 1.20m 50W	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
102		**ILUMINACIÓN EXTERIOR**	**10 days**	**9/03/26 08:00 AM**	**20/03/26 05:00 PM**	
103		Suministro e instalación de luminaria LED SOLAR GARDEN 3250LM – 25W	10 days	9/03/26 08:00 AM	20/03/26 05:00 PM	
104		**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**	**38 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**20/03/26 05:00 PM**	
105		Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC	25 days	16/02/26 08:00 AM	20/03/26 05:00 PM	85;88;90
106		Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado ante la ONAC.	2 days	19/03/26 08:00 AM	20/03/26 05:00 PM	93

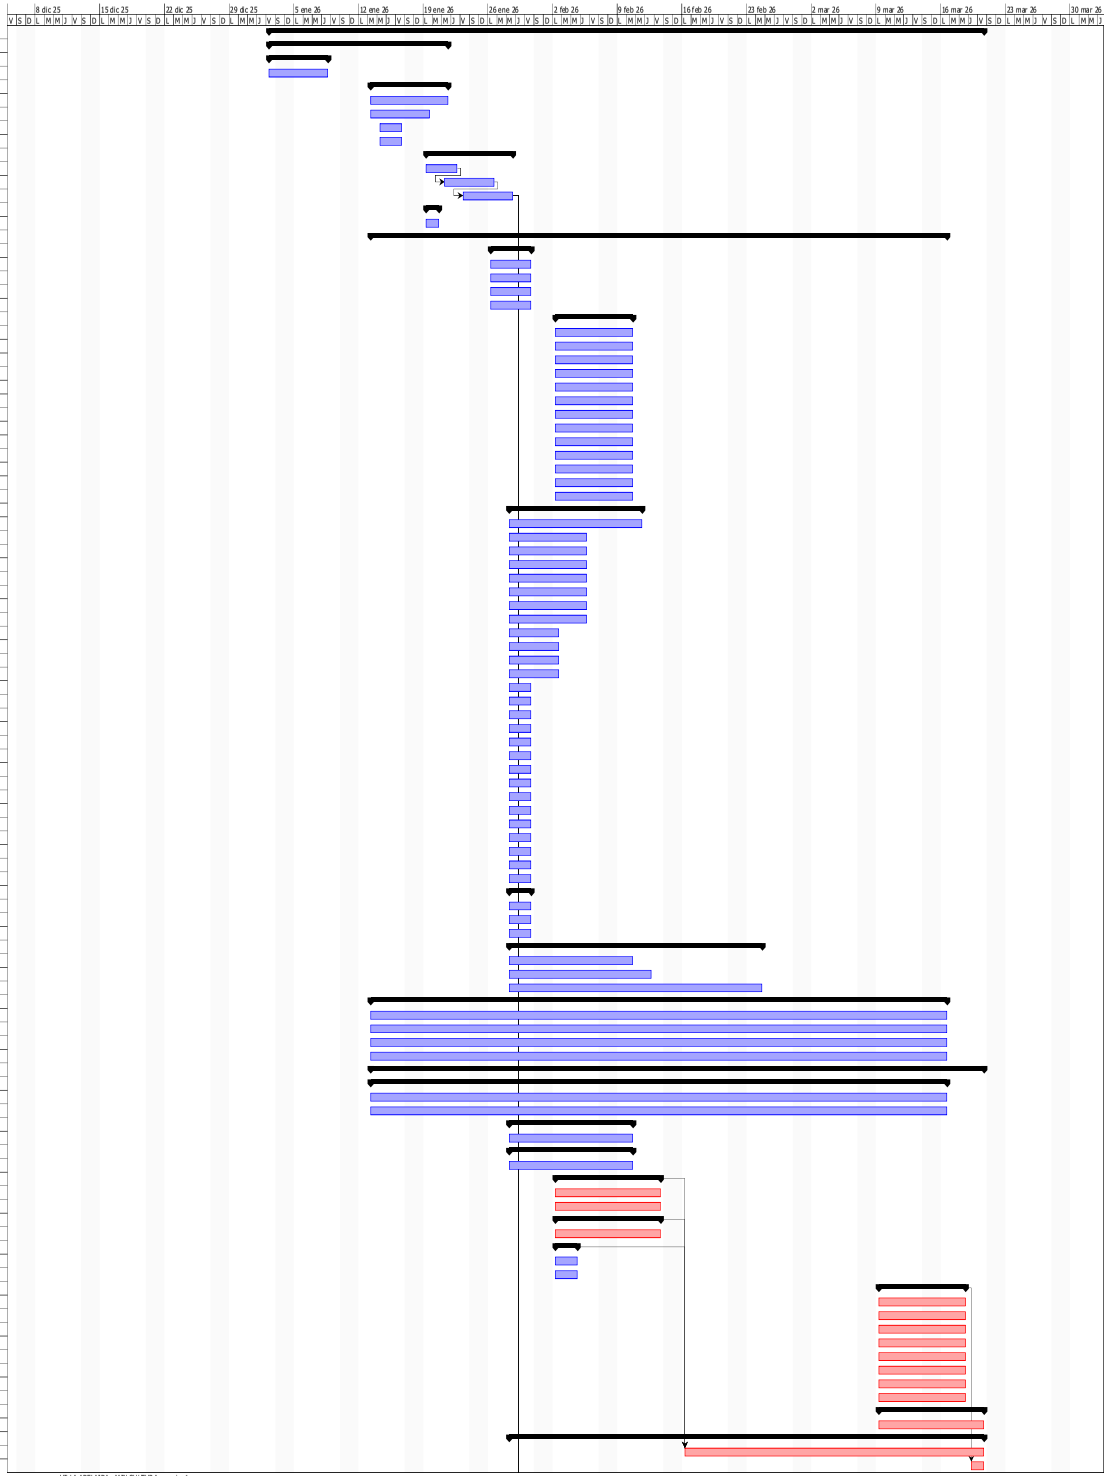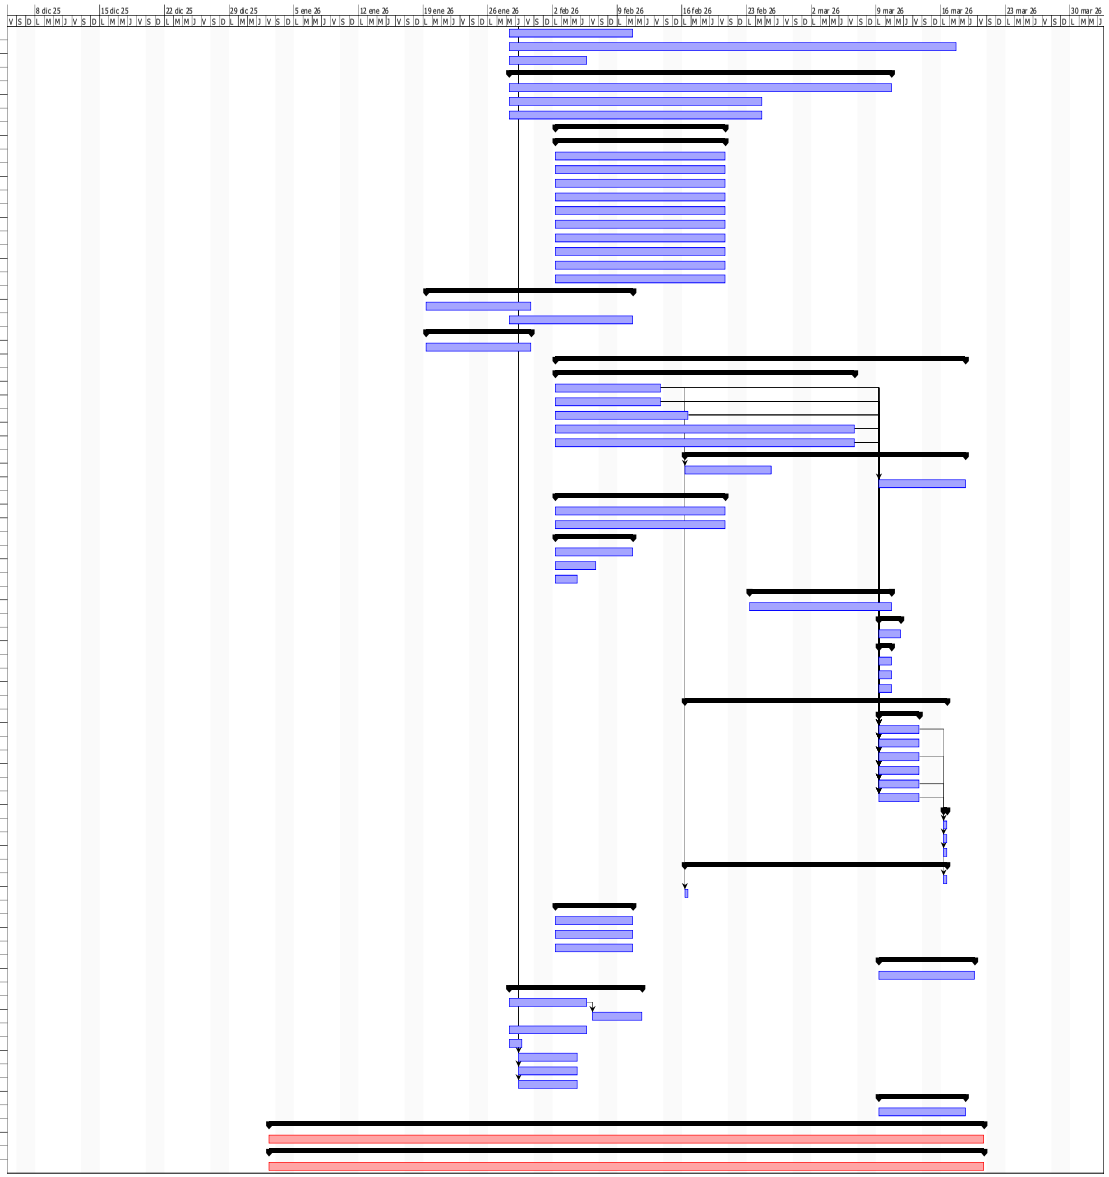


6 abr 26
13 abr 26
V S D L M M J V S D L M M J V S D

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
107		Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad ...	10 days	28/01/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
108		Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el opera...	35 days	28/01/26 08:00 AM	17/03/26 05:00 PM	
109		Medicion de resistencia de sistema de puesta a tierra incluye informe	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
110		**EQUIPOS**	**30 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**10/03/26 05:00 PM**	
111		Suministro e instalación de Planta Eléctrica Trifásica 65-75 kVA Advance AC75 Capacidad Tanque Combustible 110L 15,9 Lt/h, incluye tanque lleno ...	30 days	28/01/26 08:00 AM	10/03/26 05:00 PM	
112		Pruebas de bobinado y aislamiento al transformador, incluye actualización de protocolos con laboratorio acreditado y puesta en funcionamiento.	20 days	28/01/26 08:00 AM	24/02/26 05:00 PM	
113		Pruebas y mantenimientos a tostadores electricos de general y de distribución, incluye verificación de conexiones, de continuidad, limpieza, prueba...	20 days	28/01/26 08:00 AM	24/02/26 05:00 PM	
114		**REDES ESPECIALES**	**15 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**20/02/26 05:00 PM**	
115		**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS INCLUYE ACCESORIOS Y APARATOS ESPECIALES)**	**15 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**20/02/26 05:00 PM**	
116		Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack CAT 6A, faceplate y troquel y certificación del punto	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
117		Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
118		Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT 6A, incluye 24 JACKS	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
119		Suministro e instalación de Switch 24 puertos 10/100/1000	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
120		Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
121		Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve unidades 9U, color negro, puerta en vidrio con perforaciones perimetrales, puertas latera...	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
122		Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 ...	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
123		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTERIOR (300 Mbps Access point inalámbrico, atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11 b/g/b, Po...	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
124		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4", (incluye cajas de paso, curvas, uniones, apartería nec...	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
125		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC de 1 1/2"; instalación embebida (incluye cajas de paso, curvas, ...	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
126		**CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**17 days**	**19/01/26 08:00 AM**	**10/02/26 05:00 PM**	
127		Impermeabilización de fosos, plataformas, tanques de agua y RCI en Mortero impermeabilización flexible, bicomponente (Sistema Danosa o equival...	10 days	19/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
128		IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS Sikalastic®-707 Transparente, SIMILAR O DE MEJOR CALIDAD	10 days	28/01/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
129		**PAÑETES**	**10 days**	**19/01/26 08:00 AM**	**30/01/26 05:00 PM**	
130		PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3	10 days	19/01/26 08:00 AM	30/01/26 05:00 PM	
131		**PISOS Y ENCHAPES**	**33 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**18/03/26 05:00 PM**	
132		**Enchapes pisos y paredes**	**25 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**6/03/26 05:00 PM**	
133		ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRAN FORMATO RECTANGULAR (Dimensión mínima 25 cm X 35 cm) PARA USO INSTITUCI...	10 days	2/02/26 08:00 AM	13/02/26 05:00 PM	
134		ENCHAPE DE PISO PORCELANATO BEIGE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO (Dimensión mínima 50 cm X 50 cm) PARA USO INSTITUCIONAL CON SUPE...	10 days	2/02/26 08:00 AM	13/02/26 05:00 PM	
135		ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, Modulado acorde a planos.	11 days	2/02/26 08:00 AM	16/02/26 05:00 PM	
136		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA DE CEMENTO HIDRAULICA SIMILAR A LA EXISTENTE UNICOLOR. Tráfico pesado, incluye mortero de pega, boquill...	25 days	2/02/26 08:00 AM	6/03/26 05:00 PM	
137		ENCHAPE DE PISO EN BALDOSA DE CEMENTO HIDRAULICA SIMILAR A LA EXISTENTE SEGÚN DISEÑO DOS O MAS COLORES. Tráfico pesado, incluy...	25 days	2/02/26 08:00 AM	6/03/26 05:00 PM	
138		**Guarda escobas y boca puertas**	**23 days**	**16/02/26 08:00 AM**	**18/03/26 05:00 PM**	
139		GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO BEIGE (O A DEFINIR) GRAN FORMATO H = 10 cm, incluye material, mano de obra, remate superior, win en al...	8 days	16/02/26 08:00 AM	25/02/26 05:00 PM	134
140		ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en granito pulido, incluye dilataciones en l ongitudinales.	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	136
141		**Pisos en madera**	**15 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**20/02/26 05:00 PM**	
142		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LISTONES MACHIHEMBRADOS DE MADERA SAPAN (O EQUIVALENTE) inmunizada al vacío, e = 0,018 m y...	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
143		GUARDA ESCOBA EN MADERA SAPAN (O SIMILAR) INMUNIZADA AL VACÍO, E = 0,018 M Y ANCHO ÚTIL 0,10 M, con acatado con fondo acrílico min...	15 days	2/02/26 08:00 AM	20/02/26 05:00 PM	
144		**Varios**	**7 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**10/02/26 05:00 PM**	
145		MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes se...	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
146		POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO f'C = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño, enchapada cerámica PR...	5 days	2/02/26 08:00 AM	6/02/26 05:00 PM	
147		MEDIACAÑA EN PVC para muros-muros techos-muros, incluye instalación y acatado.	3 days	2/02/26 08:00 AM	4/02/26 05:00 PM	
148		**CARPINTERÍA EN MADERA**	**12 days**	**23/02/26 08:00 AM**	**10/03/26 05:00 PM**	
149		REMATES EN MADERA TIPO SAPÁN O GRANADILLO DE 16 x 1,8 cm, similar de mejor calidad, instalado con dilatadores, acabado en pintura tipo poliur...	12 days	23/02/26 08:00 AM	10/03/26 05:00 PM	
150		**CARPINTERÍA METÁLICA**	**3 days**	**9/03/26 08:00 AM**	**11/03/26 05:00 PM**	
151		DIVISIONES SANITARIAS (Sanitarios, Duchas, Orinales) en de acero inoxidable 304 cal. 20 satinado (Ancho 2,7 cm), anclado a pared sistema cantilév...	3 days	9/03/26 08:00 AM	11/03/26 05:00 PM	
152		**CERRADURAS**	**2 days?**	**9/03/26 08:00 AM**	**10/03/26 05:00 PM**	
153		COMBO DE CERRADURA ANTIPÁNICO TAMPA, incluye 1 barra Antipánico con un punto de cierre, 1 barra Antipánico con 2 puntos de cierre, 1 Manija ...	2 days	9/03/26 08:00 AM	10/03/26 05:00 PM	
154		CERROJO DE SOBREPONER MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales. mano de obra, herramientas y to...	2 days	9/03/26 08:00 AM	10/03/26 05:00 PM	
155		TIRADORES TIPO H, para puertas batientes y/o corredizas en acero inoxidable, incluye perforaciones y todos los elementos necesarios para su corre...	2 days?	9/03/26 08:00 AM	10/03/26 05:00 PM	
156		**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**	**21 days**	**16/02/26 08:00 AM**	**16/03/26 05:00 PM**	
157		**APARATOS SANITARIOS**	**5 days**	**9/03/26 08:00 AM**	**13/03/26 05:00 PM**	
158		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TANQUE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Incluye transporte, material, tap...	5 days	9/03/26 08:00 AM	13/03/26 05:00 PM	133;134;135;136;137
159		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE PARA USO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO Incluye transporte, material, tapa, asiento, ma...	5 days	9/03/26 08:00 AM	13/03/26 05:00 PM	133;134;135;136;137
160		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta y demás ...	5 days	9/03/26 08:00 AM	13/03/26 05:00 PM	133;134;135;136;137
161		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR, SEMIPEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL Incluye transporte, material, mano de obra, herr...	5 days	9/03/26 08:00 AM	13/03/26 05:00 PM	133;134;135;136;137
162		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE Incluye transporte, material, mano de obra, herramienta ...	5 days	9/03/26 08:00 AM	13/03/26 05:00 PM	133;134;135;136;137
163		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER, LINEA FREE TIPO INSTITUCIONAL Incluye material, mano de obra, herramienta y ...	5 days	9/03/26 08:00 AM	13/03/26 05:00 PM	133;134;135;136;137
164		**GRIFERÍAS**	**1 day**	**16/03/26 08:00 AM**	**16/03/26 05:00 PM**	
165		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA TIPO PUSH +ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obra, h...	1 day	16/03/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	163
166		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO FLUXÓMETRO DE PALANCA+ ACCESORIOS Incluye desagüe, materiales, mano de obr...	1 day	16/03/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	160
167		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS + ACCESORIOS (Tipo mono control alta y taja) Incluye desagüe, materiales, mano ...	1 day	16/03/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	162
168		**ACCESORIOS**	**21 days**	**16/02/26 08:00 AM**	**16/03/26 05:00 PM**	
169		BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + BARRA FIJA 50 cm, incluye anclajes, materiales, mano de obra, herramienta y d...	1 day	16/03/26 08:00 AM	16/03/26 05:00 PM	158
170		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGISTRO 20*20 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta y demás materiales ne...	1 day	16/02/26 08:00 AM	16/02/26 05:00 PM	133
171		**PINTURAS**	**7 days**	**2/02/26 08:00 AM**	**10/02/26 05:00 PM**	
172		APLICACIÓN ESTUCO PLÁSTICO; para muros interiores y exteriores, incluye filos, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, ...	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
173		APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO KORAZA DOBLE VIDA 10 AÑOS; para muros interiores y exteriores color a definir,...	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
174		APLICACIÓN DE PINTURA TIPO EPOXICA BASE SOLVENTE; para estructura, muros y techos interiores color a definir, incluye filos, cortes, dilatacione...	7 days	2/02/26 08:00 AM	10/02/26 05:00 PM	
175		**VIDRIOS Y ESPEJOS**	**9 days**	**9/03/26 08:00 AM**	**19/03/26 05:00 PM**	
176		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL 4 MM CON MARCO EN MADERA SAPAN O SIMILAR 0.04 m x 0.02 m por todo su contorno (según d...	9 days	9/03/26 08:00 AM	19/03/26 05:00 PM	
177		**OBRAS EXTERIORES**	**11 days**	**28/01/26 08:00 AM**	**11/02/26 05:00 PM**	
178		ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500 PSI E= 0.10 m (incluye dilataciones cada 1,5 veces el ancho del anden) incluye material, ...	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
179		ACABADO DE PISO EN GRAVILLA FINA DE 1/2" esp 5 cm. Incluye base granular B 200 de 15 cm.	4 days	6/02/26 08:00 AM	11/02/26 05:00 PM	178
180		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80 (dimensiones: base 20 cm alto 35 cm), Incluye mortero de nivelación y pega, mano ...	7 days	28/01/26 08:00 AM	5/02/26 05:00 PM	
181		BANCA EN CONCRETO PREFABRICADA (M-31) o FUNDIDA EN SITIO ACORDE A DISEÑOS, parte externa concreto a la vista incluye, perfilación del te...	2 days	28/01/26 08:00 AM	29/01/26 05:00 PM	
182		REINSTALACIÓN / SIEMBRA DE CESPEDONES (reservados del descapote) en patios. Incluye acarreos, conservación, cama en tierra negra abonada h...	5 days	29/01/26 08:00 AM	4/02/26 05:00 PM	13
183		SUMINISTRO Y SIEMBRA DE COBERTURA VEGETAL en especies diversas (16 u/m2), especie por definir incluye abono, tierra, compactación, mano de...	5 days	29/01/26 08:00 AM	4/02/26 05:00 PM	13
184		SUMINISTRO SIEMBRA DE CESPEDONES. Incluye acarreos, cama en tierra negra abonada h, 10 cm, mantenimiento.	5 days	29/01/26 08:00 AM	4/02/26 05:00 PM	13
185		**AISLAMIENTO ACUSTICO**	**8 days**	**9/03/26 08:00 AM**	**18/03/26 05:00 PM**	
186		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO O DIVISIÓN ACÚSTICA PLEGABLE MODULAR.	8 days	9/03/26 08:00 AM	18/03/26 05:00 PM	
187		**ASEO**	**56 days**	**2/01/26 08:00 AM**	**20/03/26 05:00 PM**	
188		ASEO GENERAL DE OBRA	56 days	2/01/26 08:00 AM	20/03/26 05:00 PM	
189		**OTROS EQUIPOS**	**56 days**	**2/01/26 08:00 AM**	**20/03/26 05:00 PM**	
190		SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	56 days	2/01/26 08:00 AM	20/03/26 05:00 PM	




6 abr 26
13 abr 26
V S D L M M J V S D L M M J V S D
