ROGGER MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA SEMANAL

F-CIV-03
V.2 Septiembre 2019

INFORME N°:	1	CORTE:	2 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA:	7/09/2025	INTERVENTORIA:	CAM S.A.S.
CONTRATO N°:	232 DE AGOSTO 25 DE 2025	ELABORADO POR:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
OBJETO DEL CONTRATO:	" CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		

SECO: S LLUVIOSO: LL

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

DÍA	L	M	M	J	V	S	D	TOTAL
TIEMPO		S	S	S	S	S		
HR DE LLUVIA								
HR LAB.		8	8	8	8	4		36

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.0	**PRELIMINARES**						
1.1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	319.35	$ 9,048.00	0.00	$ -	0.00 %
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE	ML	319.35	$ 28,274.00	0.00	$ -	0.00 %
					SUB-TOTAL	$ -	0.00 %
2.0	**EXCAVACIONES**						
2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO	M3	1390.98	$ 35,004.00	0.00	$ -	0.00 %
2.2	CARGUE MECÁNICO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE	M3	308.35	$ 43,563.00	0.00	$ -	0.00 %
					SUB-TOTAL	$ -	0.00 %
3.0	**RELLENO Y BASE**						
3.1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA MISMA EXCAVACION	M3	1442.24	$ 55,269.00	0.00	$ -	0.00 %
3.2	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	186.09	$ 124,220.00	0.00	$ -	0.00 %
					SUB-TOTAL	$ -	0.00 %
4.0	**TUBERIA Y ACCESORIOS**						
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE Ø = 8"	ML	319.35	$ 160,259.00	0.00	$ -	0.00 %
					SUB-TOTAL	$ -	0.00 %
5.0	**POZOS DE INSPECCION**						
5.1	CONCRETO DE 2.000 PSI PARA SOLADO E=0.10 M.	M2	36.00	$ 114,218.00	0.00	$ -	0.00 %
5.2	PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0,20 M	M2	36.00	$ 1,029,260.00	0.00	$ -	0.00 %
5.3	ANILLO EN CONCRETO 4.000 PSI PARA POZO, E=0,20 M DIAMETRO EXT=1,60 M	ML	11.80	$ 2,004,934.00	0.00	$ -	0.00 %
5.4	TAPA EN CONCRETO 4.000 PSI, REFORZ, D EXT=1,60 M E=0,20 M PARA POZO DE INSPECCIÒN INCL ARO Y TAPA HF	UND	9.00	$ 2,143,025.00	0.00	$ -	0.00 %
5.5	CAÑUELA EN CONCRETO DE 4.000 PSI PARA POZO DE INSPECCIÓN DINT. 1,20 M	UND	9.00	$ 504,958.00	0.00	$ -	0.00 %
5.6	ESCALERA PARA POZO	ML	9.91	$ 662,270.00	0.00	$ -	0.00 %
					SUB-TOTAL	$ -	0.00 %
6.0	**OBRAS CIVILES COMPLMENTARIAS**						
6.1	CONEXIÓN DE POZOS	UND	19.00	$ 464,331.00	0.00	$ -	0.00 %
					SUB-TOTAL	$ -	0.00 %
7.0	**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**						
7.1	MANTENIMIENTO DE VIAS	M2	1916.10	$ 28,863.00	0.00	$ -	0.00 %
					SUB-TOTAL	$ -	0.00 %
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UND	1.00	$ 18,709,925.00	0.10	$ 1,870,992.50	0.46 %
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	UND	1.00	$ 3,883,558.75	0.00	$ -	0.00 %
	VALOR CONTRATADO	$	409,985,808.63		PORECENTAJE DE AVANCE SEMANAL		0.46 %

PERSONAL INVOLUCRADO

PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO	L	M	M	J	V	S	D	PRESENCIA
CARGO	HR							HORAS
RESIDENTE DE OBRA	0	8	8	8	8	4		36
SUPERVISOR HS	0	8	8	8	8	4		36
								36

TÉCNICO Y OPERATIVOS		L	M	M	J	V	S	D	HORAS TRABAJO	
CARGO	CANTIDAD	HR							normal	extra
OFICIAL	1	0	8	8	8	8	4		36	
AYUDANTE	2	0	8	8	8	8	4		36	
AUX TRANSITO	1	0	8	8	8	8	4		36	
									36	


MAQUINARIA Y EQUIPO EMPLEADO


TIPO	ACTIVIDAD	L	M	M	J	V	S	D	HORAS
HERRAMIENTA MENOR	INGRESO	0	8	8	8	8	4		36

CONTROL DE INGRESO DE MATERIALES


MATERIAL	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD	UNIDAD
INGRESO DE MATERIALES DE FERRETERIA			

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

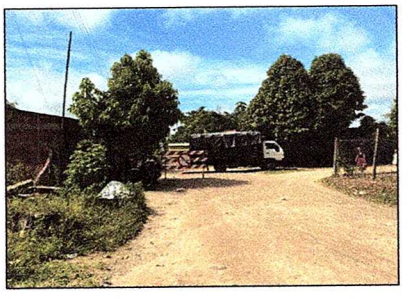





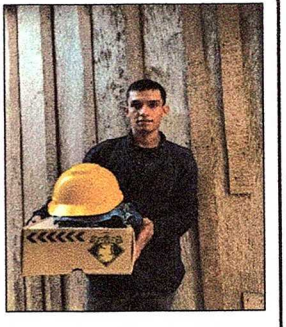

ACTIVIDAD EJECUTADAS SEMANALMENTE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD

OBSERVACIONES / OTROS

SE DA INICIO A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA MEDIANTE ACTIVIDAD DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS,
ASI MISMO A LA ACTIVIDA DE DE CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA POZOS DE INSPECCION
ACTIVIDADES DE PMT (Ingreso de elementos de señalizacion preventiva de obra)
SE DA INDUCCION AL PERSONAL INGRESADO POR PARTE DEL SUPERVISOR HS

FIRMA:

JHOSMAN FERLEY LIZCANO SÁNCHEZ
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P No. 54202-313703 NTS

FIRMA:

ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
ING RESIDENTE DE OBRA
M.P No. 25202-70810 CND
