
ALSUCON ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA	F-CIV-03 V.2 Septiembre 2019

INFORME N°:	SEMANAL 1	CORTE:	11 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE
FECHA:	15/12/2025	INTERVENTORIA:	N/A
CONTRATO N°:	383 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	ELABORADO POR:	BRYAN ALBERTO ROA CHACÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		

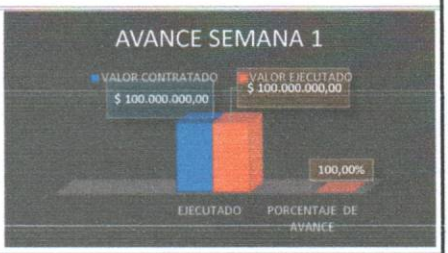

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.0	PRELIMINARES						
1.1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	DIA	2,00	$ 647.337,00	2,00	$ 1.294.674,00	1,29 %
1.2	LIMPIEZA Y ROCERÍA	ML	4.486,00	$ 1.519,00	2249,00	$ 3.416.231,00	3,42 %
					SUB-TOTAL	$ 4.710.905,00	4,71 %
2.0	CERRAMIENTO						
2.1	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.	ML	2243,00	$ 38.389,00	572,02	$ 21.959.095,00	21,96 %
					SUB-TOTAL	$ 21.959.095,00	21,96 %
3.0	VALLA INFORMATIVA						
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS	UNID	1,00	$ 5.784.565,00	0,00	$ -	0,00 %
	VALOR CONTRATADO	$	100.000.000,00		POREcentaje DE AVANCE SEMANAL		26,67 %
	VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE				$		26.670.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO






DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	2,00	DIA
LIMPIEZA Y ROCERÍA	2249,00	ML
CERRAMIENTO		
CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.	572,02	ML
VALLA INFORMATIVA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS	0,00	UNID

OBSERVACIONES / OTROS

Entre el 11 y el 14 de diciembre de 2025 se desarrollaron las actividades iniciales del proyecto. El 11 de diciembre se realizó la socialización con la comunidad de la vereda Playas del Bojabá, con acompañamiento de la Administración Municipal y el presidente de la Junta de la zona de influencia, en la cual se expusieron los objetivos, alcance, actividades y beneficios del proyecto, resolviendo inquietudes y fortaleciendo la articulación comunitaria; esta jornada fue únicamente informativa, por lo que no se iniciaron trabajos de obra.

El 12 de diciembre se dio inicio al contrato de obra, ejecutándose la localización y replanteo del predio, el cargue, transporte y acopio de los postes de concreto, el alistamiento de herramientas y la limpieza y rocería del área destinada para el cerramiento perimetral. El 13 de diciembre se finalizaron las labores topográficas, se inició la instalación de los postes de concreto y se continuaron las actividades de limpieza, logrando la instalación de 72 postes, equivalentes a un avance aproximado de 216 metros lineales, además de cuatro pies de amigo para el arriostramiento. El 14 de diciembre, al ser domingo, no se ejecutaron actividades.

Bryan Alberto R

BRYAN ALBERTO ROA CHACÓN
INSPECTOR DE OBRA
M.P 151037-0543138 STD

NG. ERIKA MILETH CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisora
Resolución de supervisión No. 3110 de 2025

ALSUCON ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S	INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA	F-CIV-03 V.2 Septiembre 2019

INFORME N°:	SEMANAL 2	CORTE:	15 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE
FECHA:	22/12/2025	INTERVENTORIA:	N/A
CONTRATO N°:	383 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	ELABORADO POR:	BRYAN ALBERTO ROA CHACÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		



CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.0	PRELIMINARES						
1.1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	DIA	2,00	$ 647.337,00	2,00	$ 1.294.674,00	1,29 %
1.2	LIMPIEZA Y ROCERÍA	ML	4.486,00	$ 1.519,00	3289,00	$ 4.995.991,00	5,00 %
					SUB-TOTAL	$ 6.290.665,00	6,29 %
2.0	CERRAMIENTO						
2.1	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.	ML	2243,00	$ 38.389,00	1746,58	$ 67.049.334,94	67,05 %
					SUB-TOTAL	$ 67.049.334,94	67,05 %
3.0	VALLA INFORMATIVA						
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS	UNID	1,00	$ 5.784.565,00	1,00	$ 5.784.565,00	5,78 %
	VALOR CONTRATADO	$	100.000.000,00		PORECENTAJE DE AVANCE ACUMULADO SEMANAL		73,34 %
	VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE				$		73.340.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO







DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	2,00	DIA
LIMPIEZA Y ROCERÍA	3289,00	ML
CERRAMIENTO		
CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.	1746,58	ML
VALLA INFORMATIVA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS	1,00	UNID

OBSERVACIONES / OTROS

Entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025 se continuó con la ejecución del cerramiento perimetral del predio, realizando de manera constante el alistamiento y control de herramientas, así como labores de rocería y limpieza en las áreas de intervención. Durante este periodo se avanzó de forma progresiva en la instalación de los postes de concreto, los elementos de arriostramiento y el tendido y tensado del alambre de púas para la delimitación perimetral.

De manera paralela, se ejecutaron las actividades necesarias para la instalación de la valla informativa, incluyendo el traslado de materiales, uso de equipos y montaje de la estructura, dejándola completamente instalada. El 21 de diciembre de 2025 no se realizaron actividades por tratarse de día domingo.


Bryan Alberto R.
BRYAN ALBERTO ROA CHACÓN
INSPECTOR DE OBRA
M.P 151037-0543138 STD

ING. EDWIN CASTRO SALCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisora
Resolución de supervisión No. 3110 de 2025

ALSUCON	INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE OBRA	F-CIV-03 V.2 Septiembre 2019

ALQUILER SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S


INFORME N°:	SEMANAL 3	CORTE:	22 DE DICIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE
FECHA:	26/12/2025	INTERVENTORIA:	N/A
CONTRATO N°:	383 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	ELABORADO POR:	BRYAN ALBERTO ROA CHACÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL PREDIO EL GAVÁN DESTINADO A LA PROTECCION Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA		

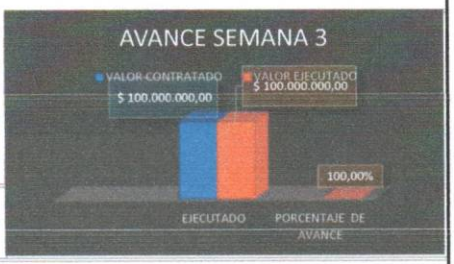

CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO
1.0	PRELIMINARES						
1.1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	DIA	2,00	$ 647.337,00	2,00	$ 1.294.674,00	1,29 %
1.2	LIMPIEZA Y ROCERÍA	ML	4.486,00	$ 1.519,00	4486,00	$ 6.814.234,00	6,81 %
					SUB-TOTAL	$ 8.108.908,00	8,11 %
2.0	CERRAMIENTO						
2.1	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.	ML	2243,00	$ 38.389,00	2243,00	$ 86.106.527,00	86,11 %
					SUB-TOTAL	$ 86.106.527,00	86,11 %
3.0	VALLA INFORMATIVA						
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS	UNID	1,00	$ 5.784.565,00	1,00	$ 5.784.565,00	5,78 %
					SUB-TOTAL	$ 5.784.565,00	5,78 %
	VALOR CONTRATADO	$	100.000.000,00		PORECENTAJE DE AVANCE ACUMULADO SEMANAL		100,00 %
	VALOR EJECUTADO NOVIEMBRE				$		100.000.000,00

REGISTRO FOTOGRAFICO

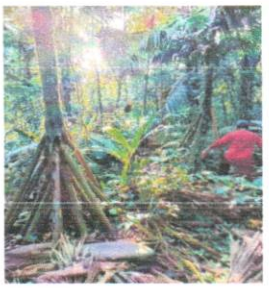
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	2,00	DIA
LIMPIEZA Y ROCERÍA	4486,00	ML
CERRAMIENTO		
CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL. 12.5 x 4 HILOS, CON POSTES DE CONCRETO. DISTANCIA ENTRE POSTES 3 M.	2243,00	ML
VALLA INFORMATIVA		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA DE 4 x 2 MTS	1,00	UNID

OBSERVACIONES / OTROS

Entre el 22 y el 24 de diciembre de 2025 se continuó con la ejecución de las actividades del cerramiento perimetral del predio, realizando de manera permanente el alistamiento y control de la herramienta principal y menor, así como labores de rocería y limpieza en los tramos previstos. Durante este periodo se avanzó de forma progresiva en la hincada e instalación de los postes de concreto y los elementos de arriostramiento, así como en el tendido y tensado del alambre de púas para la adecuada delimitación perimetral.

Al cierre de estas jornadas se dio por finalizada la instalación de los postes, las labores de limpieza y rocería, y la colocación del alambre de púas, quedando completamente ejecutada la actividad principal correspondiente al encerramiento del predio, destinado a la protección y reforestación ambiental.

El 25 de diciembre de 2025, por tratarse de día festivo, no se realizaron actividades, tomándose como día hábil el viernes 26 de diciembre de 2025 para la suscripción del acta de recibo final de la obra.

Bryan Alberto R.
BRYAN ALBERTO ROA CHACÓN
INSPECTOR DE OBRA
M.P 151037-0543138 STD

NG. ERICA LIZETH CASTRO ARCEDO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Supervisora
Resolución de supervisión No. 3110 de 2025
