AVANCE DEL PROYECTO
PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FISICO SEMANA No. 15

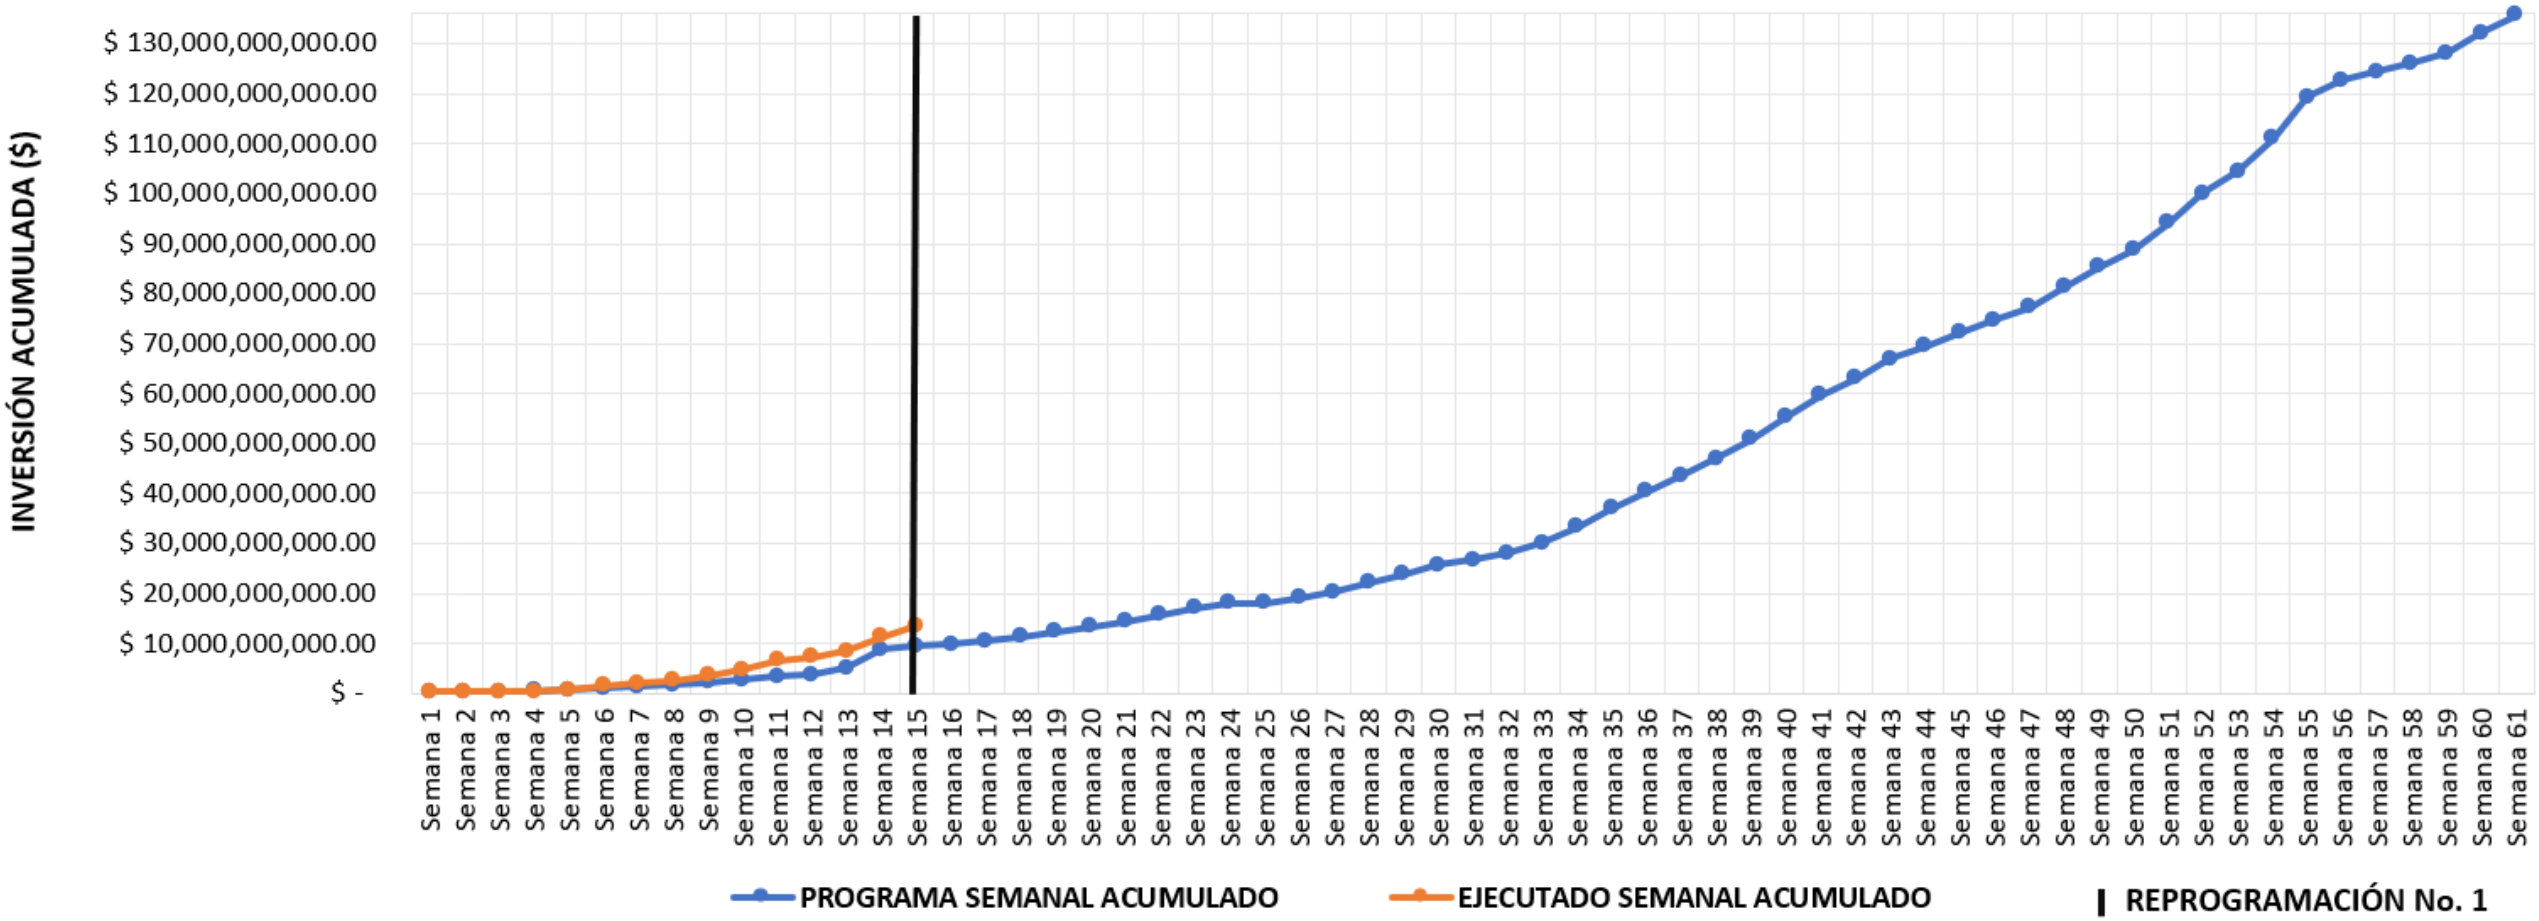

Programado	Ejecutado	Avance
6,97 %	10.04 %	3,07 %
$ 9,454,292,166.00	$ 13,556,041,261.00	$ 4,101,749,095.00
