Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

☒ Público ☐ Clasificado ☐ Reservado

FECHA:	Semana:	**8**	15/12/2025	22/12/2025	

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN - ANTIOQUIA, UBICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO DECLARADO BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL.

CONTRATO DE OBRA No.:	1890-2025	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	1900 -2025
CONTRATISTA	ID SAS	**INTEVENTOR**	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
VALOR CONTRATO DE OBRA:	$ 497.846.840,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 49.167.825,00
FECHA DE INICIO OBRA:	27/10/2025	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	27/10/2025
FECHA DE SUSPENSION DE OBRA:	NA	**FECHA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA:**	NA
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	NA	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORIA:**	NA
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE OBRA:	31/12/2025	**FECHA DE TER/CIÓN INICIAL DE INITORIA:**	31/12/2025
NUEVE FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:	NA	**NUEVE FECHA DE TER/CIÓN DE INITORIA:**	NA
PLAZO DE DURACIÓN OBRA:	65	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA:**	65


3. Descrición Obras ejecutadas

REPARACION FISURAS, PAÑETES EXTERNOS, Y 4000 KG RETIRO ANDAMIOS, PINTURA Y LAVADO FINAL CUPULAS

1. Avance del proyecto: Se muestra el estado del proyecto y los ángulos de viasuales escogidos para reportar el registro fotografico semana a semana.





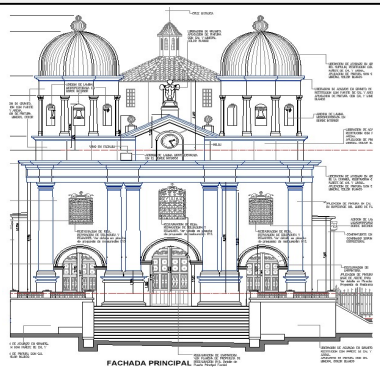

FACHADA PRINCIPAL





E Curva "S"

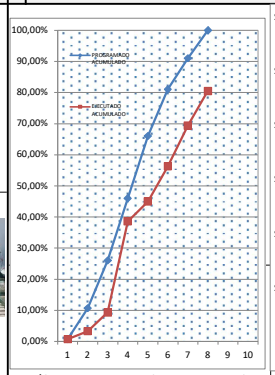


Gráfico porcent ejecutadas vs programadas

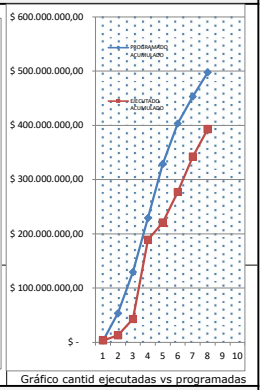


Gráfico cantid ejecutadas vs programadas

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance de Obra

ESTADO DEL PLAZO	DIAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	57,00	**88%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 485.962.563,0**	**97,61%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 393.082.694,4**	**80,93%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 92.879.868,63**	**16,68%**
Se presenta un atraso en la Obra		
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Retraso)	11,00	

6. Personal de obra e interventoría

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	ARQUITECTO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	2
	CARGO	**CANT**
CONTRATISTA	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	1
	INGENIERO RESIDENTE	1
	ESPECIALISTA EN GESTION AMBIENTAL	
	SST	1
	MAESTRO DE OBRA	
	AYUDANTES	5
	OFICIALES	10
	HERREROS	
TOTAL PERSONAL VINULADO EN OBRA		**20**


CONSTRUCTODO INEGNEIROS CONTRATISTAS LTDA
INTERVENTOR
HENRY ALBERTO CASTRO REINA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
2	10,00%	10,70%	2,59%	3,29%
3	15,30%	26,00%	6,03%	9,32%
4	20,00%	46,00%	29,30%	38,62%
5	20,00%	66,00%	6,38%	45,00%
6	15,00%	81,00%	11,30%	56,30%
7	10,00%	91,00%	13,09%	69,39%
8	9,00%	100,00%	11,10%	80,49%
9	0,00%			
10	0,00%			

CANTIDADES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 3.484.927,88	$ 3.484.927,88	$ 3.484.927,88	$ 3.484.927,88
2	$ 49.784.684,00	$ 53.269.611,88	$ 9.405.677,80	$ 12.890.605,68
3	$ 76.170.566,52	$ 129.440.178,40	$ 30.002.196,96	$ 42.892.802,64
4	$ 99.569.368,00	$ 229.009.546,40	$ 146.116.777,02	$ 189.009.579,66
5	$ 99.569.368,00	$ 328.578.914,40	$ 31.762.628,39	$ 220.772.208,05
6	$ 74.677.026,00	$ 403.255.940,40	$ 56.256.692,92	$ 277.028.900,97
7	$ 49.784.684,00	$ 453.040.624,40	$ 65.168.151,36	$ 342.197.052,33
8	$ 44.806.215,60	$ 497.846.840,00	$ 55.259.382,84	$ 393.082.694,37
9	$ -			
10	$ -			

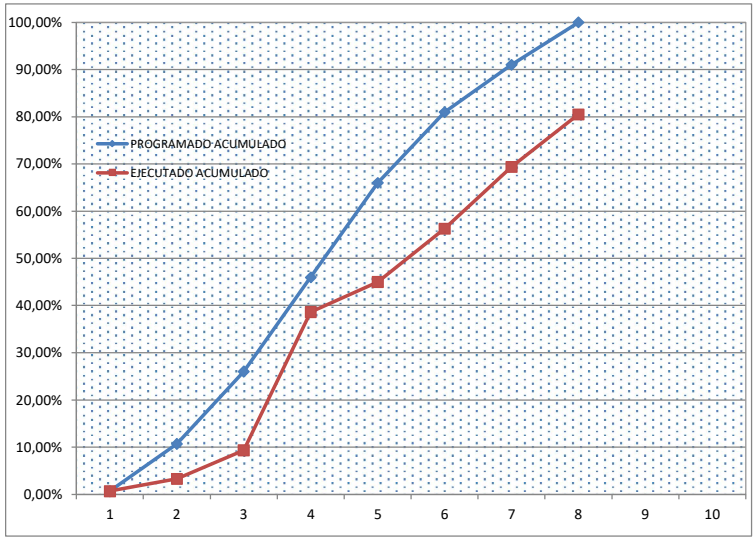

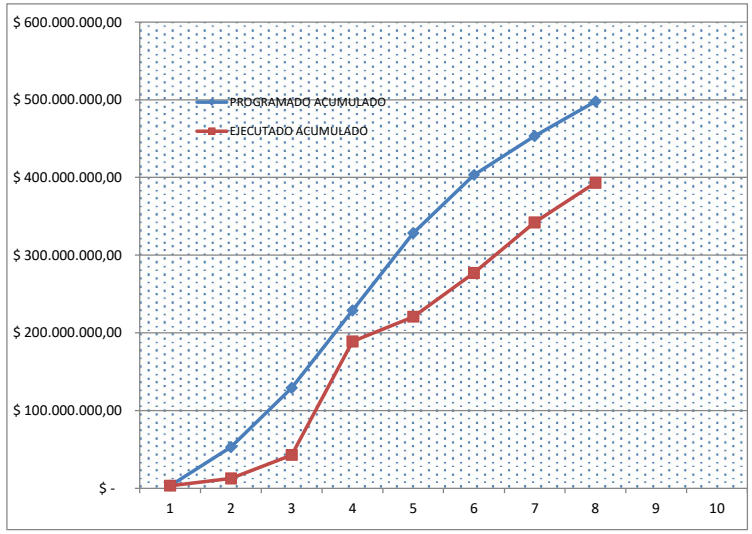

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
INTERVENTOR

SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA

FECHA REG.	**OCTUBRE 2025**	**DEPARTAMENTO**	**ANTIOQUIA**
SEMANA No.	**1**	**OBJETO**	**PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL**
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN		**INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL**	

BALANCE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO
	CAPITULO 1: PRELIMINARES										
1.1	Campamento 9 M2	UNIDAD	1,00	$ 3.049.459	$ 3.049.459		$ -	0%	1,00	$ 3.049.459,00	100,00%
1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA VERDE H = 2.10 M (Incluye postes en madera rolliza y polisombra verde o similar)	ML	100,00	$ 49.173	$ 4.917.300		$ -	0%	100,00	$ 4.917.300,00	100,00%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.966.759**		**$ -**			**$ 7.966.759,00**	
	CAPITULO 3: ESTRUCTURA MODULOS										
3.1	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/día	30000,00	$ 4.796,00	$ 143.880.000	3000	$ 14.388.000,00	10%	27000,00	$ 129.492.000,00	90%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 143.880.000**		**$ 14.388.000,00**			**$ 129.492.000,00**	
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA										
4.1	Desmonte de enchape en granito (incluye retiro de escombros)	M2		$ 77.793	$ -		$ -			$ -	
4.2	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ML	65,81	$ 565.420	$ 37.207.677		$ -			$ -	0%
4.3	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	UN	3,00	$ 3.243.227	$ 9.729.681		$ -			$ -	0%
4.4	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ML	28,00	$ 346.523	$ 9.702.644	8	$ 2.772.184,00	29%	28,00	$ 9.702.644,00	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 56.640.002**		**$ 2.772.184,00**			**$ 9.702.644,00**	
	CAPITULO 10: ACABADOS										
10.1	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	M2	1047,34	$ 84.591	$ 88.595.538	122,34	$ 10.348.862,94	12%	1047,34	$ 88.595.537,94	100%
10.2	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	M2	1047,34	$ 31.860	$ 33.368.252	400	$ 12.744.000,00	51,46%	539,00	$ 17.172.540,00	51%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 121.963.790**		**$ 23.092.862,94**			**$ 105.768.077,94**	
	CAPITULO 13: CARPINTERIA METALICA Y MADERA										
13.1	Mantenimiento de carpintería en metalica (incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte de acabado final)	M2		$ 587.657	$ -		$ -			$ -	
13.2	Mantenimiento de carpintería en madera(incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de inmunizante y dos manos de barniz de acabado final)	M2		$ 787.142	$ -		$ -			$ -	
13.4	Suministro e instalacion de proteccion vanos campanarios (rejas en marco metalico (con 1 mano de antocorrosivo y 2 manos de acabado en esmalte) y malla para control de aves (color transparente, material nylon, calibre 0,8mm rombo 4,4cm, resistencia 180k*m2, durabilidad de 4 a 6 años. Caracteristicas: proteccion uv y antihongos, no absorbe humedad, no conduce electricidad, no es escalable, no deshilacha, nudo reforzado)	M2	20,02	$ 657.540	$ 13.163.951		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 13.163.951**		**$ -**			**$ -**	
	CAPITULO 14: CUBIERTA										
14.1	lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	M2	94,45	$ 166.132	$ 15.691.167		$ -		94,45	$ 15.691.167,40	100%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 15.691.167**		**$ -**			**$ 15.691.167,40**	
	CAPITULO 15: OBRAS EXTERIORES Y ASEO GENERAL										
15.1	Aseo general para entrega	M2	300	$ 11.150	$ 3.345.000		$ -			$ -	0%
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 3.345.000**		**$ -**			**$ -**	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL						
	CAPITULO 16: ACTIVIDADES NO PREVISTAS										
							$ -		0,00	$ -	
	TOTAL OBRAS NO PREVISTAS CIMENTACION						**$ -**			**$ -**	
	TOTAL CAPITULO OBRAS NO PREVISTAS										

COSTOS DIRECTOS		**$ 362.650.670**		**$ 40.253.047**			**$ 268.620.648**	
ADMINISTRACION	28,33%	$ 102.738.935	28,33%	$ 11.403.688		28,33%	$ 76.100.230	
IMPREVISTOS	3,00%	$ 10.879.520	3,00%	$ 1.207.591		3,00%	$ 8.058.619	
UTILIDAD	5,00%	$ 18.132.533	5,00%	$ 2.012.652		5,00%	$ 13.431.032	
TOTAL A.I.U. 30%		**$ 131.750.988**		**$ 14.623.932**			**$ 97.589.882**	
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 494.401.658**		**$ 54.876.979**			**$ 366.210.530**	
IVA APIRE UTILIDAD		**$ 3.445.181**		**$ 382.404**			**$ 2.551.896**	
COSTO TOTAL		**$ 497.846.840**		**$ 55.259.383**			**$ 368.762.426**	

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
HENRY ALBERTO CASTRO REINA
INTERVENTOR

SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
FORMATO DE PRESUPUESTO

INFORMACION BASICA

ORDEN N°:	1	OBJETO	PUBLICO - EDUCACIONAL - CULTURAL
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN		INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL MUNICIPIO DE INTERÉS CULTURAL DEL ÁMBITO NACIONAL	

BALANCE DE OBRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION

OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICEMBRE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1: PRELIMINARES				
1.1	Campamento 9 M2	UNIDAD	1,00	$ 3.046.650	$ 1.049.490
1.3	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN TELA VERDE (1.2 m de altura) soportada en madera rolliza y poliuretno verde o similar)	ML	100,00	$ 49.171	$ 6.917.269
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 7.966.759**
	CAPITULO 3: ESTRUCTURA MODULOS				
3.1	Plataformas de trabajo COMPLETA con andamio certificado de 4.4 X 12 H=30m.	kg/día	30000,00	$ 4.796,00	$ 143.880.000
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 143.880.000**
	CAPITULO 4: MAMPOSTERIA				
4.1	Desmonte de enchape en granito (incluye retiro de escombros)	M2		$ 77.760	$ -
4.2	Reparación y/o remplazo de molduras afectadas o faltantes	ML	65,81	$ 560.400	$ 37.207.677
4.3	Reparación arcos de medio punto en ladrillo	UN	3,56	$ 2.243.227	$ 7.759.691
4.4	Reparación y/o consolidación de fisuras y grietas en muros	ML	28,00	$ 346.843	$ 9.702.634
	VALOR TOTAL DEL CAPETULO				**$ 56.640.002**
	CAPITULO 10: ACABADOS				
10.1	Pañete 1:3 a base de cal y arena y fibra vegetal. No incluye pintura	M2	1047,34	$ 84.591	$ 88.595.758
10.2	Pintura muro tres manos, con cal + mineral (blanco)	M2	1047,34	$ 31.860	$ 33.368.335
	VALOR TOTAL DEL CAPETULO				**$ 121.964.093**
	CAPITULO 13: CARPINTERIA METALICA Y MADERA				
13.1	Mantenimiento de carpinteria en metalica (incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de anticorrosivo y dos manos de esmalte de acabado final)	M2		$ 587.607	$ -
13.2	Mantenimiento de carpinteria en madera(incluye remplazo de piezas faltantes, masilla, lijada, una mano de inmunizante y dos manos de barniz de acabado final)	M2		$ 787.143	$ -
13.4	Suministro e instalacion de proteccion varios campanarios (rejas en marco metalico (con 1 mano de antocorrosivo y 2 manos de acabado en esmalte) y malla para control de aves (color transparente, material nylon, calibre 0,8mm rombo 4,4cm, resistencia 180k*m2, durabilidad de 4 a 6 años. Caracteristicas: proteccion uv y antihongos, no absorbe humedad, no conduce electricidad, no es escalable, no destilllacha, nudo reforzado)	M2	20,02	$ 657.640	$ 13.163.951
	VALOR TOTAL DEL CAPETULO				**$ 13.163.951**
	CAPITULO 14: CUBIERTA				
14.1	lavado y protección con sello hidrofugo de cúpulas con acabado en granito	M2	94,45	$ 166.132	$ 15.691.167
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 15.691.167**
	CAPITULO 15: OBRAS EXTERIORES Y ASEO GENERAL				
15.1	Aseo general para entrega	M2	300	$ 11.150	$ 3.345.000
	VALOR TOTAL DEL CAPITULO				**$ 3.345.000**
	CAPITULO 16: ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	VALOR TOTAL
	TOTAL OBRAS NO PREVISTAS CIMENTACION				
	TOTAL CAPITULO OBRAS NO PREVISTAS				

COSTOS DIRECTOS		**$ 362.658.973**
ADMINISTRACIÓN	28,00%	$ 102.739.023
IMPREVISTOS	3,00%	$ 10.879.529
UTILIDAD	5,00%	$ 18.132.549
TOTAL A.I.U. 36%		**$ 131.751.099**
TOTAL COSTO DIRECTO + AIU		**$ 494.402.071**
IVA SOBRE UTILIDAD		**$ 3.445.184**
COSTO TOTAL		**$ 497.847.255**

$	3.464.927,88	$	52.128.544,09	$	937.571.348,20
$	134.051.005,00	$	229.009.546,40	$	326.578.914,40
$	451.040.624,40	$	485.962.563,00		

CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
HENRY ALBERTO CASTRO REINA
INTERVENTOR

ANEXO 3			
	Proyecto Nº.		
	Interventor:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	
	Constructor:	ID SAS	
	Semana Reportada:	5	
	Perido de Informe:	1/12/2025	8/12/2025

REPORTE MANEJO IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

1. ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS



SEÑALIZACION



SEÑALIZACION

2. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA



NO APLICA A LA FECHA

3. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RELLENOS: Material de arrastre, madera, cantera, etc.

4. MANEJO DE AGUAS: Escorrentia y Residuales

NO APLICA

5. CAPTACIÓN DE AGUA: Superficiales y/o subterráneas

NO APLICA

6. OTRAS ACTIVIDADES DE MANEJO AMBIENTAL (IMPACTOS POSITIVOS O NEGATIVOS) PARA RESALTAR:





CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS
INTERVENTOR

ANEXO 4

Proyecto Nº.		
Interventor:	CONSTRUCTODO INEGNIEROS CONTRATISTAS LTDA	
Constructor:	ID SAS	
Semana Reportada:	6	
Perido de Informe:	1/12/2025	8/12/2025

REPORTE DE LA GESTION DE CALIDAD

1. CALIDAD DE MATERIALES

La interventoría Certifica la Calidad de los Materiales utilizados en la obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
X	

Liste los materiales a los cuales se les verificó el cumplimiento de los standares exigidos de Calidad: PRODUCTO SIKA LIMPIADOR PARA CUPULAS

2. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

Periodo de alistamiento y preliminares.
La interventoría Certifica la calibración de Equipos utilizados en obra.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
	X

Enumere los equipos calibrados:

3. ENSAYOS

La interventoría certifica la realización de los ensayos necesarios para la verificación del cumplimiento de las especificaciones de los materiales.
Según Formato No. _____

SI	**NO**
	X

Liste los ensayos realizados para la verificación de la Calidad de los materiales: NO APLICA DURANTE LA SEMANA

Los soportes generados por las actividades anteriores deben ser archivados por parte de la interventoria como evidencia de la Gestion de Calidad.

























OBRA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
JOSE TOMA ARIAS	DIRECTOR DE OBRAS	50%
ANTONIO LUIS ARTEAGA SANCHEZ	RESIDENTE DE OBRAS	100%
INTERVENTORIA		
NOMBRE	**CARGO**	**DEDICACION**
HENRY ALBERTO CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	50%
DAVID AMAYA NAVARRO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%

Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

Código: F-GIN-098
Versión: 4
Fecha: 24/Abr/2019

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No. 8			
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	15/12/2025 **Y EL** 22/12/2025 **PLAZO:**		
CONTRATISTA:	ID SAS	**CONTRATO No.**	1890-2025
INTERVENTOR:	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA	**CONTRATO No.**	1900 -2025

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES DICIEMBRE																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
DIRECTOR	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1												
ESPECIALISTAS																																
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
MAESTRO DE OBRA																																
OFICIAL	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3										
AYUDANTE	1	5	5	5	2	2	2	2	1	5	5	5	2	2	2	1	5	5	5	2	2	2										
SST	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1										
PERSONAL CONTRATISTA	**8**	**12**	**12**	**12**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**12**	**12**	**12**	**7**	**7**	**8**	**8**	**12**	**12**	**12**	**7**	**7**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**TOTAL PERIODO** **204**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																													SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								22	10,78%	
De fuera de la región	4	4	4	8	8	8	3	3	4	4	4	8	8	8	3	3	4	8	8	8	3	3								118	57,84%	
MANO OBRA CALIFICADA																														**0**	**0,00%**	
De la región	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								22	10,78%	
De fuera de la región	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3								66	32,35%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																														**0**	**0,00%**	
De la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0,00%	
De fuera de la región	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0,00%	
POBLACIÓN VULNERABLE																														**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0,00%	
En condición de desplazamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0,00%	
MUJERES																														**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								22	10,78%	
Profesionales - Técnicos																														0	0,00%	
PROVEEDORES																																
Local															2																	
Nacional																																
Internacional																																

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social.

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

HENRY ALBERTO CASTRO REINA
INTERVENTOR

OBRA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor anticipo:	20%	$ 99.569.368,00
valor propuesta:	100%	$ 497.846.840,00

ACTIVIDADES SOLICITUD DE ANTICIPO		VALOR
COMPRA DE MATERIALES	30%	$ 29.870.810,40
PAGO DE MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS	35%	$ 34.849.278,80
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	25%	$ 24.892.342,00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	10%	$ 9.956.936,80

INTERVENTORIA

CONCEPTO	PORCENTAJE	PESOS ($)
valor pago anticipado:		$ -
porcentaje ofertado:		$ -
valor total interventoria:		$ 49.167.825,00
valor total obra:		$ 497.846.840,00
