INFORME TRANSVERSAL DE INTERVENTORÍA n.° 7

SST, AMBIENTAL, TRÁNSITO y CALIDAD

Contrato No. 2025-2769


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.

Periodo del 1 al 31 de octubre de 2025


Versión No. 3.0

Bogotá D.C. – diciembre 2025

ELABORACIÓN Y REVISIÓN:

Componente SST y Ambiental					
Elaboró:	**Andrea Vargas Yenny Gaitán Ana Rodríguez Katalina Moya**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	10/12/2025	Fecha:	10/12/2025	Fecha:	10/12/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesionales en SST y Ambiental	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

Componente Tránsito					
Elaboró:	**Luis Daza**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	10/12/2025	Fecha:	10/12/2025	Fecha:	10/12/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Especialista Tránsito y Transporte	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

Componente Calidad					
Elaboró:	**Gloria Claudia Martin Melo**	**Revisó:**	**Andrés García Avendaño**	**Aprobó:**	**Valentín Barajas Santos**
Fecha:	10/12/2025	Fecha:	10/12/2025	Fecha:	10/12/2025
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	Profesional en Calidad	Cargo:	Coordinador Técnico de Interventoría	Cargo:	Director de Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	FECHA	CAMBIOS REALIZADOS	OBSERVACIONES
1.0	14/11/2025	Versión Inicial	Versión Inicial
2.0	01/12/2025	Atención a observaciones	Atención a observaciones
3.0	10/12/2025	Atención a observaciones supervisión	Atención de Observaciones V3

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

Título	Informe SST y Ambiental, Tránsito y Calidad n.° 7 presentado por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL correspondiente a las actividades adelantadas del 01 al 31 de octubre de 2025.		
Fecha Elaboración (día-mes-año)	10/12//2025		
Resumen	Se presentan las actividades realizadas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL en el marco del Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, respecto al seguimiento mensual de la verificación tanto integral como por aspecto, efectuada a contratistas cuyo objeto sea la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. De igual forma, se relaciona el estado técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico y ambiental del contrato, durante el período del presente informe.		
Formato	DOCX.	**Lenguaje**	Español
Código: NA	Versión 3.0		
Autor	CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL – Equipo de contrato		
Revisó	Andrés García Avendaño		

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORME SST Y AMBIENTAL 10
1.1 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 10
1.1.1 Afiliaciones y/o soportes de pagos del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral 10
1.1.2 Certificaciones pago de seguridad social y salarios contratistas 14
1.1.3 Certificaciones de la Interventoría 15
1.2 DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD DEL PERSONAL QUE INGRESA EN EL PERÍODO 15
1.3 ACTIVIDADES DE SST EN EL PRESENTE PERIODO 17
1.3.1 Inducción y capacitación 17
1.3.2 Plan de trabajo 20
1.3.3 Inspecciones SST 24
1.3.4 Elementos de Protección Personal y Dotación 25
1.4 INFORME DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO 26
1.5 CERTIFICADOS DE ALTURAS 28
1.6 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (COPASST) 29
1.7 CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 31
1.8 VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 31
1.8.1 Listado de vehículos 31
1.8.2 Inspecciones e inventario de vehículos 32
1.8.3 Relación de los equipos y/o maquinaria 33
1.9 ACOMPAÑAMIENTO SST INTERVENTORÍA EN LABORES EN CAMPO 34
1.10 ACTAS DE SOCIALIZACIÓN 39
1.11 GESTIÓN AMBIENTAL 40
1.11.1 Pin ambiental ante la SDA 40
1.11.2 Manejo de la vegetación 41
1.11.3 Manejo de cuerpos de agua y sumideros 42
1.11.4 Manejo de residuos de construcción y demolición RCD 44
1.12 VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LAS INSTALACIONES DE BODEGA Y SERVICIOS DE HIGIENE CORRESPONDIENTES, DE LOS ESPACIOS ASIGNADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE 45
1.13 SEGUIMIENTO DECRETO 332 MODIFICADO POR DECRETO 634 DEL 2023 49
1.14 SEGUIMIENTO DECRETO 1082 DE 2015 - DISCAPACIDAD / APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 50
1.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50
2. INFORME DE TRÁNSITO 52
2.1 SEGUIMIENTO PMT'S DEL CONTRATO 2025-2780 - CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD DE OBRAS CIVILES ZONA NORTE 52
2.1.1 PMT general 52
2.1.2 PMTs específicos 53
2.1.3 Seguimiento a PMTs general y específicos zona Norte 54

2.1.4 Autorización del IDPC a intersecciones complementos y nueva por cercanía a bienes de interés cultural (BIC) 55
2.2 SEGUIMIENTO PMT'S DEL CONTRATO 2025-2781 - CONSORCIO MOVILIDAD 2025 DE OBRAS CIVILES ZONA SUR 55
2.2.1 PMT general 55
2.2.2 PMTs específicos 57
2.2.3 Seguimiento a PMTs general y específicos zona sur 58
2.3 SEGUIMIENTO PMT'S GENERAL DEL CONTRATO 2025-2782 DE MANTENIMIENTO DE POSTES 58
2.3.1 Notificación de PMT's Típicos a la SDM 59
2.3.2 Seguimiento a PMT's Típicos 59
2.4 SEGUIMIENTO PMT'S GENERAL DEL CONTRATO 2025-2783 DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y DE EQUIPOS 60
2.4.1 Notificación de PMT's Típicos a la SDM 60
2.4.2 Seguimiento a PMT's Típicos 60
2.4.3 Inventario de dispositivos de señalización para PMT's típicos 60
2.5 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA SOBRE PMTS EN EL PERIODO DEL INFORME 61
2.6 CONCLUSIONES DEL COMPONENTE DE TRÁNSITO: 61
3 INFORME GESTIÓN DE CALIDAD 64
3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 64
3.2 SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE CALIDAD 65
3.3 CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE ENSAYOS DE MATERIALES (APLICA SÓLO A POSTES Y OBRAS CIVILES) 87
3.4 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS POR LOS CONTRATISTAS 92
3.5 CREACIÓN DE DOCUMENTOS 93
3.6 CORRESPONDENCIA 94
3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 95

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Sst Resumen Afiliaciones Y/O Pagos De Seguridad Social Del Periodo 10
Tabla 2. Sst Personal Retirado Del Periodo 11
Tabla 3. Sst Personal Administrativo Y/O Operativo Adicional Relacionado Para El Presente Periodo 14
Tabla 4. Sst Examen Médico Ocupacional 15
Tabla 5. Sst Resumen Inducciones Del Contrato 18
Tabla 6. Sst Capacitaciones Contratistas 18
Tabla 7. Sst Resumen Plan De Trabajo De Contratistas 20
Tabla 8. Sst Inspecciones Interventoría Y Contratistas 24
Tabla 9. Sst Relación De Personal Accidentado En El Periodo 27
Tabla 10. Sst Indicadores De Accidentalidad 28
Tabla 11. Sst Comités Copasst 30
Tabla 12.Sst Consolidado Vehículos 32
Tabla 13. Sst Relación Inspecciones Sst 36
Tabla 14. Sst Registro Fotográfico Sst 37
Tabla 15. Sst Actas De Socialización Contratistas Obras Civiles 39
Tabla 16. Manejo De Vegetación Contrato 2025-2780 41
Tabla 17. Manejo De Vegetación Contrato 2025-2781 41
Tabla 18. Convenio De Baños Contrato 2025-2780 42
Tabla 19.Convenio De Baños Contrato 2025-2781 42
Tabla 20. Protección Sumideros 2025-2780 43
Tabla 21. Protección De Sumideros Contrato 2025-2781 43
Tabla 22. Consolidado Rcd Contrato 2025-2780 44
Tabla 23. Consolidado Rcd Contrato 2025-2781 44
Tabla 24.Registro Fotográfico De Las Condiciones De Salubridad 47
Tabla 25. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2780 – Lote 1 – Zona Norte 52
Tabla 26. Relación De Sitios Con Pmt General Vigentes En Octubre De 2025 - Contrato 2025-2780 52
Tabla 27. Relación De Pmt Específicos Vigentes En Octubre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-Zona Norte 53
Tabla 28. Relación De Pmt Específicos Radicados En Sdm Para Solicitud De Aprobación De La Entidad Pendientes De Aprobación En Octubre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-Zona Norte 54
Tabla 29. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -Zona Sur 56
Tabla 30. Relación De Sitios Con Pmt General Vigentes En Octubre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 56
Tabla 31. Relación Y Estado Pmt Específicos Vigentes En Octubre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -Zona Sur 57
Tabla 32. Relación De Pmt Específicos Radicados En Sdm Para Solicitud De Aprobación De La Entidad Pendientes De Aprobación En Octubre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-Zona Norte 57

Tabla 33. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2782 – Lote 3 59
Tabla 34. Estado Y Vigencia Pmt General De Típicos. - Contrato 2025-2783 – Lote 4 60
Tabla 35. Factores De Los Planes De Calidad Evaluados Por Contrato Para El Periodo De Octubre 65
Tabla 36. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores Mes De Octubre - Contrato 2025-2780 67
Tabla 37. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores Mes De Octubre - Contrato 2025-2781 72
Tabla 38. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores _ Contrato 2025-2782 82
Tabla 39. Objetivos De Calidad Y Reporte De Resultados De Indicadores_ Contrato 2025-2783 85
Tabla 40. Registro Fotográfico De Pruebas De Inspección Correspondiente Al Periodo De Octubre 90
Tabla 41. Relación De Documentación A Octubre Plan De Calidad Contrato N.° 2025-2769 93
Tabla 42. Listado De Correspondencia Recibida Y Enviada En El Periodo De Octubre 94

Anexos

1. **SST&A**

- ANX 01. Personal
- ANX 02. Parafiscales Contratista
- ANX 03. Parafiscales Interventoría
- ANX 04. Actividades SST
- ANX 05. Documentos vehículos
- ANX 06. Equipo y maquinaria
- ANX 07. Verificación en campo Interventoría
- ANX 08. Actas de socialización
- ANX 09. Sistema gestión ambiental
- ANX 10. Condiciones de salubridad bodegas
- ANX 11. Seguimiento Decreto 634

2. **TRÁNSITO**

- ANX. 01. Seguimiento PMT's Cto 2025-2780
- ANX. 02. Seguimiento PMT's Cto 2025-2781
- ANX. 03. Seguimientos PMT’s Típicos Cto 2025-2782
- ANX. 04. Seguimientos PMT’s Típicos Cto 2025-2783
- ANX. 05. Correspondencia PMT's
- ANX. 06. Registros Fotográficos Seguimientos PMT

3. **CALIDAD**

- ANX 1. Requerimientos dotación

- ANX 2. Certificados cumplimiento P.C[1] x contrato
- ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos
- ANX 4. Planes de Mejora
- ANX 5. Formatos generales de Interventoría
- ANX 6. Correspondencia

[1] P.C: Plan de calidad

INTRODUCCIÓN

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (en adelante la "SDM") mediante concurso de méritos abierto n.° SDM-CMA-3-2025, adjudicó el Contrato de Interventoría n.° 2025-2769 al CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL (en adelante la "Interventoría") con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.", durante el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2025 y el 15 de febrero de 2026.

Así, este informe se desarrolla en cumplimiento del numeral *4.1. INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA* del *Anexo Técnico 1A* del contrato 2025-2769, celebrado entre la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD y el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, el cual establece:

> *"Mensualmente la Interventoría entregará un informe por cada contrato objeto de Interventoría a la Entidad, donde se indicará: descripción y localización de las actividades desarrolladas del contrato, una completa lista de las actividades desarrolladas por el interventor, enmarcando las actividades técnicas, administrativas, financieras y jurídicas, una ficha técnica del contrato, relación de todos y cada uno de los indicadores establecidos para el contrato, un balance financiero y el estado de avance y cumplimiento de cada uno de los contratos; igualmente, se deben incluir los anexos que soporten la información relacionada."*

De esta manera, se incluye el resumen de las labores y actividades desarrolladas por el CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL durante el período del presente informe, relacionado con la Interventoría integral de la expansión y mantenimiento del sistema de semaforización de Bogotá D.C. para las actividades de SST, Ambiental, Transito y Calidad.

1. INFORME SST Y AMBIENTAL

1.1 Sistema general de seguridad social

1.1.1 Afiliaciones y/o soportes de pagos del personal al Sistema General de Seguridad Social Integral

Para el personal que trabajó para el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025, en este informe se verificaron los soportes de pago de seguridad social o soportes de afiliación para el personal del contrato de Interventoría **CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL 2025-2769** y los contratos que esta tiene a su cargo, así:

CONTRATO 2025-2780 – CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD, componente obras civiles.
CONTRATO 2025-2781 – CONSORCIO MOVILIDAD 2025 componente obras civiles.
CONTRATO 2025-2782 – TPD componente postes.
CONTRATO 2025-2783 – YUNEX TRAFFIC 2025 componente eléctrico y equipos.

A continuación, se presenta resumen del personal contratado para el presente periodo:

Tabla 1. SST Resumen afiliaciones y/o pagos de seguridad social del periodo

CONTRATO	CANTIDAD TRABAJADORES MES ANTERIOR	NOVEDADES MES DEL 1 AL 31 OCTUBRE			CANTIDAD TRABAJADORES 1 AL 31 DE OCTUBRE
		Ingreso	Traslados	Retiros	
CONTRATO 2025–2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	41	1	0	0	42
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	37	27	0	7	57
/CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	84	11	0	15	81
CONTRATO 2025 -2782 TPD	32	1	0	0	33
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	134	2	0	2	134

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL:** Para el presente periodo, se registró una novedad correspondiente al ingreso de un (1) trabajador, quien desempeña funciones en el marco del presente contrato. Cómo resultado de este ingreso, se presenta una variación en la relación de personal con respecto al mes anterior, quedando un total de cuarenta y dos (42) trabajadores activos. Esta información se encuentra debidamente respaldada con la documentación correspondiente. Se adjuntan las planillas de seguridad social correspondientes al personal activo durante el mes reportado. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\1. Contrato 2025-2769.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Durante el presente período se realizó la aprobación y verificación de veintisiete (27) hojas de vida correspondientes al personal que ingreso por parte del Consorcio Belzcon Movilidad, como también se reportó el retiro de siete (7) trabajadores, para un total de personal directo dentro del mínimo requerido de cincuenta y siete (57) personas. Adicionalmente, se reporta el ingreso de dos (2) trabajadores y retiro de seis (6) personas como personal de apoyo para el contrato. Se verificó que la totalidad del personal se encuentre debidamente afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), cumpliendo con los requisitos legales y contractuales establecidos. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2780

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el presente período se realizó la aprobación y verificación de once (11) hojas de vida correspondientes al personal que ingresó. Adicionalmente, el Contratista reportó el retiro de quince (15) personas y como personal de apoyo se cuentan con una (1) persona para un total de 81 trabajadores vinculados al contrato. Se verificó que la totalidad del personal se encuentra debidamente afiliada al Sistema General de Seguridad Social (SGSS), cumpliendo con los requisitos legales y contractuales establecidos. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2781

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el presente periodo, se registraron novedades en los ingresos de personal, ya que se incorporó un (1) nuevo trabajador. En comparación con el mes anterior, se observa una variación en la cantidad de personal activo, alcanzando un total de 33 trabajadores. Esta información se encuentra debidamente respaldada con la documentación correspondiente. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2782.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el presente periodo, el Contratista reportó 134 personas fijas, así mismo, para el personal de apoyo reportaron 33 trabajadores, donde se retiraron cuatro (4) personas e ingresaron otras dos (2), para un total de 167 personas entre fijas y apoyo vinculadas al proyecto en el periodo ya mencionado, se cargan las planillas de la Seguridad Social del personal vigente. Ver 1. SST\ANX-01. Personal\2. Contrato 2025-2783

En la siguiente tabla se relacionan las personas retiradas por los Contratistas y la Interventoría:

Tabla 2. SST Personal retirado del periodo

Contrato	Cargo	n.° Documento	Nombre	Fecha de retiro
CONTRATO 2025–2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	Directora de Obra	1018466521	Patiño Natalia	30/09/2025
	Profesional SST	52480099	Lozada Luz	26/09/2025
	Ayudante de obra	1126121536	Orozco Walbert	18/09/2025
	Ayudante de obra	79671180	González Álvaro	22/09/2025

Contrato	Cargo	n.° Documento	Nombre	Fecha de retiro
	Ayudante de obra	1002373956	Villalobos Saray	12/09/2025
	Ayudante de obra	1042453074	Arteta Aron	12/09/2025
	Ayudante de obra	8507983	Solano Julián	18/09/2025
	Auxiliar de obra	9497379	Saavedra Salvador	18/09/2025
	Óp. Minicargador	79129242	Jiménez Pedro	10/10/2025
	Auxiliar obra	1032677686	Gamboa Andrés	31/10/2025
	Cadenero	1030675485	López Andrés	31/10/2025
	Auxiliar de obra	19792086	Rodríguez Narciso	30/10/2025
	Inspector SST	1033790097	Cárdenas Diana	18/09/2025
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	Ayudante de obra	1030522849	Mora Jesús	15/10/2025
	Ayudante de obra	1076983164	Prieto Cristian	21/10/2025
	Ayudante de obra	79416237	López Guillermo	20/10/2025
	Ayudante de obra	93202796	Navarro Luis	23/10/2025
	Ayudante de obra	1022367492	Duarte Alex	2/10/2025
	Ayudante de obra	4121574	Valbuena Juan Carlos	8/10/2025
	Ayudante de obra	1143343985	Altamar Orlando	2/10/2025
	Ayudante de obra	1001345480	Muñoz José	2/10/2025
	Ayudante de obra	1052700530	Castilla Cristóbal	7/10/2025
	Ayudante de obra	1038106720	Blandón Jhon	20/10/2025
	Ayudante de obra	1024578665	Quiroga Duván	2/10/2025
	Ayudante de obra	1032677686	Gamboa Dairon	30/10/2025
	Ayudante de obra	79792086	Jiménez Pedro	31/10/2025
	Ayudante de obra	19792086	Rodríguez Narciso	30/10/2025
	Ayudante de obra	94973799	Saavedra Salvador	31/10/2025

Contrato	Cargo	n.° Documento	Nombre	Fecha de retiro
CONTRATO 2025 -2782 TPD	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	Técnico	1090471487	Bayona Wilson	10/10/2025
	Técnico auxiliar	79854353	Castañeda Arley	17/10/2025
	Técnico	80061960	Cubillos Carlos	28/10/2025
	Escolta	1109840479	Miranda Oscar	5/09/2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Ver 1. SST\ANX-01. Personal

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para el periodo del presente informe, no se registraron novedades de retiros de personal que estuviera desempeñando funciones en el marco del contrato vigente.
- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Para el periodo del presente informe el Contratista presenta siete (7) retiros de personal del Consorcio, y se realiza el reporte de seis (6) retiros de personal de apoyo.
- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el periodo del presente informe se presenta el retiro de quince (15) personas del contrato se adjuntan los respectivos soportes.
- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el período correspondiente al presente informe, no se presentaron novedades de retiro de personal que desempeña funciones en el marco de este contrato.
- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el periodo del presente informe, se presentaron cuatro (4) retiros del personal fijo y de apoyo, se anexan planillas de seguridad social (retiro), notificación de examen de retiro y paz y salvo. De acuerdo con el Contratista, los soportes de retiro del señor Cubillos Carlos se remitirán en el próximo informe debido a que Manpower solicita 15 días hábiles para la entrega de los soportes desde recursos humanos, así mismo, los soportes de retiro del señor Miranda Oscar se remiten en este informe debido a que Fortox no reportó la novedad en el mes anterior.

A continuación, se relaciona el personal de apoyo de los **CONTRATOS 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, CONTRATO 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD, CONTRATO 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025, CONTRATO 2025-2782 TPD, CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025,** el cual hace parte del total reportado para el presente periodo:

Tabla 3. SST Personal administrativo y/o operativo adicional relacionado para el presente periodo

CONTRATO	CANTIDAD TRABAJADORES MES ANTERIOR PERSONAL DE APOYO	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE APOYO			
		Ingresos	Traslados	Retiros	Total
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD	52	2	0	6	48
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	0	1	0	0	1
CONTRATO 2025 -2782 TPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	35	0	0	2	33

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.1.2 Certificaciones pago de seguridad social y salarios contratistas

Haciendo la verificación correspondiente, se certifica mediante Paz y Salvo los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios de los contratistas que aplican para el presente periodo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Para el presente periodo, el Contratista adjuntó los certificados de los pagos al Sistema General de Seguridad Social del personal de CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD y sus consorciados, cada uno con firma del representante legal y revisor fiscal, también se remitió el certificado por parte del subcontratista PH ingeniería, donde menciona la verificación de los pagos de seguridad social del personal mínimo requerido para este contrato.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el presente periodo, se registró el ingreso de once (11) personas al contrato. En consecuencia, se adjuntan los certificados de pagos al Sistema General de Seguridad Social de todo el personal del consorcio y subcontratistas PH Ingeniería, V y P consultoría y construcción y AIPROS Asesorías integrales de proyectos sostenibles, los cuales cuentan con la firma del representante legal y revisor fiscal de cada contrato. Asimismo, se remitió el certificado emitido por el Contratista que certifica la verificación de los pagos de seguridad social del personal para este contrato.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el presente periodo, el Contratista adjunta los certificados de Paz y Salvo

correspondientes a los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social. Dichos certificados cuentan con la firma del representante legal y del revisor fiscal, y han sido avalados por la Interventoría.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el presente periodo, el contratista adjunta los certificados de Paz y Salvo correspondientes a los pagos realizados al Sistema General de Seguridad Social. Dichos certificados cuentan con la firma del representante legal y del revisor fiscal y han sido avalados por la Interventoría.

Se adjunta la certificación emitida por la Interventoría para los contratos 2025-2780, 2025-2781, 2025-2782 y 2025-2783, en donde se expresa que se han revisado y verificado los documentos soporte de pagos salariales de los contratistas.

Ver 1. SST\ANX-02. Parafiscales Contratistas

1.1.3 Certificaciones de la Interventoría

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2025, se emitieron los certificados de parafiscales correspondientes a los componentes del Consorcio Movilidad Capital: REDTIC INGENIERÍA S.A.S - BIC e INGENIERÍA CONSULTORÍA Y PLANEACIÓN S.A. INCOPLAN S.A. Para la certificación de CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL, se menciona que no están obligados a tener Revisor Fiscal, debido a que el Consorcio es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada. Por consiguiente, se envía solo la certificación de parafiscales firmada por el representante legal.

Ver 1. SST\ANX-03. Parafiscales Interventoría Contrato 2025-2769

1.2 Diagnóstico de condiciones de salud del personal que ingresa en el período

A continuación, se relacionan los exámenes realizados durante este periodo:

Tabla 4. SST Examen médico ocupacional

CONTRATO	# DE TRABAJADORES	EVIDENCIA
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	1	Ver ANX-01. Personal / 1. 2025-2769 / 4. Seguimiento EMO
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	30	Ver ANX-01. Personal / 2. 2025-2780 / 5. Seguimiento EMO
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	11	Ver ANX-01. Personal / 3. 2025-2781 / 3. Seguimiento EMO / Seguimiento Divulgación EMO

CONTRATO	# DE TRABAJADORES	EVIDENCIA
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1	Ver ANX-01. Personal / 4. 2025-2782 / 5. Seguimiento EMO
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	7	Ver ANX-01. Personal / 5. 2025-2783 / 5. Seguimiento EMO

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante este periodo, Se realizó un (1) examen médico ocupacional de ingreso, de acuerdo con la nueva normatividad vigente, así como el seguimiento correspondiente a las recomendaciones de tipo ocupacional emitidas por la IPS. Dichas recomendaciones estuvieron dirigidas a todos los trabajadores que actualmente desempeñan labores en el consorcio. Estas acciones se desarrollaron con el propósito de garantizar el cumplimiento de las indicaciones médicas y fomentar el bienestar, la salud y la seguridad de los trabajadores. Como respaldo de este proceso de seguimiento, se anexa un archivo en formato Excel, junto con el listado de asistencia, en el cual se detalla el control efectuado sobre los exámenes médicos ocupacionales realizados a cada trabajador.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD:** Durante este periodo, el Contratista presentó treinta (30) exámenes médicos ocupacionales correspondientes al personal que ingresó en el período del personal directo mínimo requerido, dos (2) de personal de apoyo y un (1) EMO de personal de apoyo PH ingeniería que fue actualizado de la señora Romero Daniela Se anexa el seguimiento EMO de todo el personal del contrato.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante este periodo, el Contratista presentó once (11) exámenes médicos ocupacionales correspondientes al personal que ingresó en el período. Se anexa el seguimiento EMO de todo el personal del contrato.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante este periodo, En cumplimiento de la nueva normatividad vigente para la realización de exámenes médicos ocupacionales, se ejecutó un (1) examen médico de ingreso, conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Dicho examen fue realizado por la IPS autorizada**,** la cual notificó oportunamente tanto al trabajador como a la organización sobre las recomendaciones médicas derivadas de los resultados obtenidos. Estas recomendaciones están orientadas a prevenir posibles afectaciones a la salud de los trabajadores y a fortalecer las condiciones seguras en el desarrollo de sus labores.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante este periodo, se realizaron siete (7) exámenes periódicos. Los exámenes de Becerra Maikol, Cárdenas Hugo y Carrillo Javier se reprograman para el siguiente mes. Adicionalmente, para las personas que ingresaron, los

exámenes se realizaron en enero 2025 y julio 2025 y estos se encuentran en la carpeta de ingresos. Así mismo, se anexa el seguimiento EMO de todo el personal del contrato.

Ver Anexo 1. SST\ANX-01. Personal

1.3 Actividades de SST en el presente periodo

1.3.1 Inducción y capacitación

1.3.1.1 Inducciones

Se revisan y cruzan los soportes de inducción y reinducción de personal del presente periodo de acuerdo con el SG-SST específico para cada contrato.

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para el mes de octubre, se llevó a cabo una (1) inducción de seguridad dirigida al personal de nuevo ingreso del contrato.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el mes de octubre se presentaron veintinueve (29) inducciones realizadas al personal que ingresó incluido el personal de apoyo cada uno acompañado de su respectiva evaluación de conocimientos y registro de asistencia.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el mes de octubre el Contratista presenta once (11) inducciones del personal que ingresó cada uno acompañado de su respectiva evaluación de conocimientos y registro de asistencia.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el mes de octubre, se llevó a cabo una (1) inducción de seguridad dirigida al personal de nuevo ingreso del contrato.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el mes de octubre, se llevaron a cabo cuatro (4) inducciones para el personal antiguo. Para las personas que ingresaron, las inducciones se realizaron en agosto y septiembre de 2025 y los soportes se encuentran en la carpeta de ingresos, cumpliendo así con los protocolos de ingreso establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A continuación, se presenta un resumen del proceso de inducción específico para el personal que ingresó durante este periodo.

Tabla 5. SST Resumen inducciones del contrato

CONTRATO	CANTIDAD INDUCCIONES	EVIDENCIAS
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	1	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 1. Contrato 2025-2769
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	29	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 2. Contrato 2025-2780
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	11	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 3. Contrato 2025-2781
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 4. Contrato 2025-2782
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	4	Ver ANX-04. Actividades SST / 2. Inducciones / 5. Contrato 2025-2783

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.3.1.2 Capacitaciones

A continuación, se presenta cuadro resumen de capacitaciones según los soportes de los contratistas e Interventoría:

Tabla 6. SST Capacitaciones contratistas

CONTRATISTA	CANTIDAD	TEMA	FECHA	ASISTENTES
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	6	1. Pausas Activas	1 al 31 de octubre de 2025	42
		2.Promoción de la Salud Mental y prevención del trastorno Mental	17/10/2025	42
		3.Trabajo en Equipo	15/10/2025	42
		4.Manejo Defensivo	20/10/2025	7
		5.Punto de Encuentro	16/10/2025	42
		6.Realización de Simulacro	22/10/2025	42
CONTRATO 2025 - 2780 CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	6	1. Inducciones	Del 1 al 31 de octubre de 2025	29
		2. Charlas de seguridad	Del 1 al 31 de octubre de 2025	60
		3 sensibilización y funciones de brigada emergencia	22/10/2025	23
		4 manejo de residuos sólidos y líquidos	29/10/2025	6
		5 uso y mantenimiento de EPP	29/10/2025	9
		6 riesgo químico	27/10/2025	7
CONTRATO 2025 - 2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	6	1. Inducciones	Del 1 al 31 de octubre de 2025	11
		2. Reporte de actos y condiciones	03/10/2025	30
		3 participación identificación de peligros	12/09/2025	30

CONTRATISTA	CANTIDAD	TEMA	FECHA	ASISTENTES
		4 manejo seguro de herramientas	19/09/2025	26
		5 uso adecuado EPP	06/10/2025	15
		6. Charlas de seguridad	Del 1 al 31 de octubre	60
CONTRATO 2025 - 2782 TPD	3	1.Charlas de Seguridad	Del 1 al 31 de octubre de 2025	33
		2. (Pausas Activas)	Del 1 al 31 de octubre de 2025	33
		3. Conducción Bajo efecto del Alcohol/SPA	24/09/2025	33
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	8	1. Charlas de seguridad	1 al 31 de oct de 2025	134
		2. Trabajo en equipo	03/10/2025	7
		3. Campaña de salud mental	10/10/2025	61
		4. Estilos de vida saludables	16/10/2025	101
		5. Armonía emocional y consciente	17/10/2025	51
		6. Formación de líderes	22/10/2025	9
		7. Investigación de accidentes	15/10/2025	4
		8. Socialización de procedimiento trabajo en alturas	31/10/2025	13
		8. Simulacro distrital	22/10/2025	26

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el mes de octubre de 2025 se llevaron a cabo diversas jornadas de capacitación dirigidas a todo el personal de la organización, en cumplimiento del Plan de Trabajo establecido en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).Estas actividades fueron desarrolladas de acuerdo con el cronograma establecido, con el propósito de fortalecer la cultura organizacional en temas de prevención, autocuidado y seguridad laboral, promoviendo así entornos de trabajo saludables, seguros y sostenibles para todos los colaboradores.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes de octubre de 2025, el Contratista presentó el programa de capacitaciones correspondiente a su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Como evidencia del cumplimiento de las actividades formativas, de acuerdo con la cantidad de capacitaciones programadas se ejecuta el 100%, a su vez se menciona que se llevaron a cabo cuarenta y ocho (48) charlas de acuerdo con el cronograma de capacitaciones del contrato.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el mes de octubre del 2025, el Contratista realizó ciento dos (102) charlas que equivalen a los siete (7) frentes de trabajo activos, no obstante, se da claridad que durante el mes algunas intersecciones no ejecutaron

actividades por vencimiento de PMT, como también se menciona que se presentaron cuatro (4) capacitaciones de las cuales fueron programadas y ejecutadas por el área SST de acuerdo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se alcanzó un 100% de cumplimiento.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD**: Durante el mes de octubre de 2025, se desarrolló una jornada de capacitación sobre la Conducción bajo los efectos del alcohol y el consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA), en el marco de las acciones contempladas en el del cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). En la actividad participaron 33 trabajadores, quienes recibieron información y orientación sobre los riesgos asociados a la conducción en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, así como sobre las medidas preventivas y de autocuidado que contribuyen a la seguridad vial y laboral.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el período evaluado, El Contratista adjuntó el plan de intervención y capacitación, donde se realizó el seguimiento y se evidenció que se programaron 12 actividades y solo se ejecutaron 10 actividades, cumpliendo con el 83% de las actividades programadas durante el mes. Estas incluyeron charlas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), participación en el simulacro distrital, así como capacitaciones específicas en riesgo psicosocial y estilos de vida saludable, fortaleciendo las competencias del personal y promoviendo un entorno de trabajo seguro.

Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \1. Capac

1.3.2 Plan de trabajo

A continuación, se relaciona el resumen de actividades referentes a la ejecución del plan de trabajo del **CONTRATO 2025-2780 CONSORCIO BELZCON - MOVILIDAD,** componente obras civiles, **CONTRATO 2025-2781 - CONSORCIO MOVILIDAD 2025** componente obras civiles, **CONTRATO 2025-2782 - TPD** componente postes **CONTRATO 2025-2783 - YUNEX TRAFFIC 2025** componente eléctrico y equipos.

Tabla 7. SST Resumen plan de trabajo de contratistas

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	Capacitación Programa de Riesgo Psicosocial Capacitación en Seguridad Vial Exámenes Ocupacionales de Ingreso Inducción de Seguridad nuevo Trabajador Revisión documentación Vehículos (Soat, Tecno-mecánica) Revisión Documentación Conductores (licencias, Seguridad Social) Entrega de Dotación /EPP Seguimiento uso de EPP/ Dotación Sensibilizaciones SST	Actividades Programadas 36 Actividades Ejecutadas 35 Porcentaje Cumplimiento 97%

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Realización Pausas Activas Seguimiento recomendaciones médicas exámenes Ocupacionales Reunión mensual del Copasst Reunión Mensual CCL Inspecciones de Seguridad (locativa, equipos de emergencia, EPP, vehículos, motocicletas Verificación pagos de seguridad Social Actualización Indicadores de proceso, estructura, resultado Verificación y acompañamiento SST en Campo.	
CONTRATO 2025 - 2780 CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD	Actualización y divulgación reglamento SST Divulgación política de trabajo alcohol y objetivos Verificación de aportes SGSSS Socializaciones manuales, fichas, de seguridad a los colaboradores Relación actas COPASST Reporte actos y condiciones inseguras Compra y entrega de EPP Curso y reentrenamiento alturas Exámenes médico-ocupacionales Alimentar indicadores SG-SST Participación simulacro distrital Participación brigadistas Inspecciones EPP, locativas, equipos de emergencia, herramientas y equipos Compra y entrega EPP Reporte de condiciones inseguras	Programadas 22 actividades Ejecutadas 22 actividades Porcentaje cumplimiento 100%
CONTRATO 2025 - 2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	Socialización y notificación de riesgos Capacitación de inducción SG-SST Reunión COPASST Reunión COCOLAB Realización EMO Socialización reglamento higiene y seguridad industrial Divulgación de políticas (SST, alcohol, seguridad vial) Inspección y uso EPP Inspección riesgo locativo Inspección orden y aseo Inspecciones herramienta y equipos Capacitación uso almacenamiento de EPP Verificación de ejecución EMO Divulgación de lecciones aprendidas Estadísticas de ausentismo, incapacidad y accidente laboral Simulacro distrital	Programadas 17 actividades Ejecutadas 17 actividades Porcentaje cumplimiento 100%

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
CONTRATO 2025 -2782 TPD	Realización de exámenes médicos ocupacionales de Ingreso Seguimiento recomendaciones médicas de exámenes de ingreso Actividades de Promoción y prevención en riesgo Psicosocial y Biomecánico Asignación y Reposición de EPP Inspecciones de Seguridad (equipos de emergencia, locativas, sustancias químicas, EPP, Herramienta menor) Pausas Activas Capacitación Mensual Inducción a Trabajador Nuevo Reunión mensual Copasst Reunión Mensual CCL Proceso de subsanación hallazgos SST Revisión Licencias de Conducción, Soat, Tecno mecánicas	Programadas 26 actividades Ejecutadas 26 actividades Porcentaje cumplimiento 100%
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	Seguimiento a la ejecución cronograma de trabajo EHS proyecto Inducción y capacitación a personal interno y/o externo Entrega de informes mensuales con los soportes de la gestión EHS Pausas activas Entrega de elementos de protección personal Ejecución cronograma de inspecciones Inspección de grúa, vehículo y actividades de operación de grúa y brazo articulado. Verificación de la vigencia de los documentos de los vehículos. Reporte y gestión de fallas de control actos inseguros, condiciones inseguras en las áreas, reporte, investigación Indicadores de accidentalidad (Frecuencia, severidad y ausentismos) Realizar la verificación y programación del personal que realiza actividades de: operación de grúa, manejo defensivo y alturas. Realizar la verificación y programación del personal a exámenes médicos Realizar el seguimiento y programación de las inspecciones anuales de los equipos y herramientas (Alturas, escaleras, grúas) Diligenciamiento de la documentación EHS Inspección en el sitio de trabajo de los elementos disponibles para atender una emergencia Socialización de PONS con los trabajadores. Preparación y ejecución de simulacros Seguimiento a planes de acción y de mejora derivados de hallazgos	Programadas 20 actividades Ejecutadas 20 actividades Porcentaje cumplimiento 100%

CONTRATO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
	Inspecciones mensuales de sustancias químicas y kit de derrames Disposición final de residuos peligrosos con proveedor autorizado	

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

El porcentaje de avance de la ejecución del plan de trabajo anual de los contratistas para el presente periodo se relaciona a continuación:

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para el periodo del presente informe, se logró un cumplimiento del 97% en la ejecución de las actividades planificadas, del plan de trabajo del SGSST lo que equivale al desarrollo de 35 actividades de las 36 actividades programadas. Estas acciones se encuentran alineadas con el ciclo de mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), en concordancia con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El objetivo principal de estas actividades fue fortalecer la cultura de prevención, promover el bienestar laboral y asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el periodo del presente informe, se ejecutó el plan de trabajo que contemplaba 22 actividades programadas, de las cuales se completaron 22, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100%.de las actividades del plan de trabajo.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el periodo del presente informe, se da cumplimiento al plan de trabajo donde se programaron 17 actividades de las cuales 17 fueron ejecutadas durante el mes de octubre dando así un porcentaje de cumplimiento del 100%, según lo reportado por el Contratista.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD** Para el periodo del presente informe, la Interventoría llevó a cabo la verificación del cumplimiento en la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme al plan de trabajo previamente aprobado. Como resultado de esta revisión, se evidenció un cumplimiento del 100% del cronograma de actividades. De un total de 26 actividades programadas, se ejecutaron 26 durante el periodo evaluado. Adicionalmente, desde la Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo se remitió, vía correo electrónico, un reporte con los hallazgos identificados en la bodega. Esto con el propósito de que el Contratista procediera con la correspondiente subsanación y cierre de los hallazgos encontrados.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el periodo del presente informe, la Interventoría verificó el cumplimiento de la ejecución de 20 actividades SST conforme al plan de trabajo, abarcando la gestión de los programas de riesgo, capacitaciones, permisos de

trabajo, análisis de tareas, divulgación de controles preoperacionales, gestión de reportes de seguridad y presentación oportuna de informes a la Interventoría, cumpliendo con el 100% de ejecución para el periodo establecido.

Ver 1. SST\ ANX-04. Actividades SST \3. Seg_Plan_Trab

1.3.3 Inspecciones SST

A continuación, se presentan las inspecciones realizadas por parte del **CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA** y los contratos que esta tiene a su cargo, así:

Tabla 8. SST Inspecciones Interventoría y contratistas

Contrato	Inspección	Fecha
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	Inspección Equipos de emergencia Inspección EPP Inspección áreas Locativas	Del 1 al 31 de octubre de 2025
CONTRATO 2025-2780 - CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	Inspección a extintor Inspección botiquín Inspección orden y aseo Inspección sustancias químicas Inspección EPP Inspección vehículos (anexo 5) Inspección herramienta y maquinaria (anexo 6)	Del 1 al 31 de octubre de 2025
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	Inspección a extintor Inspección botiquín inspección camilla inspección EPP Inspección orden y aseo inspección vehículos (anexo 5) inspección Herramienta y maquinara (anexo 6)	Del 1 al 31 de octubre de 2025
CONTRATO 2025 -2782 TPD	Inspección Equipos de emergencia Inspección Equipos de EPCC Inspección Equipos y Herramientas Inspección E.P.P Inspección de sustancias químicas Inspección de Vehículos Inspecciones Locativas	Del 1 al 31 de octubre de 2025
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	Inspección de escaleras Inspección de orden y aseo Inspección de Herramientas Inspección de equipos emergencia Inspección de EHS en campo	Del 1 al 31 de octubre de 2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el presente período, se elabora el reporte correspondiente a las inspecciones realizadas, de acuerdo con el cronograma establecido. Entre las inspecciones efectuadas se incluyen:

inspección de equipos de emergencia, inspección de elementos de protección personal (EPP), inspección de áreas locativas entre otras.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el presente período, se realizaron las actividades que se detallan en el cronograma de inspecciones mensuales adjunto, incluyeron la revisión de extintores, botiquines, camilla, orden y aseo y EPP.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el presente período, se ejecutaron inspecciones para garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos. En el programa de inspecciones abarcó la verificación del estado operativo de extintores, botiquines de primeros auxilios, camilla de emergencia, elementos de protección personal (EPP), en los frentes de obra activos, el Contratista realiza refuerzo de los equipos de emergencia por áreas de trabajo.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD** Durante el presente período se llevaron a cabo inspecciones programadas a herramientas, equipos e instalaciones, con el objetivo de verificar su estado y condiciones de seguridad. Estas actividades incluyeron la revisión de extintores, botiquines de primeros auxilios, elementos de protección personal (EPP), elementos de protección contra caídas (EPCC, escaleras). Asimismo, se evaluaron las condiciones locativas de las áreas de trabajo y el almacenamiento de productos químicos, tanto en los diferentes frentes de obra como en la bodega del contratista .

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el presente período, se verificó que el Contratista realizó las inspecciones mencionadas en la tabla 8, adicionalmente, la Interventoría corroboró la correcta ejecución de estas actividades mediante visitas de supervisión a los diferentes frentes de trabajo, garantizando así el adecuado monitoreo de las condiciones laborales, por lo cual se cumple el 100% de las inspecciones programadas.

Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades STT \4. Inspec

1.3.4 Elementos de Protección Personal y Dotación

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el período correspondiente a este informe, se llevó a cabo la asignación y seguimiento en uso de Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación institucional o corporativa de forma correcta, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y al Manual de Indumentaria establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), contribuyendo así a fortalecer la uniformidad, imagen institucional y adecuada presentación del equipo de trabajo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista dio cumplimiento a la obligación de suministrar reposición de EPP al personal del contrato, realizando la asignación conforme al análisis de riesgos ocupacionales

y perfil del cargo. Esta gestión garantiza las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo óptimo de las labores del proyecto, manteniendo trazabilidad del proceso a través de actas de entrega individuales y debidamente firmadas.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe el Contratista realizó la entrega de la dotación de imagen institucional y de los elementos de protección personal (EPP) al personal que ingresó en el periodo, de acuerdo con el perfil de cargo de cada trabajador, como también Interventoría en mesa de trabajo solicitó la debida reposición de EPP, puesto que se ha evidenciado el uso inadecuado de los mismos, por lo cual se solicita llamados de atención al personal.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD** Durante el período correspondiente al presente informe, se realizó la entrega de Elementos de Protección Personal (EPP), base en un análisis previo de los riesgos y peligros asociados a las actividades a desarrollar. Esta entrega tuvo como objetivo garantizar que cada trabajador cuente con los implementos adecuados para su protección, en cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realizó la entrega obligatoria de los equipos de protección personal (EPP) a su personal, conforme a los requisitos establecidos en la legislación actual. Los registros que evidencian estas entregas se adjuntan como anexo al informe actual, lo que permite confirmar el cumplimiento de este compromiso relacionado con la seguridad en el trabajo.

Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \5. Ent EPP y Dot

1.4 Informe de accidentes e incidentes de trabajo

En cumplimiento de la Resolución 1401 de 2007, se debe registrar y notificar los accidentes e incidentes de trabajo que se presenten en la ejecución del contrato. Los trabajadores afectados deben reportar inmediatamente el accidente o incidente de cualquier tipo a su jefe inmediato, o al área SST- Ambiental.

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante este periodo no se presentaron accidentes e incidentes laborales.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el presente periodo no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante este periodo no se presentó accidentes ni incidentes de trabajo.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** El 27 de octubre de 2025, se presentó un incidente laboral en la AK 86 x CL 46 sur sobre las 8 pm aproximadamente, el grupo de mantenimiento correctivo se encontraba realizando la implementación de un cableado aéreo que se solicitó esa misma tarde por la SDM, el grupo instala el cable en la ménsula ubicada en el flujo 2 carril derecho, el cual estaba cerrado por unos maletines instalados por movilidad, en el momento que la grúa se estaba ubicando en el flujo 6B para continuar con la implementación, un camión ingresa por el carril del flujo 2 que estaba cerrado y acelera llevándose el cable que ya estaba instalado, el colaborador que tenía el cable en la mano y lo suelta evitando ser halado con él, el camión al llevarse el cable tumba el semáforo y continua con su camino sin percatarse de lo ocurrido. No sucede ningún daño o lesiones a los colaboradores, ni bienes de la empresa. La investigación de este incidente se remitirá en el próximo informe.

  Igualmente, el 27 de octubre de 2025, por medio del comunicado SEM-CMC-SDM-099-25 con n.°. de radicado ORFEO 202561203919132, se remiten los planes de acción del accidente ocurrido el 20 de mayo de 2025 del señor James Fernando Contreras Sáenz.

Tabla 9. SST Relación de personal accidentado en el periodo

CONTRATO	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	SEGUIMIENTO
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
CONTRATO 2025 -2782 TPD	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo	Sin accidentes de trabajo

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se presenta un resumen de los indicadores de accidentalidad durante el periodo de ejecución correspondiente al presente informe:

Tabla 10. SST Indicadores de accidentalidad

n.° CONTRATO	No. DE EMPLEADOS CONTRATISTA (INCLUYE PERSONAL DE APOYO)	n.° DE PERSONAS ACCIDENTADAS	FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD	42	0	0	0	0
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	105	0	0	0	0
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	81	0	0	0	0
CONTRATO 2025 -2782 TPD	33	0	0	0	0
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	167	0	0	0	0

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \6. Accidentalidad

1.5 Certificados de alturas

En cumplimiento de la Resolución 4272 de 2021, por la cual establece los requisitos de seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas, se deben mencionar todas las actividades y certificados de alto riesgo que se ejecutaron del 1 al 31 de octubre:

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante este periodo, el personal de Interventoría con la competencia laboral de jefe de área llevó a cabo la supervisión y el acompañamiento de las actividades en alturas ejecutadas por el personal Contratista**.** Esta labor incluyó la verificación del cumplimiento de los protocolos de seguridad, el uso adecuado de los equipos de protección personal (EPP) y la correcta ejecución de los procedimientos establecidos. El objetivo principal fue garantizar la integridad física de los trabajadores y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de trabajo seguro en alturas.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante este periodo se ejecutaron permisos en caliente para actividades con uso de pulidora teniendo en cuenta que

dichos trabajos se identifican como trabajos de alto riesgo, como también se realizan Análisis de Trabajo Seguro en todas las actividades de los frentes de trabajo del contrato, además se presenta el certificado de coordinador en alturas de la profesional SST designada para este contrato.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante este período, Se realizaron diecinueve (19) Análisis de Trabajo Seguro (ATS) para todas las actividades desarrolladas en los frentes de trabajo del contrato, y siete (7) permisos de trabajo en caliente debido al uso de pulidora, se presentan los certificados de alturas de la profesional y tecnólogo SST y oficiales.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante este periodo se llevaron a cabo actividades TAR, en las cuales se diligenciaron los respectivos formatos y permisos requeridos, tales como: Análisis de Trabajo Seguro (ATS), Permiso de trabajo respectivos, para trabajos en alturas, trabajos en caliente, e izaje de cargas. Previamente a la ejecución de cada actividad, se realizó la verificación del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normativa vigente, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de trabajo, promover el autocuidado y prevenir accidentes.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante este periodo, el Contratista reportó cinco (5) reentrenamientos para trabajos en altura, así mismo se adjunta el seguimiento de cursos de alturas del personal del contrato, permisos de trabajo en alturas, permiso de trabajo con corriente eléctrica, permiso de trabajo en caliente, inspección preoperacional de equipos y los ATS del periodo correspondiente.

Ver 1. SST\ ANX-04. Actividades SST \7. Tareas de alto Riesgo

1.6 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (copasst)

El COPASST, tiene como objetivo promover la prevención y la gestión de riesgos laborales, mejorando las condiciones de trabajo, por tal motivo se debe reflejar el seguimiento mensual.

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para el presente período se llevó a cabo la reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el día 29 de octubre de 2025 dando en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1072 de 2015. En el desarrollo de la sesión se trataron temas clave relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entre los cuales se destacan: Revisión de los principales indicadores del SG-SST, socialización plan de trabajo del comité, socialización de las políticas del SG-SST, con el fin de garantizar su apropiación por parte de todos los colaboradores. Igualmente se realizó la verificación del avance en la ejecución de las actividades de capacitación lideradas por la ARL, La reunión permitió mantener el compromiso institucional con la mejora continua en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como fortalecer la participación de los miembros del comité en el cumplimiento de sus funciones.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el presente período se llevó a cabo la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) del Contratista, en la cual se trataron temas relevantes sobre la gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización y se establecieron compromisos específicos para la corrección de condiciones inseguras identificadas.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el presente período se llevó a cabo la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), en la cual el Contratista presentó los temas más relevantes relacionados con la mejora continua de los hallazgos identificados semanalmente por la Interventoría, estableciéndose compromisos específicos para su implementación.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Para el presente periodo se llevó a cabo la reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), el día 30 de octubre de 2025 donde se abordaron diversos temas de gran relevancia para la organización en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Uno de los puntos principales tratados fue la revisión de los indicadores de accidentalidad correspondientes al periodo actual. Este análisis permitió identificar aspectos críticos que servirán como base para la implementación de acciones orientadas a la mejora continua en seguridad y salud en el trabajo.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** El 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo la reunión del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) por parte del Contratista, durante la cual se abordaron temas significativos relacionados con la gestión de SST de la organización y se establecieron compromisos específicos de condiciones inseguras.

Tabla 11. SST comités COPASST

n.° CONTRATO	Fecha acta COPASST
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	29/10/2025
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	29/10/2025
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	27/10/2025
CONTRATO 2025 -2782 TPD	30/10/2025
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	22/10/2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Ver 1. SST\ ANX-04. Actividades SST \8. COPASST

1.7 Clasificación y etiquetado de sustancias químicas

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes de octubre, se implementó la gestión de cumplimiento para el manejo de productos químicos en los frentes de obra. Esta gestión incluyó la verificación del etiquetado correcto, la disponibilidad de hojas de seguridad actualizadas, la elaboración de una matriz de compatibilidad química y la actualización del listado de productos químicos presentes en cada frente de obra. Adicionalmente, se realizó la rotulación adecuada de los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas y se verificó la validez del certificado de capacitación del conductor.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el mes de octubre de 2025, el Contratista adjunta matriz de compatibilidad de químicos, hojas de seguridad actualizadas, e inspección de kit de derrames, como también manifiesta que no transporta mercancías peligrosas en el vehículo, por lo tanto, no requiere certificado del conductor y rotulación del vehículo.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el mes de octubre de 2025, se implementaron seis acciones correctivas orientadas a eliminar la causa raíz de los hallazgos relacionados con el manejo de sustancias químicas. Estas acciones se desarrollaron con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) para la clasificación y comunicación de peligros

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el mes de octubre de 2025, la Interventoría verificó el adecuado almacenamiento de sustancias químicas tanto en los frentes de trabajo como en la bodega.

  El Contratista Indica que, las hojas de seguridad han sido migradas a formato digital y se encuentran cargadas en el repositorio digital del canal de WhatsApp de Yunex, Siguiendo los principios corporativos de la compañía y dando cumplimiento a nuestra Política de gestión integrada, donde *"promovemos el cuidado del medio ambiente, impulsando el uso eficiente de la energía y los recursos naturales…",* por lo tanto, para el mes de octubre se revisó en campo y se evidenció que los trabajadores si conocen el manejo del canal de WhatsApp y la búsqueda de las hojas de seguridad.

Ver 1 SST\ ANX-04. Actividades SST \9. Relación químicos

1.8 Vehículos, equipos y maquinaria

1.8.1 Listado de vehículos

En cumplimiento a los requerimientos contractuales, se adjunta el consolidado de vehículos de todos los contratos:

Tabla 12.SST Consolidado Vehículos

Contrato	Vehículos	Motos	Grúas	Camionetas Tipo platón	Camiones	Total
CONTRATO 2025 – 2769 INTERVENTORÍA CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL	16	8	0	0	0	24
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	0	0	0	1	1	2
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	0	0	0	0	2	2
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1	0	3	0	0	4
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	29	4	13	0	0	46

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.8.2 Inspecciones e inventario de vehículos

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para este periodo se adjunta un archivo en formato Excel que contiene los datos actualizados correspondientes a dieciséis (16) vehículos y ocho (8) motocicletas disponibles durante el presente período. Asimismo, se incluye la información de los operadores o conductores asignados a cada uno de dichos vehículos, así como las inspecciones de vehículos y motocicletas**.**

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes de octubre, el consorcio reportó dos vehículos en cumplimiento del anexo técnico del contrato: un camión con placa WPP343, destinados al traslado de material, y una camioneta tipo platón de placa JXR814 para traslado de personal administrativo, Asimismo. Como soporte de este informe, se anexan los registros de los preoperacionales de cada vehículo. Como también se adjuntan los vehículos del subcontratista PH ingeniería, como apoyo al contrato evidenciando el cumplimiento de sus documentos y preoperacionales.
  Se menciona que se realizó mantenimiento a la camioneta JXR814 en cuanto a cambio de llantas en el presente mes. Por cada frente de trabajo, se realizaron inspecciones de los vehículos

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el mes de octubre, el Contratista reportó dos vehículos aprobados en cumplimiento del anexo técnico del contrato: dos camiones con placa KYP683 y JKU690. Asimismo, se anexa al presente informe la documentación correspondiente de los vehículos del subcontratista, incluyendo los

documentos legales y los registros de inspecciones preoperacionales, no se realizaron mantenimientos preventivo o correctivos a ninguno de los vehículos en el presente mes.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Se adjunta un archivo en formato Excel que contiene los datos actualizados correspondientes a los cuatro (4) vehículos utilizados durante este periodo para el desarrollo de las actividades.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para este periodo, se anexa las inspecciones preoperacionales de vehículos de octubre 2025. Así mismo, durante este periodo se realizó las actualizaciones documentales de los siguientes vehículos y personas:

  - Técnico mecánico: GLW773, GLW769, GLW771, GLW765, GLW775
  - SOAT: FOQ182, FOK649, FON455, FON464, FON468, FON471, JTS369, JTS371, JTS372, NIO958, NKY980
  - Mantenimientos: FOK649, FYS884, GLM857, GPM437, NIO958
  - Licencia de conducción: Luis Portilla
  - Curso de manejo defensivo: 15 trabajadores

Igualmente, se adjunta documento en Excel donde se registra los datos actualizados de los vehículos y la tabla con el personal autorizado para conducción del periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, además se evidencia el retiro de una moto con placa YED09F, que pertenecía al escolta que se retiró según lo indicado en la tabla 2.

Ver 1. SST\ANX-05. Documentos Vehículos

1.8.3 Relación de los equipos y/o maquinaria

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes reportado, se realizaron actividades en los frentes de trabajo. Para tal fin, se presentaron las fichas técnicas, hojas de vida y preoperacionales de las herramientas eléctricas y/o maquinaria del subcontratista, se presenta el cronograma de mantenimientos programados. Se realizó mantenimiento a una pulidora y planta eléctrica, en cuanto a la maquinaria aprobada no se le realizo ningún mantenimiento. Se evidenció que el resto de los equipos se encuentran en buen estado y funcionamiento óptimo.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el mes reportado, se ejecutaron actividades en los frentes de trabajo del contrato. De esta manera, el Contratista presentó las herramientas eléctricas y maquinaria del subcontratista, incluyendo las inspecciones realizadas, a su vez se menciona que no se realizaron mantenimientos a herramienta y equipos del contrato.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el mes reportado, se documentaron y utilizaron diversos equipos y herramientas fundamentales para el desarrollo de las actividades programadas y ejecutadas garantizando la protección del personal y la mitigación efectiva de riesgos.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** La Interventoría verificó la documentación técnica de los equipos menores empleados (estibador, taladro, pulidora, equipo de soldar y moto soldador), incluyendo su correspondiente cronograma de inspecciones y hojas de vida. Durante el mes de octubre se verificó las inspecciones preoperacionales requeridas para los equipos empleados en las labores ejecutadas, dando cumplimiento a los estándares de seguridad industrial vigente.

Ver 1. SST\ANX-06. Equipo y Maquinaria

1.9 Acompañamiento SST Interventoría en labores en campo

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el mes de octubre, la Interventoría registró la aprobación de veintisiete (27) afiliaciones al sistema de seguridad social incluyendo la revisión de exámenes médicos ocupacionales e inducciones correspondientes al personal que ingresó durante el período.

  Durante las verificaciones por Interventoría en cada una de las intersecciones, se ha evidenciado un mejoramiento en la gestión SST, sin embargo, los hallazgos más reiterativos en los frentes de trabajo es el uso inadecuado de los elementos de protección personal-EPP del personal y bolsas de cemento arrojadas dentro de los cerramientos, aunque se subsanan dichos hallazgos se solicita a la profesional SST del contrato retirar al personal que no haga uso adecuado de sus EPP y certificado de disposición final de las bolsas de cemento.

  El día 22 de octubre el Contratista realiza el simulacro distrital contando con la participación de los trabajadores y concientización en evacuación.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** La Interventoría registró la aprobación de 11 hojas de vida del personal sub-Contratista VyP donde se presentó la verificación de once (11) afiliaciones al sistema de seguridad social incluyendo la revisión de exámenes médicos ocupacionales e inducciones correspondientes al personal que ingresó durante el período.

- La Interventoría notificó estos hallazgos mediante comunicados enviados los viernes de cada semana, y al corte del mes se logró la gestión de cierre de estos hallazgos, cabe resaltar que estos hallazgos son remitidos al área de calidad donde se requiere al Contratista un plan de acción inmediato.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el período del presente informe se llevó a cabo un acompañamiento en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), enfocado en el desarrollo de actividades

preventivas, correctivas y de atención a emergencias. Este acompañamiento incluyó la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de SST, con especial atención en tareas de alto riesgo, tales como: Trabajo en alturas, Trabajos eléctricos, Izaje de cargas, Otras actividades críticas, El objetivo principal de esta labor fue garantizar la seguridad del personal involucrado en dichas actividades.

Como parte del proceso de control y verificación de cumplimiento de normas de seguridad, se realizó una inspección en la bodega ubicada en la calle 165 #56-30. Durante esta visita, se evaluaron diversos aspectos relacionados con la seguridad y el comportamiento del personal operativo. La información recolectada fue consignada en el formato SEM-TEC-M05-F01: Inspección General de Bodega. Donde se evaluaron los siguientes aspectos: Cumplimiento de normas de seguridad industrial, Uso adecuado de elementos de protección personal (EPP), Condiciones de almacenamiento y organización de materiales, Señalización de seguridad y rutas de evacuación, Estado de equipos y herramientas de trabajo, Orden y limpieza general del área, rotulación de sustancias químicas de acuerdo con el SGA entre otros a los cuales se observan dificultades de cumplimiento de acuerdo con el ciclo PHVA.

Se realiza aprobación de hoja de vida de conductor de grúa mediante comunicados SEM-CMC-TPD-062-25 con radicado ORFEO 202561203752182 de 22/10/2025;

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** El 23 de octubre del 2025 se realizó reunión con Yunex Traffic, en donde se realizó una revisión documental del programa de alturas, donde se identificaron 2 hallazgos relacionados con la inspección anual de escaleras y el reporte a la ARL de los cursos de reentrenamiento en alturas, estos hallazgos se remitieron al Contratista y se encuentran subsanados.

  El 28 de octubre de 2025, la Interventoría realizó inventario de las grúas y camionetas, donde se evidenció un (1) vehículo con hallazgo referente a que le faltaba elementos en el botiquín, los cuales ya fueron subsanados.

  Así mismo, ese día se realizó la revisión y verificación de la bodega de la Contratista ubicada en el parque empresarial Puerta del Sol, donde no se identificó ningún hallazgo igualmente, se realizó reunión con el Profesional EHS Carlos Pérez, donde se revisan temas relacionados con el SG-SST, se anexa el acta.

  Igualmente, de las 50 verificaciones de campo realizadas en el periodo del 1 al 31 de octubre, se identificaron 3 hallazgos por divulgación de las fichas de seguridad (FDS) del canal de WhatsApp, un botiquín le faltaba elementos, diligenciamiento incompleto de formatos, los cuales se informaron mediante correo electrónico y así mismo, fueron subsanados en su totalidad por el Profesional EHS del Contratista.

Ver 1. SST\ANX-07. Verificación en Campo Interventoría

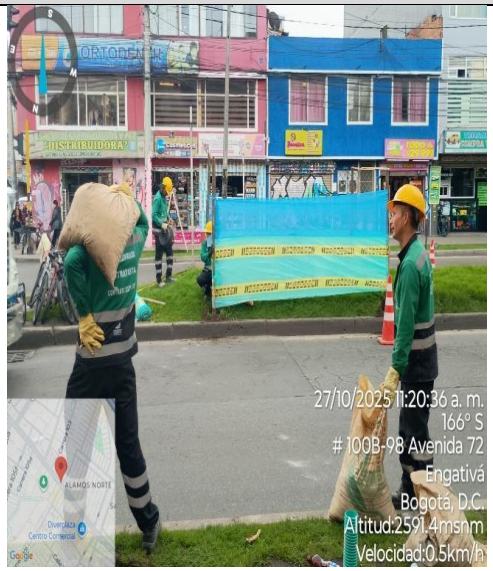
Tabla 13. SST Relación inspecciones SST

CONTRATISTAS	PERIODO	CANTIDAD DE VISITAS
CONTRATO 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	1 al 5 de octubre de 2025	17
	6 al 12 de octubre de 2025	26
	13 al 19 de octubre de 2025	16
	20 al 26 de octubre de 2025	13
	27 al 31 de octubre de 2025	11
CONTRATO 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	1 al 5 de octubre de 2025	3
	6 al 12 de octubre de 2025	17
	13 al 19 de octubre de 2025	16
	20 al 26 de octubre de 2025	22
	27 al 31 de octubre de 2025	30
CONTRATO 2025 -2782 TPD	1 al 5 de octubre de 2025	3
	6 al 12 de octubre de 2025	3
	13 al 19 de octubre de 2025	5
	20 al 26 de octubre de 2025	3
	27 al 31 de octubre de 2025	2
CONTRATO 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025	1 al 5 de octubre de 2025	12
	6 al 12 de octubre de 2025	11
	13 al 19 de octubre de 2025	13
	20 al 26 de octubre de 2025	9
	27 al 31 de octubre de 2025	5

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

A continuación, se registra evidencia fotográfica de las verificaciones en campo realizadas por parte de la Interventoría:

Tabla 14. SST Registro fotográfico SST

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD Fecha: 17/10/2025 Dirección: Ak 104 (av Cali) x CL 135a NEI: 21162 ID: 1928	 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD Fecha: 27/10/2025 Dirección: AV 72 x 101 NEI: 1564 ID: 760
S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 Fecha: 16/10/2025 Dirección: AK 79 X CL 38c sur EXT: 3454 ID:887	 CONSORCIO MOVILIDAD 2025 Fecha: 22/10/2025 Dirección: AK 78k X CL 38b SUR NEI:3122 ID:1922

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA
Fecha: 14/10/2025 Dirección: Cl 76 con AK1
EXT: 1804 ID:97

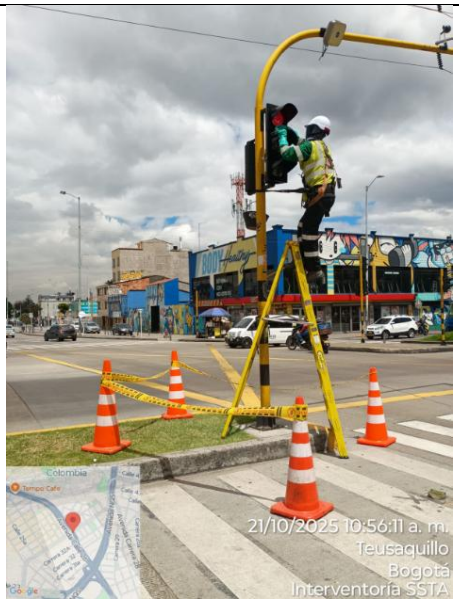


TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA
Fecha: 16/10//2025 Dirección: Calle 6 con AK 30
EXT: 2326 ID: 1294

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO



YUNEX TRAFFIC 2025
Fecha: 16/10/2025 Dirección: AK 27 X AC 6
EXT: 2325 ID: 637



YUNEX TRAFFIC 2025
Fecha: 21/10/2025 Dirección: Kr 33 con AC 26
EXT: 2147 ID:555

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.10 Actas de socialización

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** En el presente periodo las actas de socialización anexas al presente informe corresponden a los frentes de trabajo que ejecutaron actividades durante septiembre. Se aclara que estas actas se generan al momento de iniciar operaciones en cada frente y no tienen periodicidad mensual.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** En el presente informe se relacionan las actas de socialización de los frentes de trabajo donde se ejecutaron actividades durante el mes. Es importante aclarar que las actas de socialización se elaboran únicamente al inicio de la ejecución en cada frente de trabajo y no de manera mensual. Por lo anterior, se presentan las actas correspondientes a los frentes de trabajo que estuvieron en ejecución durante el mes de septiembre.

Tabla 15. SST Actas de socialización contratistas obras civiles

n.° de CONTRATO	DIRECCIÓN	ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE OBRA
CONTRATO 2025 -2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD	Av. Boyacá x Cl152	Actividad iniciada en julio de 2025
	Av. Cali x Cl 135a	Actividad iniciada en agosto de 2025
	AK 19 x Cll 134	Actividad iniciada en octubre de 2025
	av. Cali x Cll 23	Inicio de actividad en octubre de 2025
	AK 101 x Cll 72	Inicio de actividad en octubre de 2025
	tv 42 x cl 4	Inicio de actividad en octubre de 2025
CONTRATO 2025 -2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025	KR 79 x CL 38C sur	Socialización realizada el día 22 de julio de 2025
	KR 78 x K CL 38 C SUR	Socialización realizada el día 09 de julio de 2025
	KR 80 x CLL 38 C SUR	Socialización realizada el día 09 de julio de 2025
	KR 14I x Cl 84 SUR	Socialización realizada el día 18 de julio de 2025
	KR 72 x Cl 9	Socialización realizada el día 25 de julio de 2025
	TV 60 x DG 70 SUR	Socialización realizada el día 25 de julio de 2025
	KR 46ª X AC 68 SUR	Socialización realizada el día 08 de septiembre de 2025

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Se aclara que para los contratos **2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE INGENIERÍA S.A.S**, y **2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025,** no se requiere este compromiso de actas de socialización. De acuerdo con lo anterior no se presentan evidencias en el anexo.

Ver 1. SST\ANX-08. Actas soc.

1.11 GESTIÓN AMBIENTAL

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Durante el periodo del presente informe se llevó a cabo sensibilización ambiental sobre “Formas de cuidar el medio ambiente” en donde contó con la participación de todo el personal operativo y administrativo. Con lo anterior la interventoría da cumplimiento al factor de sostenibilidad, de igual manera, se adjunta la ficha técnica del papel que cuenta con el sello ambiental colombiano. Las evidencias se encuentran en el ANX-12. Factor de sostenibilidad.

1.11.1 Pin ambiental ante la SDA

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para el contrato se asigna el Pin Ambiental n.° 27327 cuyo nombre del proyecto quedó registrado “CONTRATO n.° 2025-2780 DE 2025- SEMAFORIZACIÓN LOTE 1", allí se cargará toda la información correspondiente a la gestión de los RCD. De acuerdo con lo anterior, el día 23 de octubre del presente año se realizó el cargue del reporte de RCD correspondiente a los meses de junio, agosto y septiembre. De igual manera, por falla del aplicativo WEB de la SDA se realizó nuevamente el cargue del reporte de RCD del mes de julio, como constancia se anexa la respectiva acta.
  Por otro lado, mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-118-25 con asunto “Solicitud de Cargue de Reporte de RCD” y radicado ORFEO 202561203803942 del día 16 de octubre de 2025, esta Interventoría solicita al Contratista que a más tardar el día quince (15) de cada mes realice el cargue del reporte de residuos de construcción y demolición (RCD), junto con los respectivos certificados de disposición final y/o aprovechamiento expedidos por los gestores ambientales autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) o por la autoridad ambiental competente.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para el contrato se asigna el Pin Ambiental n.° 27328, con nombre de proyecto registrado "CONTRATO 2025-2781 LOTE 2 ZONA SUR", en el cual se cargará toda la información relacionada con la gestión de los RCD. De acuerdo con lo anterior, el día 8 de octubre del año en curso se realizó el respectivo cargue de las certificaciones juramentadas para el reporte mensual de RCD correspondiente a los meses de mayo y junio de 2025, en conjunto se carga el cronograma del plan de trabajo. De igual manera, se realiza nuevamente el cargue de los reportes de RCD de los meses de julio y agosto, puesto que al momento de ingresar al aplicativo WEB de la SDA se evidencia que la información no se encuentra la cual había sido cargada los días 4 y 24 de septiembre del 2025, como constancia se anexa la respectiva acta.

  Por otro lado, mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-113-25 con asunto “Solicitud de Cargue de Reporte de RCD” y radicado ORFEO 202561203735332 del día 10 de octubre de 2025, esta Interventoría solicita al Contratista que a más tardar el día quince (15) de cada mes realice el cargue del reporte de residuos de construcción y demolición (RCD), junto con los respectivos certificados de disposición final y/o aprovechamiento expedidos por los

gestores ambientales autorizados por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) o por la autoridad ambiental competente.

1.11.2 Manejo de la vegetación

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD**: Durante el periodo del presente informe, el Contratista realiza la respectiva protección de los individuos arbóreos ubicados en las intersecciones en las cuales se encuentran realizando actividades:

Tabla 16. Manejo de vegetación contrato 2025-2780

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE INDIVIDUOS ARBÓREOS PROTEGIDOS
Av. Boyacá (AK 72) X CL 152 EXT_1162 ID_1928.	3 árboles
AK 104 (AV CALI) X CL 135ª EXT_1175 ID_1929	5 árboles
AK 19 X CLL 134 EXT_1302 ID_79	3 árboles
AK 104 (AV CALI) X CL 132 EXT_1552 ID_671	0 árboles
AK 86 (AV CALI) X CLL 23 EXT_2843 ID_797	2 árboles
KR 101 X AC 72 EXT_1564 ID_760	3 árboles
TV 42 X CLL 4ª EXT_2185 ID_1942	6 árboles

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realiza la protección a los individuos arbóreos encontrados en cada una de las intersecciones en donde están ejecutando actividades. Sin embargo, en donde han terminado actividades, el Contratista presenta el registro fotográfico donde ya no aplica la protección de estos individuos.

Tabla 17. Manejo de vegetación contrato 2025-2781

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE INDIVIDUOS ARBÓREOS PROTEGIDOS
AK 79 X CL 38C SUR	5 árboles
AK 80 X CL 38C SUR	3 árboles
AK 78K X CL 38C SUR	6 árboles
KR 14 I X CL 84 SUR	16 árboles
TV 60 X DG 70 SUR	0 árboles
AV BOYACA (AK 72) X CL 9	1 árbol
KR 46ª X AC 68 SUR	6 árboles

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.11.3 Manejo de cuerpos de agua y sumideros

1.11.3.1 Alquiler y/o convenio de baños

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realizó los respectivos convenios del uso de baño para sus trabajadores garantizando las condiciones sanitarias mínimas de higiene para el uso de estos.

Tabla 18. Convenio de baños contrato 2025-2780

DIRECCIÓN	CONVENIO DE BAÑO
Av. Boyacá (AK 72) X CL 152 EXT_1162 ID_1928.	Se adjunta acuerdo de baño
AK 104 (AV CALI) X CL 135ª EXT_1175 ID_1929 AK 104 (AV CALI) X CL 132 EXT_1552 ID_671	Se adjunta acuerdo de baño
AK 19 X CLL 134 EXT_1302 ID_79	Se adjunta acuerdo de baño
AK 86 (AV CALI) X CLL 23 EXT_2843 ID_797	Se adjunta acuerdo de baño
KR 101 X AC 72 EXT_1564 ID_760	Se adjunta acuerdo de baño
TV 42 X CLL 4ª EXT_2185 ID_1942	Se adjunta acuerdo de baño

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista presenta los acuerdos de baño con el fin que el personal pueda hacer uso del servicio de baño cerca de las áreas de trabajo, garantizando las condiciones mínimas de higiene.

Tabla 19.Convenio de baños contrato 2025-2781

DIRECCIÓN	CONVENIO DE BAÑO
AK 79 X CL 38C SUR- EXT 3454 AK 80 X CL 38C SUR- EXT 3796 AK 78K X CL 38C SUR- EXT 3049	Se adjunta acuerdo de baño
KR 14 I X CL 84 SUR	Se adjunta acuerdo de baño
TV 60 X DG 70 SUR	Se adjunta acuerdo de baño
AV BOYACA (AK 72) X CL 9	Se adjunta acuerdo de baño
KR 46ª X AC 68 SUR	Se adjunta acuerdo de baño

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.11.3.2 Protección a sumideros

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista realizó los cerramientos correspondientes a cada una de las áreas intervenidas, así como la protección de los sumideros cercanos a los frentes de trabajo.

Tabla 20. Protección sumideros 2025-2780

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE SUMIDEROS PROTEGIDOS
Av. Boyacá (AK 72) X CL 152 EXT_1162 ID_1928.	0 sumideros
AK 104 (AV CALI) X CL 135ª EXT_1175 ID_1929	3 sumideros
AK 19 X CLL 134 EXT_1302 ID_79	5 sumideros
AK 104 (AV CALI) X CL 132 EXT_1552 ID_671	0 sumideros
AK 86 (AV CALI) X CLL 23 EXT_2843 ID_797	0 sumideros
KR 101 X AC 72 EXT_1564 ID_760	5 sumideros
TV 42 X CLL 4ª EXT_2185 ID_1942	4 sumideros

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista reporta la protección de los sumideros presentes en las intersecciones, así como el cerramiento de las zonas de trabajo.

Tabla 21. Protección de sumideros contrato 2025-2781

DIRECCIÓN	CANTIDAD DE SUMIDEROS PROTEGIDOS
AK 79 X CL 38c SUR	3 sumideros
AK 80 X CL 38c SUR	3 sumideros
AK 78K X CL 38c SUR	5 sumideros
TV 60 X DG 70 SUR	5 sumideros
KR 14 I X CL 84 SUR	0 sumideros
AV BOYACA (AK 72) X CL 9	1 sumidero
KR 46A X AC 68 SUR	0 sumideros

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.11.4 Manejo de residuos de construcción y demolición RCD

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista en cumplimiento con el Decreto 507 de 2023 adjuntan los vales de transporte RCD expedidos durante el mes de octubre, los cuales fueron entregados a las plantas de los gestores ambientales Greco S.A.S, Eco desarrollo e ingeniería S.A.S, F&F Solution S.A.S, Construcción y Consultoría de Obras Civiles- Codeobras. Por lo anterior, se anexan los certificados correspondientes a los RCD entregados durante el mes. Así mismo se adjunta el certificado que estaba pendiente en el mes de septiembre que hace referencia al material comprado en la empresa Reciclados Industriales.

Tabla 22. Consolidado RCD contrato 2025-2780

CONSOLIDADO RCD- PIN 27327 CONTRATO 2025-2780							
CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD							
MES	% APROV. EN EL MES	MATERIAL APROV. EN TONELADA	MATERIAL INSTALADO NUEVO EN OBRA EN EL MES Ton	GESTOR	RCD DISPUESTO (VALES DE DISPOSICIÓN) Ton	RCD POR CERTIFICAR Ton	RCD REAL CERTIFICADO Ton
Octubre	100	277,28	41,76	Greco Ecodesarrollo e Ingeniería F&F Solution SAS Codeobras	277,28	277,28	277,28

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Por otro lado, mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-127-25 del 23 de octubre de 2025 y n.° de radicado ORFEO 2561203893392 la Interventoría emite Requerimiento Previo – Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMRCD. Por consiguiente, a través del comunicado BEL-SDM-ADM-220-25 del 29 de octubre de 2025 con n.° de radicado ORFEO 202561203963382; el Contratista manifiesta que realizan el retiro de los RCD´S de las intersecciones de acuerdo con la disponibilidad de las escombreras, puesto que, por las lluvias presentadas en el mes, las escombreras no permiten el ingreso de las volquetas. No obstante, el Contratista se compromete a cumplir con lo estipulado en el Decreto 507 de 2023 en su artículo 27.1.7.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista en cumplimiento con el Decreto 507 de 2023 adjuntan los vales de transporte RCD expedidos durante el mes de octubre, los cuales fueron entregados a las plantas de los gestores ambientales Greco S.A.S, Ingeniería y Transporte Lamd, Máquinas amarillas y Eco desarrollo e ingeniería S.A.S. Por lo anterior, se anexan los respectivos certificados de los RCD entregados durante el mes. Así mismo se adjunta los certificados que estaban pendientes en el mes de septiembre de 2025.

Tabla 23. Consolidado RCD contrato 2025-2781

CONSOLIDADO RCD- PIN 27328 CONTRATO 2025-2781							
CONSORCIO MOVILIDAD 2025							
MES	% APROV. EN EL MES	MATERIAL APROV. EN TONELADA	MATERIAL INSTALADO NUEVO EN OBRA EN EL MES Ton	GESTOR	RCD DISPUESTO (VALES DE DISPOSICIÓN) Ton	RCD POR CERTIFICAR Ton	RCD REAL CERTIFICADO Ton
Octubre	98%	202.98	319.88	Ecodesarrollo e Ingeniería Ingeniería y Transporte Lamd Greco Sas Maquinas Amarillas	207.44	207.44	

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Por otro lado, mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-131-25 del 24 de octubre de 2025 con n.° de radicado ORFEO 202561203901442 la Interventoría emite Requerimiento Previo – Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición – PMRCD.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista desarrolló actividad ambiental sobre la temática “reciclar, reutilizar, reducir”. Además, realizó la entrega a Gestiones Ambientales Castañeda S.A.S de 3.190 kilos de cartón, 631 kilos de plástico, 2318 kilos de PVC y 211 kilos de Pet, de lo anterior se anexan las respectivas certificaciones.

  Por otro lado, el día 24 de octubre 2025 se desarrolló inspección a la bodega con el fin de validar la gestión ambiental ejecutada por el Contratista, durante la inspección se encontró en buenas condiciones la protección de los individuos arbóreos, uso adecuado de los puntos ecológicos, disposición adecuada de colillas de soldadura en su recipiente metálico, separación de cartón, residuos especiales en el acopio temporal, No obstante, como hallazgo se encontró el almacenamiento inadecuado de llantas puesto que se encontraron al lado de los galones de gasolina, dicho hallazgo fue subsanado por el Contratista .

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Durante el periodo del presente informe, el Contratista desarrolló charlas sobre gestión ambiental en los siguientes temas: cambio climático y contaminación del agua. También, realizó las inspecciones mensuales de baños, cafetería, oficinas, inspección de residuos, inspección de químicos, generación y clasificación de residuos sólidos. Para este mes hace entrega de residuos peligrosos. En igual forma, realizó la entrega de residuos peligrosos, para lo cual anexa el manifiesto, puesto que la certificación es entregada por el gestor ambiental en un plazo de 90 días hábiles. Adicionalmente, el día 28 de octubre del 2025 se realizó inspección a la bodega con el fin de validar la gestión ambiental ejecutada por el Contratista, durante la inspección se evidenció todo en buenas condiciones con relación al uso adecuado de los puntos ecológicos, almacenamiento de sustancias químicas y residuos.

Ver 1. SST\ANX_09. Sistema de Gestión Ambiental

1.12 Verificación de las condiciones de salubridad de las instalaciones de bodega y servicios de higiene correspondientes, de los espacios asignados a la ejecución del contrato, acorde a la normatividad vigente

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** El día 20 de octubre Interventoría realizo verificación a la bodega del Contratista donde se evidenciaron 5 hallazgos en cuanto a:

  - Señalización y delimitación del área de almacenamiento de material
  - Falta delimitación del sendero peatonal
  - Falta señalización del área de la bodega asignada para el contrato
  - Se debe realizar jornada de orden y aseo
  - No se evidencia matriz de compatibilidad

  Estos hallazgos fueron subsanados por el Contratista el día 24 de octubre del 2025, cabe resaltar que se está dando cumplimiento a las condiciones de salubridad, servicios de higiene y adecuación de los espacios para garantizar el paso peatonal a los trabajadores.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** El día 20 de octubre Interventoría realizó verificación a la bodega del Contratista donde se evidenciaron 4 hallazgos en cuanto a:

  - No se evidencia extintor en la bodega
  - Falta delimitación y demarcación del área de trabajo
  Se evidencia insumos y material de otros contratos en el área de almacenamiento de este contrato
  -No se evidencia señalización de tableros eléctricos
  El Contratista realiza subsanación de estos hallazgos el día 24 de octubre donde se evidencia las condiciones de salubridad, orden y aseo, y espacios asignados para la ejecución del contrato.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD 2025:** Durante el presente periodo se llevó a cabo una inspección a las instalaciones locativas, en particular a la bodega, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de condiciones de salubridad, servicios de higiene y adecuación de los espacios asignados para la ejecución del contrato, así:

  Cumplimiento de Normas de Seguridad, Orden y Aseo

  Se evidenció un déficit en aspectos relacionados con el orden y la limpieza, así como un almacenamiento inadecuado de materiales, lo cual puede representar riesgos para la integridad del personal y el desarrollo seguro de las actividades. Se destaca la instalación de señalización informativa y reglamentaria en puntos estratégicos, lo cual contribuye a orientar al personal y puede mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo

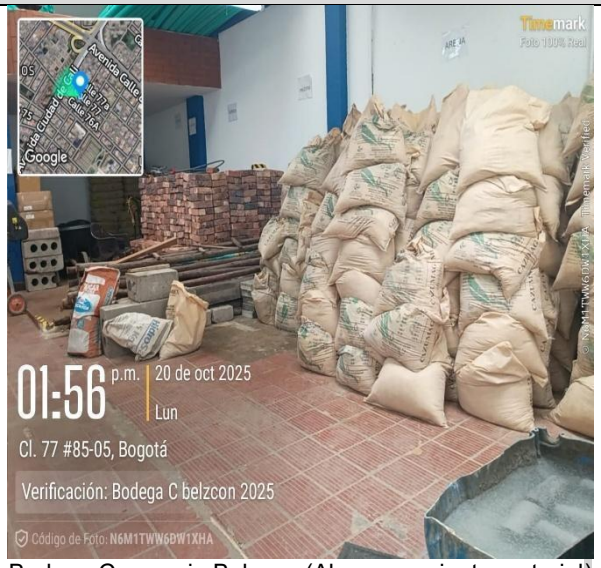
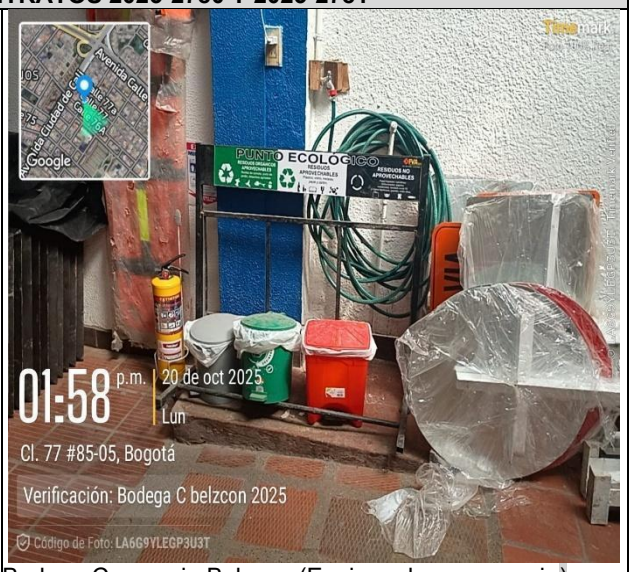
  Servicios Sanitarios y Medidas de Higiene

Se constató la existencia de unidades sanitarias diferenciadas para cada género, encontrándose en óptimas condiciones de orden, limpieza y funcionamiento. Asimismo, se observó la implementación de medidas de control sanitario

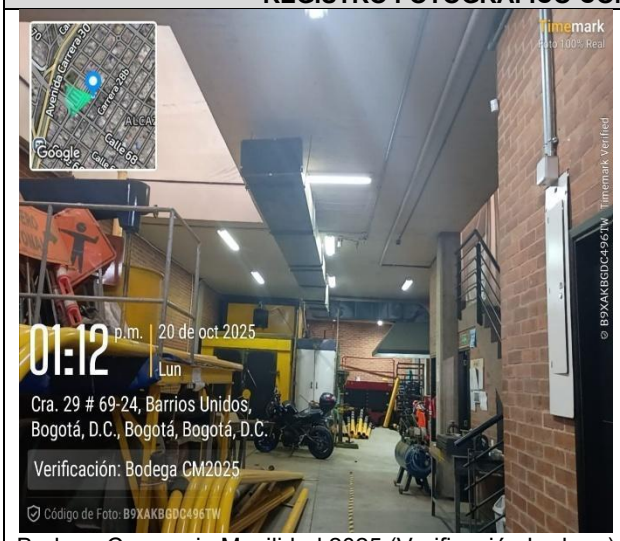
- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** El 28 de octubre de 2025 se realizó recorrido por las instalaciones de la bodega para verificar las condiciones de salubridad, entre otros ítems como se observa en la lista de chequeo anexa y registro fotográfico.

Ver 1 SST/ ANX-10. condiciones salubridad bodegas
A continuación, se presenta evidencia fotográfica referente a las condiciones de salubridad de las bodegas:

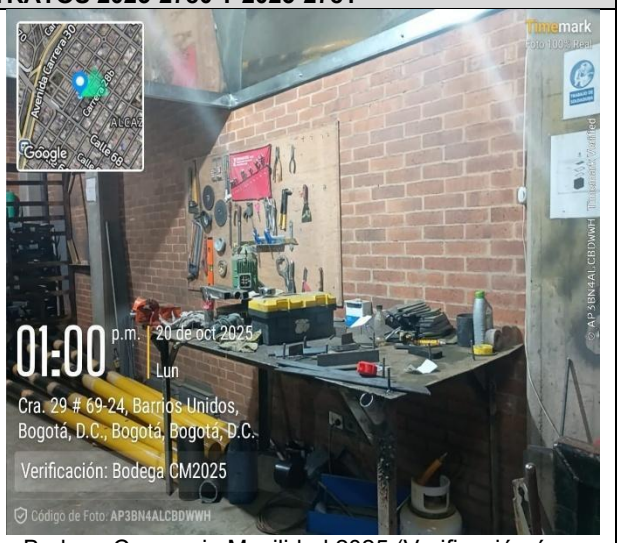
Tabla 24.Registro fotográfico de las condiciones de salubridad

SG. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATOS 2025-2780 Y 2025-2781	
	
Bodega Consorcio Belzcon (Almacenamiento material) Fecha: 20/10/2025 Dirección: Calle 77 n.° 85-05	Bodega Consorcio Belzcon (Equipos de emergencia) Fecha: 20/09/2025 Dirección: Calle 77 n.° 85-05

SG. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATOS 2025-2780 Y 2025-2781



Bodega Consorcio Movilidad 2025 (Verificación bodega)
Fecha: 20/10/2025 Dirección: CR 29 # 69-23



Bodega Consorcio Movilidad 2025 (Verificación área herramientas)
Fecha: 20/10/2025 Dirección: CR 29 # 69-23

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 2025-2782



Almacenamiento de estructuras
TPD INGENIERÍA S.A. Fecha:24/10/2025
Dirección: Calle 165 # 56-30



Equipos de Emergencia
TPD INGENIERÍA S.A. Fecha: 24/10/2025
Dirección: Calle 165 # 56-30

S.G. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATO 2025-2783

SG. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REGISTRO FOTOGRÁFICO CONTRATOS 2025-2780 Y 2025-2781	
	
Bodega UT Yunex Traffic Salubridad en bodega Fecha: 28/10/2025 Dirección: Tv 93 #51-98	Bodega UT Yunex Traffic Salubridad en bodega Fecha: 28/10/2025 Dirección: Tv 93 #51-98

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

1.13 Seguimiento Decreto 332 modificado por Decreto 634 del 2023

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Para este periodo se dio cumplimiento a la contratación y vinculación de mujeres en el proyecto, conforme a lo establecido en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. Se anexa la certificación correspondiente que respalda dicho cumplimiento.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Para este periodo, el Contratista emitió el certificado de cumplimiento correspondiente a la vinculación de mujeres al contrato con porcentaje del 9,88%, en conformidad con el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. En dicho certificado el Contratista a la fecha no cumple con lo requerido por la norma del nivel de cumplimiento del 13,8%.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Para este periodo, el Contratista informa que, para el sector de la construcción, el porcentaje mínimo de participación femenina establecido por la norma es del 13,8%. En este sentido, el Consorcio Movilidad 2025 manifiesta que para este periodo comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2025 no cumple con dicho requisito, toda vez que, dentro del personal actualmente aprobado para la ejecución del contrato, se cuenta con ochenta y una (81) personas, de las cuales ocho (8) corresponden

a mujeres lo que equivale al 9,88% de participación, cabe resaltar que el reporte de cumplimiento se hace semestral.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A.- TPD:** Para este periodo se dio cumplimiento a la contratación y vinculación de mujeres en el proyecto, conforme a lo establecido en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto 634 de 2023. Se anexa la certificación correspondiente que respalda dicho cumplimiento.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** Para el periodo de este informe, el Contratista tiene vinculado al proyecto 19 mujeres del total de integrantes que conforman el equipo de trabajo, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 332 con un porcentaje del 14,2%.

Ver 1 SST/ ANX-11. Seguimiento Decreto 634

1.14 Seguimiento Decreto 1082 de 2015 - Discapacidad / apoyo a la Industria Nacional

En ejercicio de las obligaciones asignadas mediante el Contrato de Interventoría n.° 2025-2769, celebrado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Consorcio Movilidad Capital, se anexan los certificados de vinculación de trabajadores con discapacidad vigente, emitido por el Ministerio del Trabajo y los certificados referentes al apoyo a la Industria Nacional durante la ejecución del presente contrato , donde se evidencia el cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, en los artículos 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.9.

Ver 1 SST/ ANX-12. Certificado de discapacidad / apoyo a la Industria Nacional

1.15 Conclusiones y recomendaciones

- **Contrato 2025-2769 CONSORCIO MOVILIDAD CAPITAL INTERVENTORÍA:** Es fundamental continuar fortaleciendo los procesos de formación y capacitación del personal, ya que estos constituyen una herramienta clave para el desarrollo individual y colectivo dentro de las organizaciones. Además, fomentan el compromiso, la motivación y el sentido de pertenencia de los colaboradores. En un entorno laboral cada vez más dinámico y competitivo, la capacitación continua se convierte en un factor estratégico esencial para mejorar el desempeño y alcanzar los objetivos institucionales.

- **Contrato 2025-2780 CONSORCIO BELZCON – MOVILIDAD:** Como conclusión para este contrato, se debe reforzar el cumplimiento de la gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, sensibilizando al personal sobre el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y dotación y disposición final de bolsas de cemento, así como promover prácticas de autocuidado y fomentar una cultura preventiva que incluya la identificación y reporte oportuno de condiciones y actos inseguros, el cumplimiento estricto de los procedimientos de trabajo seguro, y la participación activa en las actividades de capacitación y entrenamiento programadas por la organización.

- **Contrato 2025-2781 CONSORCIO MOVILIDAD 2025:** Como conclusión del presente periodo, se evidenció mejoramiento en cuanto a la reiteración de hallazgos presentados en los frentes de trabajo, sin embargo, se debe reforzar el uso adecuado de EPP de los trabajadores para las actividades y fomentar prácticas de autocuidado, como también se debe dar cumplimiento frente a los estándares mínimos con lo requerido en la normatividad colombiana sobre el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SG-SST.

- **Contrato 2025-2782 TRANSPORTE PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA 2025:** Como conclusión Se requiere un mayor compromiso y disposición por parte de todos los integrantes de la organización en lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, es fundamental mejorar los canales de comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos, con el fin de garantizar una adecuada coordinación y ejecución de las actividades.

- **Contrato 2025-2783 YUNEX TRAFFIC 2025:** En este periodo el Contratista entregó lo requerido en SST para el informe, igualmente, cumple con lo requerido en la normatividad colombiana sobre el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SG-SST y el Programa de Seguridad vial – PESV y ha gestionado los hallazgos identificados durante este periodo.

2. INFORME DE TRÁNSITO

A continuación, se describen las actividades de tránsito adelantadas por esta Interventoría en el periodo del 01 al 31 de octubre de 2025:

2.1 Seguimiento PMT's del Contrato 2025-2780 - CONSORCIO BELZCON MOVILIDAD de obras civiles zona norte

2.1.1 PMT general

Al 31 de octubre de 2025 se encuentra vigente el PMT general con fecha de finalización hasta el 28 de febrero de 2026:

Tabla 25. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2780 – Lote 1 – zona norte

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
15/05/2025	202561201666352	**APROBADO**	16/06/2025	SPMT 202531207778511	La ciudad de Bogotá D.C.	16/06/2025	28/02/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

La relación de sitios con PMT general vigentes con corte al 31 de octubre de 2025 del contrato 2025-2780, solicitados a la Gerencia Única de PMT y aprobados durante este mes es la siguiente:

Tabla 26. Relación de sitios con PMT general vigentes en octubre de 2025 - Contrato 2025-2780

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
742	2950	AK 50 X CL 4F	Puente Aranda	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	17-oct-25	31-oct-25
165	1107	KR 9 X CL 72	Chapinero	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25
1133	1877	AK 58 X AC 170	Suba	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25
848	2788	KR 99 X CL 17	Fontibón	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25
627	2379	TV 39 Bis A X AC 20	Puente Aranda	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25
79	1302	AK 19 X AC 134	Usaquén	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25
723	2324	AK 86 X CL 66 A	Engativá	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25
258	1488	AK 55 X AC 127	Suba	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
1294	2326	AK 30 X AC 6	Puente Aranda	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	19-oct-25	25-oct-25
79	1302	AK 19 X AC 134	Usaquén	Aprobado por SDM	39	25/09/2025	1-oct-25	17-oct-25
671	1552	AK 104 (AV. CALI) X AC 132	Suba	Aprobado por SDM	37	11/09/2025	12-sep-25	12-oct-25
767	3664	AK 50 X AC 8 Sur	Puente Aranda	Aprobado por SDM	39	25/09/2025	26-sep-25	8-oct-25
759	3660	AK 50 X CL 1G	Puente Aranda	Aprobado por SDM	39	25/09/2025	26-sep-25	8-oct-25
742	2950	AK 50 X CL 4F	Puente Aranda	Aprobado por SDM	39	25/09/2025	26-sep-25	8-oct-25
736	2911	AK 50 X CL 5A	Puente Aranda	Aprobado por SDM	39	25/09/2025	26-sep-25	8-oct-25
127	1492	KR 55 X AC 170 (AV. SAN JOSÉ)	Suba	Aprobado por SDM	37	11/09/2025	12-sep-25	3-oct-25

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia de las solicitudes de programación de PMT general y copia de los COI autorizados en el mes de octubre de 2025 para el contrato 2025-2780 – Lote 1, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

2.1.2 PMTs específicos

La relación de sitios con PMT específicos vigentes con aprobación de SDM para el contrato 2025-2780 en octubre de 2025 es la siguiente:

Tabla 27. Relación de PMT específicos vigentes en octubre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-zona norte

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	N.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Complemento	759	3664	AK 50 X AC 8 Sur	Puente Aranda	202561203821322	17/10/2025	Aprobado por SDM	44	30/10/2025	31-oct-25	30-nov-25
Complemento	1316	2911	AK 50 X CL 5A	Puente Aranda	202561203821132	17/10/2025	Aprobado por SDM	44	30/10/2025	31-oct-25	30-nov-25
Complemento	772	3410	KR 56 X AC 3	Puente Aranda	202561203751602	14/10/2025	Aprobado por SDM	43	23/10/2025	24-oct-25	27-nov-25
Complemento	742	2950	AK 50 X CL 4F	Puente Aranda	202561203742822	10/10/2025	Aprobado por SDM	43	23/10/2025	24-oct-25	17-nov-25
Nueva	767	P1007	TV 42 X CL 4 A	Puente Aranda	202561203607382	1/10/2025	Aprobado por SDM	42 Adicional	20/10/2025	20-oct-25	11-dic-25
Complemento	742	1564	KR 101 X AC 72	Engativá	202561203525852	24/09/2025	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	17-oct-25	18-dic-25
Nueva	1929	1175	AK 104(AV. CALI) X CL 135A	Suba	202561203463992	19/09/2025	Aprobado por SDM PRÓRROGA n.° 1	40	2/10/2025	10-oct-25	13-nov-25
Complemento	770	2843	AK 86 (AV. Cali) x CL 23	Fontibón	202561203351612	11/09/2025	Aprobado por SDM	41	9/10/2025	10-oct-25	11-dic-25

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	N.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nueva	736	1162	AV. BOYACÁ (AK 72) X CL 152	Suba	202561203195542	1/09/2025	Aprobado por SDM PRÓRROGA n.° 1	37	11/09/2025	12-sep-25	6-nov-25

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia de los PMT específicos de complementos e intersecciones nuevas del contrato 2025-2780, junto con su respectivo radicado en la SDM y copia de los COI autorizados para el mes de octubre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

La relación de sitios con PMT específicos radicados en la Entidad en revisión de la SDM para el contrato 2025-2780, pendientes de aprobación en octubre de 2025 es la siguiente:

Tabla 28. Relación de PMT específicos radicados en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad pendientes de aprobación en octubre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-zona norte

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO DEL PMT
Complemento	1172	1001	KR 11 X CL 66	Chapinero	27/10/2025	202561203968122	30/10/2025	En revisión por SDM
Complemento	354	1151	AK 24 X CL 66	Barrios Unidos	15/10/2025	202561203780462	15/10/2025	En revisión por SDM
Complemento	770	3659	AK 50 X CL 16 Sur	Puente Aranda	9/10/2025	202561203742622	10/10/2025	En revisión por SDM

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia del respectivo radicado en la SDM para los PMT específicos presentados a la Entidad en el mes de octubre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

2.1.3 Seguimiento a PMTs general y específicos zona Norte

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a doce (12) intersecciones, a las cuales se efectuó cincuenta y nueve (59) seguimientos a PMTs entre generales y específicos, implementados por el contrato 2025-2780 en el mes de octubre de 2025.

Copia de los formatos de seguimiento a los PMT general y específicos del contrato 2025-2780 – Lote 1 durante el mes de octubre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

Mediante comunicado BEL-SDM-ADM-161-25 del 03 de octubre de 2025, enviado por el representante legal del Contratista (CBM) y dirigido al director de Interventoría del (CMC), el cual

fue radicado en la Entidad (SDM) mediante el número ORFEO N.°202561203643522 del 03 de octubre de 2025. El Contratista (CBM) informó acerca del cumplimiento del requerimiento previo de PMT en la Av. Ciudad de Cali con Calle 135 A, el cual estaba pendiente del mes anterior, situación que fue verificada en terreno por esta Interventoría (CMC) el día 04 de octubre de 2025 con la instalación de las señales solicitadas en el requerimiento previo. Copia del comunicado BEL-SDM-ADM-161-25, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

En cuanto a los PMT de complementos pendientes por presentar por el Contratista, la Interventoría mediante comunicado SEM-CMC-CBM-116-25 radicado ORFEO n.° 202561203795622 del 16 de octubre de 2025, advirtió y requirió al Contratista del CBM la entrega en el mes de octubre de 2025 de los PMT del Complemento # 11 al Complemento # 14. Copia del comunicado SEM-CMC-CM25-116-25, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

El día 14 de octubre de 2025 se realizó Acta N.°14 de recorrido de verificación de implementación del PMT de la intersección EXT_2843 ID_797 AK 86 (AV CALI) X CL 23, verificando que el Contratista cuenta con la implementación adecuado del PMT para arrancar la etapa de ejecución de obras civiles a partir de esta fecha (14/10/2025). Copia de esta acta, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

2.1.4 Autorización del IDPC a intersecciones complementos y nueva por cercanía a bienes de interés cultural (BIC)

En cuanto a las intersecciones complemento y la intersección nueva con temas de BIC, durante octubre de 2025 el Contratista entregó al IDPC los planos, formularios y documentos técnicos con los cuales el IDPC revisará la autorización y posible aprobación de intervención en estos sitios. Copia de los documentos aprobados por Interventoría y entregados a IDPC, se incorporan al presente informe en el **ANX. 01** de los anexos del componente de Tránsito.

2.2 Seguimiento PMT's del Contrato 2025-2781 - CONSORCIO MOVILIDAD 2025 de obras civiles zona sur

2.2.1 PMT general

Al 31 de octubre de 2025 se encuentra vigente el PMT general con fecha de finalización hasta el 07 de marzo de 2026:

Tabla 29. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -zona sur

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
15/05/2025	202561201705042	**APROBADO**	24/06/2025	SPMT 202531207916131	La ciudad de Bogotá D.C.	24/06/2025	07/03/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

La relación de sitios con PMT general vigentes con corte al 31 de octubre de 2025 del contrato 2025-2781, solicitados a la Gerencia Única de PMT y aprobados es la siguiente:

Tabla 30. Relación de sitios con PMT general vigentes en octubre - Contrato 2025-2781 – Lote 2

ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	ESTADO PMT general	COI - APROBADO	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
881	3795	KR 79 X CL 40 C Sur	KENNEDY	Aprobado por SDM	42	16/10/2025	17-oct-25	15-nov-25
1754	3049	KR 78 K X CL 38 C Sur	KENNEDY	Aprobado por SDM	Por Emergencia	20/10/25	20-oct-25	31-oct-25
1339	3489	AK 86 (AV. CALI) X DG 49 Sur	KENNEDY	Aprobado por SDM	Por Emergencia	14/10/2025	14-oct-25	21-oct-25
1339	3489	AK 86 (AV. CALI) X DG 49 Sur	KENNEDY	Aprobado por SDM	39	25/09/2025	22-sep-25	7-oct-25
819	2393	AV BOYACA (AK 72) X CL 9	KENNEDY	Aprobado por SDM	36	4/09/2025	5-sep-25	4-oct-25
1202	2301	KR 16 X CL 22	LOS MARTIRES	Aprobado por SDM	36	4/09/2025	5-sep-25	4-oct-25
519	2301	KR 17 X CL 22	LOS MARTIRES	Aprobado por SDM	36	4/09/2025	5-sep-25	4-oct-25
1082	3429	KR 19C X CL 48C Sur Y DG 48 Sur	TUNJUELITO	Aprobado por SDM	36	4/09/2025	5-sep-25	4-oct-25
1177	3013	KR 18B X CL 53 Sur Y DG 54 Sur	TUNJUELITO	Aprobado por SDM	36	4/09/2025	5-sep-25	4-oct-25

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Durante el mes octubre de 2025 también se aprobó PMT por emergencia en las intersecciones de la KR 78 K X CL 38 C Sur y KR 79 X CL 40 C Sur, esto con el fin de garantizar la seguridad vial y peatonal durante la finalización de las actividades constructivas que se adelantan en estas intersecciones.

Copia de las solicitudes de programación de PMT general y copia de los COI autorizados en el mes de octubre de 2025 para el contrato 2025-2781 – Lote 2, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

2.2.2 PMTs específicos

La relación de sitios con PMT específicos aprobados para el contrato 2025-2781 en octubre de 2025 es la siguiente:

Tabla 31. Relación y estado PMT específicos vigentes en octubre - Contrato 2025-2781 – Lote 2 -zona sur

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico	COI	FECHA COI	FECHA INICIO	FECHA FIN
Nueva	1922	3122	TV 60 X DG 70 Sur	CIUDAD BOLÍVAR	22/10/2025	202561203889882	23/10/2025	Aprobado por SDM PRÓRROGA n.° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	22-ene-25
Complemento	881	3795	KR 79 X CL 40 C Sur	KENNEDY	9/10/2025	202561203728532	9/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA n.° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	15-ene-26
Nueva	1900	3928	KR 46A X CL 68 Sur	CIUDAD BOLIVAR	19/10/2025	202561203830162	20/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA n.° 1	44	30/10/2025	31-oct-25	1-ene-26
Nueva	1921	3121	KR 14 I X CL 84 Sur	USME	6/10/2025	202561203673972	6/10/2025	Aprobado por SDM PRORROGA n.° 1	42	16/10/2025	17-oct-25	4-dic-25
Complemento	1754	3049	KR 78K X CL 38 C Sur	KENNEDY	20/10/2025	FORMALIZACION DE EMERGENCIA CORREO ELECTRÓNICO DEL 20-OCT-25	20/10/2025	Aprobado por SDM Emergencia	44	30/10/2025	20-oct-25	31-oct-25

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia de los PMT específicos de complementos e intersecciones nuevas del contrato 2025-2781, junto con su respectivo radicado en la SDM para el mes de octubre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

La relación de sitios con PMT específicos radicados en la Entidad en revisión de la SDM para el contrato 2025-2781, pendientes de aprobación en octubre de 2025 es la siguiente:

Tabla 32. Relación de PMT específicos radicados en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad pendientes de aprobación en octubre - Contrato 2025-2780 – Lote 1-zona norte

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico
Complemento	1168	3873	AK 80 X CL 38 C sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967532	30/10/2025	En revisión de SDM PRORROGA n.° 1
Complemento	887	3454	KR 79 X CL 38 C Sur	KENNEDY	29/10/2025	202561203967552	30/10/2025	En revisión de SDM PRORROGA n.° 1
Complemento	882	3814	KR 63 X CL 57 B Sur	BOSA	29/10/2025	202561203967592	30/10/2025	En revisión de SDM
Complemento	930	3273	KR 79 C X CL 63 S	BOSA	29/10/2025	202561203967742	30/10/2025	En revisión de SDM

TIPO	ID	EXT	INTERSECCIÓN	LOCALIDAD	FECHA APROBADO POR INTERVENTORÍA	n.° RADICADO SDM	FECHA EN SDM	ESTADO PMT específico
Complemento	969	3690	KR 14 X CL 2 SUR	ANTONIO NARIÑO	29/10/2025	202561203967802	30/10/2025	En revisión de SDM
Complemento	819	2393	AK 72 X CL 9	KENNEDY	29/10/2025	202561203967642	30/10/2025	En revisión de SDM
Complemento	937	3916	TV 78 L X CL 68 A Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	En revisión de SDM
Complemento	936	3916	TV 78 L X CL 68 Sur	BOSA	23/10/2025	202561203892102	23/10/2025	En revisión de SDM
Nueva	1919	3119	KR 61G X CL 67B Sur	TUNJUELITO	6/10/2025	202561203673912	7/10/2025	En revisión de SDM
Complemento	896	3796	AK 80 X CL 40 C Sur	KENNEDY	9/10/2025	202561203726932	9/10/2025	En revisión de SDM PRORROGA n.° 1

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Copia del respectivo radicado en la SDM para los PMT específicos presentados a la Entidad en el mes de octubre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

En cuanto a los PMT de complementos pendientes por presentar por parte del Contratista del Consorcio Movilidad 2025, la Interventoría mediante comunicado SEM-CMC-CM25-118-25 radicado ORFEO n.° 202561203795762 del 16 de octubre de 2025, advirtió y requirió al Contratista del CM2025 la entrega en el mes de octubre de 2025 de los PMT del Complemento # 11 al Complemento # 14, los cuales a la fecha no han sido entregados. Se espera que con este comunicado sean entregados la primera semana del siguiente mes.

2.2.3 Seguimiento a PMTs general y específicos zona sur

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a diez (10) intersecciones, a las cuales se efectuó cincuenta y cuatro (54) seguimientos a PMTs generales y específicos implementados por el contrato 2025-2781 en el mes de octubre de 2025.

Copia de los formatos de seguimiento a los PMT general y específicos del contrato 2025-2781 – Lote 2 durante el mes de octubre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

En cuanto a los PMT de complementos pendientes por presentar por el Contratista, la Interventoría mediante comunicado SEM-CMC-CM25-118-25 radicado ORFEO n.° 202561203795762 del 16 de octubre de 2025, advirtió y requirió al Contratista del CM2025 la entrega en el mes de octubre de 2025 de los PMT del Complemento # 11 al Complemento # 14, los cuales a la fecha no han sido entregados. Copia del comunicado SEM-CMC-CM25-118-25, se incorporan al presente informe en el **ANX. 02** de los anexos del componente de Tránsito.

2.3 Seguimiento PMT’s general del Contrato 2025-2782 de mantenimiento de postes

A la fecha se encuentra vigente con aprobación por parte de la SDM mediante comunicado SPMT_202531206790011. La fecha de terminación quedó hasta el día 15 de febrero de 2026. El

horario de preventivos y correctivos quedó entre las 9:00 a 15:00 horas y el horario para emergencias de 6:00 a 21:00 horas.

Tabla 33. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2782 – Lote 3

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
30/04/2025	202561201471222	APROBADO EN EJECUCIÓN	09/05/2025	SPMT 202531206790011	La ciudad de Bogotá D.C.	09/05/2025	15/02/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

2.3.1 Notificación de PMT's Típicos a la SDM

Durante octubre de 2025 se reportaron a la Gerencia Única de PMTS treinta y tres (33) Intersecciones con PMT's típicos. Copia de estos reportes de programación de PMT en el mes de octubre de 2025 se incorporan al presente informe en el **ANX. 03** de los anexos del componente de Tránsito.

2.3.2 Seguimiento a PMT's Típicos

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a veintiséis (26) intersecciones semaforizadas, a las cuales se efectuó treinta y dos (32) seguimientos a PMTs típicos implementados por el contrato 2025-2782 en el mes de octubre de 2025, obteniendo que el 100 % de los PMT revisados cumple requisitos técnicos.

El día 27 de octubre de 2025, en instalaciones de la bodega del Contratista de TPD Ingeniería, por parte de Interventoría se realizó inventario de señalización y elementos de PMT a cada uno de los tres (3) vehículos de grúas de mantenimiento de postes. Se encontró que el Contratista de TPD Ingeniería realizó el mantenimiento a la mayoría de los elementos de señalización con base en las observaciones de la Interventoría, quedando subsanadas las observaciones del mes anterior.

Copia de los registros fotográficos obtenidos en el seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2782 – Lote 3, se incorporan al presente informe en el **ANX. 06** de los anexos del componente de Tránsito.

Copia de los formatos de seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2782 – Lote 3 durante el mes de octubre de 2025, se incorporan al presente informe en el **ANX. 03** de los anexos del componente de Tránsito.

2.4 Seguimiento PMT's general del Contrato 2025-2783 de mantenimiento eléctrico y de equipos

A la fecha se encuentra vigente con aprobación por parte de la SDM mediante comunicado SPMT_202531205280221. La fecha de terminación quedó hasta el día 15 de febrero de 2026. El horario de cierre y de trabajo quedó autorizado de 24 horas.

Tabla 34. Estado y vigencia PMT General de Típicos. - Contrato 2025-2783 – Lote 4

FECHA DE SOLICITUD A SDM	RADICADO SDM	ESTADO	FECHA APROBACIÓN	OFICIO APROBACIÓN	DIRECCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
23/04/2025	202561201371512	APROBADO EN EJECUCIÓN	29/04/2025	SPMT 202531205280221	La ciudad de Bogotá D.C.	29/04/2025	15/02/2026

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

2.4.1 Notificación de PMT's Típicos a la SDM

Durante el mes de octubre de 2025 los viernes de cada semana la Interventoría realizó el reporte a la Gerencia de PMT de la SDM, de mil veinticuatro (1024) intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT's típicos en actividades de mantenimiento eléctrico y de equipos. Las notificaciones a la Gerencia de PMT de la SDM junto con los listados de intersecciones remitidos semanalmente en octubre de 2025 se incorporan al presente informe en el **ANX. 04** de los anexos del componente de Tránsito.

2.4.2 Seguimiento a PMT's Típicos

Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a ochenta y una (61) intersecciones semaforizadas de la ciudad, a las cuales se efectuó ciento veintiséis (126) seguimientos a PMTs típicos implementados por el contrato 2025-2783 en el mes de octubre de 2025, obteniendo que el 100% de los PMT revisados cumple con los requisitos.

Copia de los formatos de seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2783 – Lote 4, se incorporan al presente informe en el **ANX. 04** de los anexos del componente de Tránsito.

Copia de los registros fotográficos obtenidos en el seguimiento al PMT general de típicos del contrato 2025-2783 – Lote 4, se incorporan al presente informe en el **ANX. 06** de los anexos del componente de Tránsito.

2.4.3 Inventario de dispositivos de señalización para PMT's típicos

El día 28 de octubre de 2025, en instalaciones de la bodega de Yunex Traffic, por parte de Interventoría se realizó inventario de señalización y elementos de PMT a cada uno de los

vehículos de grúas de eléctricos y vehículos de los grupos de equipos. Se encontró observaciones de algunos elementos que requieren mantenimiento a los dispositivos de señalización en los siguientes grupos: SE-156, SE-159, SE-164, los cuales realizaron los correctivos inmediatamente en bodega antes de salir a realizar labores de atención de mantenimientos.

En cuanto a la propuesta de modificación de las dimensiones de las vallas de señalización de listones por parte del Contratista de Yunex Traffic, la cual fue una iniciativa del mismo Contratista en el mes anterior a octubre de 2025, el Contratista manifestó que por el momento continúa con las vallas que dispone en la actualidad, las cuales igualmente están cumpliendo a satisfacción. Este cambio de dimensiones se había propuesto por Yunex Traffic pensando en reducir el peso de las vallas actuales.

Copia de los formatos del inventario de señalización realizado al contrato 2025-2783 – Lote 4, se incorporan al presente informe en el **ANX. 04** de los anexos del componente de Tránsito.

2.5 Relación de correspondencia sobre PMTs en el periodo del informe

En cuanto a la correspondencia enviada y recibida concerniente a PMT's de los contratos 2025-2780, 2025-2781, 2025-2782 y 2025-2783, esta información se relaciona y se incorpora al presente informe en el **ANX. 05** de los anexos del componente de Tránsito.

2.6 Conclusiones del componente de Tránsito:

- **Contrato 2025-2769 Consorcio Movilidad Capital:**

  - Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a doce (12) intersecciones, a las cuales se efectuó cincuenta y nueve (59) seguimientos a PMTs generales y específicos implementados por el contrato 2025-2780 en el mes de octubre de 2025.

  - Por parte de Interventoría se realizó en terreno el seguimiento a diez (10) intersecciones, a las cuales se efectuó cincuenta y cuatro (54) seguimientos en total a PMTs generales y específicos implementados por el contrato 2025-2781 en el mes de octubre de 2025.

  - En cuanto a los seguimientos de PMT típicos del contrato 2025-2782, durante el mes de octubre de 2025 se realizaron treinta y dos (32) seguimientos en terreno a los grupos de postes de semaforización.

  - En cuanto a los seguimientos de PMT típicos del contrato 2025-2783, durante el mes de octubre de 2025 se realizaron ciento veintiséis (126) seguimientos en terreno a los grupos eléctricos y de equipos de semaforización.

- **Contrato 2025-2780 Consorcio Belzcon Movilidad - zona norte:**

  - Durante el mes de octubre de 2025 el Contratista programó con la GUPMT de la SDM dieciséis (16) intersecciones semaforizadas con PMT general y fueron aprobadas todas para actividades de mantenimientos y apiques.

  - Durante el mes de octubre de 2025, fue aprobado por la SPMT de la SDM la prórroga al PMT específico de la intersección nueva EXT_1175 ID_1929 AK 104(AV. CALI) X CL 135 A.

  - El Contratista (CBM) informó mediante comunicado BEL-SDM-ADM-161-25 acerca del cumplimiento del requerimiento previo de PMT en la Av. Ciudad de Cali con Calle 135 A, el cual estaba pendiente del mes anterior, situación que fue verificada en terreno por esta Interventoría (CMC) el día 04 de octubre de 2025 con la instalación de las señales solicitadas en el requerimiento previo.

  - Se advirtió al Contratista y requirió al Contratista del CBM la entrega en el mes de octubre de 2025 de los PMT del Complemento # 11 al Complemento # 14. Esto mediante comunicado SEM-CMC-CBM-116-25 radicado ORFEO n.° 202561203795622 del 16 de octubre de 2025.

- **Contrato 2025-2781 Consorcio Movilidad 2025 – zona sur:**

  - Durante el mes de octubre de 2025 el Contratista programó con la GUPMT de la SDM nueve (9) intersecciones semaforizadas con PMT general y fue aprobada para actividades de mantenimiento y apiques.

  - Durante este mes de octubre también se aprobó PMT por emergencias en las intersecciones de la KR 78 K X CL 38 C Sur y KR 79 X CL 40 C Sur, esto con el fin de garantizar la seguridad vial y peatonal durante la finalización de las actividades constructivas que se adelantan en estas intersecciones.

  - Durante el mes de octubre de 2025 se tuvo aprobados y vigentes dos (2) PMT específicos de intersecciones complementos en los externos 3795 y 3049, además tres (3) PMT para intersecciones nuevas en los externos EXT_3122, EXT_3928 y EXT_3121.

  - Durante este mes de octubre se logró radicar en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad un (1) PMT específico de intersecciones nuevas correspondiente al EXT_3119 ID_1919 KR 61G X CL 67B Sur, el cual al finalizar este mes se encuentra en revisión de la Entidad.

  - Durante este mes de octubre se logró radicar en SDM para solicitud de aprobación de la Entidad seis (6) PMT específicos de intersecciones de complementos, correspondiente a

los externos EXT_3814, EXT_3273, EXT_3690, EXT_2393, EXT_3916 – ID_936 y ID_937, los cuales al finalizar este mes se encuentran en revisión de la Entidad.

- **Contrato 2025-2782 TPD Ingeniería S.A.S:**

  - El Contratista de TPD Ingeniería reportó en la programación de octubre de 2025 treinta y tres (33) intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT típicos del contrato 2025-2782.

  - El día 27 de octubre de 2025 realizó el mantenimiento a la mayoría de los elementos de señalización con base en las observaciones de la Interventoría, quedando subsanadas las observaciones del mes anterior.

- **Contrato 2025-2783 UT Yunex Traffic 2025:**

  - El Contratista de UT Yunex Traffic 2025 reportó en la programación de octubre de 2025 mil veinticuatro (1024) intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT típicos del contrato 2025-2783

3 INFORME GESTIÓN DE CALIDAD

3.1 Actividades Realizadas

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Respecto a la dotación del personal del Consorcio Movilidad Capital, contrato de Interventoría n.° 2025-2769, se indica que, durante el mes de octubre del 2025, se realizó entrega dotación a (chaquetas, overoles, pantalones, cascos y carnés al personal) dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Indumentaria de SDM.

- Con relación a la dotación del contrato n.° 2025-2780, durante el mes de octubre de la presente vigencia, el Contratista realizó entrega de EPP[2] tal como se indica en el capítulo 1.3. Actividades de SST en el Presente Periodo" y subcapítulo "1.3.4. Elementos de Protección Personal y Dotación", igualmente realizó entrega dotación a (chaquetas, overoles, pantalones, cascos y carnés al personal) de acuerdo con los requerimientos.

- Respecto a la dotación del contrato n.° 2025-2781, durante el mes de octubre de la presente vigencia, el Contratista realizó entrega de EPP[3] tal como se indica en el capítulo 1.3. Actividades de SST en el Presente Periodo" y subcapítulo "1.3.4. Elementos de Protección Personal y Dotación", igualmente realizó entrega dotación a (chaquetas, overoles, pantalones, cascos y carnés al personal) de acuerdo con los requerimientos.

- Respecto a la dotación del contrato n.° 2025-2782, durante el mes de octubre de la presente vigencia, el Contratista realizó entrega de EPP[4] tal como se indica en el capítulo 1.3. Actividades de SST en el Presente Periodo" y subcapítulo "1.3.4. Elementos de Protección Personal y Dotación", también se realizó entrega dotación a (chaquetas, overoles, pantalones, cascos y carnés al personal) dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Indumentaria de SDM.

- Respecto a la dotación del contrato n.° 2025-2783, durante el mes de octubre de la presente vigencia, el Contratista realizó entrega dotación a (chaquetas, overoles, pantalones, cascos y carnés al personal) dando cumplimiento a las directrices establecidas en el Manual de Indumentaria de SDM.

Los soportes de la entrega de dotación correspondientes para cada uno de los contratos podrán ser consultados en el ANX 1. Requerimientos de dotación, subcarpetas contratos nº 2025-2780, n ° 2025-2781, n ° 2025-2782 y nº 2025-2783.

---

[2] EPP: Elementos de protección personal

[3] EPP: Elementos de protección personal

[4] EPP: Elementos de protección personal

3.2 Seguimiento de los Planes de Calidad

A continuación, se detallan las actividades de seguimiento del cumplimiento de los planes de calidad para cada uno de los contratos.

- **Contrato n.° 2025-2769**

Con relación al contrato n.° 2025-2769, durante el periodo de octubre de 2025, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Continuidad en el desarrollo del esquema de evaluación de los factores de calidad de acuerdo con el esquema de seguimiento definido para los contratos n.° 2025-2780, n.° 2025-2781, n.° 2025-2782 y n.° 2025-2783. En la siguiente tabla se detalla los factores evaluados específicamente para cada uno por cada contrato de acuerdo con el alcance de cada uno de los planes de calidad.

Tabla 35. Factores de los planes de calidad evaluados por contrato para el periodo de octubre

Factores	Contrato n.° 2025-2780	Contrato n.° 2025-2781	Contrato n.° 2025-2782	Contrato n.° 2025-2783
Objetivos de calidad del proyecto e indicadores	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo
Control de la información documentada	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo
Recursos materiales e insumos	Factor **no evaluado** en el periodo	Factor **no evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	No aplica
Procesos, productos y servicios proporcionados externamente	Factor **evaluado no evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **no evaluado** en el periodo	Factor en **no evaluado** en el periodo
Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo
Seguimiento y Medición	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo	Factor **evaluado** en el periodo
Mejora Continua	En implementación	En implementación	En implementación	En implementación

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

- Durante el periodo se realiza el seguimiento a la actualización, desarrollo y evaluación de los resultados de los planes de mejora (acciones correctivas y/o preventivas) establecido para cada uno de contratistas para la eliminación de desviaciones que se han presentado durante el desarrollo del proyecto los diferentes componentes[5].

- **Contrato n.° 2025-2780**

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del Consorcio Belzcon, para el periodo de octubre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

Respecto a este ítem, durante el mes de octubre, el Consorcio Belzcon Movilidad presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

[5] Componentes: Estos componentes corresponden a técnico, gestión de tránsito, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, financiero y legal.

Tabla 36. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores mes de octubre - Contrato 2025-2780

OBEJTIVOS DE CALIDAD Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
Garantizar que el 100% de las obras civiles se ejecuten dentro de los plazos previstos en los permisos otorgados por las autoridades competentes	Relación de los frentes de obra cerrados antes de los vencimientos de los planes de manejo de tránsito respecto a los frentes cerrados en el periodo. Esta métrica permite medir la eficacia en el cumplimiento de la programación de actividades de obra de acuerdo con los tiempos del PMT.	(n.° Frentes de obra cerrados antes del vencimiento del PMT en el periodo X / n.° total, frentes de obra cerrados en el periodo X) *100	Mensual	= 100%	Oct 2025	3	3	**100%** Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo de acuerdo con el indicador, sin embargo, la métrica se complementará con un indicador que permita evaluar integralmente el cumplimiento del cronograma de actividades establecido para el proyecto y la ejecución presupuestal real y estimada.

OBEJTIVOS DE CALIDAD Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
Garantizar que el 100% de las obras civiles se ejecuten de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato	Relación correspondiente al n.° de frentes de obra cerrados sin incumplimientos respecto al n.° de frentes de obra cerrados en el periodo. Mediante este indicador se evalúa el porcentaje de frentes de obra que cerraron a conformidad, es decir cumpliendo criterios de aceptación del producto de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto.	(n.° Frentes de obra cerrados sin incumplimientos en el periodo / n.° total, frentes de obra cerrados en el periodo) *100	Mensual	=100%	Oct 2025	3	3	**100%** Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo de acuerdo con el indicador, sin embargo, la métrica se complementará con un indicador que permita evaluar integralmente el cumplimiento del cronograma de actividades establecido para el proyecto y la ejecución presupuestal real y estimada.

OBEJTIVOS DE CALIDAD Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1**	**Variable n.° 2**	**Resultados del Periodo**
Cumplir con el 100% de las solicitudes de mantenimiento	Relación de mantenimientos ejecutados y cerrados efectivamente en el periodo respecto al número total de requerimientos de mantenimiento del periodo	(n.° Mantenimientos ejecutados en el periodo / n.° total, de mantenimientos solicitados en el periodo) *100	Mensual	= 100%	Oct 2025	9	9	**100%**

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

- **Control de la información documentada**

Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato n.° 2025-2780, así como el listado maestro de documentos solicitado por la Interventoría con las actualizaciones al periodo de octubre de la presente vigencia, igualmente procedió a verificar aplicación y uso de los registros[6] correspondientes al control de lluvias. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- Se corroboró que el Contratista Consorcio Belzcon Movilidad controla y asegura la disponibilidad y uso de los documentos vigentes del plan de calidad, los cuales corresponden a manuales, procedimientos, instructivos y formatos, entre otros. Lo cual se verificó a partir de las actualizaciones que el Contratista realiza cuando se requieren cambios en su documentación, lo cual se evidencia en el listado maestro de documentos para el periodo.

- Se verificó el uso y aplicabilidad de las versiones vigentes del formato “Control de Lluvias” en las intersecciones donde realizan intervenciones, mediante la validación de los registros de octubre. Dado lo anterior la Interventoría ratifica el cumplimiento del este requisito de acuerdo con las disposiciones establecidas en el plan de calidad.

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el listado maestro de documentos y los respectivos registros, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados de cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2780.

- **Producción, provisión y conformidad de los productos y/o servicios**

Respecto a este factor, durante el periodo se verificó que se aplican métodos de inspección y ensayos a materiales que confirman el cumplimiento de especificaciones (Resistencias de compresión de cilindros de concreto). Es importante mencionar que los ensayos de resistencia de compresión de cilindros de concreto son validados en su conformidad por el Ingeniero Residente de Obra Civil y desde el componente de calidad se verifica y ratifica que se aplicaron los métodos de inspección y ensayos de acuerdo con lo dispuesto en el plan de calidad para el periodo (Ver ítem 3.3. Certificaciones de cumplimiento de ensayos de materiales).

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales podrá ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, subcarpeta contrato No. 2025-2780.

- **Mejora Continua**

Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas.

---

[6] Registros: Documento que presenta la evidencia objetiva de que se han realizado actividades o alcanzado los resultados conforme a los requisitos establecidos

- **Contrato n.° 2025-2781**

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad del Consorcio Movilidad 2025, para el periodo de octubre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Procesos, productos y/o servicios suministrados externamente
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

Respecto a este ítem, durante el mes de octubre, el Consorcio Movilidad 2025, presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

Tabla 37. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores mes de octubre - Contrato 2025-2781

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
Cumplir con los plazos estipulados	Relación de las actividades entregadas y/o ejecutadas fuera de las fechas estimadas para el periodo respecto a la cantidad de actividades programadas en el periodo	(Cantidad de actividades entregadas o ejecutadas por fuera de las fechas establecidas) / Cantidad de actividades programadas en el mes) X 100%	Mensual	< = 5%	Oct 2025	Q actividades entregadas o ejecutadas por fuera de fechas establecidas para el periodo 8	Q actividades programadas para el periodo 12	**66,67 %** El resultado no alcanza la meta esperada y se categoriza como deficiente. Las causas de este resultado obedecen al incumplimiento de cuatro (4) compromisos o actividades que no se cumplieron dentro de las fechas establecidas. Estas actividades corresponden a: ● Presentación de PMT[7] de acometida en sierra morena ● Subsanación de observaciones para recibo final de intersección

[7] PMT: Plan de Manejo de Tránsito

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
								79 x 40C sur EXT 3795 ● Proyección del presupuesto contemplando todos los complementos e intersecciones, el cual se reprogramó para el siguiente periodo ● Subsanación de hallazgos de la actividad fundida de tapas por parte del Contratista respecto al componente de SST&A[8] de la Interventoría.

[8] SST&A: Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
No tener más de dos (2) por parte del cliente y cualquier parte interesada (Autoridades Regulatorias, Comunidad, Equipo de Proyecto, entre otros)	Número de quejas y/o reclamos	# de quejas y/o reclamos y/o reclamos	Mensual	<= 2	Oct 2025	n.° de Quejas y/o Reclamos por parte SDM y Partes Interesadas (Autoridades Regulatorias, Comunidad, Equipo de Proyecto, entre otros)) 4	–	**4** El resultado no alcanza la meta esperada y se categoriza como deficiente. Durante el periodo el Consorcio Movilidad 2025 no cumplió en su totalidad los compromisos esperados y/o actividades programadas, actividades programadas. Los cuales corresponden a: ● Presentación de PMT[9] de acometida en sierra morena

[9] PMT: Plan de Manejo de Tránsito

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
								● Subsanación de observaciones para recibo final de intersección 79 x 40C sur EXT 3795 ● Proyección del presupuesto contemplando todos los complementos e intersecciones, el cual se reprogramó para el siguiente periodo. ● Subsanación de hallazgos de la actividad fundida de tapas por parte del Contratista respecto al componente de SST&A[10] de la Interventoría

[10] SST&A: Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y manuales de diseño que exige el cliente	Cumplimiento de especificaciones productos y/o servicios componente obra civil	# de productos, productos y/o servicios aprobados en la primera inspección / # de productos, productos y/o servicios entregados	Mensual	>= 96%	Oct 2025	n.° de productos y/o servicios aprobados en la primera inspección 12	n.° de productos y/o servicios entregados en el periodo 12	**100%** Se presenta una mejora respecto a los resultados del periodo anterior al fortalecimiento de esquemas de control por parte del Contratista, respecto a los criterios de liberación y aceptación.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y manuales de diseño que exige el cliente	Nivel de porcentaje de correcciones en trabajos	# de trabajos con retrabajo/ # total de trabajos ejecutados	Mensual	<= 5%	Oct 2025	# de trabajos con retrabajo 0	# total de trabajos ejecutados 12	**0%** Se presenta una mejora respecto a los resultados del periodo anterior al fortalecimiento de esquemas de control por parte del Contratista, respecto a los criterios de liberación y aceptación.

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PROYECTO Y RESULTADOS DE INDICADORES								
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Fórmula**	**Periodicidad**	**Meta**	**Periodo de medición**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del Periodo**
Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas y manuales de diseño que exige el cliente	Número de reclamos por incumplimiento de las especificaciones técnicas	# de reclamos por cumplimiento de especificaciones técnicas según el contrato n.° 2025-2781 y sus anexos	Mensual	<= 5%	Oct 2025	# de reclamos por cumplimiento de especificaciones técnicas según el contrato n.° 2025-2781 y sus anexos 0		**0** Se presenta una mejora respecto a los resultados del periodo anterior al fortalecimiento de esquemas de control por parte del Contratista, respecto a los criterios de liberación y aceptación, control de salidas no conformes y fortalecimiento en la fase de planeación incrementado al porcentaje de cumplimiento de especificaciones

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el reporte de cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto e indicadores, plan de calidad del contrato n.° 2025-2781, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2781, subcarpeta 1. Reporte cump obj calid.

- **Control de la información documentada**

Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato n.° 2025-2781 respecto al control de la información documentada al igual que el procedimiento “Control de Documentos y Registros” y el listado maestro de documentos. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- Se corroboró que Contratista Consorcio Movilidad 2025 controla y asegura la disponibilidad y uso de los documentos vigentes del plan de calidad, los cuales corresponden a manuales, procedimientos, instructivos y formatos, entre otros. Igualmente se verificó a partir del listado maestro de documentos la trazabilidad respecto a los cambios y actualizaciones de estos documentos, así como su accesibilidad y disponibilidad. Para el periodo de octubre el Contratista incorporó y actualizó los siguientes formatos:

    - Formato F-PMV-31, versión n.° 2. Inventario de materiales en bodega, con fecha de vigencia 01/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 15, versión n.° 2. Inspección de EPP[11], con fecha de vigencia 06/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 19, versión n.° 2. Preoperacional cortadora, con fecha de vigencia 06/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 20, versión n.° 2. Preoperacional pulidora, con fecha de vigencia 06/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 23, versión n.° 2. Preoperacional rana canguro, con fecha de vigencia 06/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 24, versión n.° 2. Inspección preoperacional de herramientas manuales, con fecha de vigencia 01/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 25, versión n.° 2. Preoperacional mezcladora portátil de concreto, con fecha de vigencia 06/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 49, versión n.° 3. ATS Análisis de trabajo seguro, con fecha de vigencia 06/Oct/2025
    - Formato F-SSTAMOV- 65, versión n.° 0. Informe mensual de vehículos, con fecha de vigencia 06/Oct/2025

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el listado maestro de documentos del plan de calidad del contrato n.° 2025-2781 y los formatos generados y/o actualizados para el periodo de octubre, podrán ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados

[11] EPP: Elementos de protección personal

cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2781, subcarpeta 2. Control inf doc.

- **Procesos, productos y/o servicios suministrados externamente**

Respecto a este factor para el periodo de octubre, la Interventoría realizó la verificación del procedimiento aplicado y los registros generados por el Consorcio Movilidad 2025 para la evaluación de los proveedores VYP Consultoría y Construcción Sas y Asesorías Integrales de Proyectos Sostenibles Sas. La verificación se realizó a partir revisión del registro y evidencias a aportadas por el Contratista Consorcio Movilidad 2025. Los resultados de esta verificación evidencian que los proveedores cumplen con los requisitos para el desarrollo de actividades de obra civil acorde a los requisitos del proyecto.

Teniendo en cuenta los resultados respecto a las evaluaciones de proveedores practicadas, se ratifica el cumplimiento por parte del Contratista Consorcio Movilidad 2025 respecto al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el plan calidad con relación a los requisitos para el control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente de acuerdo con las disposiciones de la norma ISO 10005:2018.

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como los registros de evaluación de proveedores, podrán ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2781, subcarpeta 3. Eval Proveedores

- **Producción, provisión y conformidad de productos y/o servicios**

Con relación a este factor, durante el periodo se verificó que se aplican métodos de inspección y ensayos a materiales que confirman el cumplimiento de especificaciones (Resistencias de compresión de cilindros de concreto). Es importante mencionar la Interventoría realizó seguimiento y verificación del cumplimiento de la toma de ensayos de laboratorio en los diferentes frentes de obra ejecutados durante el periodo de octubre de la presente vigencia, ratificando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato n° 2025-2781.

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, subcarpeta contrato No. 2025-2781.

- **Seguimiento y Medición**

Se corroboró la confiabilidad y validez de los resultados inherentes a las mediciones y verificaciones a través de los ensayos realizados para asegurar la conformidad de materiales, tal como se indica la viñeta anterior. Igualmente se corroboró que se inició monitoreo de los resultados de métricas de calidad mediante las cuales se evalúa el cumplimiento de los objetivos de calidad, tal como se indica en el ítem “Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores” de este capítulo.

- **Mejora Continua**

Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas.

- **Contrato n.° 2025-2782**

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad de TPD Ingeniería, para el periodo de octubre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Recursos materiales e insumos
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

Respecto a este ítem, durante el mes de octubre, el TPD Ingeniería, presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

Tabla 38. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores _ Contrato 2025-2782

Objetivos de calidad	**Indicador**	**Meta**	**Periodicidad**	**Periodo**	**Variable n.° 1:** Facturación Mensual	**Variable n.° 2:** Presupuesto	**Resultados del periodo**
Cumplimiento ejecución presupuestal	(Facturación mensual) / (Presupuesto) X 100%	=100%	Mensual	Oct 2025	El dato se relaciona en el informe ejecutivo del periodo	El dato se relaciona en el informe ejecutivo del periodo	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Meta**	**Periodicidad**	**Periodo**	**Variable n.° 1:** Órdenes de trabajo ejecutadas	**Variable n.° 2:** Órdenes de trabajo programadas	**Resultados del periodo**
Cumplimiento del cronograma	Órdenes de trabajo ejecutadas / Órdenes de trabajo programadas * 100	=100%	Mensual	Oct 2025	5 Actas parciales de recibo a satisfacción	5 Actas parciales de recibo a satisfacción	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo
Objetivos de calidad	**Indicador**	**Meta**	**Periodicidad**	**Periodo**	**Variable n.° 1:**	**Variable n.° 2:**	**Resultados del periodo**
Satisfacción del cliente	Cumplimiento de las obligaciones contractuales - acta de cumplimiento para pago	=100%	Mensual	Oct 2025	9 Actas parciales de recibo a satisfacción	9 Actas parciales de recibo a satisfacción	100% Los resultados indican que se logró la meta estimada para el periodo

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el reporte de cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto e indicadores, plan de calidad del contrato n.° 2025-2782, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2782, subcarpeta 1. Reporte cump obj calid.

- **Control de la información documentada**

Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato n.° 2025-2782 respecto al control de la información documentada al igual que listado maestro de documentos. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- Los documentos requeridos para el desarrollo del contrato n.° 2025-2782 y ejecución del proyecto han sido identificados, establecidos y categorizados de acuerdo con la estructura documental (Plan de calidad, procedimientos, instructivos, formatos).

- La información documentada es formalizada mediante los respectivos ciclos de revisión y aprobación por las instancias establecidas en el plan de calidad, lo anterior se corroboró a través de validación del respectivo plan de calidad.

- Se corroboró la disponibilidad y uso de la información documentada (formatos), mediante la visita realizada el 27 de octubre en la bodega del Contratista.

- Se corroboró que se monitorea la aplicabilidad de la información documentada y se gestiona los cambios y actualizaciones de acuerdo con los requerimientos del proyecto. Durante el periodo de octubre, se gestionaron los siguientes cambios:

    - Se incorpora el formato TPD-F-PCO2782-21. Bitácora pintura de corte

    - Se incorpora el formato TPD-F-PCO2782-22. Inventario pintura

    - Se incorpora el formato TPD-F-PCO2782-23. Resumen de postes instalados

    - Se incorpora el formato TPD-F-PCO2782-24. Resumen de tapas

    - Se modifica y actualiza el formato TPD-F-PCO2782-02. Orden de servicio

    - Se modifica y actualiza el formato TPD-F-PCO2782-12. Reporte de inventario tapas

    - Se modifica y actualiza el formato TPD-F-PCO2782-19. Programación de postes

    - Se modifica y actualiza el formato TPD-F-PCO2782-20. Programación de postes preventivo

- Se modifica y actualiza el formato el formato TPD-F-PCO2782-25. Listado maestro prueba calidad pintura

- Se deroga y declara como obsoleto el formato TPD-F-PCO2782-02. Orden de servicio, versión 0

- Se deroga y declara como obsoleto el formato TPD-F-PCO2782-12. Reporte de inventarios tapas, versión 0

- Se deroga y declara como obsoleto el formato TPD-F-PCO2782-17. Listado maestro prueba calidad pintura, versión 0

- Se deroga y declara como obsoleto el formato TPD-F-PCO2782-21. Bitácora de terreno corte, versión 0

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como los formatos verificados dentro del plan de calidad del contrato n.° 2025-2782, podrá ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2782, subcarpeta 2. Control inf doc.

- **Recursos insumos y materiales**

Durante la visita efectuada el 27 de octubre del 2025, se verificaron las existencias en bodega de los materiales correspondientes a esmalte amarillo cromo medio rápido secado y anticorrosivo gris, así como las que están en uso, las cuales corresponden a los lotes de productos con certificados de calidad y materiales vigentes, identificados con los consecutivos P-0010122 y P-0010131. Lo cual confirma que los insumos y materiales cumplen con las especificaciones y las disposiciones establecidas en el plan de calidad.

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como los certificados de calidad y materiales, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2782, subcarpeta 3. materiales.

- **Seguimiento y Medición**

Se corroboró los resultados de métricas de calidad mediante las cuales se evalúa el cumplimiento de los objetivos de calidad, tal como se indica en el ítem “Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores” de este capítulo.

- **Mejora Continua**

Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas.

- **Contrato n.° 2025-2783**

Dentro del esquema de seguimiento del cumplimiento del plan de calidad de Yunex Traffic, para el periodo de octubre se evaluaron los siguientes aspectos:

- Objetivos de calidad del proyecto e indicadores
- Control de la información documentada
- Recursos de seguimiento y medición
- Producción, provisión y conformidad de los productos y servicios
- Seguimiento y medición
- Mejora continua.

- **Cumplimiento de objetivos de calidad del proyecto e indicadores**

Respecto a este ítem, durante el mes de octubre, el Contratista Yunex Traffic, presentó los resultados de los indicadores mediante los cuales el Contratista mide el cumplimiento de los objetivos de calidad del proyecto.

En la siguiente tabla se presenta la relación de objetivos de calidad y del proyecto y sus indicadores

Tabla 39. Objetivos de calidad y reporte de resultados de indicadores_ Contrato 2025-2783

OBJETIVOS DE CALIDAD	INDICADOR	META	PERIODICIDAD	RESULTADOS
Cumplimiento del tiempo de Solución de solicitudes del componente de Equipos de Control de tráfico	TSS (%): ((A[12]-B[13])/(A)) *100	>=95%	Mensual	Los resultados de indicadores al mes de octubre cumplen con meta y se registran en el informe básico mensual.
Cumplimiento del tiempo de Solución de solicitudes del componente de mantenimiento eléctrico.	TSS (%): ((A-B) /(A)) *100	>=99%	Mensual	Ídem
Calidad de la solución de incidentes del componente de mantenimiento eléctrico	CSI= 1- ((# órdenes de servicios reabiertos) / (#Total de órdenes de servicios recibidas)	>=98%	Mensual	Ídem

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

- **Control de la información documentada**

Con relación a este ítem, la Interventoría revisó las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato n.° 2025-2783 respecto al control de la información documentada al igual que

[12] A: Total mensual de solicitudes realizadas para atención

[13] B: Total mensual de solicitudes fuera de tiempo máximo establecido

lo establecido en el listado maestro de documentos. Los resultados de esta verificación son los siguientes:

- Se corroboró que el Contratista Yunex Traffic controla y asegura la disponibilidad y uso de los documentos vigentes del plan de calidad, los cuales corresponden a manuales, procedimientos, instructivos y formatos, entre otros. Lo cual se verificó a partir de las actualizaciones que el Contratista realiza cuando se requieren cambios en su documentación, lo cual se evidencia en el listado maestro de documentos para el periodo.

El certificado de cumplimiento del plan de calidad, así como el listado maestro de documentos, podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2783.

- **Producción, provisión y conformidad de los productos y/o servicios**

Durante el periodo se verificó a partir de la trazabilidad la conformidad de los servicios de mantenimiento y los resultados de ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio), también se corroboró que no se presentaron salidas No Conformes a las especificaciones.

- **Seguimiento y Medición**

Se corroboró la confiabilidad y validez de los resultados inherentes a las mediciones y verificaciones a través los resultados de los indicadores de calidad los cuales corresponden al cumplimiento de las siguientes métricas:

- Cumplimiento del tiempo de solución de solicitudes del componente de equipos de control de tráfico, el cual es mayor al 95%, dando cumplimento a la meta establecida.

- Cumplimiento del tiempo de solución de solicitudes del componente de mantenimiento eléctrico es mayor al 99%, %, dando cumplimento a la meta establecida.

- Calidad (cumplimiento de requisitos) de la solución de incidentes del componente de mantenimiento eléctrico es mayor 98%, dando cumplimento a la meta establecida.

El certificado de cumplimiento del plan de calidad podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 2. Certificados cumplimiento P.C x contrato, subcarpeta ANX 2.3. Contrato n.° 2025_2783

- **Mejora Continua**

Ver detalle en el capítulo 3.4. Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas

3.3 Certificaciones de cumplimiento de ensayos de materiales (Aplica sólo a postes y obras civiles)

Durante el periodo del 1 al 31 de octubre de la presente vigencia, se presentaron los siguientes certificados de cumplimiento de ensayos.

- **Contrato n.° 2025-2780**

Resultante de las operaciones desarrolladas por el Contratista Consorcio Belzcon Movilidad, dentro del marco del contrato n.° 2025-2780, la interventoría realizó seguimiento y verificación del cumplimiento de la toma de ensayos de laboratorio en los diferentes frentes de obra ejecutados durante el periodo de octubre de la presente vigencia, ratificando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato n° 2025-2780 aprobado mediante el comunicado SEM-CMC-CBM-083-23 y radicado en Orfeo con el consecutivo No 202561203439992, con fecha del 18 de julio del 2025. Igualmente se verificó los registros emitidos por el laboratorio los cuales confirman el cumplimiento de las especificaciones de los materiales.

Es importante mencionar que los ensayos de resistencia de compresión de cilindros de concreto son válidos en su conformidad por el Ingeniero Residente de Obra Civil y desde el componente de calidad se verificó y ratificó que se aplicaron los métodos de inspección y ensayos de acuerdo con lo dispuesto en el plan de calidad para el periodo.

Dado lo anterior la Interventoría ratifica que el Contratista ha establecido y aplica los métodos de seguimiento y medición para asegurar la conformidad del producto e insumos, dando cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal c[14] y noma 10005:2018, numeral 6.16. Seguimiento y medición, literales a, b, c y d.

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, subcarpeta contrato No. 2025-2780.

- **Contrato n.° 2025-2781**

Resultante de las operaciones desarrolladas por el Contratista Consorcio Movilidad 2025, dentro del marco del contrato n.° 2025-2781, la interventoría realizó seguimiento y verificación del cumplimiento de la toma de ensayos de laboratorio en los diferentes frentes de obra ejecutados durante el periodo de octubre de la presente vigencia, ratificando el cumplimiento de las

[14] **Numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal c**: La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la implementación de actividades de seguimiento y medición (inspecciones, ensayos y/o pruebas) en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

disposiciones establecidas en el plan de calidad del contrato n° 2025-2781 aprobado mediante el comunicado SEM-CMC-CM25-071-25 radicado en Orfeo con el consecutivo n.° 202561203273912, con fecha del 05 de septiembre del 2025.

Dado lo anterior la Interventoría ratifica que el Contratista ha establecido y aplica los métodos de seguimiento y medición para asegurar la conformidad del producto (Diseño de la mezcla de concreto), dando cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal c[15] y noma 10005:2018, numeral 6.16. Seguimiento y medición, literales a, b, c y d.

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, subcarpeta contrato No. 2025-2781.

- **Contrato n.° 2025-2782**

El día 27 de octubre de 2025, se realizaron las pruebas de inspección de pintura de postes metálicos, mediante muestras tomadas en la bodega del Contratista la cual está ubicada en la calle 165 #56 A – 45 y en terreno en la ubicación KR 5 X AC 72 externo 1803 ID 140.

La Interventoría solicitó pruebas en tres (3) postes diferentes, dos (2) de ellos ubicados en la bodega del Contratista que corresponden a un (1) poste T1 y un (1) poste T2 de 6,5 m; y el último restante en terreno (EXT 1803 ID 140) el cual corresponde a un (1) poste de videodetección.

Durante la inspección[16] de pintura, se dibujó con un bisturí sobre la superficie del poste pintado, una cuadrícula de cuarenta y nueve cuadros (49), sobre la cual se colocó cinta transparente de embalaje, con ancho de 48 mm y adhesivo acrílico, el cual fue posteriormente retirado, corroborando que el porcentaje de desprendimiento de los cuadros al retirar la cinta estuvo por debajo del 30%, lo cual está dentro del porcentaje máximo permitido. Dado lo anterior se concluye que el producto es conforme a las especificaciones de acuerdo con el anexo técnico 1D, numeral “7.1.2.2. Aplicación de la pintura.

Considerando las premisas expuestas, la Interventoría ratifica la conformidad de los resultados de las pruebas de pintura y certifica el cumplimiento de calidad y especificaciones de los materiales (Esmalte amarillo cromo medio rápido secado y esmalte negro rápido secado). Así mismo confirma que se cumple con la frecuencia de las inspecciones de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad de TPD Ingeniería.

---

[15] **Numeral 8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio, literal c**: La organización debe implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable, la implementación de actividades de seguimiento y medición (inspecciones, ensayos y/o pruebas) en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;

[16] **Inspección:** Actividad mediante la cual se examina un producto, proceso o servicio utilizando medición, observación, comparación o evaluación con requisitos específicos. El objetivo es verificar si cumple con las especificaciones de dimensiones y/o características de tipo visual

El certificado de cumplimiento de calidad y los registros correspondientes a las pruebas de calidad de pintura podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, subcarpeta ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, subcarpeta Contrato n.° 2025_2782.

En las siguientes tablas se presentan algunos registros fotográficos de la inspección realizada el 27 de octubre del 2025 en la bodega de TPD Ingeniería y terreno.

Tabla 40. Registro fotográfico de pruebas de inspección correspondiente al periodo de octubre

PRUEBAS DE INSPECCIÓN DEL PERIODO	
 Registro fotográfico n.° 1. Primera actividad, se marcan puntos horizontal y verticalmente para trazar cuadrícula y se procede a trazar cuadrícula	 Registro fotográfico n.° 2. Se verifica cuadrícula para colocar cinta adhesiva extrafuerte para realizar prueba
 Registro fotográfico n.° 3. Se coloca cinta adhesiva y procede a retirarse	 Registro fotográfico n.° 4. Se retira cinta y se confirma que porcentaje de desprendimiento de cuadros está por debajo del 30%, dando cumplimiento a las especificaciones establecidas en la norma técnica NTC 811:2016 (métodos para medir la adhesión de un recubrimiento mediante el ensayo de cinta en pinturas), así como del anexo técnico 1D

Fuente: Elaboración propia del Consorcio Movilidad Capital

También es importante mencionar que la durante la visita realizada a la bodega de TPD Ingeniería, el día 27 de octubre del 2025, se verificaron los insumos correspondientes a esmalte negro de secado rápido, esmalte amarillo cromo medio de rápido secado, así como sus respectivos certificados. A continuación, se presenta los resultados:

- Esmalte negro rápido de secado, con certificado de calidad emitido el 14 de marzo del 2025 por Pintuflex, con vigencia hasta el 14 de marzo del 2026, este documento presenta los resultados de los ensayos aplicados al lote de producto P-0009333 bajo la norma técnica NTC 6325-Esmaltes sintéticos de secamiento al aire e instructivos, lo cual confirma que el insumo cumple con las especificaciones. Durante la visita se corroboró que las existencias en bodega de este material, así como las que están en uso corresponden a lote de producto indicado.

- Esmalte amarillo cromo medio rápido secado, con certificado de calidad emitido el 24 de febrero del 2025 por Pintuflex, con vigencia hasta el 27 de febrero del 2026, este documento presenta los resultados de los ensayos aplicados al lote de producto P-0009397 bajo la norma técnica NTC 6325-Esmaltes sintéticos de secamiento al aire e instructivos, lo cual confirma que el insumo cumple con las especificaciones. Durante la visita se corroboró que las existencias en bodega de este material, así como las que están en uso corresponden a lote de producto indicado.

De acuerdo con lo establecido en el plan de calidad de TPD Ingeniería, en el anexo correspondiente a la estructura desglosada de trabajo, la Interventoría ratifica que el Contratista ha establecido y aplica los métodos de seguimiento y medición para asegurar la conformidad del producto (acabados pintura de postes metálicos) de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por SDM, así como las etapas de aplicación de acuerdo con el proceso.

Es importante mencionar que el Contratista TPD Ingeniería, diseño y habilito la disponibilidad del instructivo para el ingreso, almacenamiento, gestión de inventarios y salidas de materiales e insumos en almacén. Lo anterior corresponde a una mejora incorporada en el plan de calidad con relación a la gestión de los recursos para la producción y provisión de los productos y/o prestación de los servicios.

El certificado de cumplimiento de calidad y especificación de materiales, el registro de la prueba de calidad de pintura del mes de octubre y los certificados de ensayo de materiales (esmalte negro rápido secado y esmalte amarillo cromo medio rápido secado), podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 3. Certificados cumplimiento ensayos, subcarpeta contrato n.° 2025-2782.

3.4 Seguimiento a las acciones de mejoramiento definidas por los contratistas

- **Contrato n.° 2025-2780**

Durante el mes de octubre se continua en el diseño y construcción el reporte consolidado de acciones correctivas y preventivas. En cuanto al Consorcio Belzcon Movilidad, el mayor número de hallazgos se focaliza en los componentes correspondientes a:

- Supervisión y control técnico (Desviaciones sobre cumplimiento de cronograma)
- Gestión de tránsito _PMT[17]
- Cumplimiento de programación

- **Contrato n.° 2025-2781**

Durante el mes de octubre de 2025 se inicia la implementación de plan de mejora o reporte de acciones correctivas y/o preventivas. Estas acciones se focalizan en la eliminación de la causa raíz de los hallazgos que se han identificado durante el desarrollo del contrato n.° 2025-2781, para los componentes técnico, PMT[18], seguridad y salud en el trabajo, ambiental y Mántum. Para el establecimiento del plan de mejora es importante mencionar que algunas de las acciones correctivas fueron solicitadas por la Interventoría por cada uno de los especialistas y otras fueron establecidas por el Contratista como parte de su propio plan de calidad. Es importante precisar que las acciones correctivas se integran de una o más acciones para la eliminación de causa raíz, lo cual es diferente a las acciones de corrección o medidas inmediatas para la subsunción de hallazgos.

A la emisión de este informe, el avance del plan de mejora corresponde a:

- El 50% de acciones correctivas se encuentran en ejecución
- El 43% de acciones correctivas se encuentran en un estatus de programación
- El 7% de acciones correctivas reportan estatus finalizado

El reporte consolidado de acciones correctivas y/o preventivas actualizado al mes de octubre, así como el estatus de ejecución podrá ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 4. Plan de Mejoras, subcarpeta contrato n.° 2025-2781.

- **Contrato n.° 2025-2782**

Durante el mes de octubre se inicia la implementación de plan de mejora o reporte de acciones correctivas y/o preventivas. Estas acciones se focalizan en la eliminación de la causa raíz de los

[17] PMT: Planes de Manejo de Tránsito

[18] PMT: Planes de Manejo de Tránsito

hallazgos que se han identificado durante el desarrollo del contrato n.° 2025-2782, para los componentes técnico, seguridad y salud en el trabajo, ambiental y Mántum.

Para el establecimiento del plan de mejora es importante mencionar que algunas de las acciones correctivas fueron solicitadas por la Interventoría por cada uno de los especialistas y otras fueron establecidas por el Contratista como parte de su propio plan de calidad. Es importante precisar que las acciones correctivas se integran de una o más acciones para la eliminación de causa raíz, lo cual es diferente a las acciones de corrección o medidas inmediatas para la subsunción de hallazgos.

A la emisión de este informe, el avance del plan de mejora corresponde a:

- El 57% de acciones correctivas se encuentran en estatus de programación
- El 43% de acciones correctivas se encuentran en ejecución.

El reporte consolidado de acciones correctivas y/o preventivas actualizado al mes de octubre, así como el estatus de ejecución podrá ser consultados en la carpeta 03. Calidad, ANX 4. Plan de Mejoras, subcarpeta contrato n.° 2025-2782.

- **Contrato n.° 2025-2783**

Durante el mes de octubre se continua con la construcción del plan de mejora, el cual se focaliza en la eliminación de la causa raíz de los hallazgos que se han identificado durante el desarrollo del contrato n.° 2025-2783 para el componente SST [19] y Mántum.

3.5 Creación de documentos

Durante el periodo de octubre no se realizaron incorporaciones, modificaciones y/o actualizaciones y/o derogaciones en los formatos del plan de calidad del contrato n.° 2025-2769.

En la siguiente tabla se presenta el resumen consolidado a corte del 31 de octubre de los documentos registrados como vigentes en el listado maestro.

Tabla 41. Relación de documentación a octubre plan de calidad contrato n.° 2025-2769

Proceso	Metodología y caracterización del proceso	Procedimiento	Manual	Reglamento	Formatos	Total, por Proceso
Control y vigilancia financiera y presupuestal	1	0	0	0	4	5
Gestión de calidad, evaluación y mejora continua	0	0	0	0	7	7

[19] SST: Seguridad y Salud en Trabajo

Proceso	Metodología y caracterización del proceso	Procedimiento	Manual	Reglamento	Formatos	Total, por Proceso
Gestión de la información documental	1	0	0	0	9	10
Gestión Mántum	1	0	0	0	1	2
SG-SST y Ambiental	1	1	1	1	34	38
Supervisión y control de la gestión de tránsito	1	0	0	0	2	3
Supervisión y control técnico del componente de los eléctricos y equipos de control de semaforización	1	0	0	0	19	20
Supervisión y control técnico del componente de obra civil	1	0	0	0	10	11
Supervisión y control técnico del componente de postes metálicos	1	0	0	0	11	12
Vigilancia del cumplimiento contractual y marco regulatorio	1	1	0	0	0	2
Total, por tipo de documento	9	2	1	1	97	110

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

El listado maestro de documentos del plan de calidad del contrato n.° 2025-2769, con corte a octubre del 2025, podrá ser consultado en la carpeta 03. Calidad, subcarpeta ANX 5 Formatos generales de Interventoría.

3.6 Correspondencia

Tabla 42. Listado de correspondencia recibida y enviada en el periodo de octubre

FECHA	RADICADO SDM	ASUNTO	REMITENTE	ENTIDAD QUE RECIBE	ESTADO
27/10/25	BEL-SDM-ADM-215-25 con radicado ORFEO n.° 202500001298452	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cumplimiento de objetivos de calidad y resultados de indicadores.	Consorcio Belzcon Movilidad	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado

FECHA	RADICADO SDM	ASUNTO	REMITENTE	ENTIDAD QUE RECIBE	ESTADO
24/10/2025	BEL-SDM-ADM-216-25 con radicado ORFEO n.° 202500001298512	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cambios y actualizaciones de la información documentada focalizada en formatos	Consorcio Belzcon Movilidad	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado
02/10/25	WEXT-2025-2781-130 con radicado ORFEO n.° 202561203626532	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cumplimiento de objetivos de calidad y resultados de indicadores.	Consorcio Movilidad 2025	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado
03/10/25	TPD2782-179-25 con radicado ORFEO n.° 202561203659132	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cumplimiento de objetivos de calidad y resultados de indicadores.	TPD Ingeniería	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado
16/Oct/2025	TPD2782-191-25 con radicado ORFEO n.° 202561203814742	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cambios y actualizaciones de la información documentada focalizada en formatos	TPD Ingeniería	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado
16/Oct/2025	TPD2782-194-25 con radicado ORFEO n.° 202561203900692	Atención a requerimiento componente de calidad, factor cumplimiento de objetivos de calidad y resultados de indicadores	TPD Ingeniería	Consorcio Movilidad Capital	Cerrado

Fuente: Elaboración propia de Interventoría Consorcio Movilidad Capital

Los soportes de la correspondencia recibida y enviada durante el mes de octubre podrán ser consultados en la carpeta 03. Calidad, subcarpeta ANX 6 Correspondencia, subcarpetas “Enviadas”.

3.7 Conclusiones y Recomendaciones

En esta etapa del proyecto la Interventoría Consorcio Movilidad Capital dio cumplimento a los aspectos inherentes a la Gestión de Calidad de acuerdo con lo estipulado en el contrato y cronograma de actividades.

Los anexos al presente informe se encuentran alojados en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/drive/folders/1MRD68Szfvpy1A7GafrPmD7E4wEl1c8Gt?usp=drive_link
