
CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024



Yopal, 01 de septiembre de 2025

OFICIO T - 044

Yopal, 2025/09/04 14:49:02
RAD: 20250108748
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Ingeniero
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder supervisor e interventoría
Oficina Jurídica
prof3.juridica@enerca.com.co

Asunto: Entrega de informes semanales 29 y 30.

Ref.: Contrato de consultoría 001 de 2025 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras actividades contractuales, muy respetuosamente realizamos la entrega de los informes semanales del contrato en referencia, de la siguiente manera:

N° INFORME SEMANAL	PERIODO	FOLIOS
29	Del 18/08/2025 al 24/08/2025	4
30	Del 25/08/2025 al 31/08/2025	4

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024
R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA
Contrato de consultoría No 001 de 2025

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		25	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

Semana Número:	29	Del:	18/08/2025	Al:	24/08/2025	No:	29

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Meses y 24 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO CAFETERA
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE							
CONTRATO No	004 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO CAFETERA					
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127	No. C.D.P.	6825	No R.P.	6825	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.317.074.940,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A					
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	2 de febrero de 2026			

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 2.926.829.976,00	40,00%
ACTA PARCIAL	ACTA N°2	2	$ 1.321.631.486,00	18,06%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 4.248.461.462,00	58,06%

PRORROGAS		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
1	SEIS (06) MESES	2/02/2026

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	2,71%	45,29%	OBRA EJECUTADA (%)	4,72%	50,49%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 198.378.802,03	$ 3.313.721.678,41	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 345.222.626,00	$ 3.694.687.005,54

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		25	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

		PROYECTO SGR	CODIGO BPIN: 2024005850127
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

OBJETO:	**INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.**						
CONTRATO No	001 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127	No. C.D.P.	6525	No R.P.	6525
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 628.563.058,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SIETE (07) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de septiembre de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	2 de marzo de 2026		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA				
CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ACTA PARCIAL	ACTA N°2	2	$ 281.343.578,00	44,76%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 281.343.578	44,76%

PRORROGAS				SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
1	SEIS (06) MESES	2/03/2026		N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

OBJETO:	N/A						
CONTRATO No	N/A	NOMBRE DEL CONTRATISTA					
NOMBRE DEL RUBRO	N/A	RUBRO		No. C.D.P.		No R.P.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	N/A	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN					
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		25	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850127

INTERVENTORIA [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]

FECHA DE INCIO	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A


PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con excavaciones manuales en las veredas Cuneque, Cizareque, Une, Delicias, Ariporo y Zulia.
Se continúa con la instalación de tuberia de 1" en las veredas Cuneque, Cizareque, Ariporo y Zulia.
Se continúa con la instalación de tuberia de 1/2" en las veredas Cizareque, Une y Delicias.
Se continúa con la instalación de tuberia de 3/4" en las veredas Cuneque, Ariporo, Cizareque y Zulia.
Se continúa con relleno a excavaciones realizadas en las veredas Cuneque, Cizareque, Zulia, Ariporo, Une y Delicias.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

REGISTRO FOTOGRAFICO

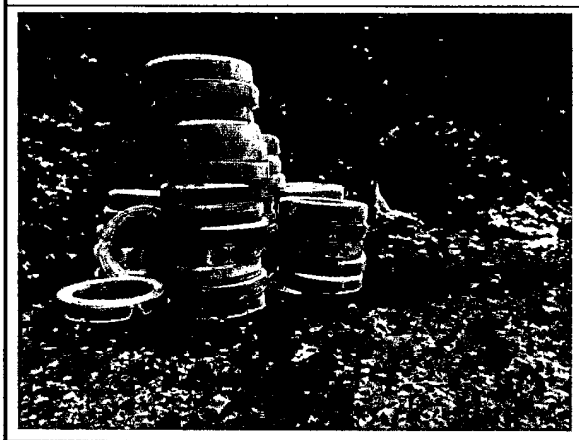

Descripción: Acopio de tuberia en el sitio de obra.



Descripción: Pegue de tubería.

CONTRATO No.:	001 DE 2025	FECHA	DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.		25	8	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR **CODIGO BPIN:** 2024005850127


INTERVENTORIA [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar con excavaciones manuales en las veredas Cuneque, Zulia, Ariporo, Cizareque, Une y Delicias.
Continuar con la instalación de tuberia de 1/2" en las veredas Cizareque, Ariporo, Zulia y Delicias.
Continuar con la instalación de tuberia de 1" en la vereda Cuneque, Ariporo y Zulia.
Continuar con la instalacion de conexiones domiciliarias en las veredas Chitacote y Chaparral.
Continuar con relleno a excavaciones realizadas.

OBSERVACIONES

Al corte del presente informe semanal, se tiene un adelanto del 5,21%.

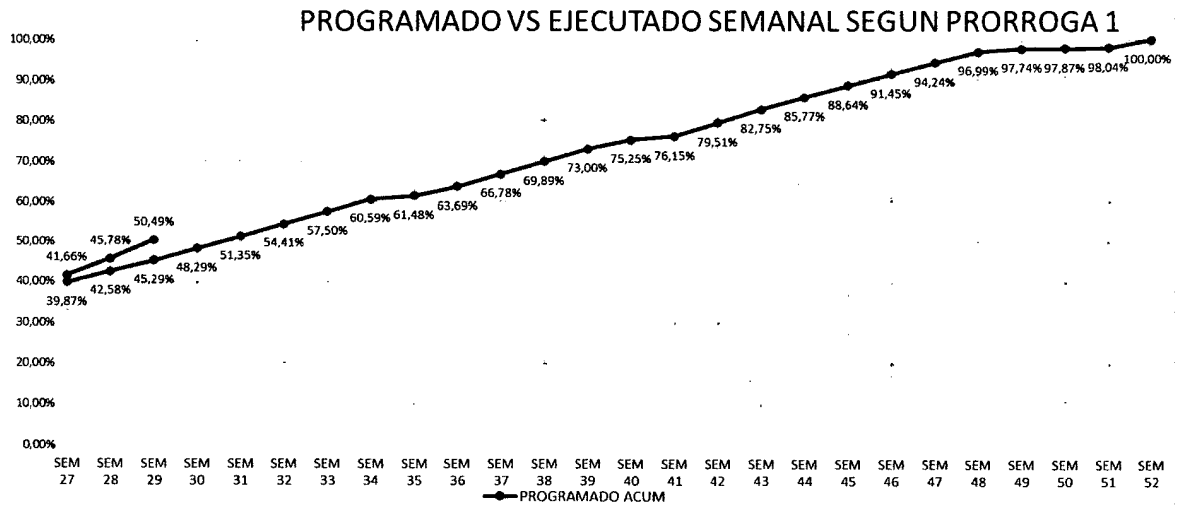

En constancia se firma.

Elaboró:
CONSORCIO INTER-GAS TAMARA 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:
RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

CONTRATO No.:	001 DE 2025		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.	FECHA	1	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

Semana Número:	30	Del:	25/08/2025	Al:	31/08/2025	No:	30

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Meses y 28 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO CAFETERA
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE

CONTRATO DE OBRA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE						
CONTRATO No	004 DE 2025	NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO CAFETERA				
NOMBRE DEL RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE	RUBRO	00AD-2101-1900-2024-00585-0127	No. C.D.P.	6825	No R.P.	6825
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.317.074.940,00	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES				
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	N/A	PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN	N/A				
FECHA DE INCIO	3 de febrero de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN	2 de agosto de 2025	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	2 de febrero de 2026		

DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA

CONCEPTO DEL DESEMBOLSO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	VALOR DESEMBOLSADO	% DESEMBOLSO
ANTICIPO	ACTA DE INICIO	1	$ 2.926.829.976,00	40,00%
ACTA PARCIAL	ACTA N°2	2	$ 1.321.631.486,00	18,06%
TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA			$ 4.248.461.462,00	58,06%

PRORROGAS			SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION		
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA No	TIEMPO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
1	SEIS (06) MESES	2/02/2026	N/A	N/A	N/A

ADICIONES		
CONTRATO ADICIONAL No	VALOR	NUEVO VALOR DEL CONTRATO
N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	3,00%	48,29%	OBRA EJECUTADA (%)	5,20%	55,70%
VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA	$ 219.799.403,07	$ 3.533.521.081,48	VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	$ 380.816.156,00	$ 4.075.503.161,54

CONTRATO No.:	001 DE 2025		DD	MM	AA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.	FECHA	1	9	2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION


	PROYECTO SGR	CODIGO BPIN:	2024005850127
INTERVENTORIA	X	APOYO SUPERVISION	

ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA

Se proyecta continuar con excavaciones manuales en las veredas Cuneque, Zulia, Ariporo, Cizareque, Une y Delicias.
Continuar con la instalación de tuberia de 1/2" en las veredas Cizareque, Ariporo, Zulia y Delicias.
Continuar con la instalación de tuberia de 1" en la vereda Cuneque, Ariporo y Zulia.
Continuar con la instalacion de conexiones domiciliarias en las veredas Chitacote y Chaparral.
Continuar con relleno a excavaciones realizadas.

OBSERVACIONES

Al corte del presente informe semanal, se tiene un adelanto del 7,41%.

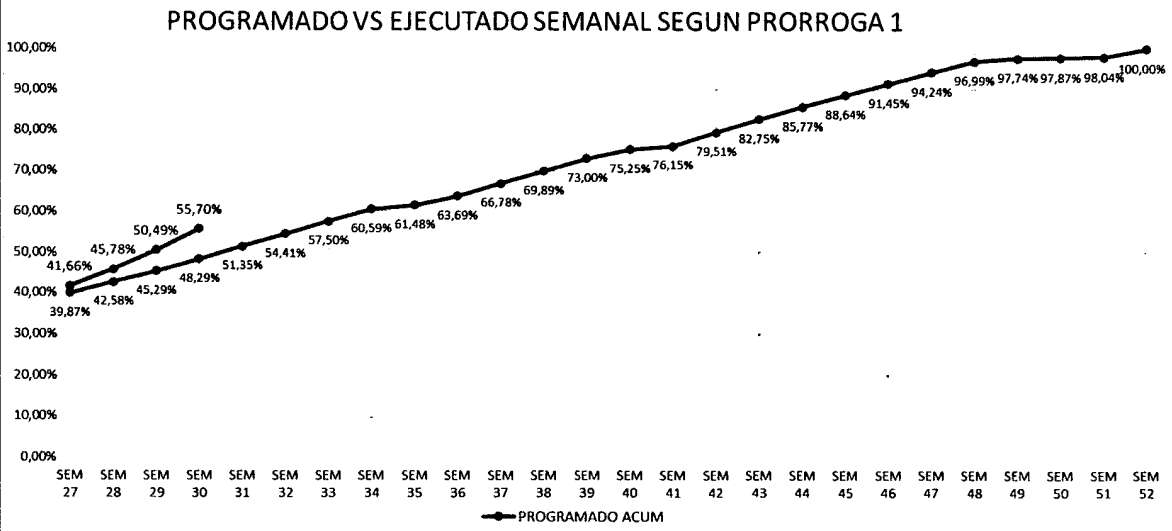

En constancia se firma.

Elaboró:
CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:
RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:
LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:
ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
