
# CONSORCIO INTER – GASTAMARA 2024



Yopal, 30 de septiembre de 2025

**OFICIO T - 050**

Yopal, 2025/09/30 10:25:20
RAD: 20250109647
Empresa de energia de casanare S.A.E.S.P.
Enerca
correspondencia

Ingeniero
**LUIS RENE GRANADOS VARGAS**
Líder supervisor e interventoría
Oficina Jurídica
prof3.juridica@enerca.com.co

**Asunto: Entrega de informes semanales 33 y 34.**

Ref.: Contrato de consultoría 001 de 2025 que tiene por objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras actividades contractuales, muy respetuosamente realizamos la entrega de los informes semanales del contrato en referencia, de la siguiente manera:

| N° INFORME SEMANAL | PERIODO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 33 | Del 15/09/2025 al 21/09/2025 | 4 |
| 34 | Del 22/09/2025 al 30/09/2025 | 4 |

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

**CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024**
R/L AUDENAR FLOREZ SANABRIA
Contrato de consultoría No 001 de 2025
Anexo: 8 folios

| CONTRATO No.: | 001 DE 2025 | FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE. | | 22 | 9 | 2025 |

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

| Semana Número: | 33 | Del: | 15/09/2025 | Al: | 21/09/2025 | No: | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 6 Meses y 19 Días (Calendario)

Nombre del Contratista: CONSORCIO CAFETERA
Nombre del Interventor: CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024
Nombre del Supervisor: LUIS RENE GRANADOS VARGAS - ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO
Nombre Apoyo a la Supervisión: RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE

## CONTRATO DE OBRA

| OBJETO: | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No | 004 DE 2025 | NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO CAFETERA | | | | | |
| NOMBRE DEL RUBRO | 00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE | RUBRO | 00AD-2101-1900-2024-00585-0127 | No. C.D.P. | 6825 | No R.P. | 6825 | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 7.317.074.940,00 | PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | SEIS (06) MESES | | | | | |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | N/A | PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN | DOCE (12) MESES | | | | | |
| FECHA DE INCIO | 3 de febrero de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN | 2 de agosto de 2025 | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 2 de febrero de 2026 | | | |

**DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA**

| CONCEPTO DEL DESEMBOLSO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | VALOR DESEMBOLSADO | % DESEMBOLSO |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | ACTA DE INICIO | 1 | $ 2.926.829.976,00 | 40,00% |
| ACTA PARCIAL | ACTA N°2 | 2 | $ 1.321.631.486,00 | 18,06% |
| | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA | | | $ 4.248.461.462,00 | 58,06% |

| PRORROGAS | | | SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | ACTA No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| 1 | SEIS (06) MESES | 2/02/2026 | N/A | N/A | N/A |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | VALOR | NUEVO VALOR DEL CONTRATO |
| N/A | N/A | N/A |

## EJECUCIÓN

| | SEMANAL | ACUMULADO | | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA PROGRAMADA (%) | 3,09% | 57,50% | OBRA EJECUTADA (%) | 6,56% | 70,07% |
| VALOR DE LA OBRA PROGRAMADA | $ 226.274.669,00 | $ 4.207.366.889,28 | VALOR DE LA OBRA EJECUTADA | $ 480.028.887,00 | $ 5.126.864.551,06 |

| CONTRATO No.: | 001 DE 2025 | FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE. | | 22 | 9 | 2025 |

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION**

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | **INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.** | | | | | | |
| CONTRATO No | 001 DE 2025 | NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024 | | | | |
| NOMBRE DEL RUBRO | 00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE | RUBRO | 00AD-2101-1900-2024-00585-0127 | No. C.D.P. | 6525 | No R.P. | 6525 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 628.563.058,00 | PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | SIETE (07) MESES | | | | |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | N/A | PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN | TRECE (13) MESES | | | | |
| FECHA DE INCIO | 3 de febrero de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN | 2 de septiembre de 2025 | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 2 de marzo de 2026 | | |

**DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA**

| CONCEPTO DEL DESEMBOLSO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | VALOR DESEMBOLSADO | % DESEMBOLSO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL | ACTA N°2 | 2 | $ 281.343.578,00 | 44,76% |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA | | | $ 281.343.578 | 44,76% |

| PRORROGAS | | | | SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | | ACTA No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| 1 | SEIS (06) MESES | 2/03/2026 | | N/A | N/A | N/A |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | VALOR | NUEVO VALOR DEL CONTRATO |
| N/A | N/A | N/A |

**PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | N/A | | | | | | |
| CONTRATO No | N/A | NOMBRE DEL CONTRATISTA | | | | | |
| NOMBRE DEL RUBRO | N/A | RUBRO | | No. C.D.P. | | No R.P. | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | N/A | PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | | | | | |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | N/A | PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN | N/A | | | | |

| CONTRATO No.: | 001 DE 2025 | FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE. | | 22 | 9 | 2025 |

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

| FECHA DE INCIO | N/A | FECHA DE TERMINACIÓN | | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | N/A |
|---|---|---|---|---|---|

| PRORROGAS | | | SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | ACTA No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | VALOR | NUEVO VALOR DEL CONTRATO |
| N/A | N/A | N/A |

## RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la instalación de medidores en las veredas Bujío, Tablón de tamara y Chaparral.
Se continúa con excavaciones manuales en las veredas Ariporo, Zulia y Delicias.
Se continúa con la instalación de tuberia de 1/2" en las veredas Zulia, Ariporo y Delicias.
Se continúa con la instalación de tuberia de 3/4" en la vereda Ariporo.
Se continúa con relleno a excavaciones realizadas en las veredas Ariporo, Zulia y Delicias.
Se continúa con la construcción del paso elevado Cruce Aereo Encamisado Ø 2" en la vereda el Chaparral y Bujio.
Se realiza la construcción de pasos elevados sobre canales menores en las veredas Chaparral y Chitacote.
Se realiza el cruce de via con misil de diámetro de 2" en la vereda tablón de tamara.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

## REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Cruce de via con misil.



Descripción: Cruce de via con misil.

| CONTRATO No.: | 001 DE 2025 | | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE. | FECHA | 22 | 9 | 2025 |

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION**

**PROYECTO SGR** **CODIGO BPIN:** 2024005850127


**INTERVENTORIA** [X] **APOYO SUPERVISION** [ ]

**ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA**

Se proyecta continuar con excavaciones manuales en las veredas Zulia, Ariporo y Delicias.
Continuar con la instalación de tuberia de 1/2" en las veredas Ariporo y Zulia.
Continuar con la instalación de tuberia de 3/4" en la vereda Ariporo.
Continuar con la instalacion de conexiones domiciliarias en las veredas Chitacote y Chaparral.
Continuar con relleno a excavaciones realizadas.

**OBSERVACIONES**

**Al corte del presente informe semanal, se tiene un adelanto del 12,57%.**

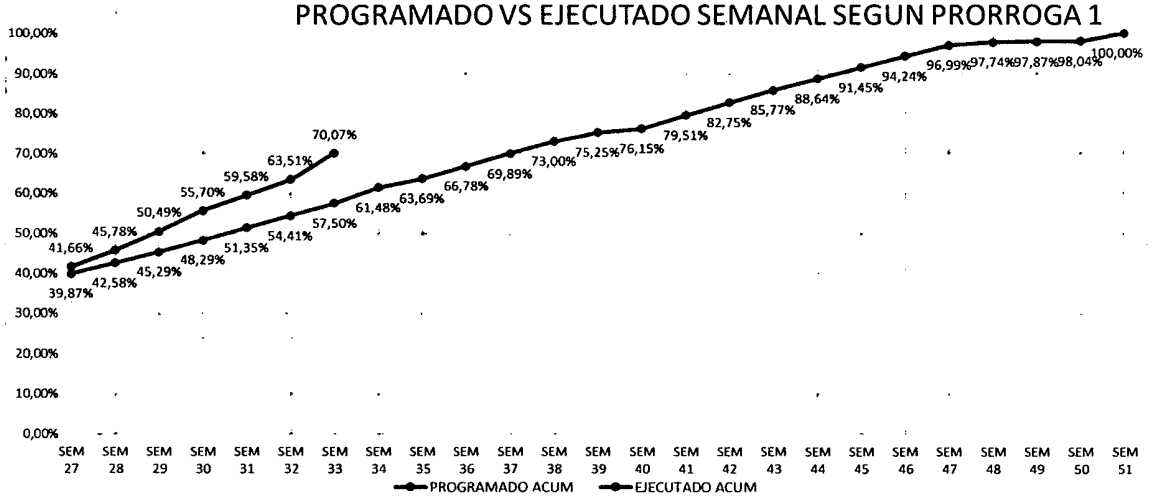


**En constancia se firma.**

Elaboró:
**CONSORCIO INTER - GASTAMARK 2024**
R/L Audenar Florez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:
**RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:
**LUIS RENE GRANADOS VARGAS**
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:
**ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO**
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

| CONTRATO No.: | 001 DE 2025 | | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE. | FECHA | 1 | 10 | 2025 |

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | **INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE.** | | | | | | |
| CONTRATO No | 001 DE 2025 | NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO INTER - GASTAMARA 2024 | | | | |
| NOMBRE DEL RUBRO | 00AD-2101-1900-2024-00585-0127 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE | RUBRO | 00AD-2101-1900-2024-00585-0127 | No. C.D.P. | 6525 | No R.P. | 6525 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 628.563.058,00 | PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | SIETE (07) MESES | | | | |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | N/A | PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN | TRECE (13) MESES | | | | |
| FECHA DE INCIO | 3 de febrero de 2025 | FECHA DE TERMINACIÓN | 2 de septiembre de 2025 | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 2 de marzo de 2026 | | |

**DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA**

| CONCEPTO DEL DESEMBOLSO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | N° DOCUMENTO | VALOR DESEMBOLSADO | % DESEMBOLSO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL | ACTA N°2 | 2 | $ 281.343.578,00 | 44,76% |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA | | | $ 281.343.578 | 44,76% |

| PRORROGAS | | | | SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | | ACTA No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| 1 | SEIS (06) MESES | 2/03/2026 | | N/A | N/A | N/A |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | VALOR | NUEVO VALOR DEL CONTRATO |
| N/A | N/A | N/A |

### PRESTACION DE SERVICIO - APOYO A LA SUPERVISION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | N/A | | | | | | |
| CONTRATO No | N/A | NOMBRE DEL CONTRATISTA | | | | | |
| NOMBRE DEL RUBRO | N/A | RUBRO | | No. C.D.P. | | No R.P. | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | N/A | PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN | | | | | |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | N/A | PLAZO ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN | N/A | | | | |

| CONTRATO No.: | 001 DE 2025 | FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE. | | 1 | 10 | 2025 |

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION

PROYECTO SGR — CODIGO BPIN: 2024005850127

INTERVENTORIA [X] — APOYO SUPERVISION [ ]

| FECHA DE INCIO | N/A | FECHA DE TERMINACIÓN | | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | N/A |
|---|---|---|---|---|---|

| PRORROGAS | | | SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | ACTA No | TIEMPO | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| ADICIONES | | |
|---|---|---|
| CONTRATO ADICIONAL No | VALOR | NUEVO VALOR DEL CONTRATO |
| N/A | N/A | N/A |


## RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con la instalación de medidores en las veredas Chaparral y chitacote y en el casco urbano de Tamara.
Se continúa con excavaciones manuales en las veredas Ariporo y Zulia.
Se continúa con la instalación de tuberia de 1/2" en las veredas Zulia y Ariporo.
Se continúa con la instalación de tuberia de 3/4" en la vereda Ariporo.
Se continúa con relleno a excavaciones realizadas en las veredas Ariporo, Zulia y Delicias.
Cabe resaltar que las anteriores actividades son realizadas bajo el acompañamiento constante de la interventoría, desarrolladas bajo las normativas NTC 2505 instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales, NTC 3728 gasoductos, líneas de transporte y redes de distribución de gas, ademas, de acuerdo al acto de gerencia No 219 del 12/09/2013 "manual de supervisión e interventoria de la empresa de energia de Casanare"

## REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción: Pegue de tuberias.

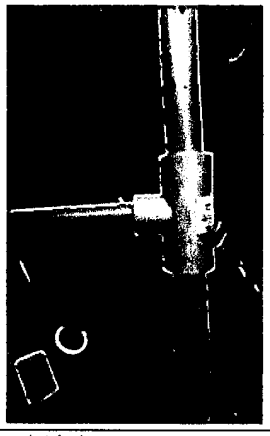





Descripción: Excavación manual en material común.

| CONTRATO No.: | 001 DE 2025 | FECHA | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TAMARA, CASANARE. | | 1 | 10 | 2025 |

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA O QUINCENAL APOYO SUPERVISION**


| | | | |
|---|---|---|---|
| | PROYECTO SGR | CODIGO BPIN: | 2024005850127 |
| INTERVENTORIA | X | APOYO SUPERVISION | |

**ACTIVIDADES PROYECTADAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA**

Se proyecta continuar con excavaciones manuales en las veredas Zulia, Ariporo y Delicias.
Continuar con la instalación de tuberia de 1/2" en las veredas Ariporo y Zulia.
Continuar con la instalación de tuberia de 3/4" en la vereda Ariporo.
Continuar con la instalacion de conexiones domiciliarias en las veredas Chitacote y Chaparral y en el casco urbano de tamara.
Continuar con relleno a excavaciones realizadas.

**OBSERVACIONES**

**Al corte del presente informe semanal, se tiene un adelanto del 11,85%.**

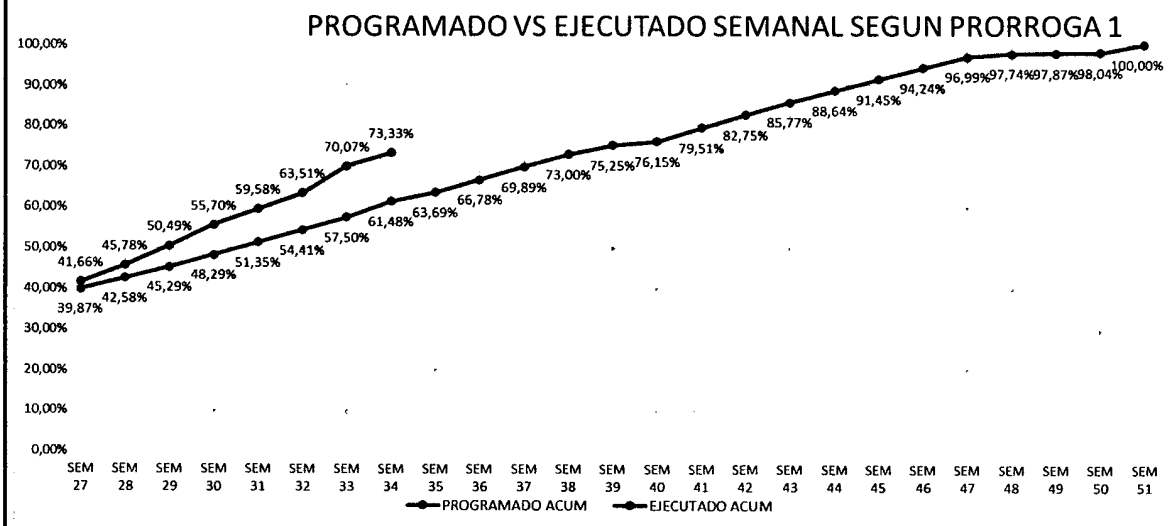


**En constancia se firma.**

Elaboró:
**CONSORCIO INTER - CASTAMARA 2024**
R/L Audenar Elorez Sanabria
INTERVENTOR

Revisó:
**RICARDO LEON PULIDO AGUIRRE**
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibió:
**LUIS RENE GRANADOS VARGAS**
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA

Enterado:
**ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO**
SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA
